




Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predeces	Qui, 04/Jun				Sex, 05/Jun			
								0	6	12	18	0	6	12	18
1		Player de Musica	308 hrs	55 dias?	Ter 19/04/22	Seg 04/07/22									
2		prospecção	24 hrs	3 dias	Ter 19/04/22	Qui 21/04/22									
3		PTEC	2 hrs	0,25 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22									
4		Estudar Domínio de aplicaçâ	2 hrs	0,25 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22									
5		Reunir com o Fornecedor de Requisitos	0 hrs	0 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22	4								
6		Redigir PTEC	0 hrs	0 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22	5								
7		Revisar PTEC	0 hrs	0 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22	6								
8		Aprovar PTEC	0 hrs	0 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22	7								
9		EST	11 hrs	1,38 dias	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22									
10		Estimar tamanho do projeto	8 hrs	1 dia	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22	8								
11		Revisar EST	3 hrs	0,38 dias	Qua 20/04/22	Qua 20/04/22	10								
12		Cronograma e Orçamento	11 hrs	1,38 dias	Qua 20/04/22	Qui 21/04/22									
13		Elaborar Cronograma e Orçamento Preliminares	6 hrs	0,75 dias	Qua 20/04/22	Qui 21/04/22	11								
14		Revisar Cronograma e Orçamento Preliminares	5 hrs	0,63 dias	Qui 21/04/22	Qui 21/04/22	13								
15		Análise	25 hrs	3,88 dias	Ter 19/04/22	Seg 25/04/22									
16		DRE	18 hrs	2,25 dias	Ter 19/04/22	Qui 21/04/22									
17		Reunir com o Fornecedor de Requisitos	0 hrs	0 dias	Ter 19/04/22	Ter 19/04/22	8								

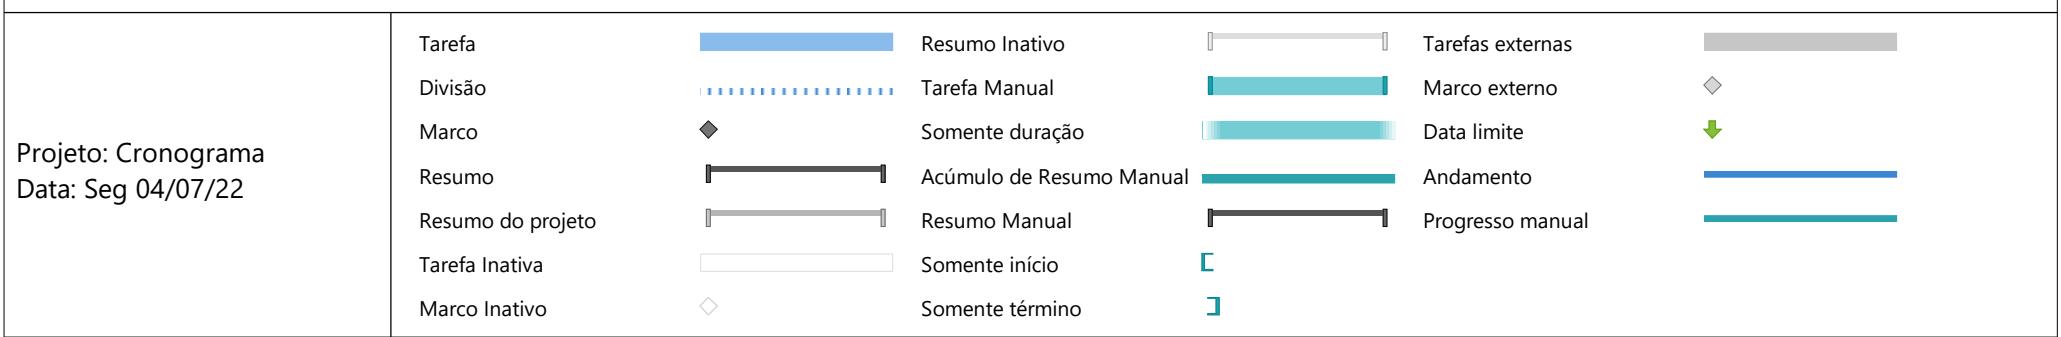

Id	Mod. da Tare	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predeces	Qui, 04/Jun				Sex, 05/Jun			
								0	6	12	18	0	6	12	18
18	➡	Elaborar DRE		8 hrs	1 dia	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22	17							
19	➡	Revisar DRE		5 hrs	0,63 dias	Qua 20/04/22	Qua 20/04/22	18							
20	➡	Aprovar DRE		5 hrs	0,63 dias	Qua 20/04/22	Qui 21/04/22	19							
21	➡	MRB		7 hrs	1,63 dias	Qui 21/04/22	Seg 25/04/22								
22	➡	Elaborar MRB		6 hrs	0,75 dias	Qui 21/04/22	Sext 22/04/22	20							
23	➡	Revisar MRB		1 hr	0,13 dias	Seg 25/04/22	Seg 25/04/22	22							
24	➡	Projeto		7 hrs	0,75 dias	Qui 21/04/22	Sext 22/04/22								
32	➡	Planejamento		47 hrs	5,88 dias	Sext 22/04/22	Seg 02/05/22								
36	➡	Desenvolvimento		126 hrs	11,88 dias	Sext 22/04/22	Seg 09/05/22								
37	➡	Implementação		92 hrs	5,5 dias	Seg 02/05/22	Seg 09/05/22								
38	➡	Implementar [RF01]		14 hrs	1,75 dias	Seg 02/05/22	Ter 03/05/22	35							
39	➡	Implementar [RF02]		15 hrs	1,88 dias	Seg 02/05/22	Ter 03/05/22	35							
40	➡	Implementar [RF03]		2 hrs	0,25 dias	Ter 03/05/22	Qua 04/05/22	38							
41	➡	Implementar [RF04]		3 hrs	0,38 dias	Ter 03/05/22	Qua 04/05/22	38							
42	➡	Implementar [RF05]		11 hrs	1,38 dias	Qua 04/05/22	Qui 05/05/22	41							
43	➡	Implementar [RF06]		0 hrs	0 dias	Ter 03/05/22	Ter 03/05/22	39							
44	➡	Implementar [RF07]		4 hrs	0,5 dias	Qua 04/05/22	Qua 04/05/22	40							
45	➡	Implementar [RF08]		7 hrs	0,88 dias	Qua 04/05/22	Seg 09/05/22	40							
46	➡	Implementar [RF09]		8 hrs	1 dia	Qua 04/05/22	Qui 05/05/22	44							
47	➡	Implementar [RF10]		2 hrs	0,25 dias	Seg 09/05/22	Seg 09/05/22	45							




Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predeces	Qui, 04/Jun				Sex, 05/Jun			
								0	6	12	18	0	6	12	18
48	➡	Implementar [RF11]	10 hrs	1,25 dias	Qui 05/05/22	Sex 06/05/22	42								
49	➡	Implementar [RF12]	16 hrs	2 dias	Qui 05/05/22	Sat 07/05/22	42								
50	➡	Teste	34 hrs	11,88 dias	Sex 22/04/22	Seg 09/05/22									
51	➡	Testar [RF01]	4 hrs	0,5 dias	Sex 22/04/22	Sex 22/04/22	30								
52	➡	Testar [RF02]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	39								
53	➡	Testar [RF03]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	40								
54	➡	Testar [RF04]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	41								
55	➡	Testar [RF05]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	42								
56	➡	Testar [RF06]	0 hrs	0 dias	Ter 03/05/22	Ter 03/05/22	43								
57	➡	Testar [RF07]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	44								
58	➡	Testar [RF08]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	45								
59	➡	Testar [RF09]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	46								
60	➡	Testar [RF10]	3 hrs	0,38 dias	Thu 03/05/22	Thu 03/05/22	47								
61	➡	Testar [RF11]	3 hrs	0,38 dias	Sex 06/05/22	Sex 06/05/22	48								
62	➡	Testar [RF12]	3 hrs	0,38 dias	Sex 06/05/22	Sex 06/05/22	49								
63	➡	Monitoramento e Controle	32 hrs	1,38 dias?	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22									
68	➡	Fechamento	15 hrs	1,88 dias?	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22									
69	➡	Elaborar relatório de lições	15 hrs	1,88 dias?	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22									
70	➡	Controle de mudanças	32 hrs	4,5 dias?	Qua 04/05/22	Ter 10/05/22									
71	➡	Ajustar [RF02] - upload no front	7 hrs	0,88 dias?	Qua 04/05/22	Qui 05/05/22	52								




Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predeces	Qui, 04/Jun				Sex, 05/Jun			
								0	6	12	18	0	6	12	18
72	➡	Restructurar [RF02] - chave principal	7 hrs	0,88 dias?	Qua 04/05/22	Qui 05/05/22	52								
73	➡	Alterar [RF12] - organização da base	7 hrs	0,88 dias?	Ter 10/05/22	Ter 10/05/22	62								
74	➡	Incrementar [RF12] - Adição de novos recursos	6 hrs	0,75 dias?	Ter 10/05/22	Ter 10/05/22	62								
75	➡	Alterar [RF05] - função de volta	5 hrs	0,63 dias?	Seg 09/05/22	Seg 09/05/22	55								

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

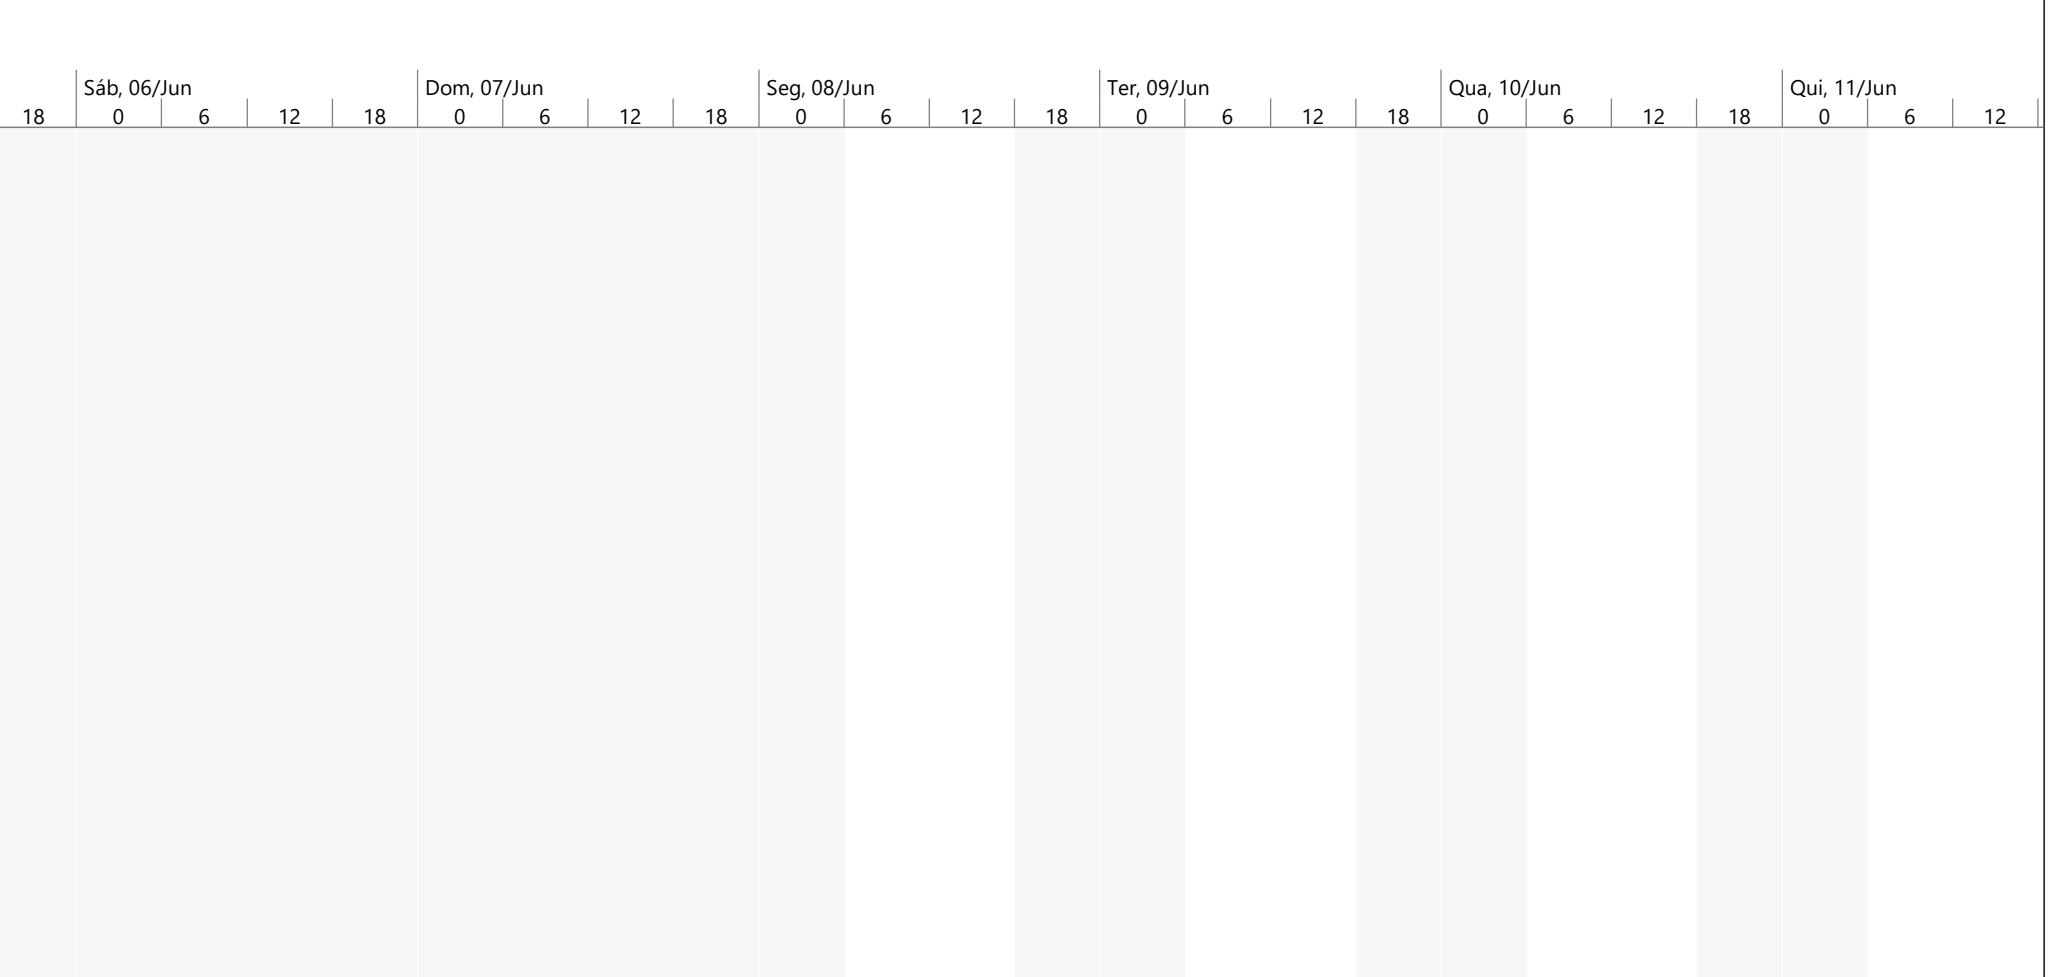


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

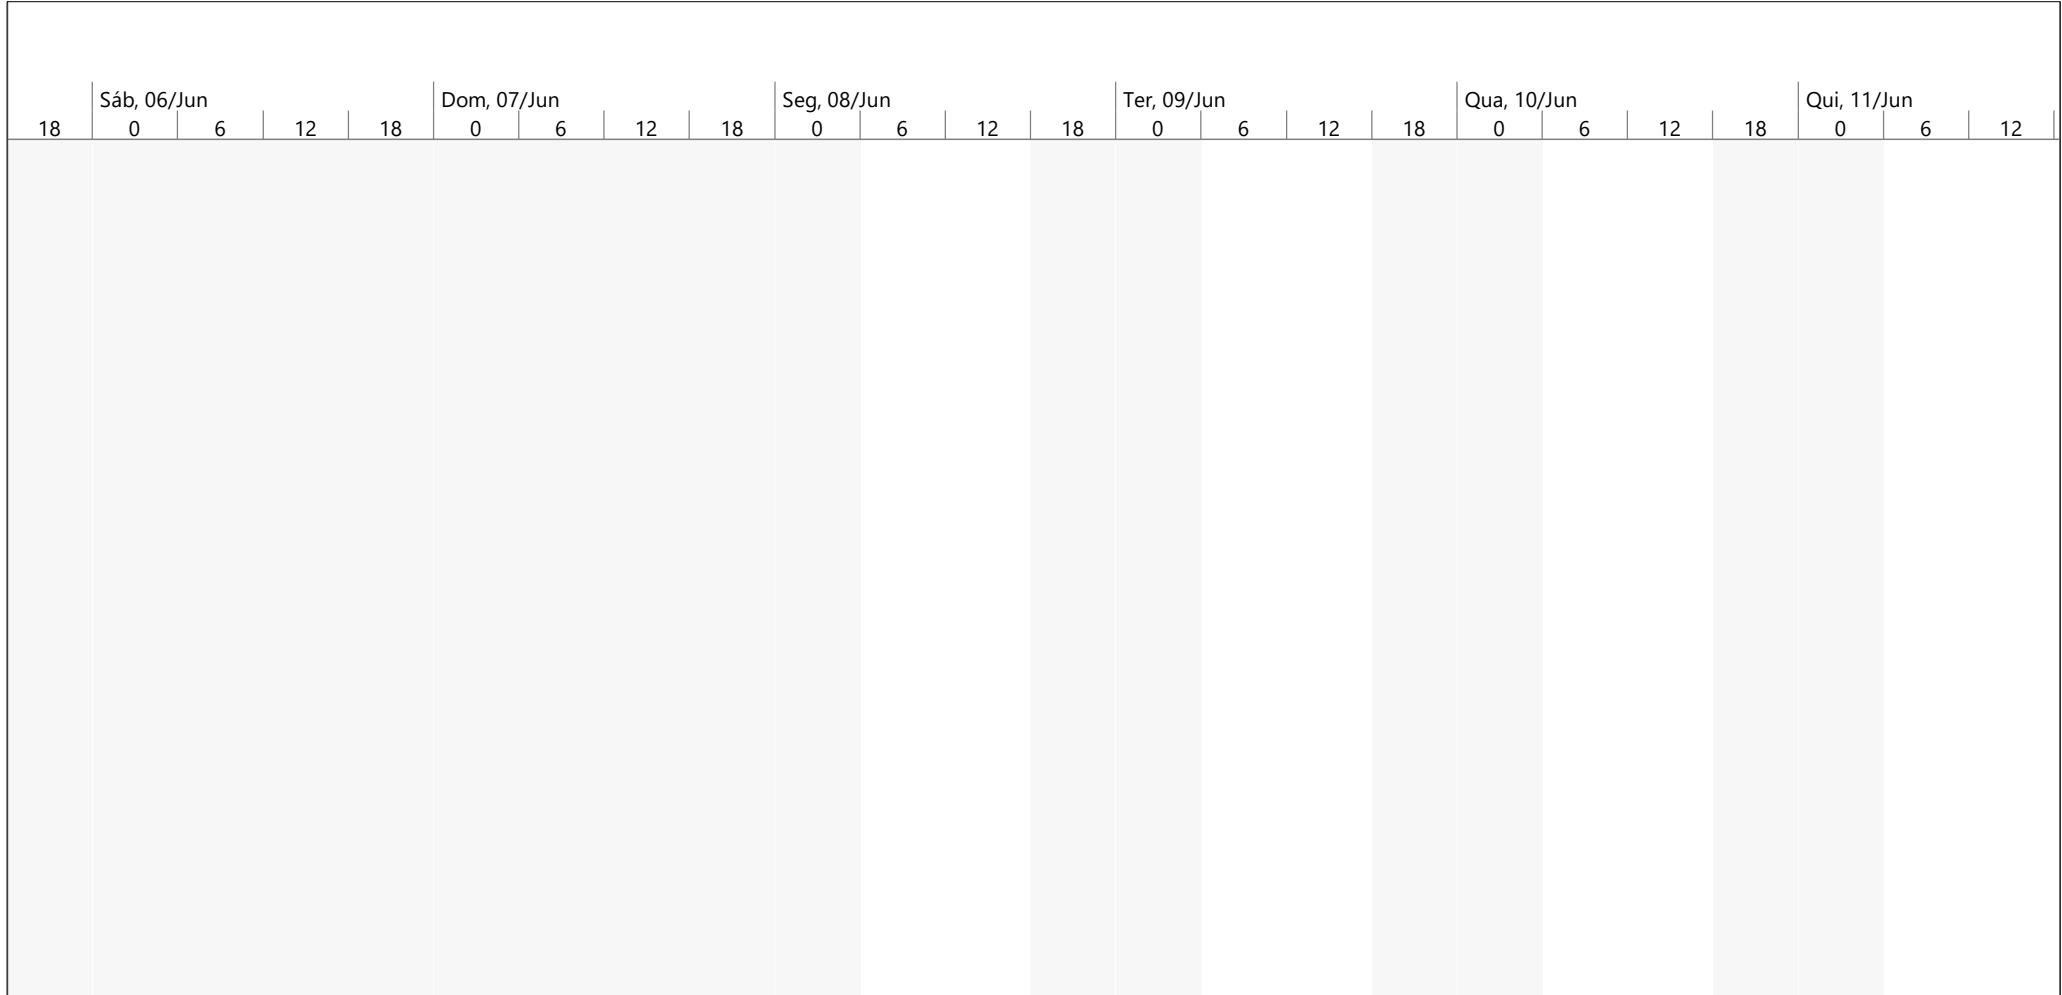


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

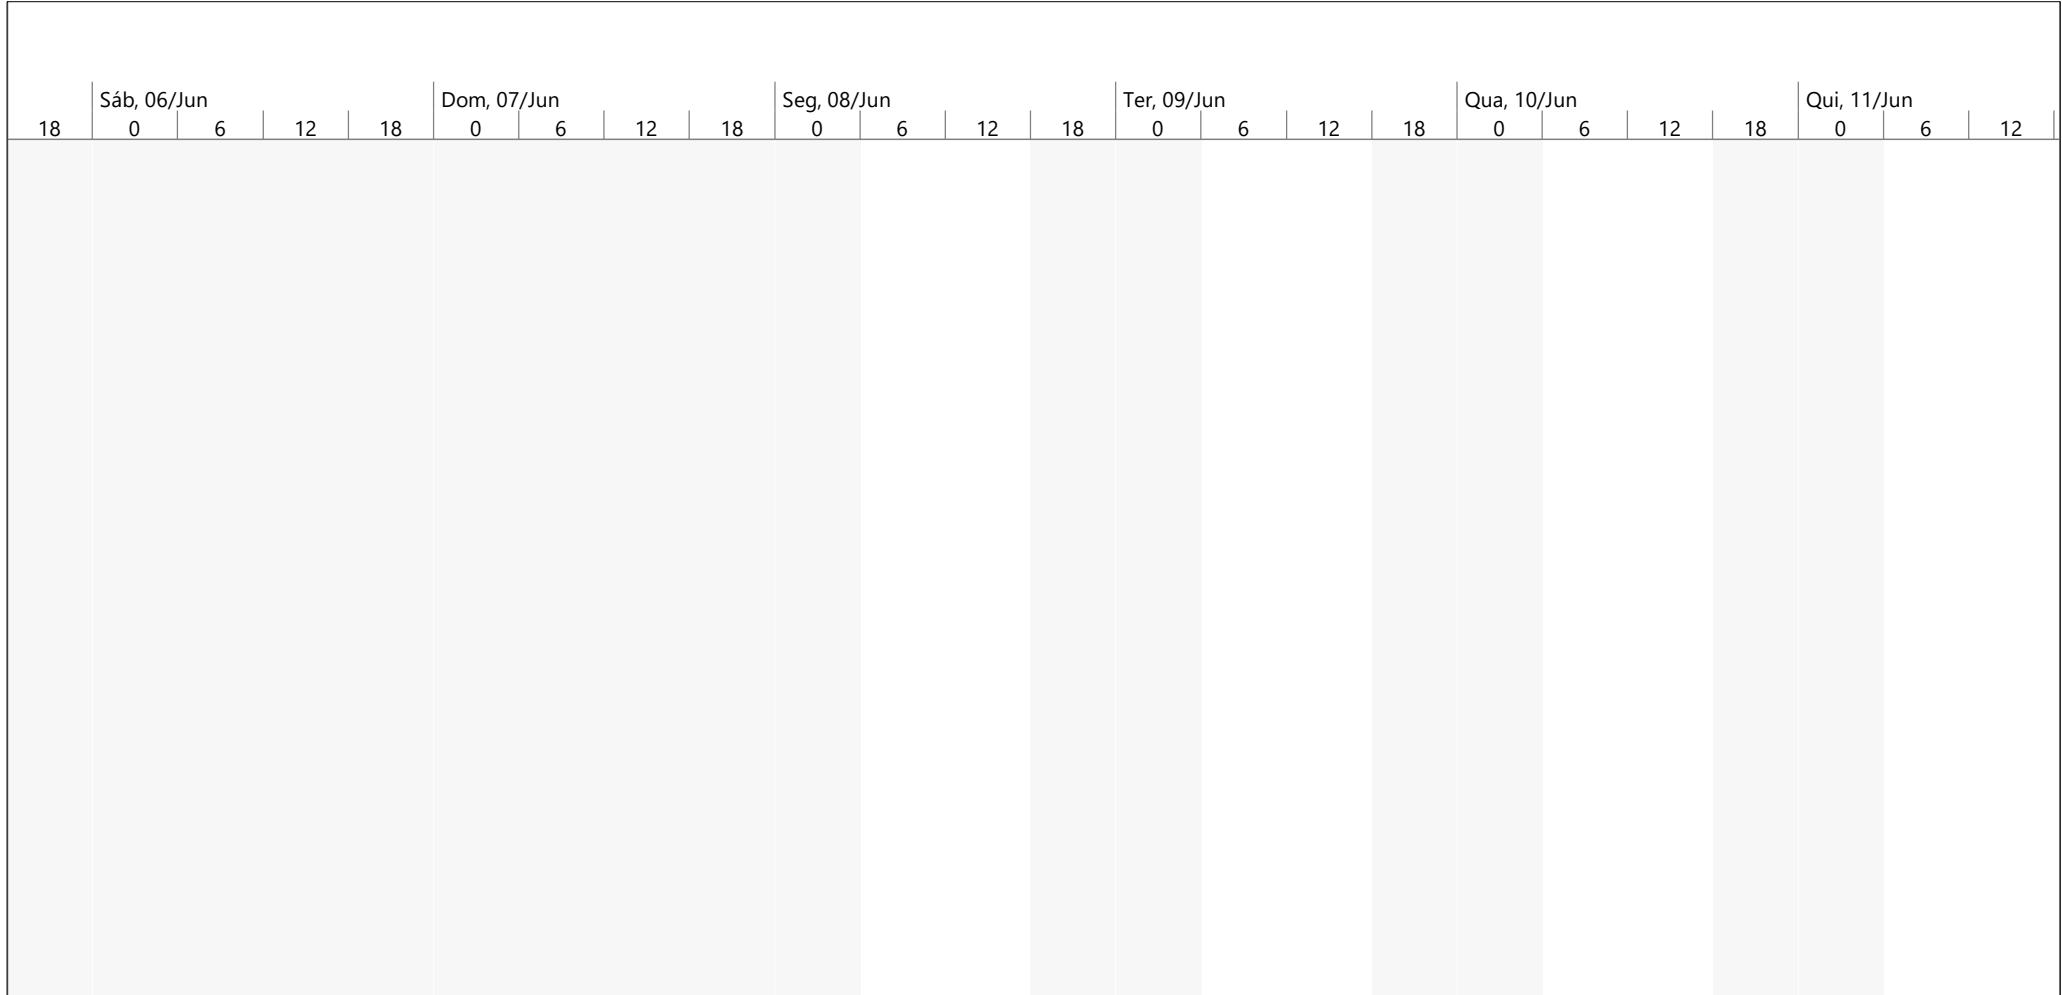


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

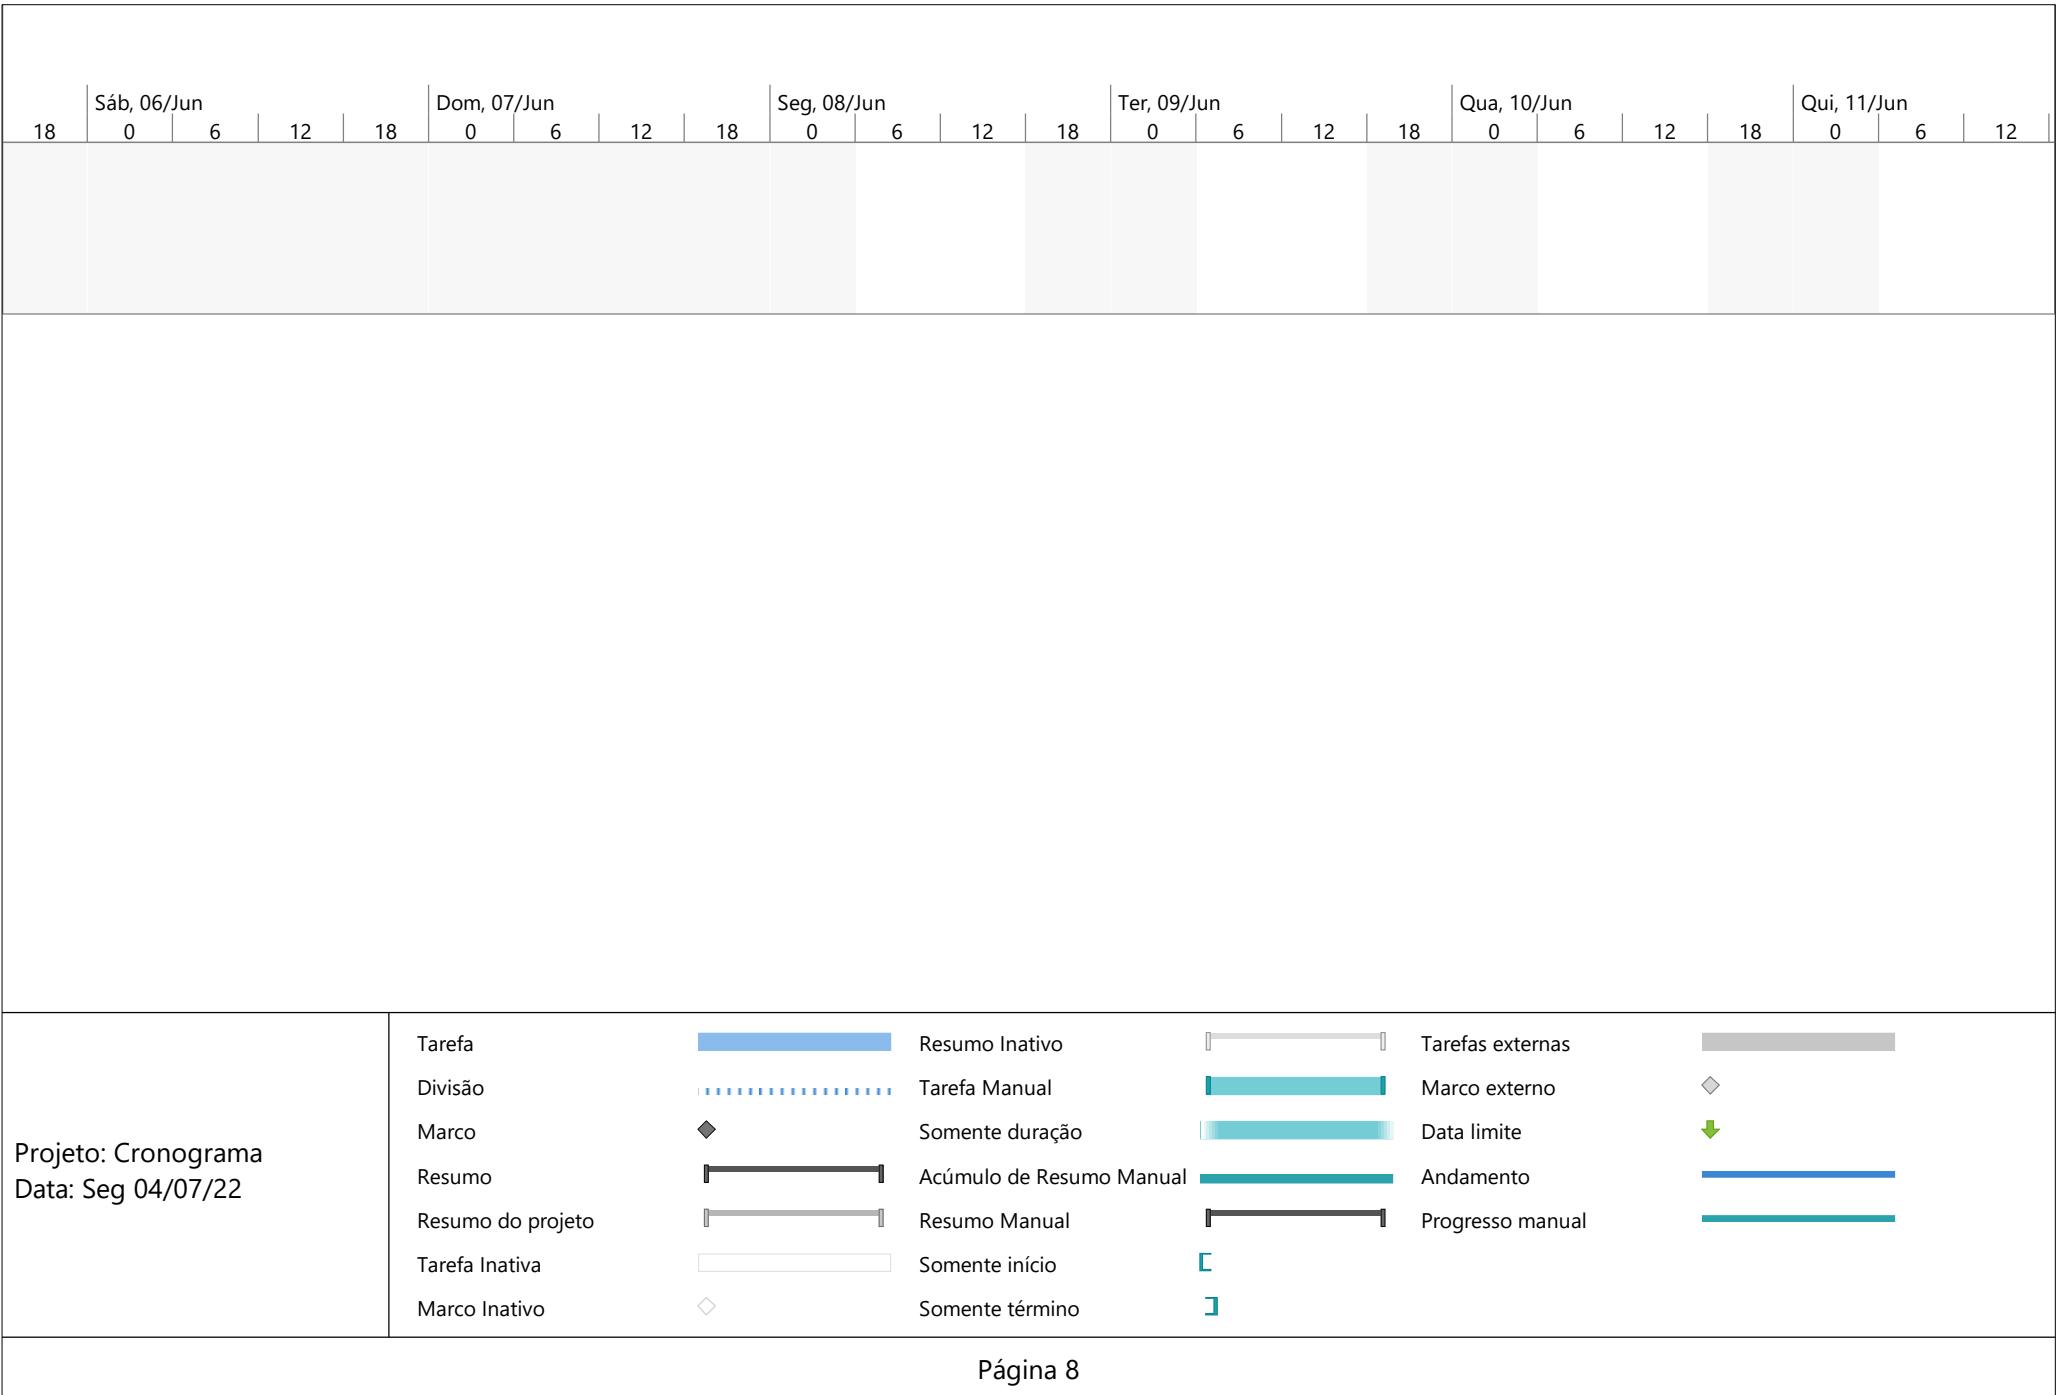


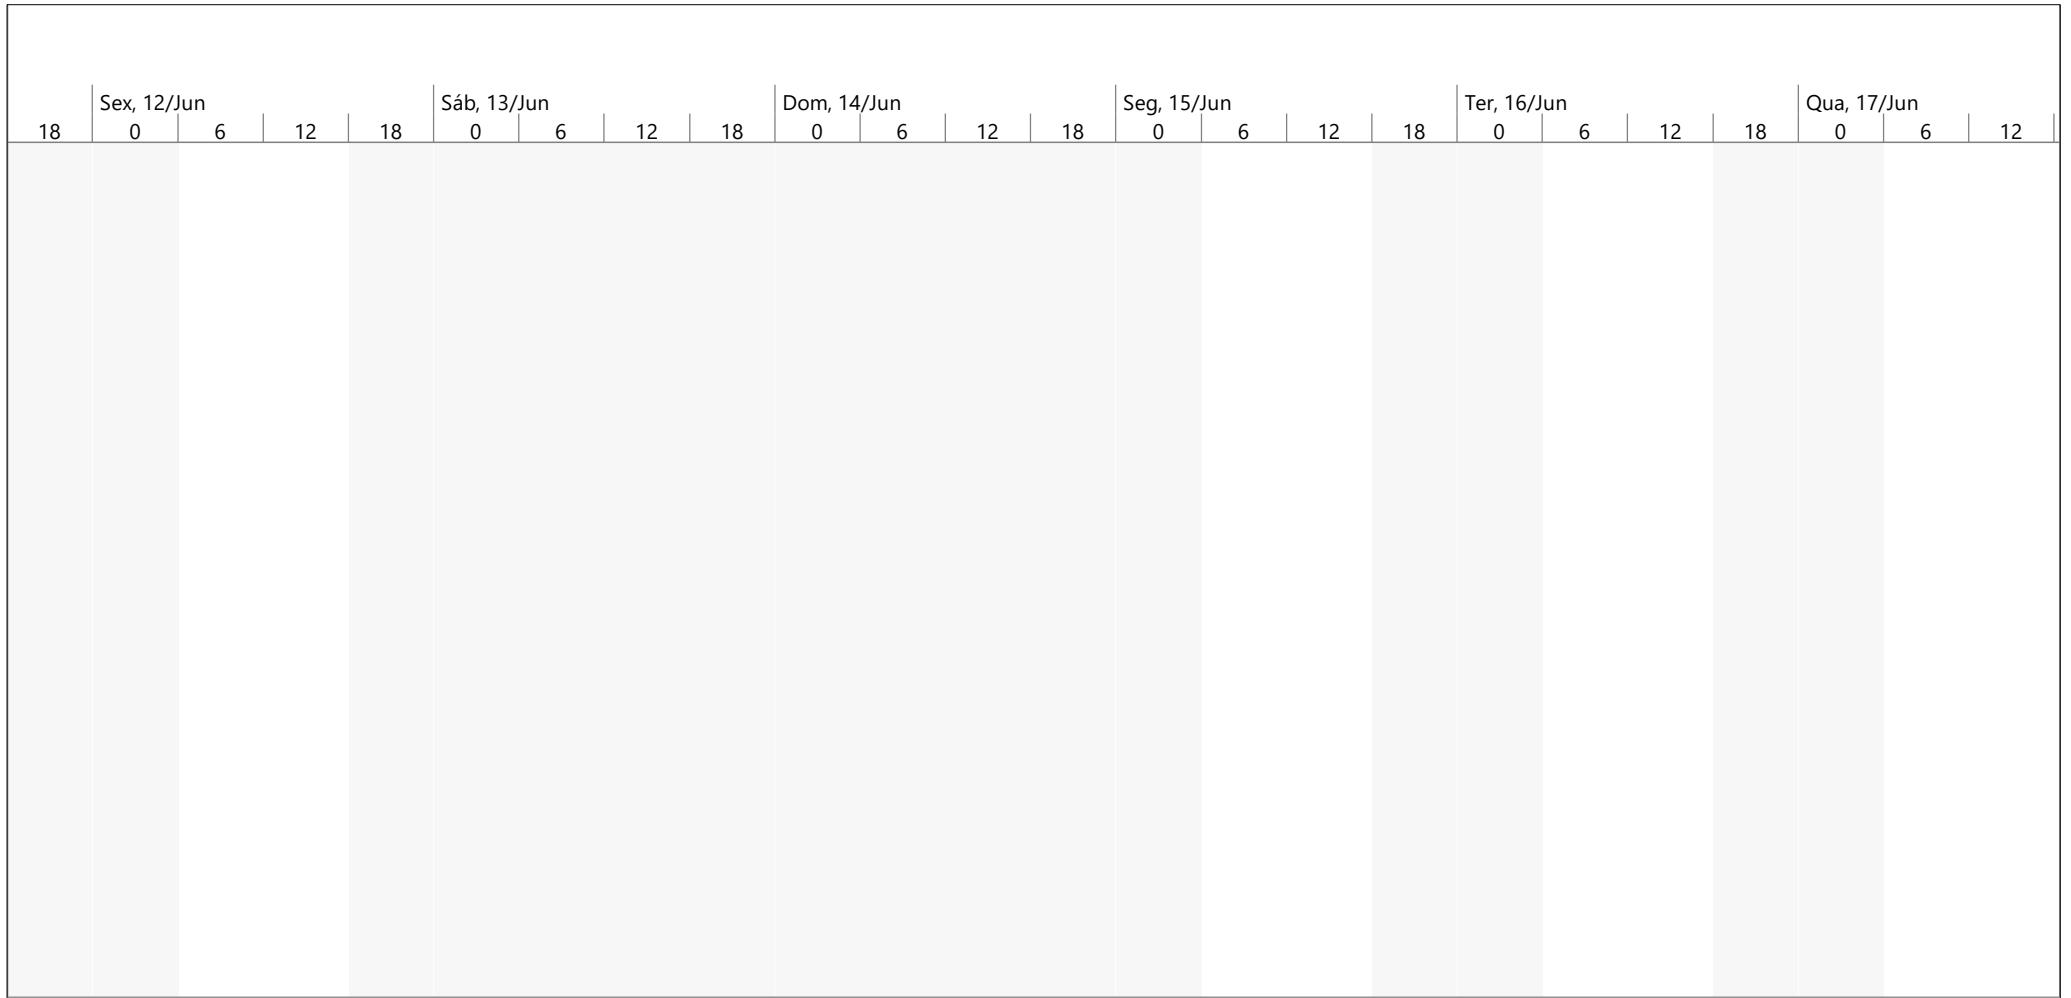


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

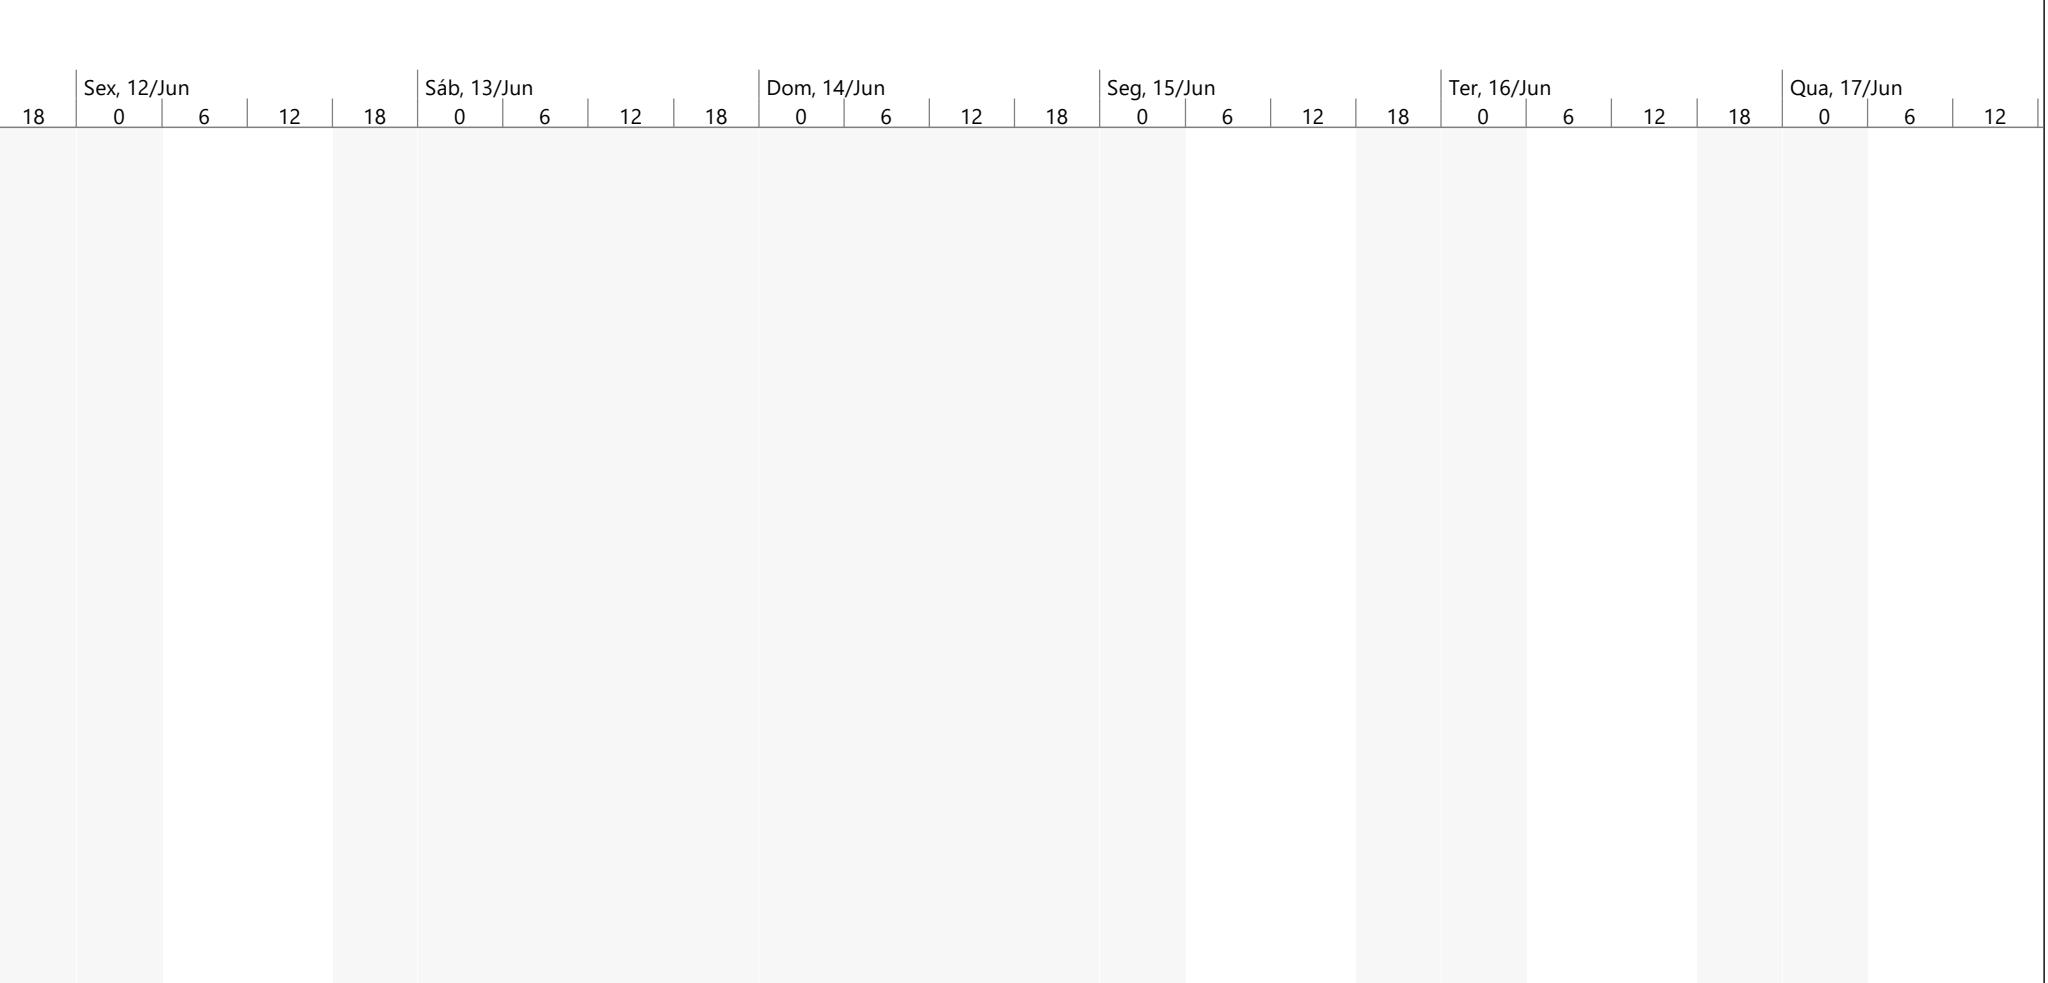


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

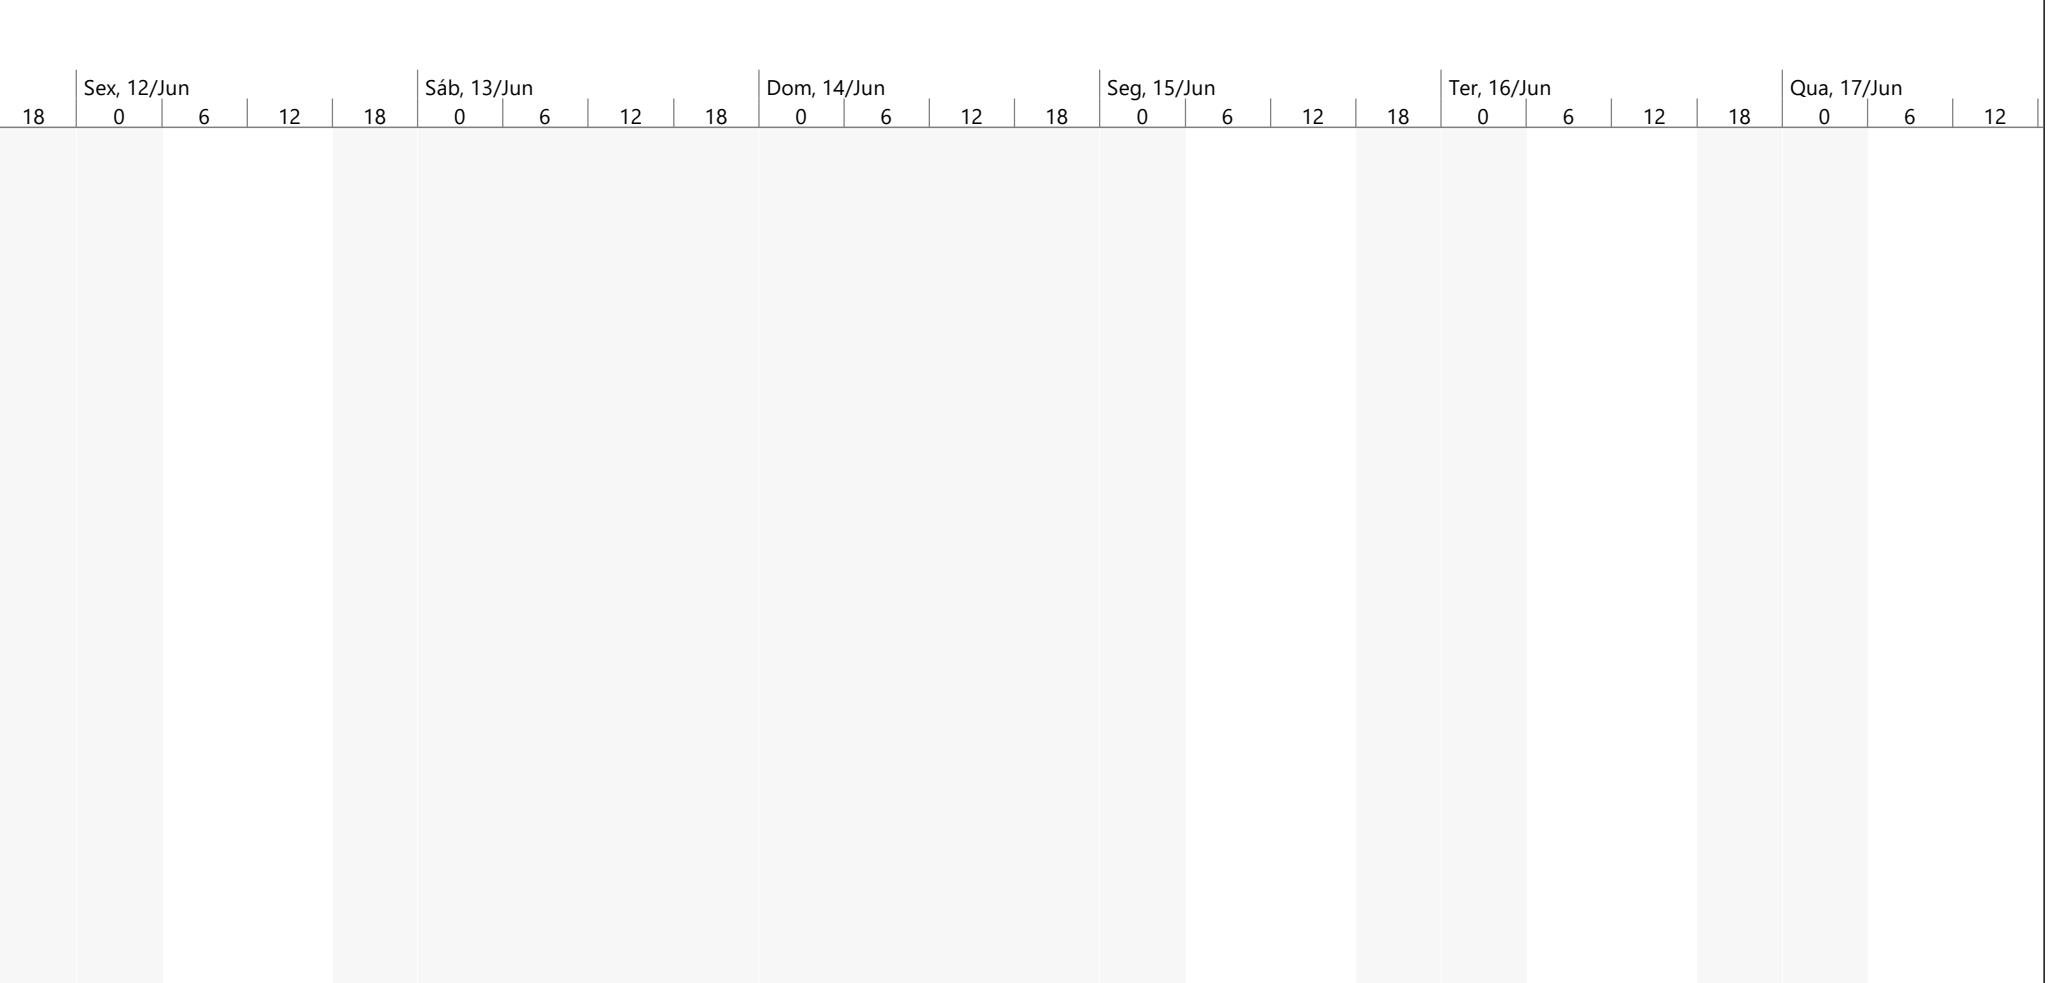


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

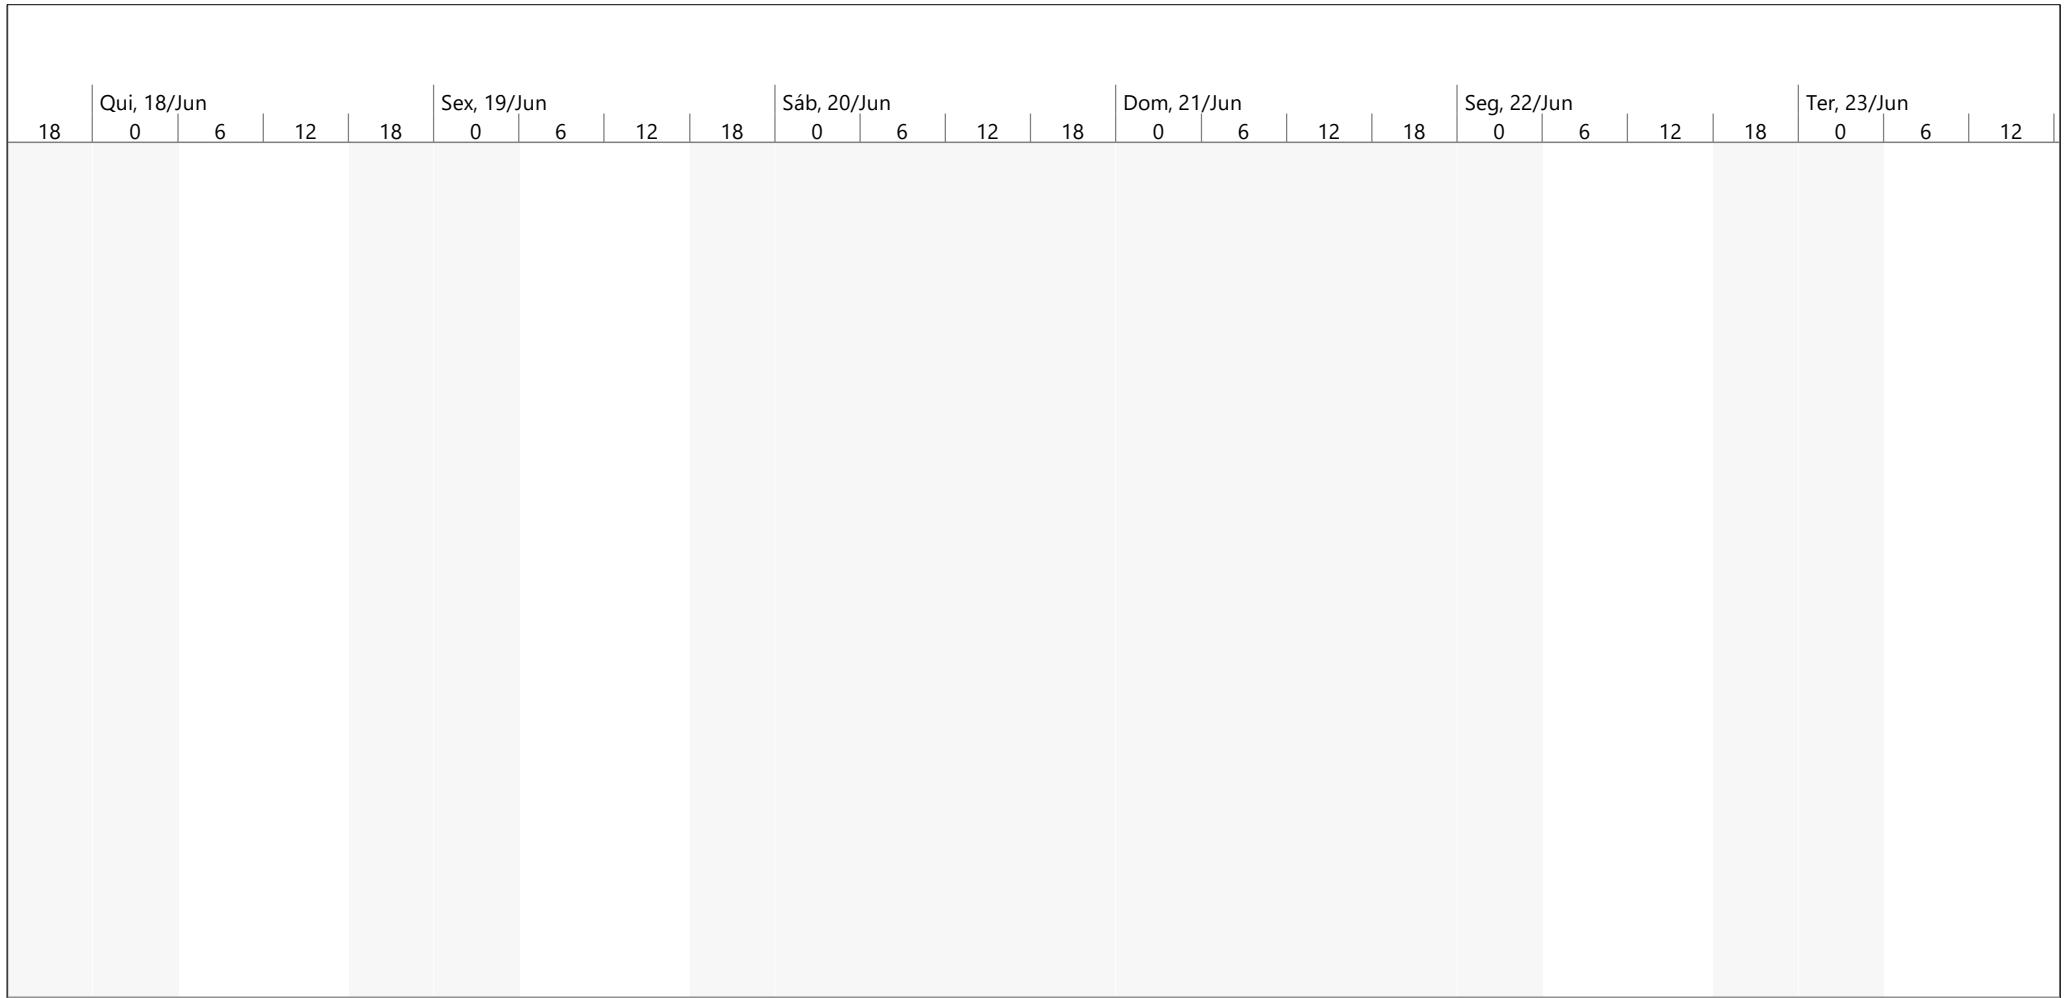


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

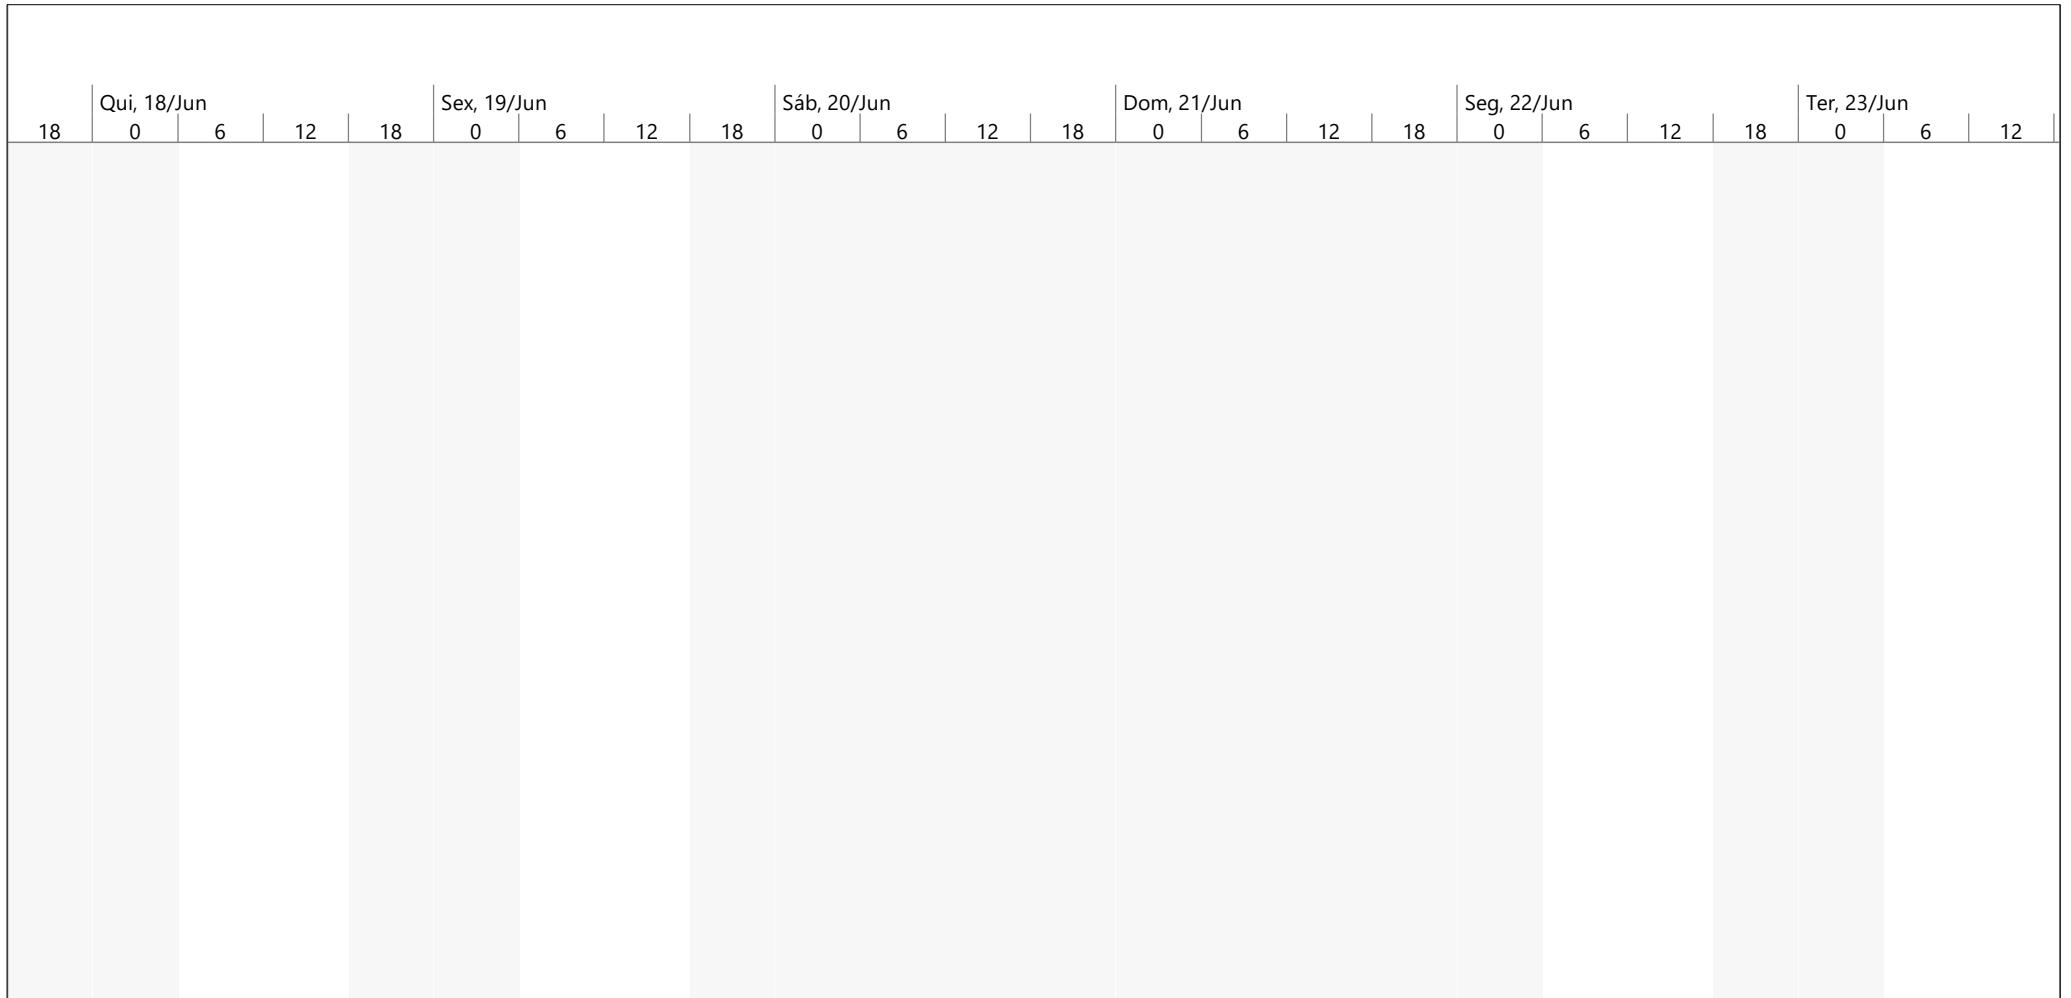


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

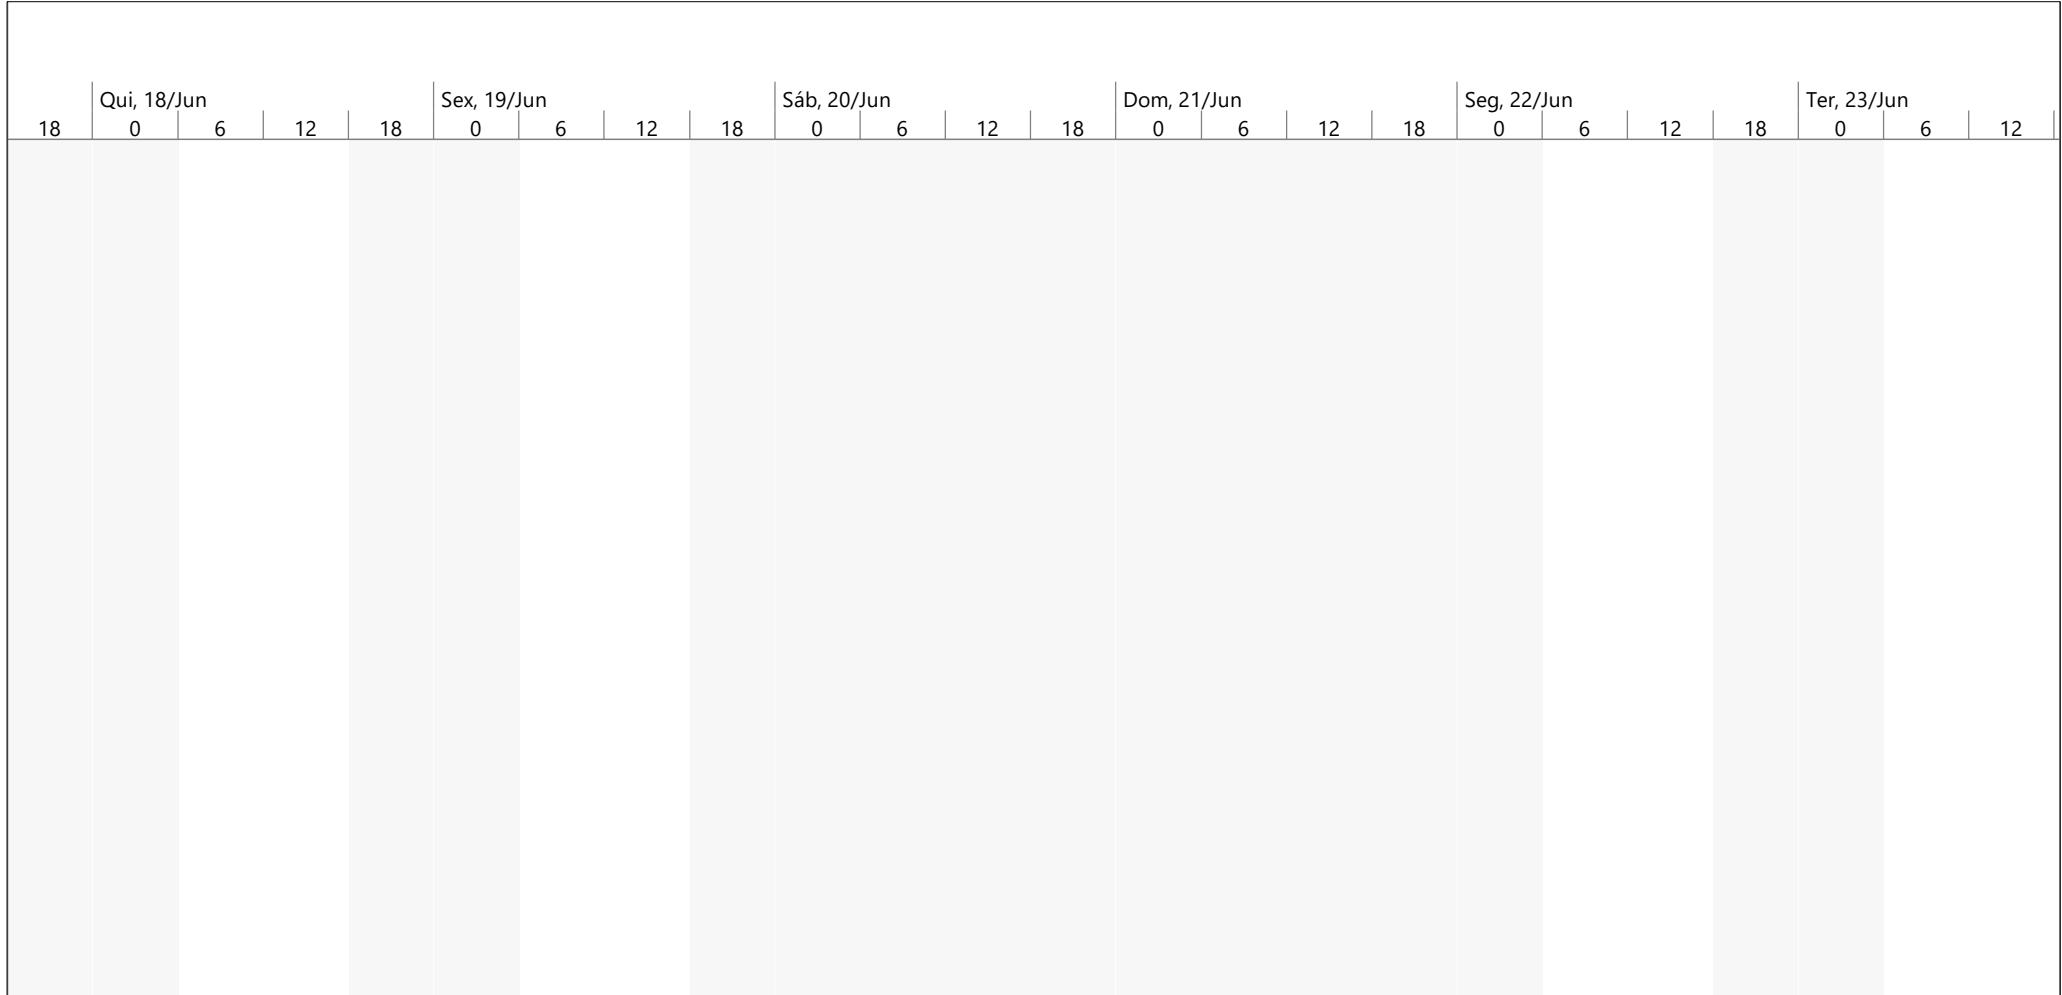

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

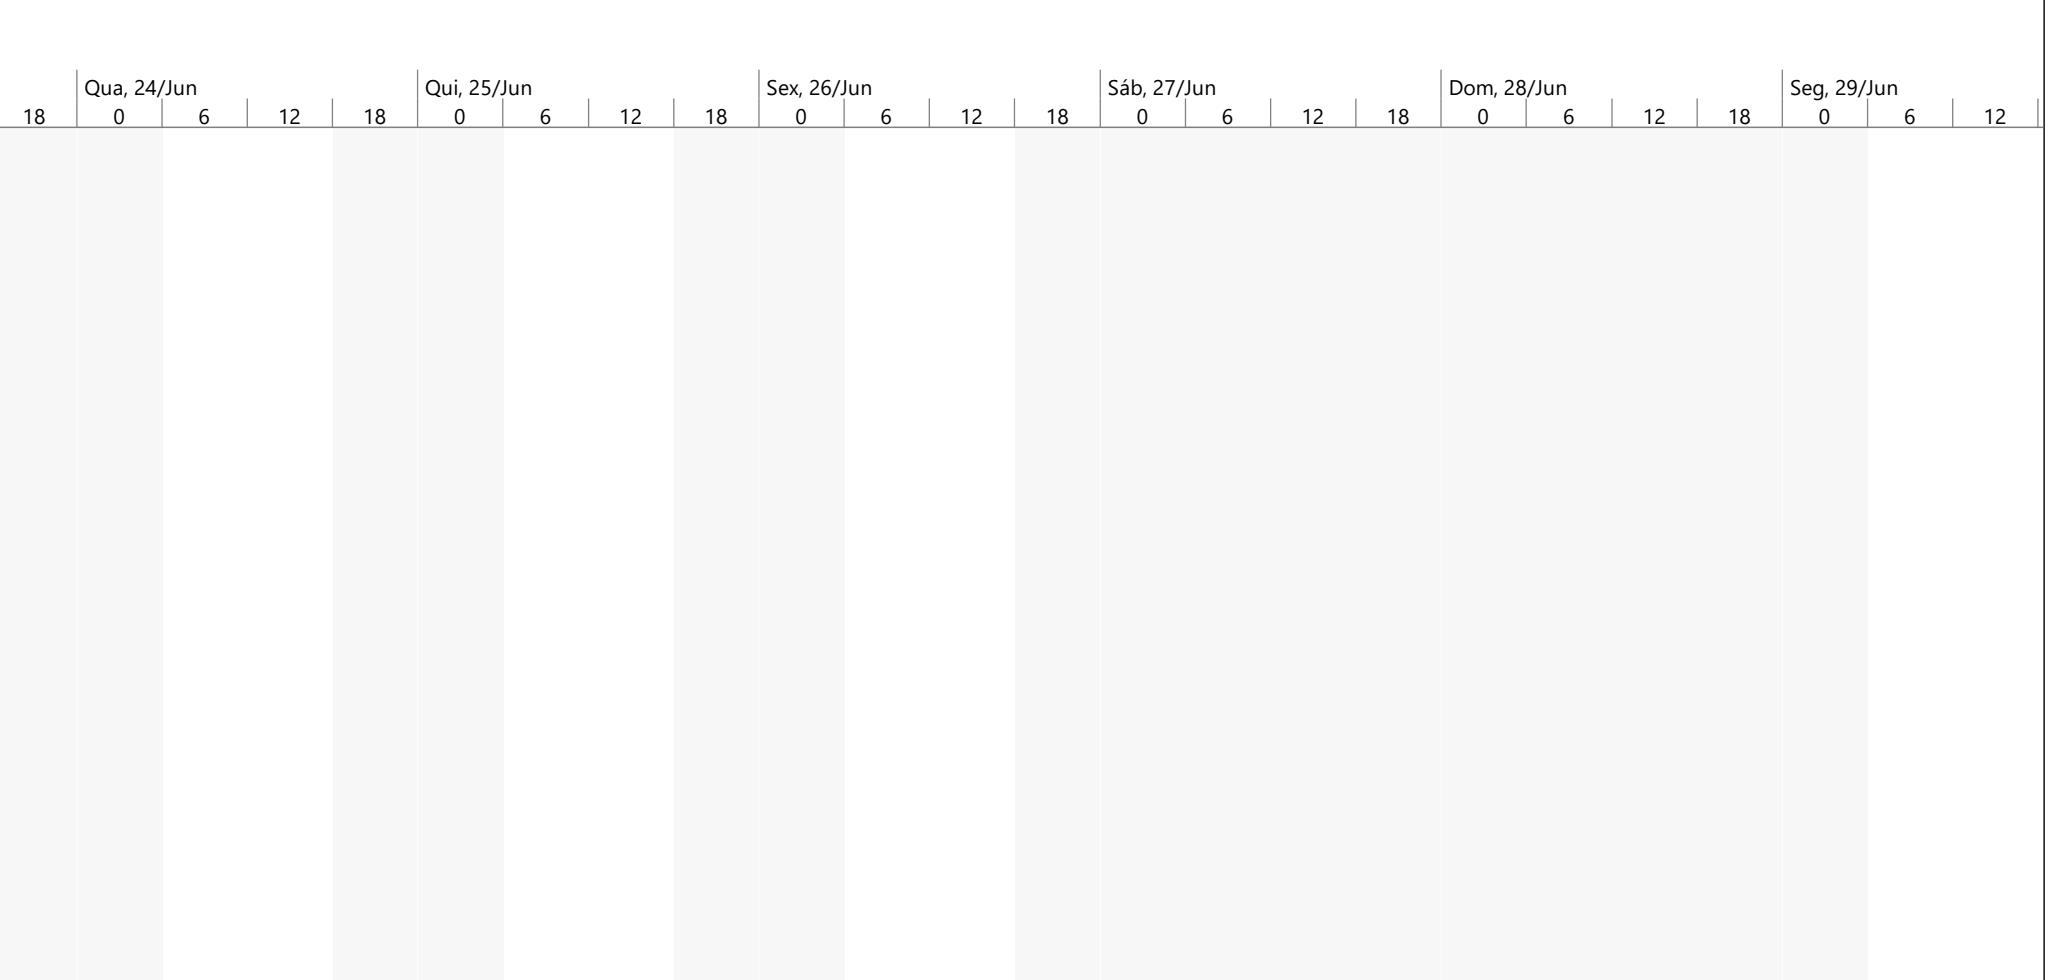


Projeto: Cronograma	Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
		Divisão	00:00 - 06:00	00:00 - 06:00
		Marco	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
		Resumo	00:00 - 06:00	00:00 - 06:00
		Resumo do projeto	00:00 - 06:00	00:00 - 06:00
		Tarefa Inativa	00:00 - 06:00	00:00 - 06:00
		Marco Inativo	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

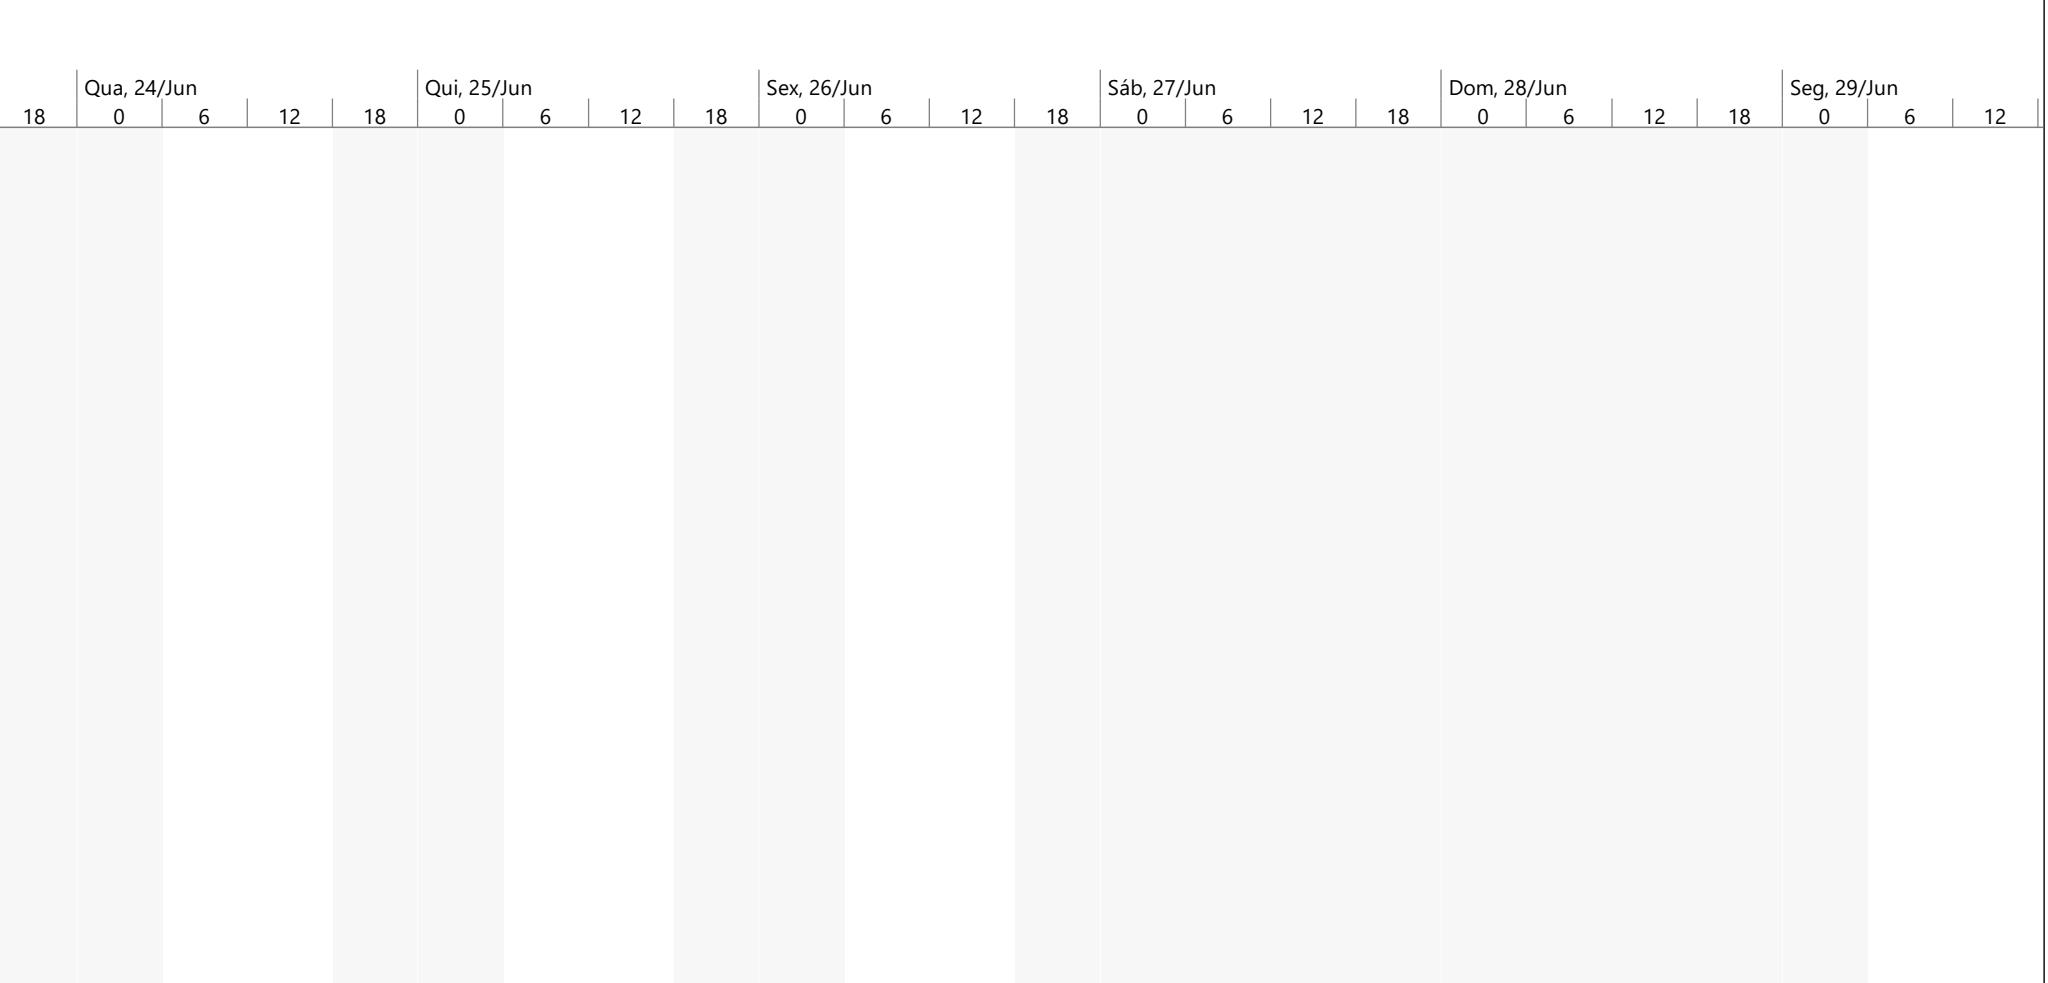

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

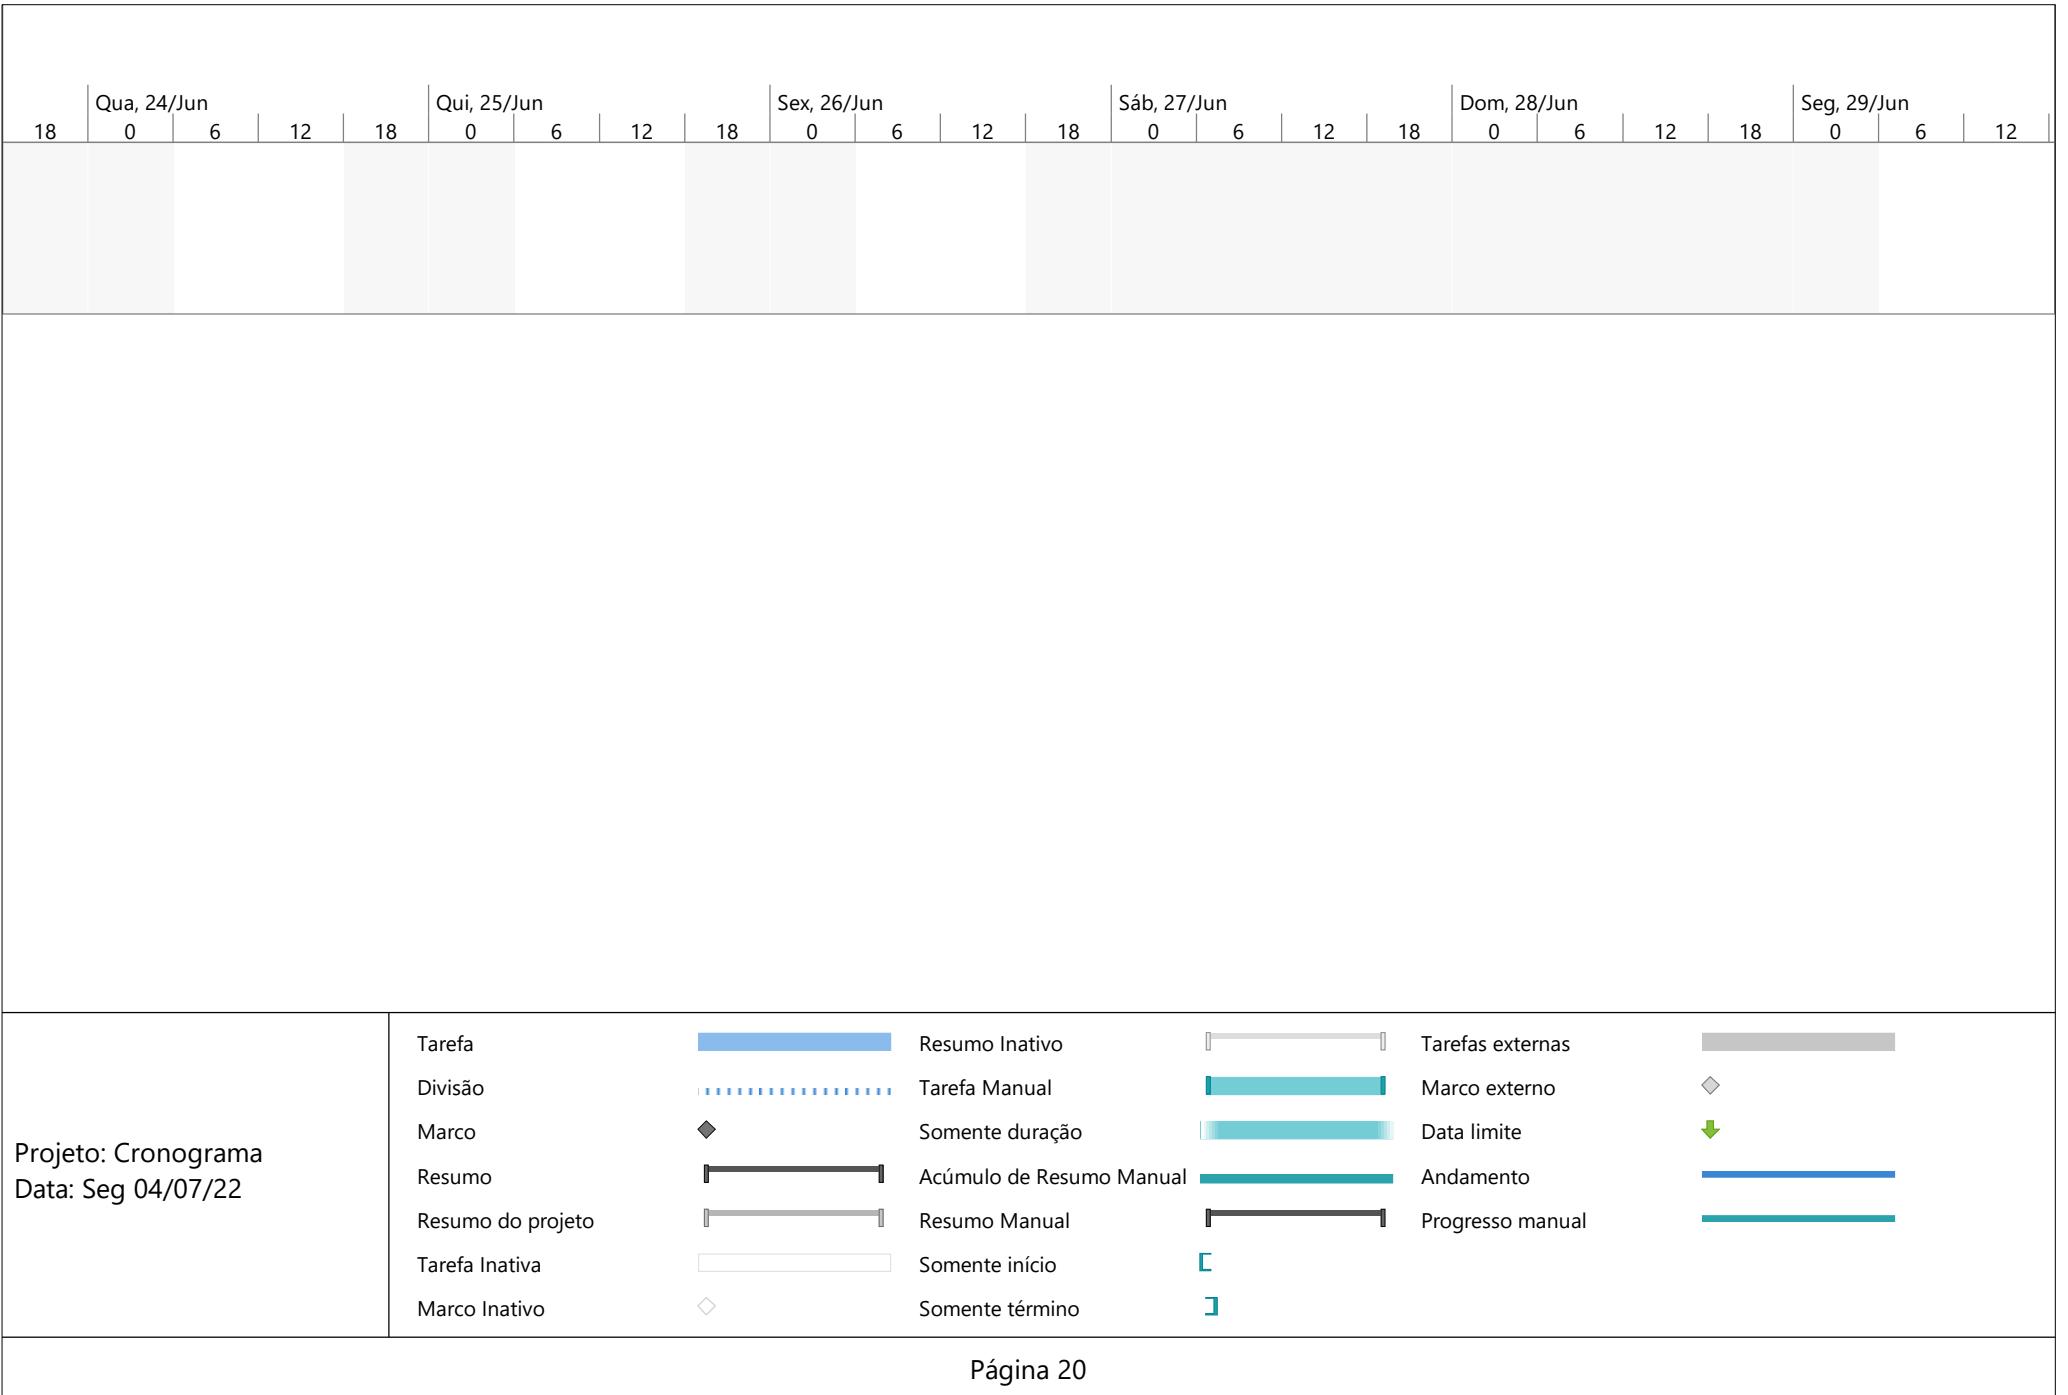


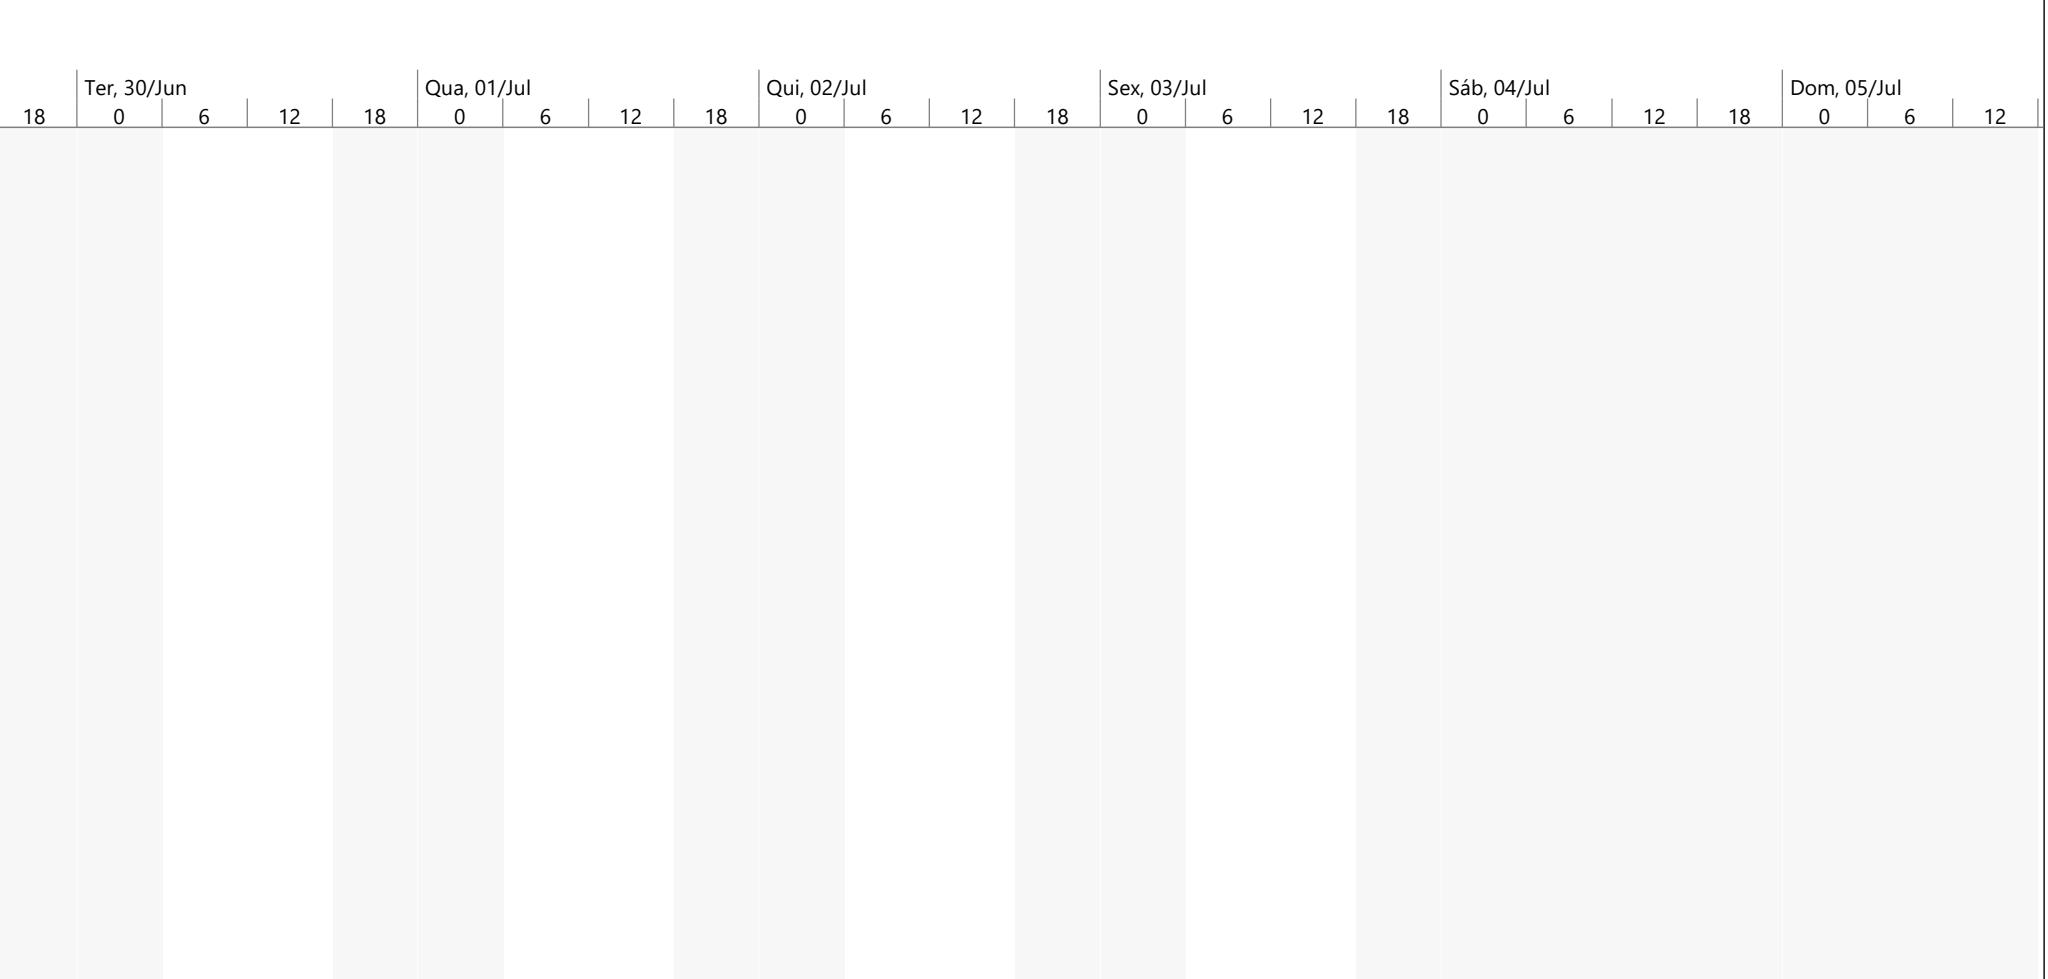


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

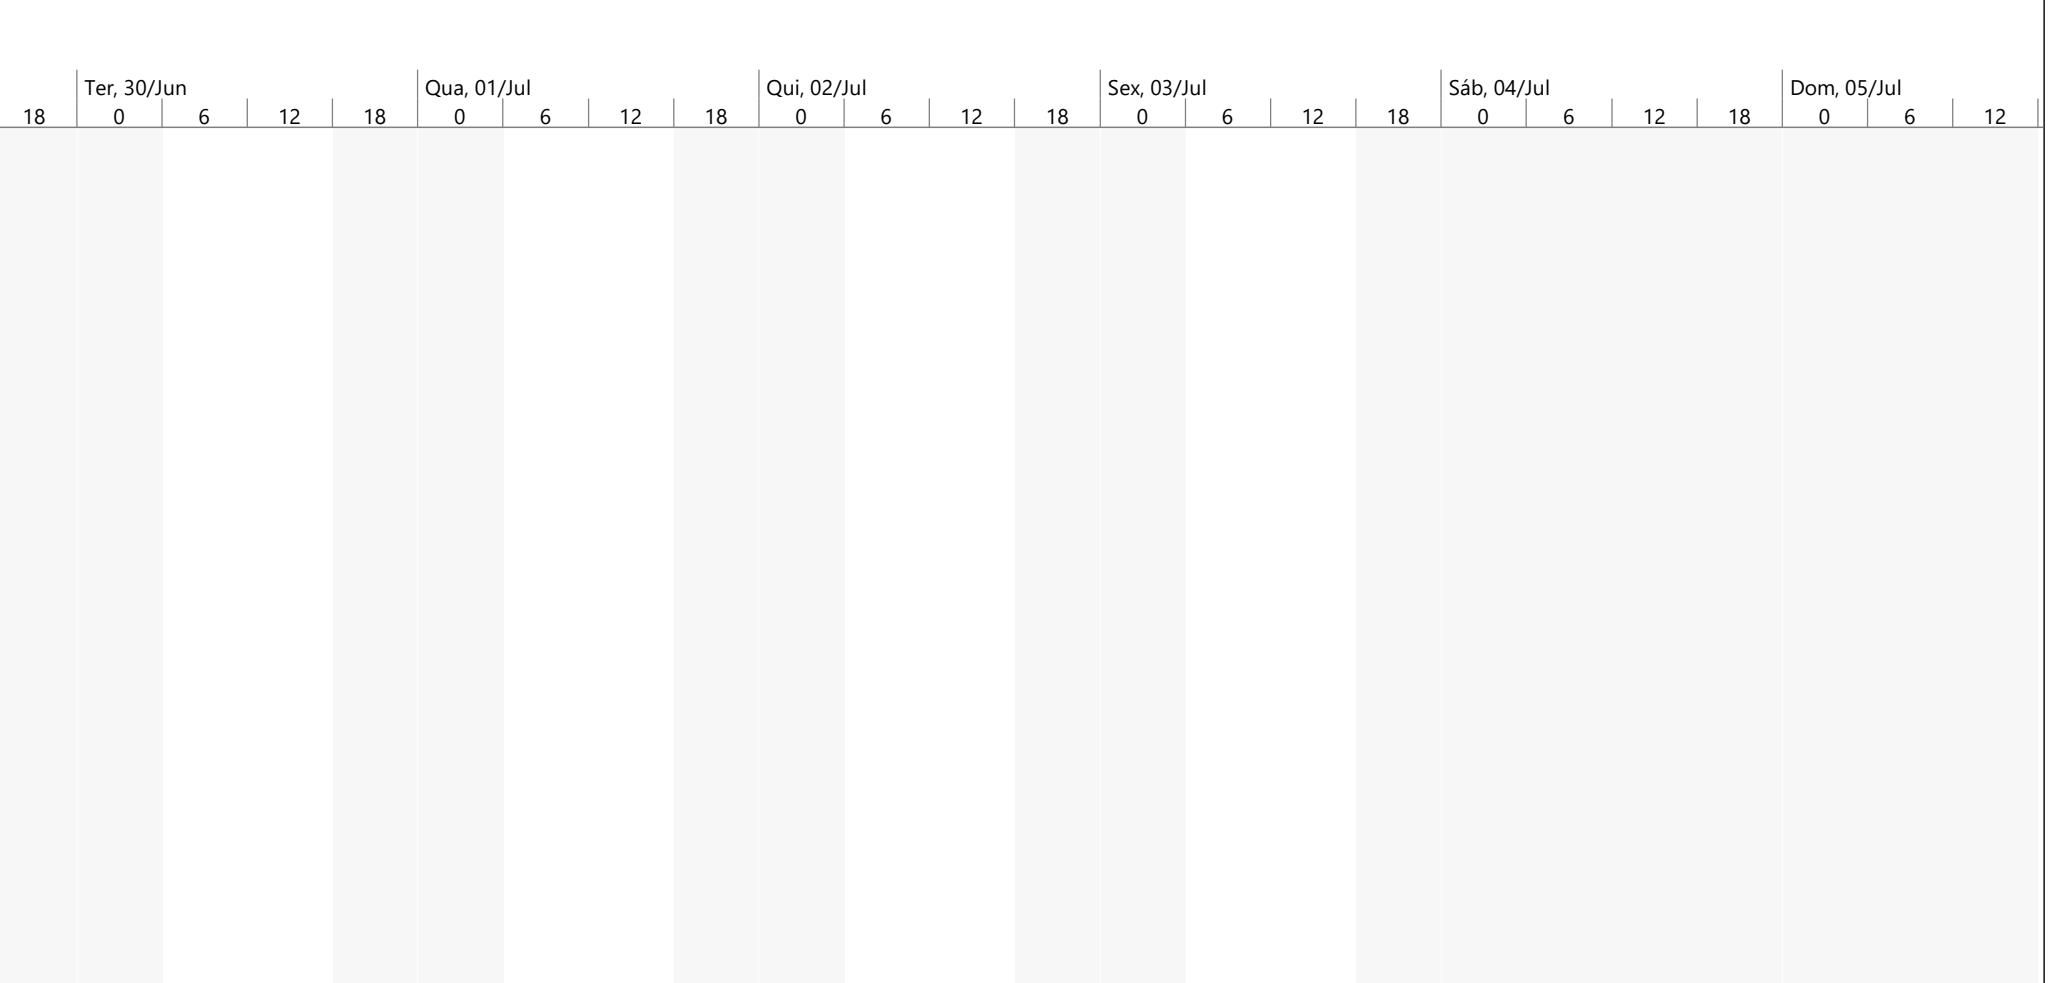


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

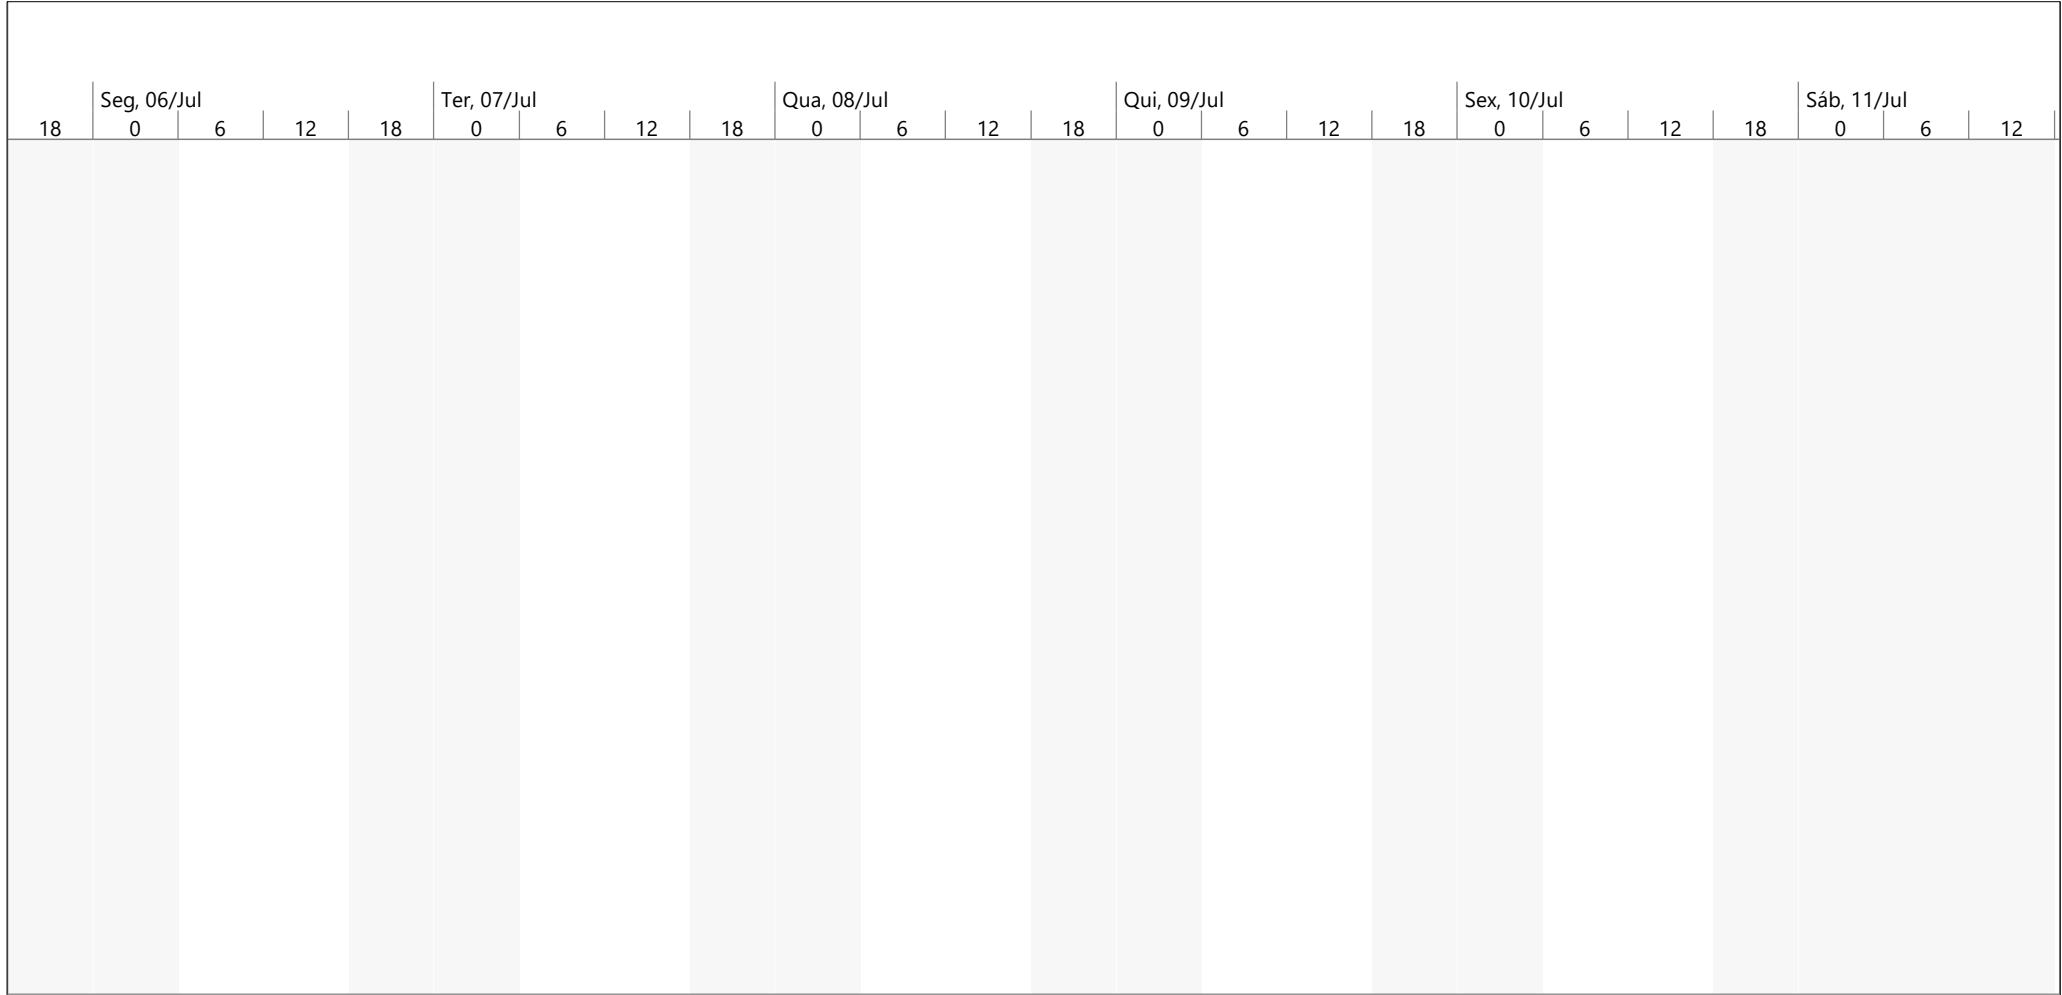


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

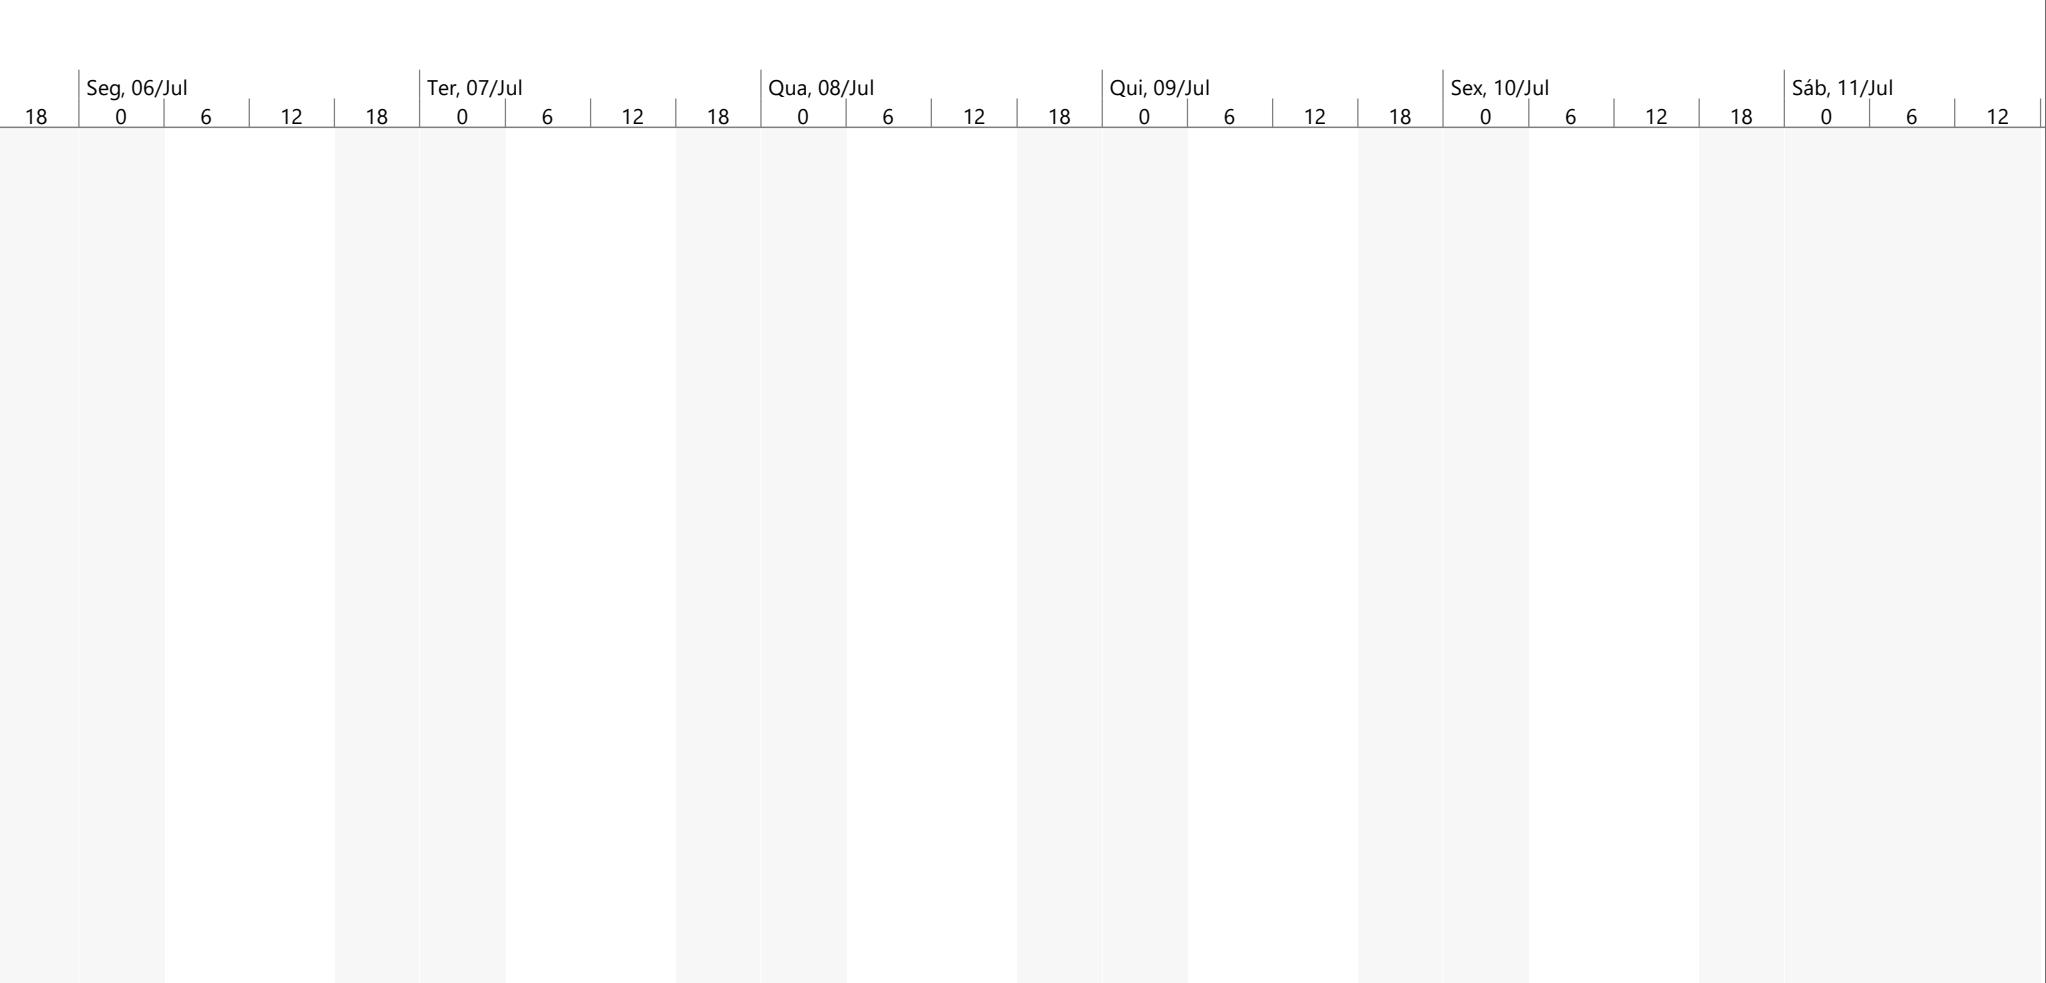


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

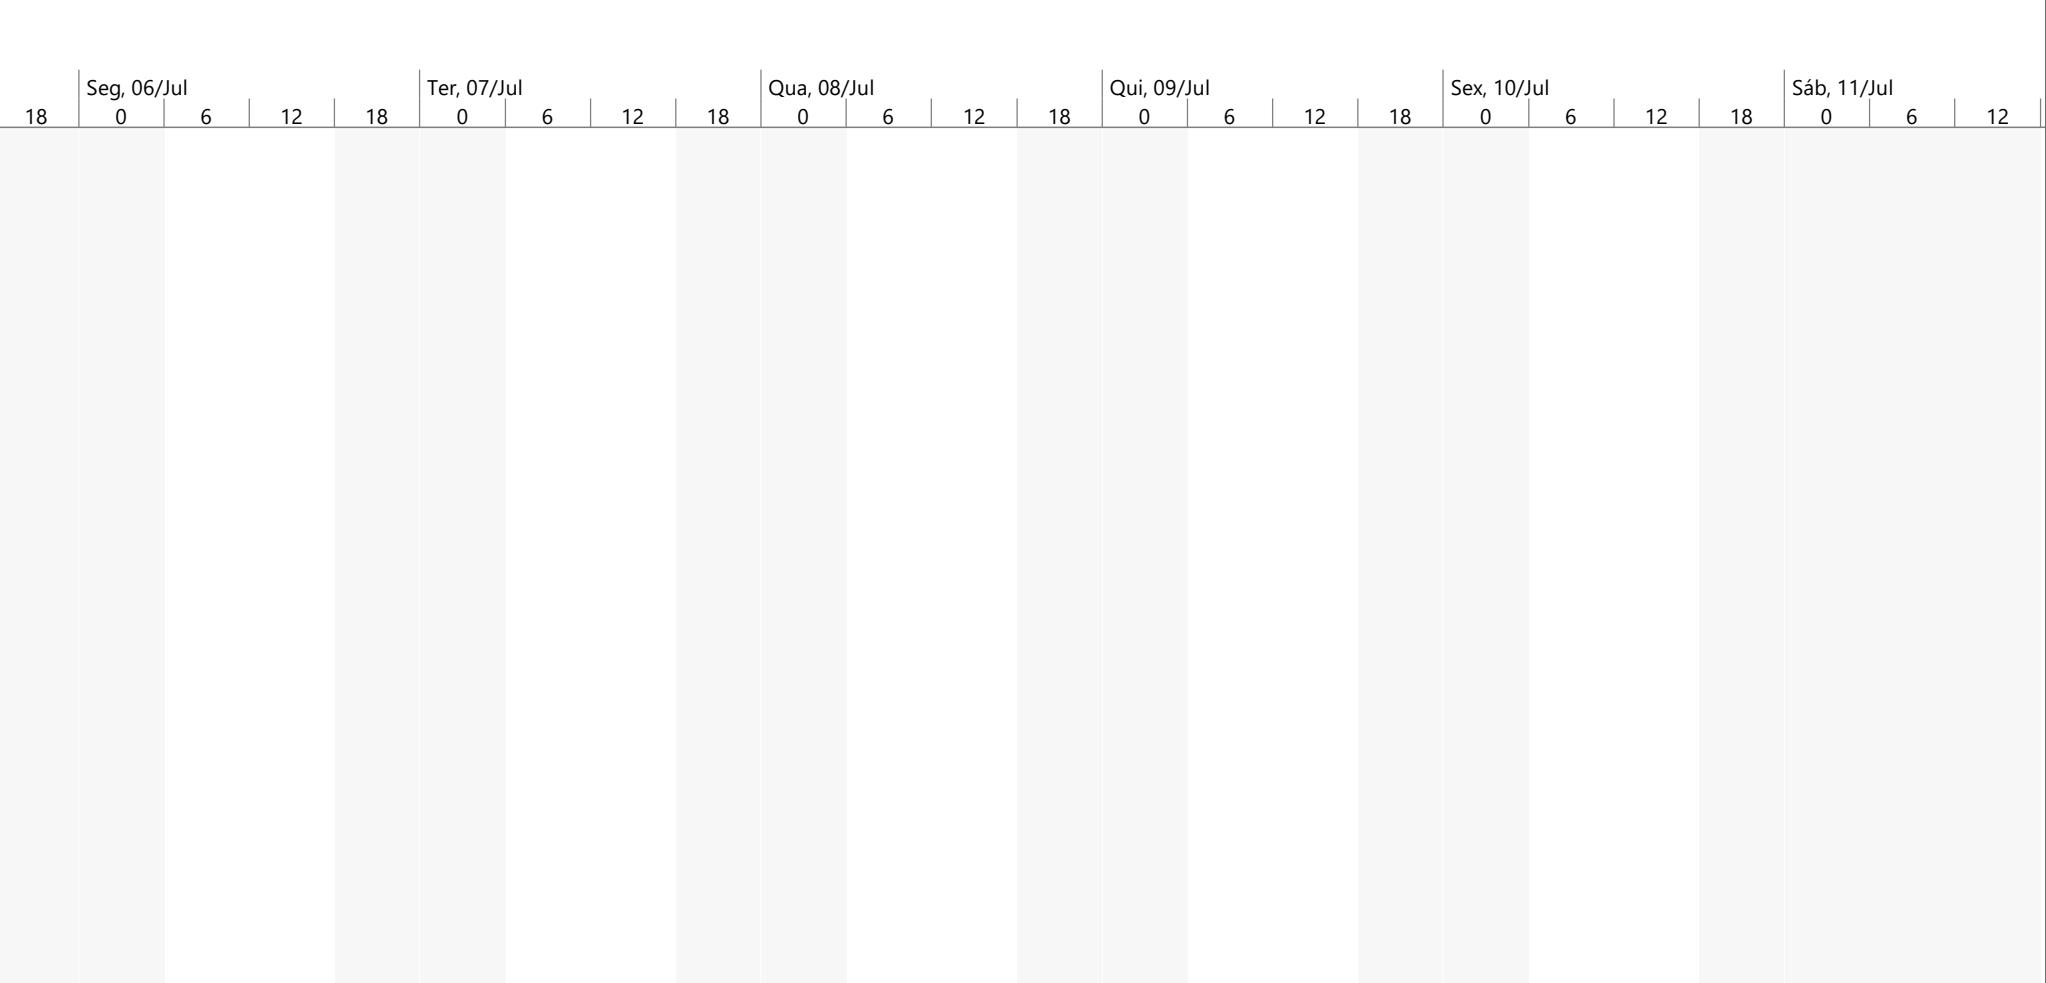

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

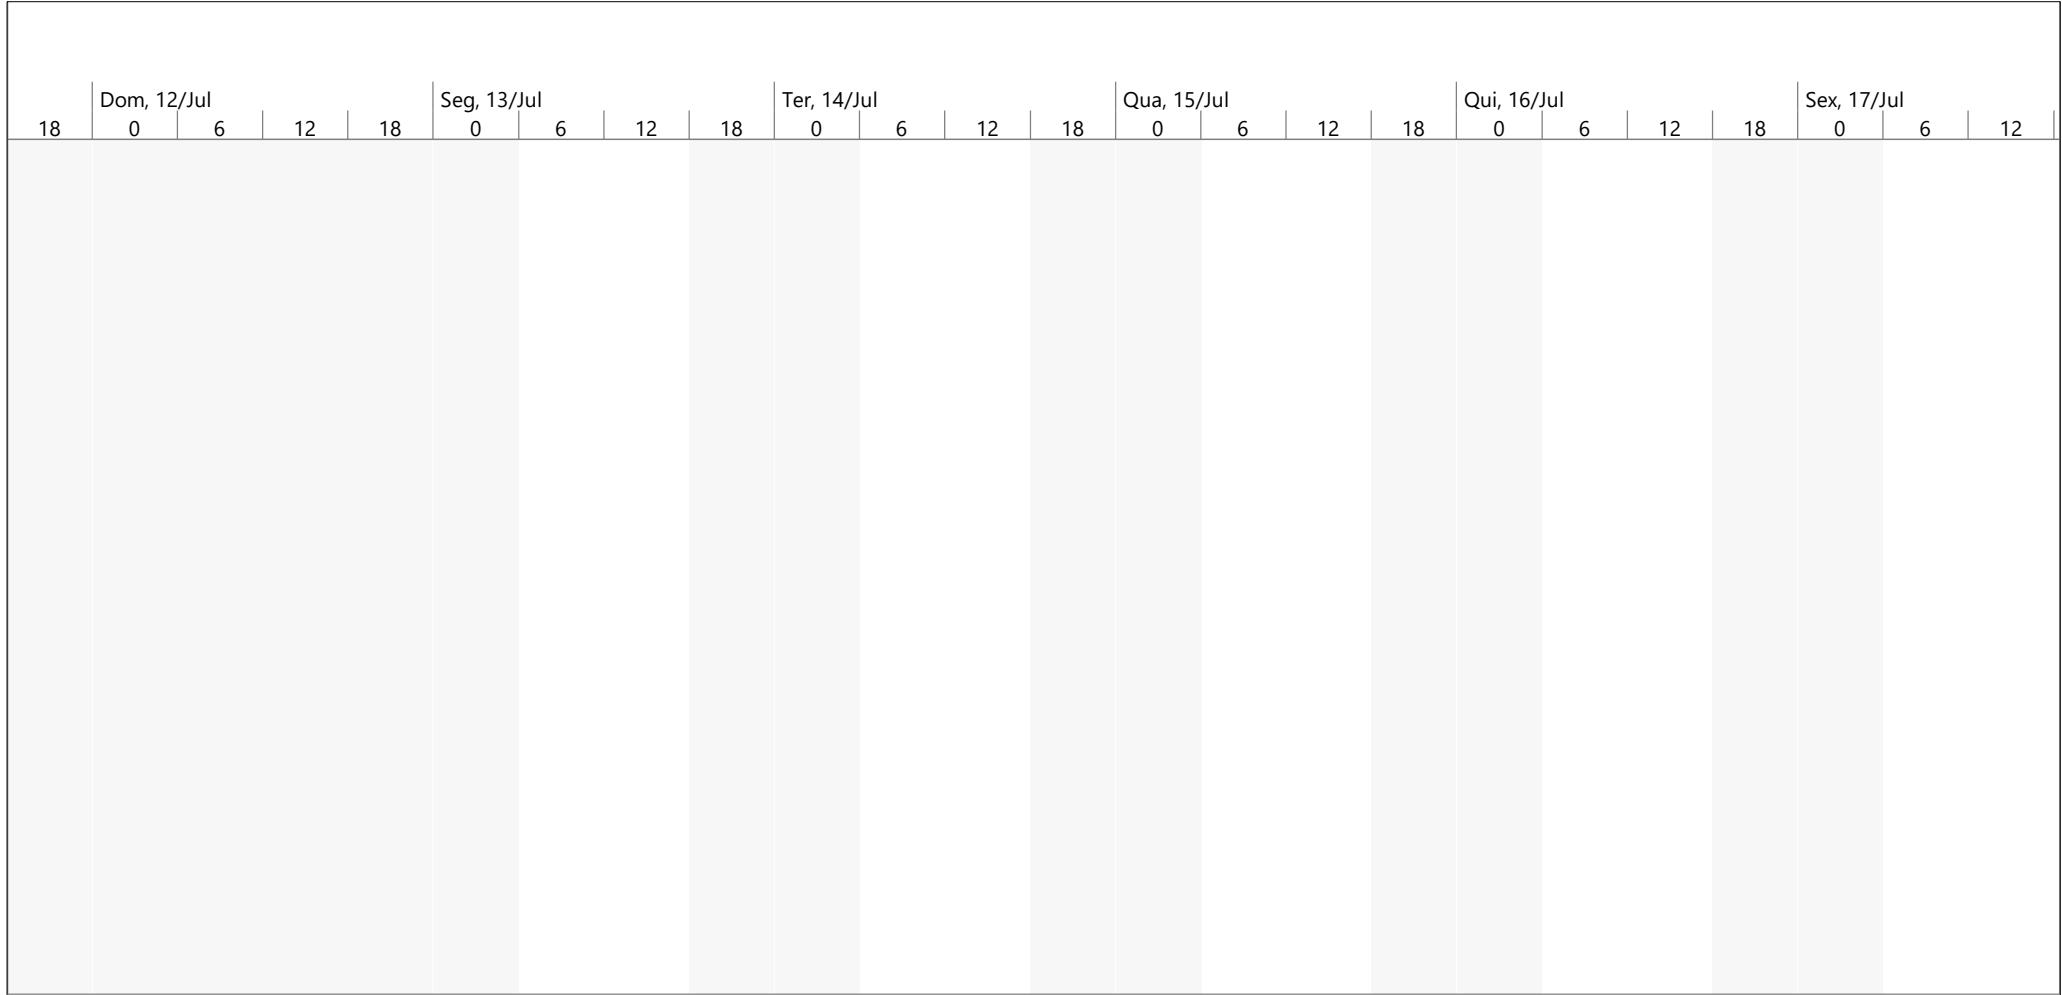


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

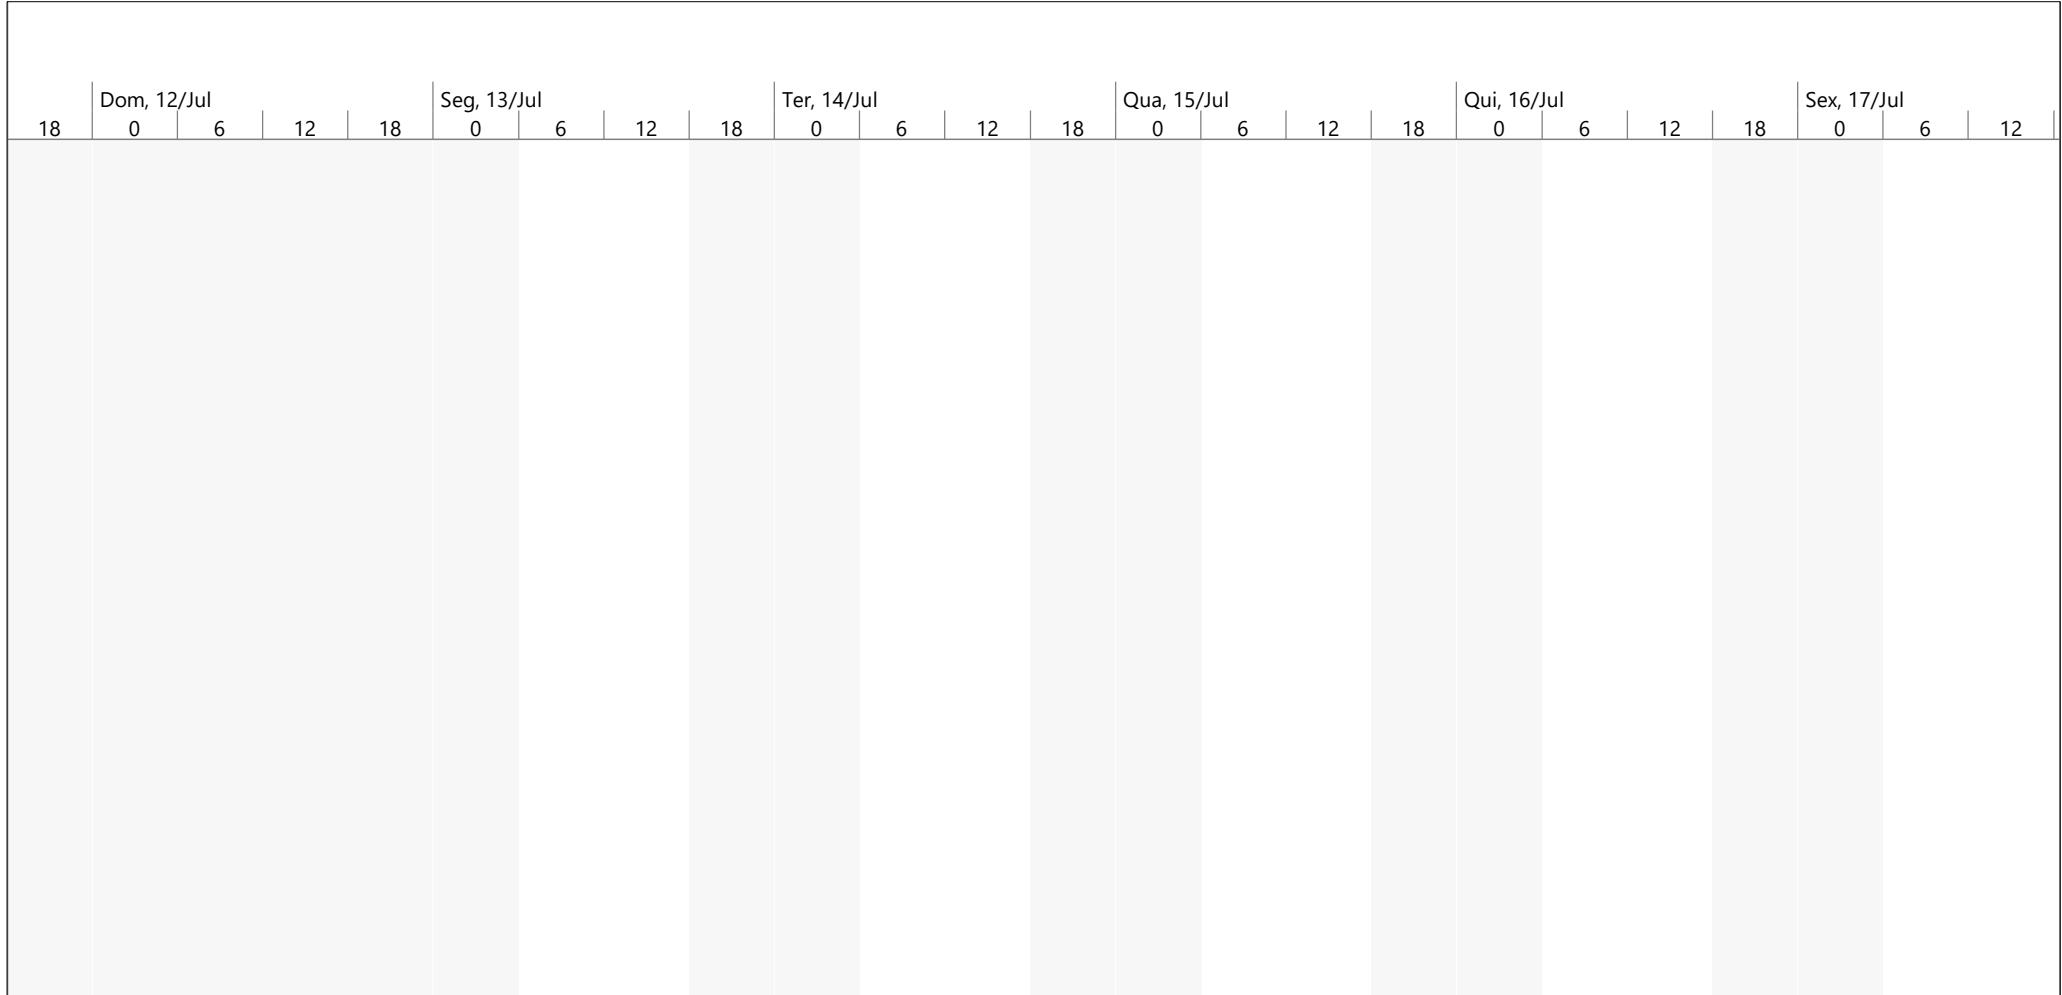

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

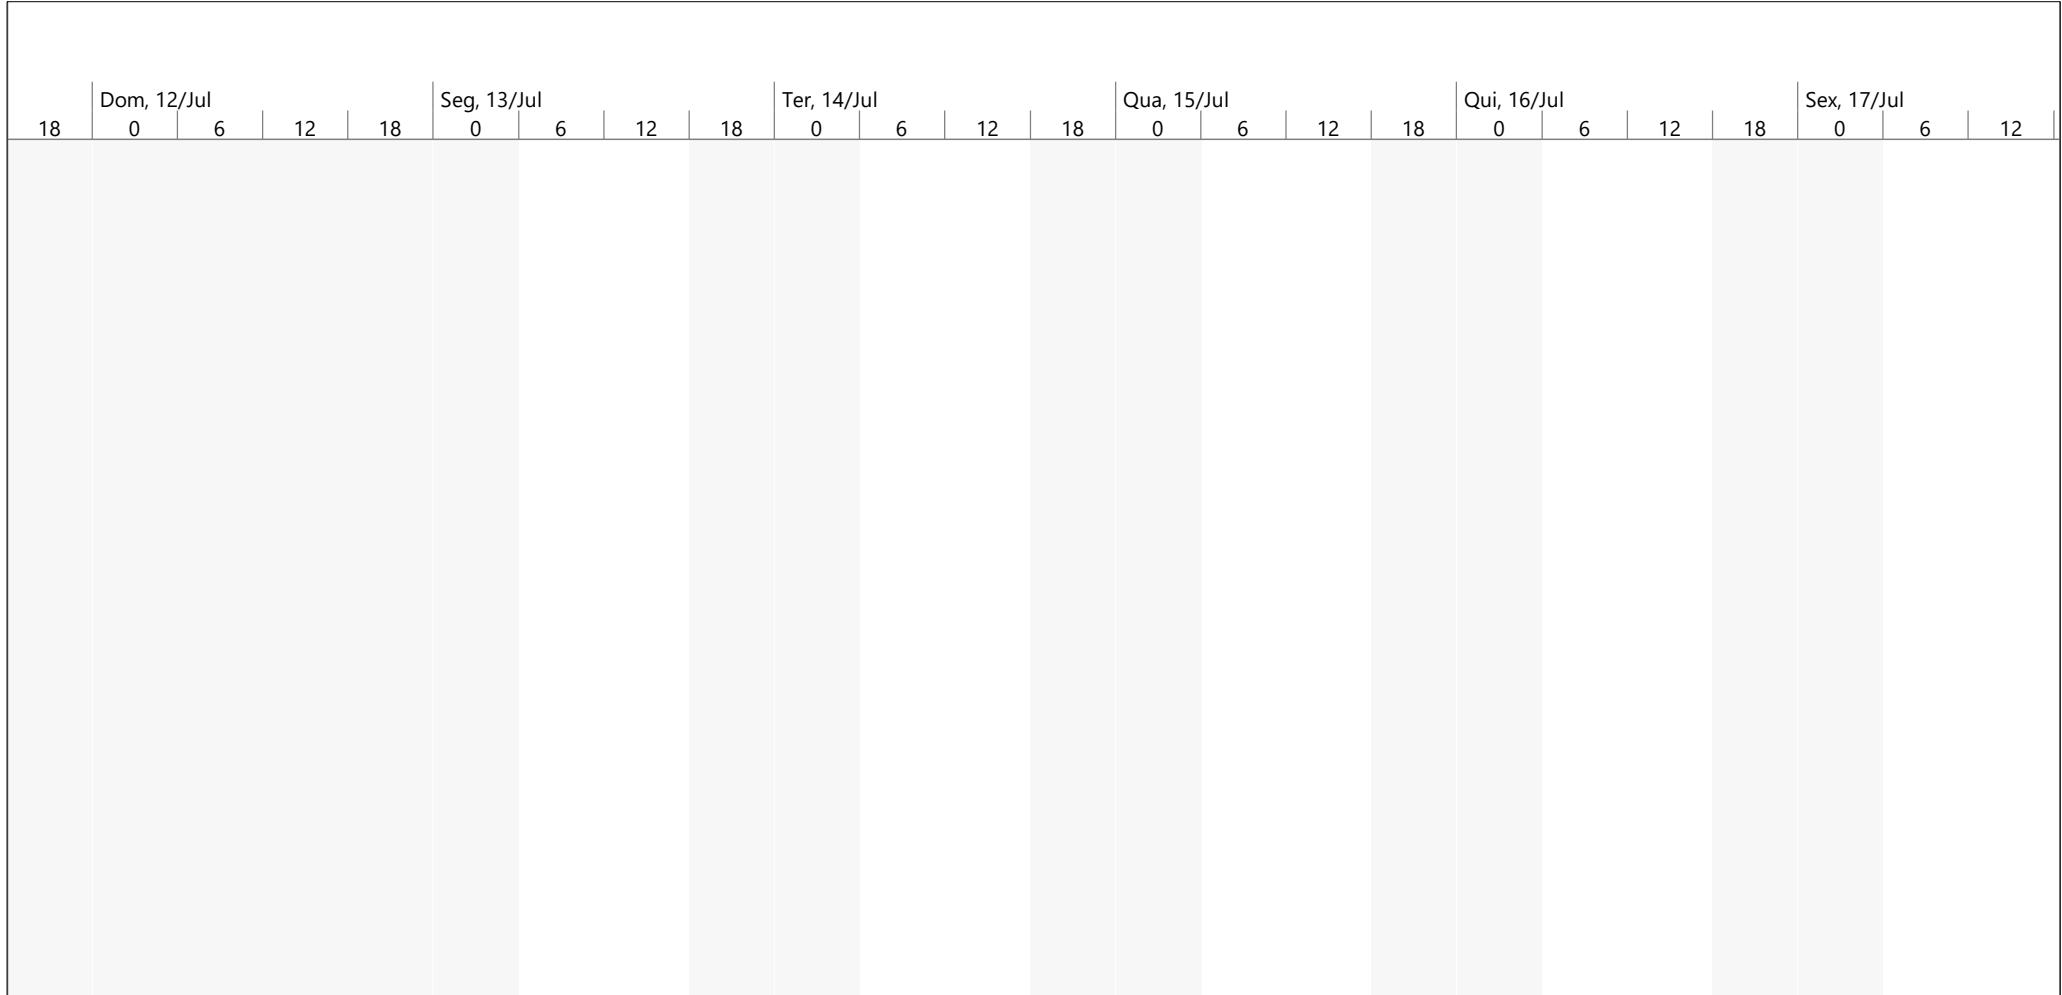

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

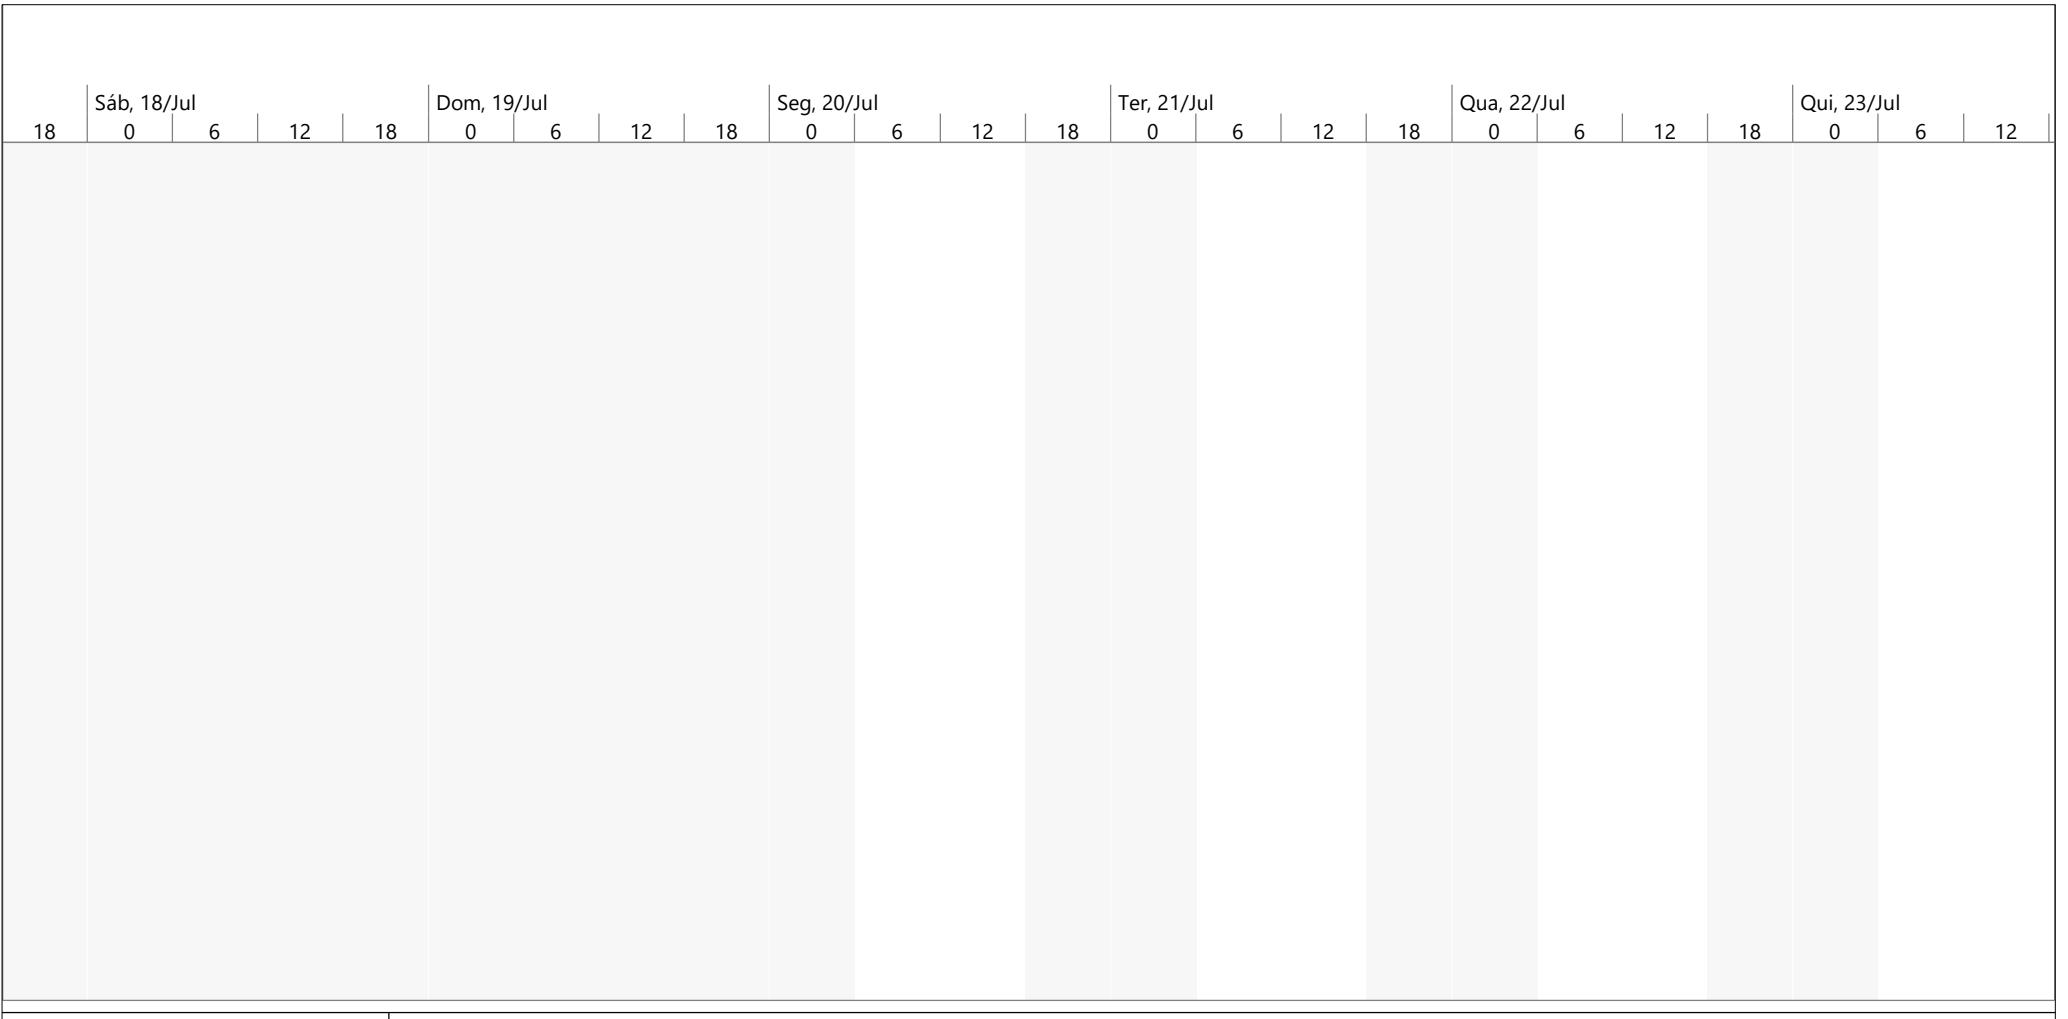


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		

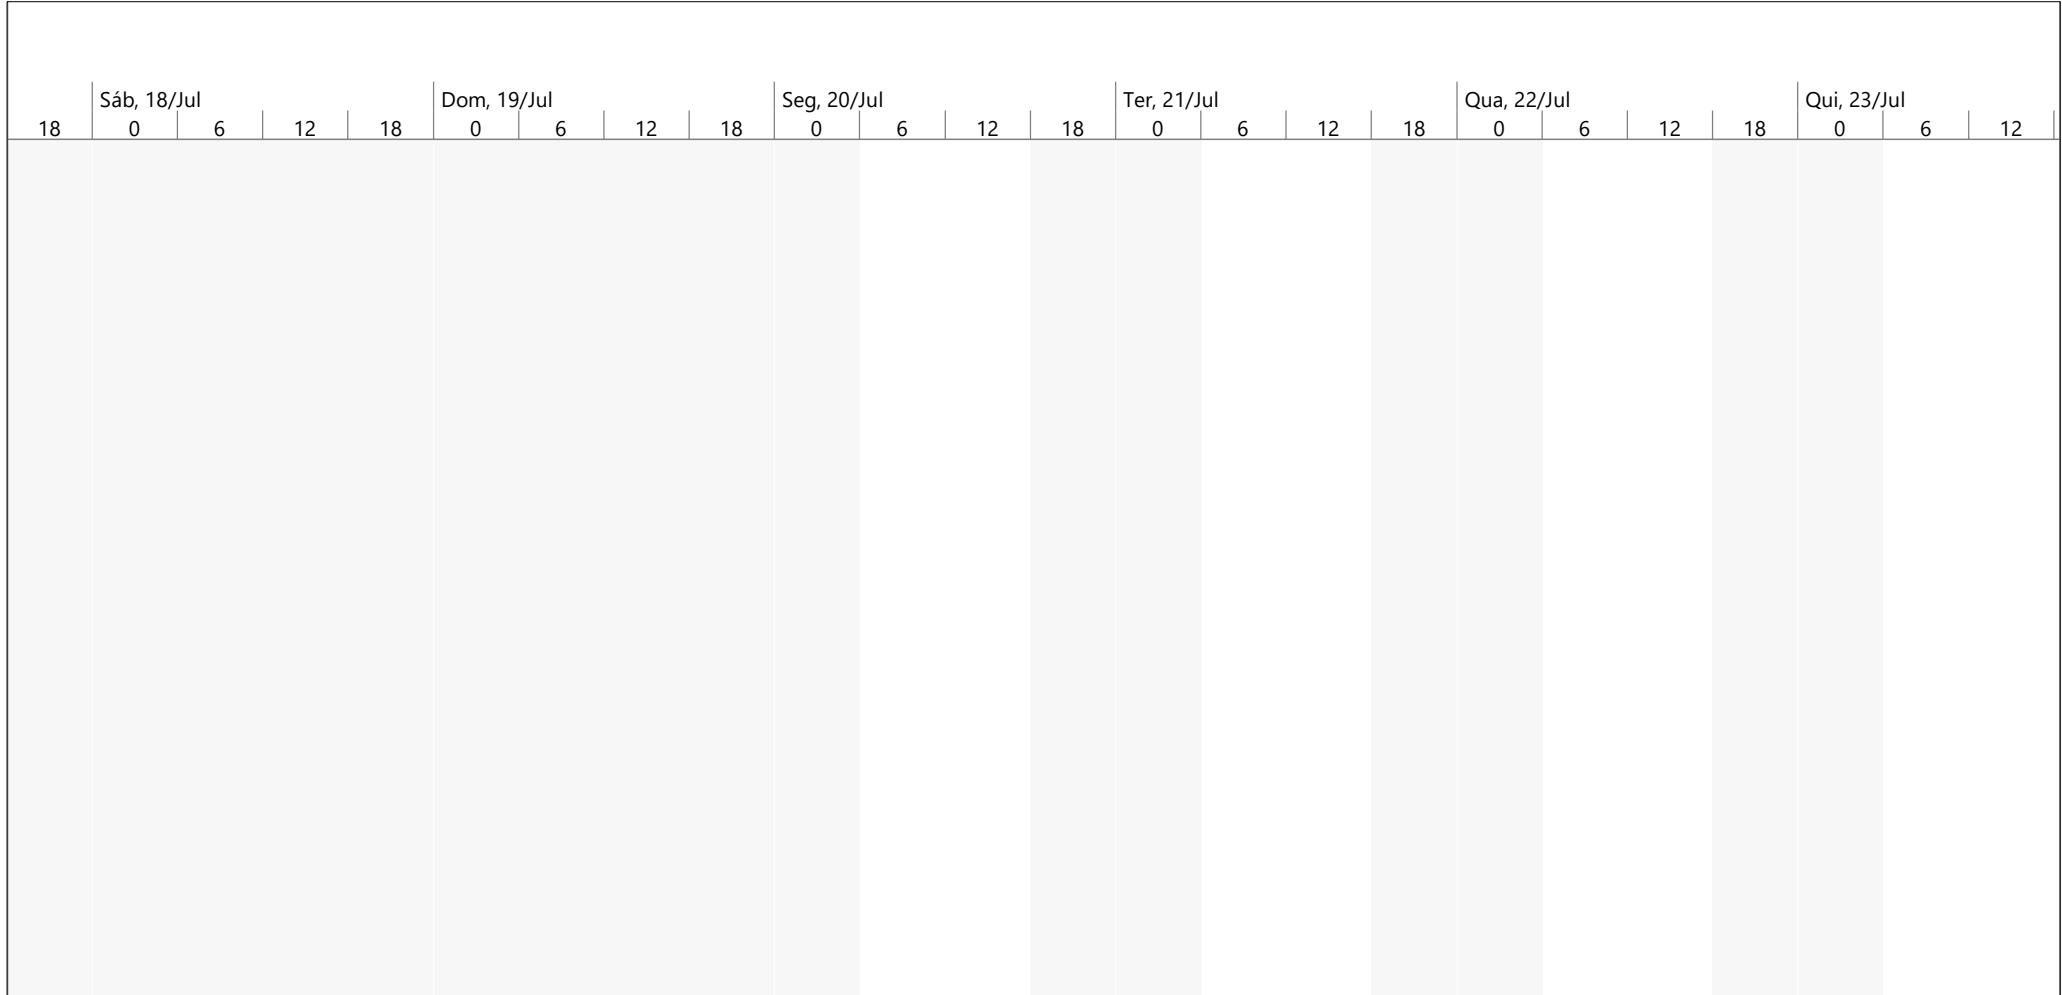


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

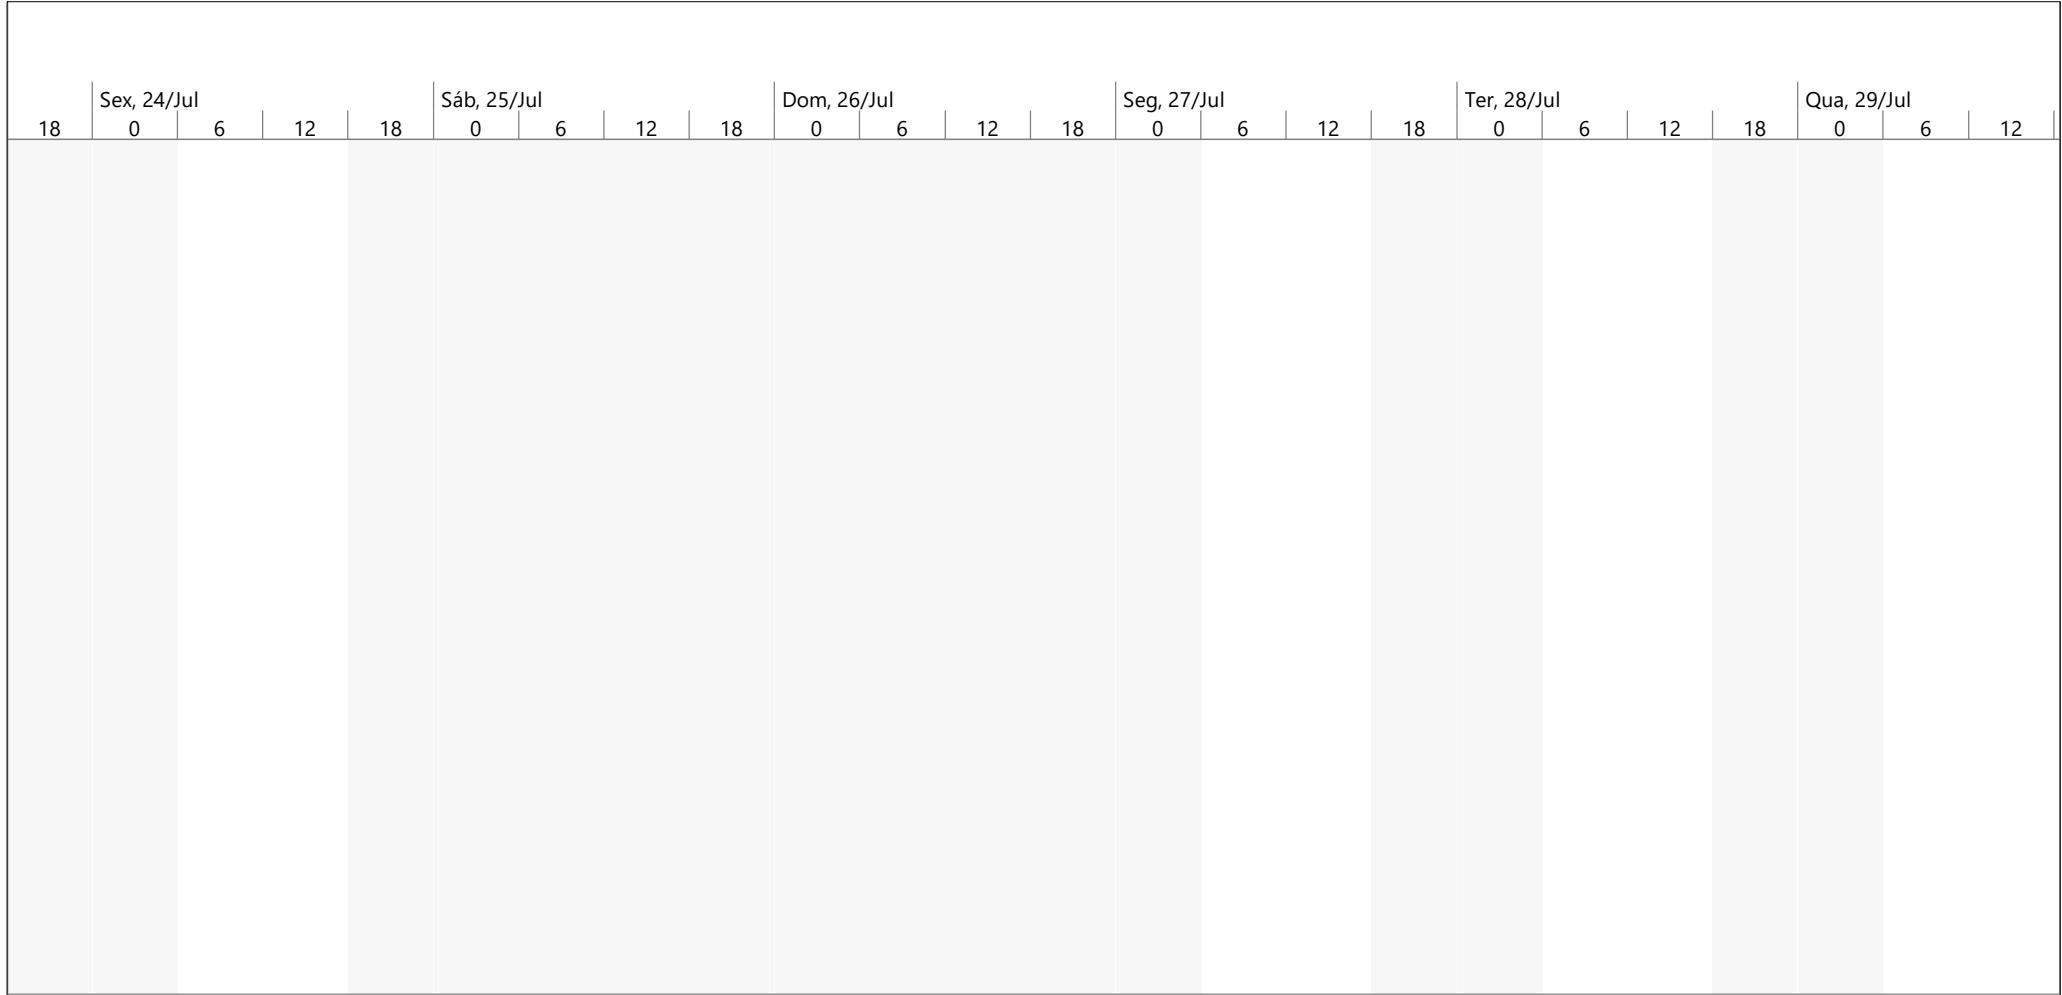


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

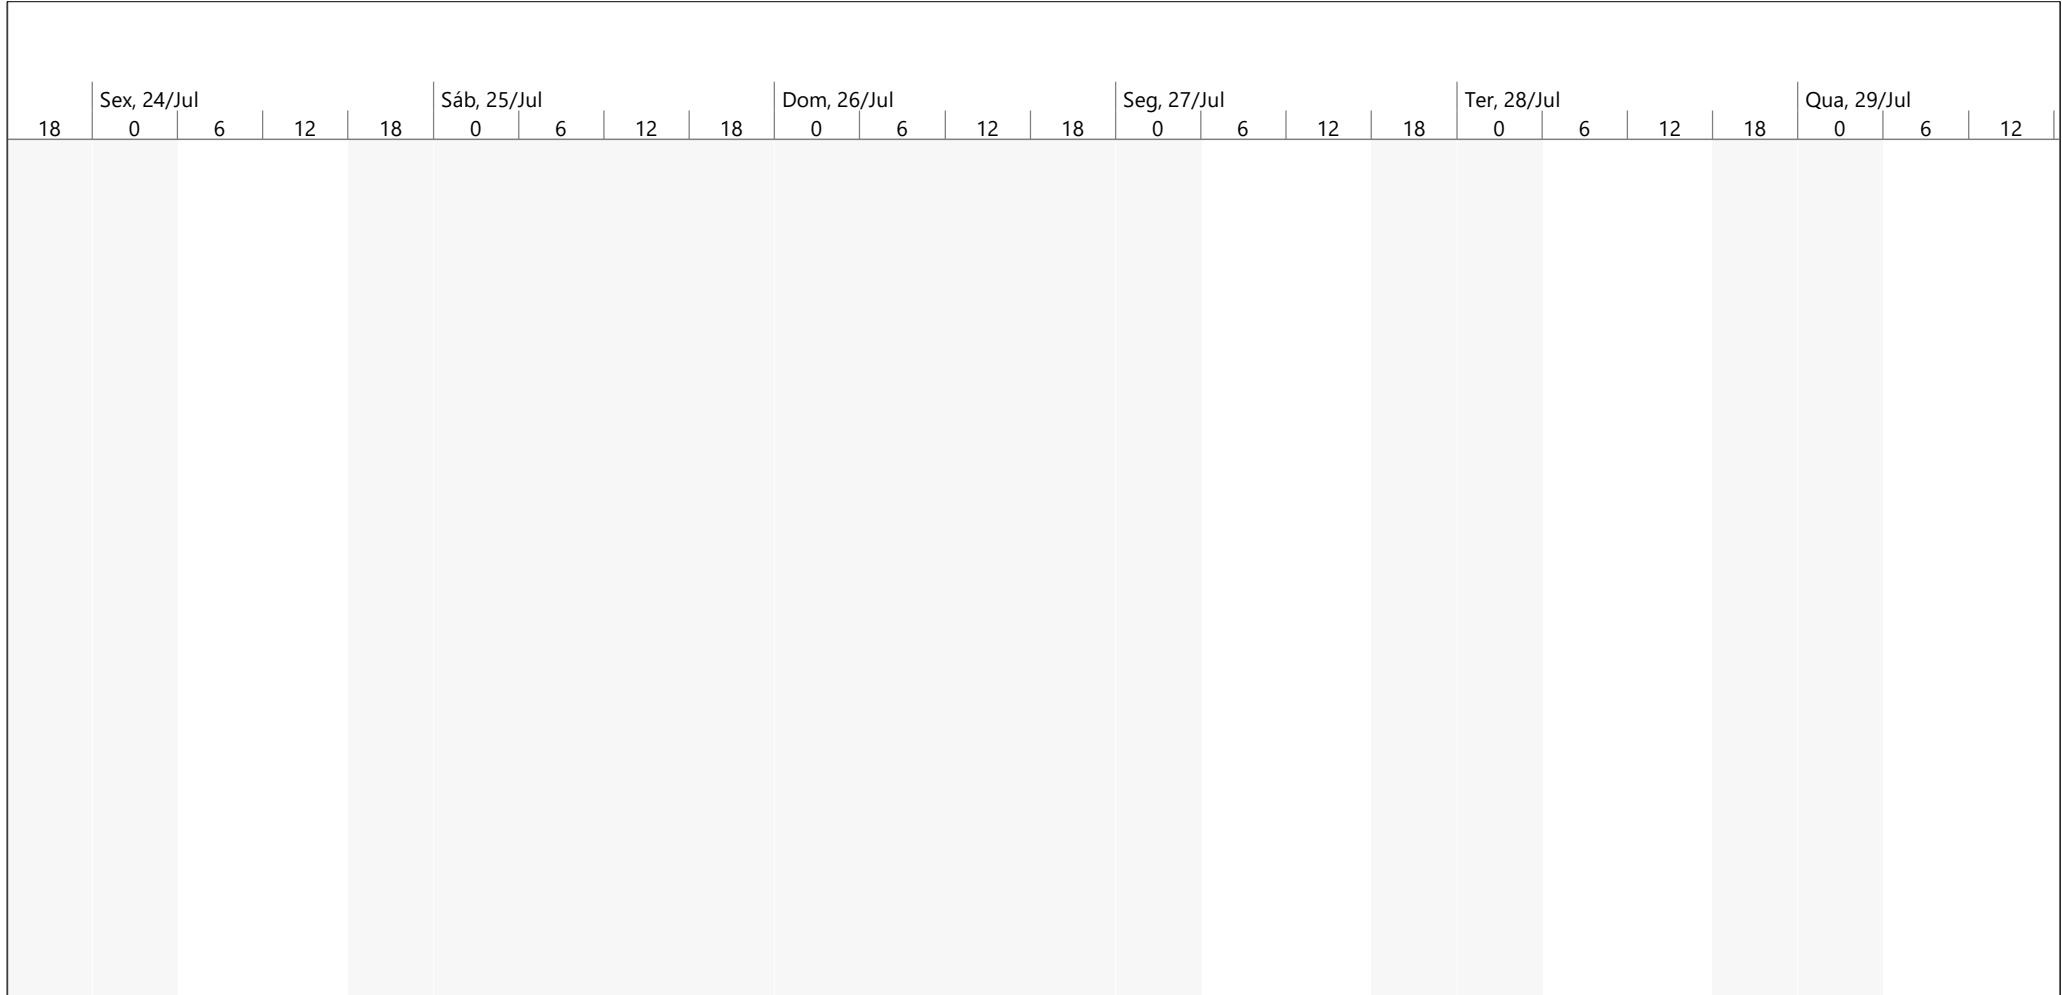


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

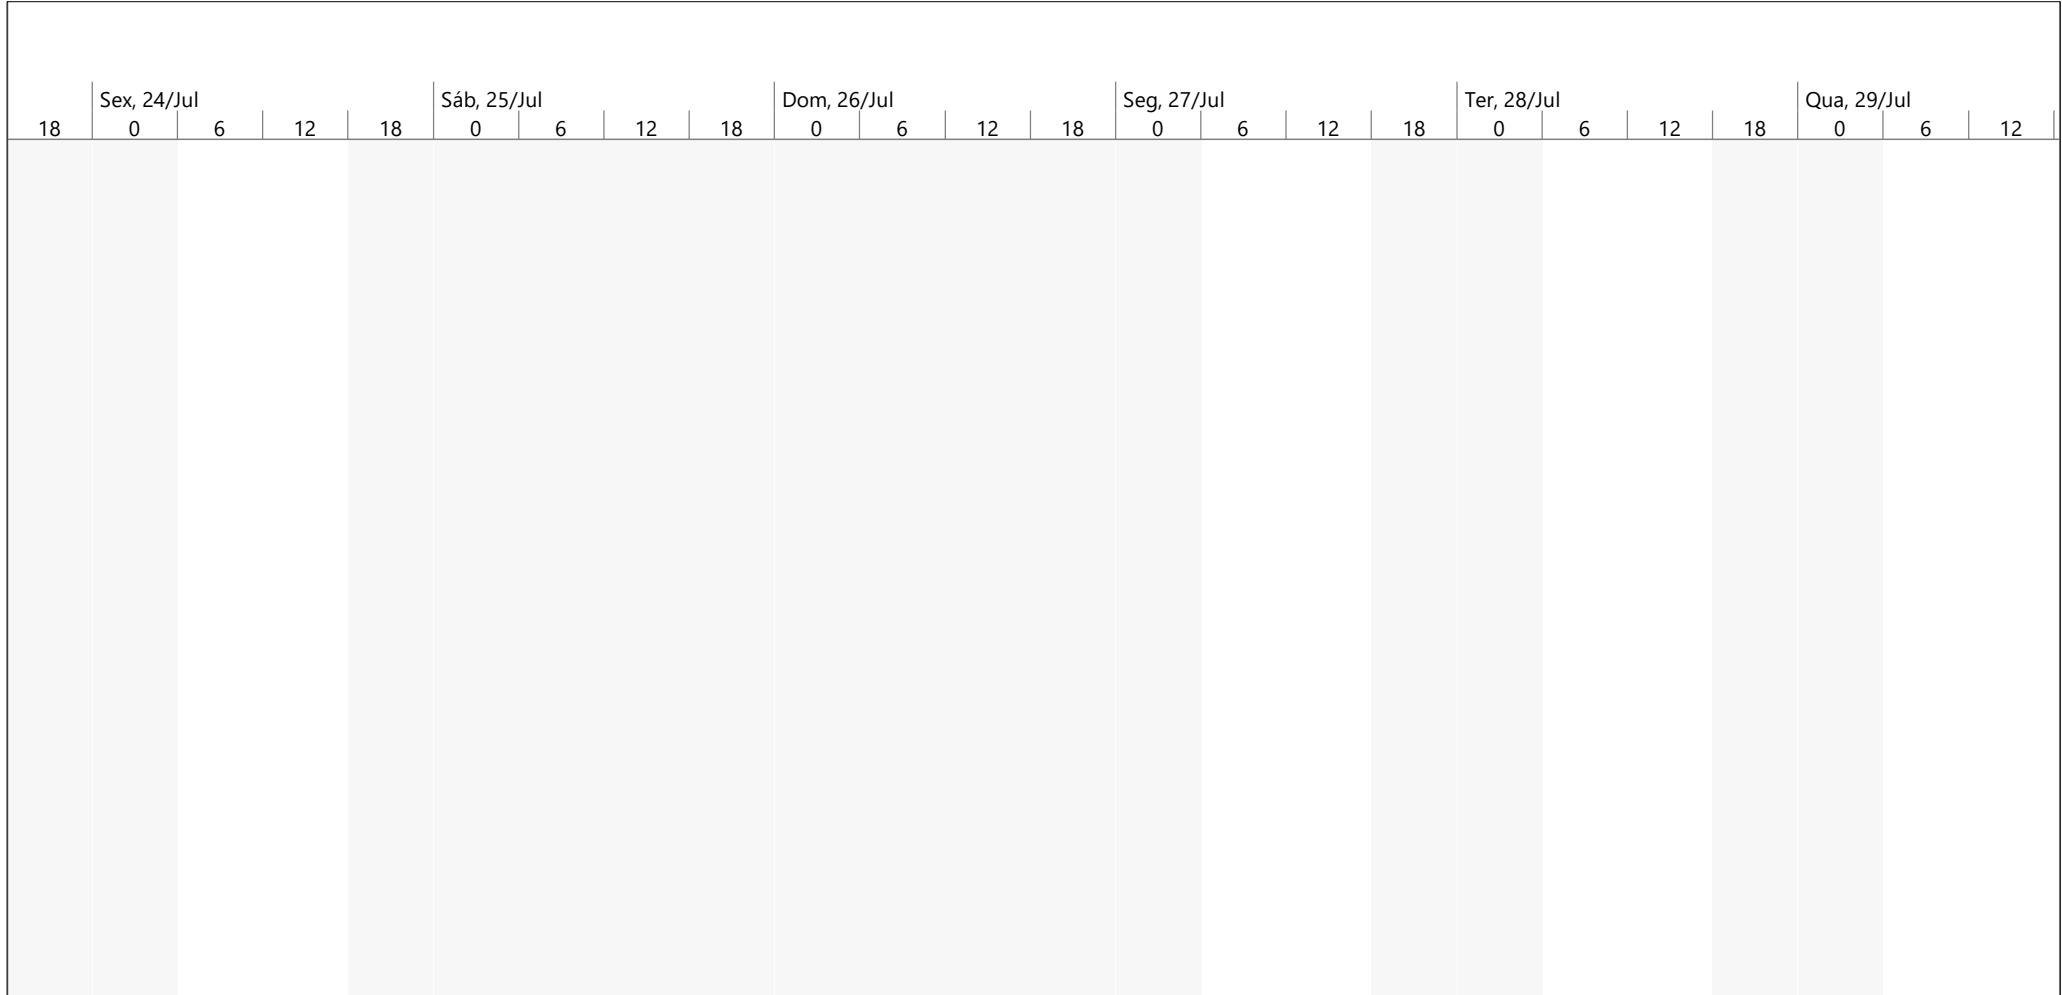

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

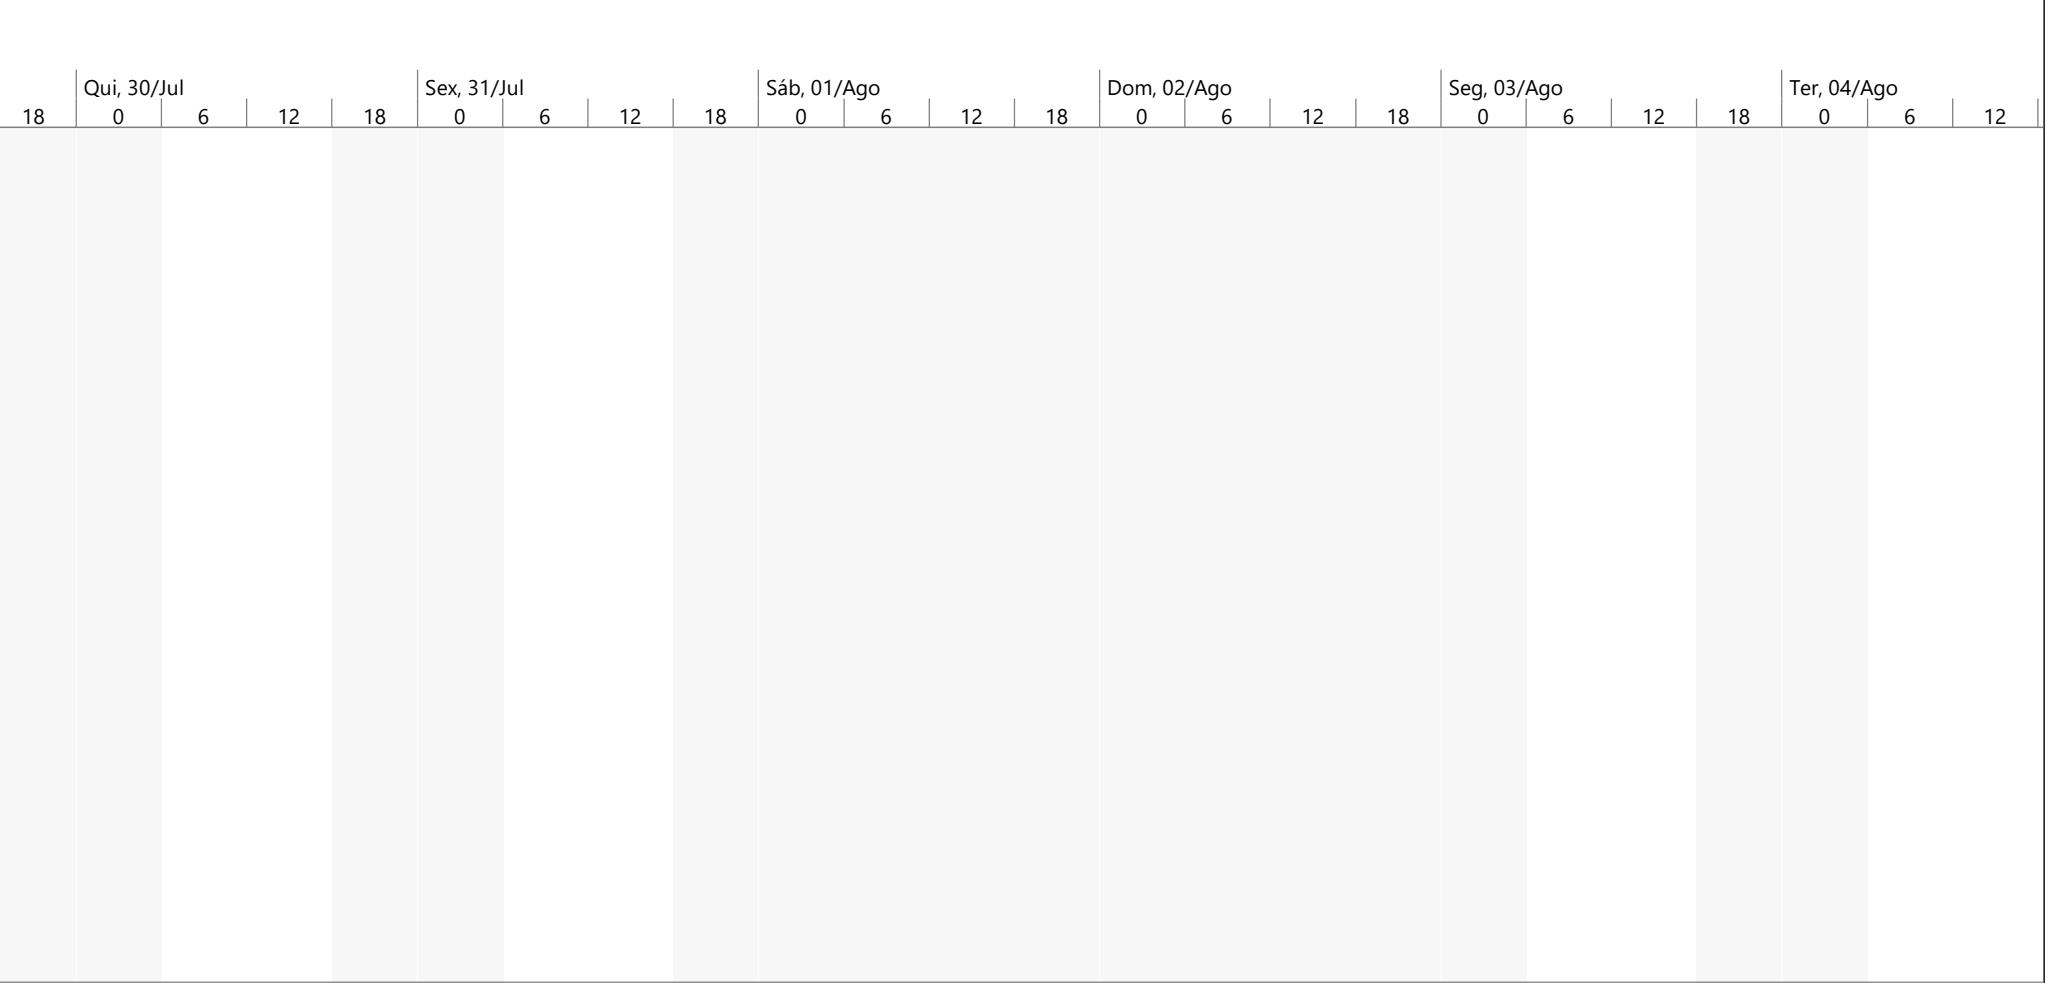


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

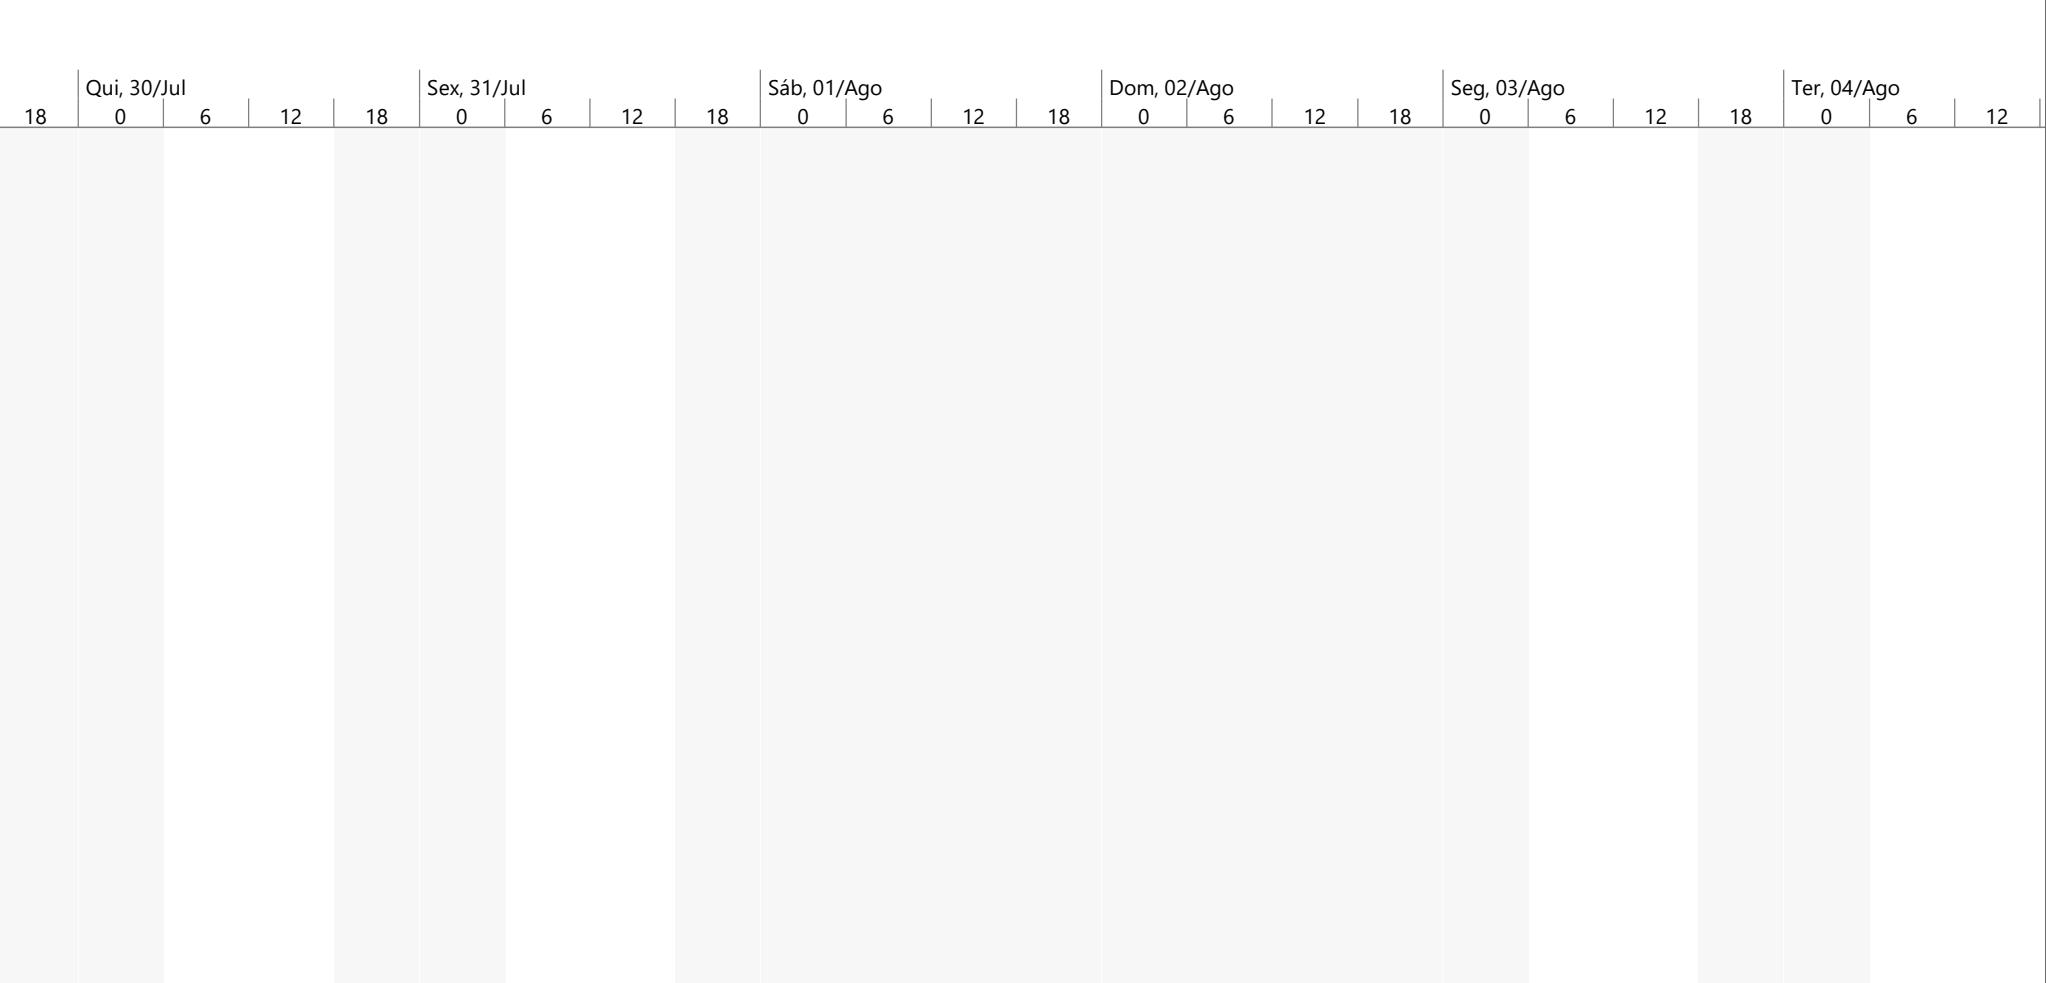

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

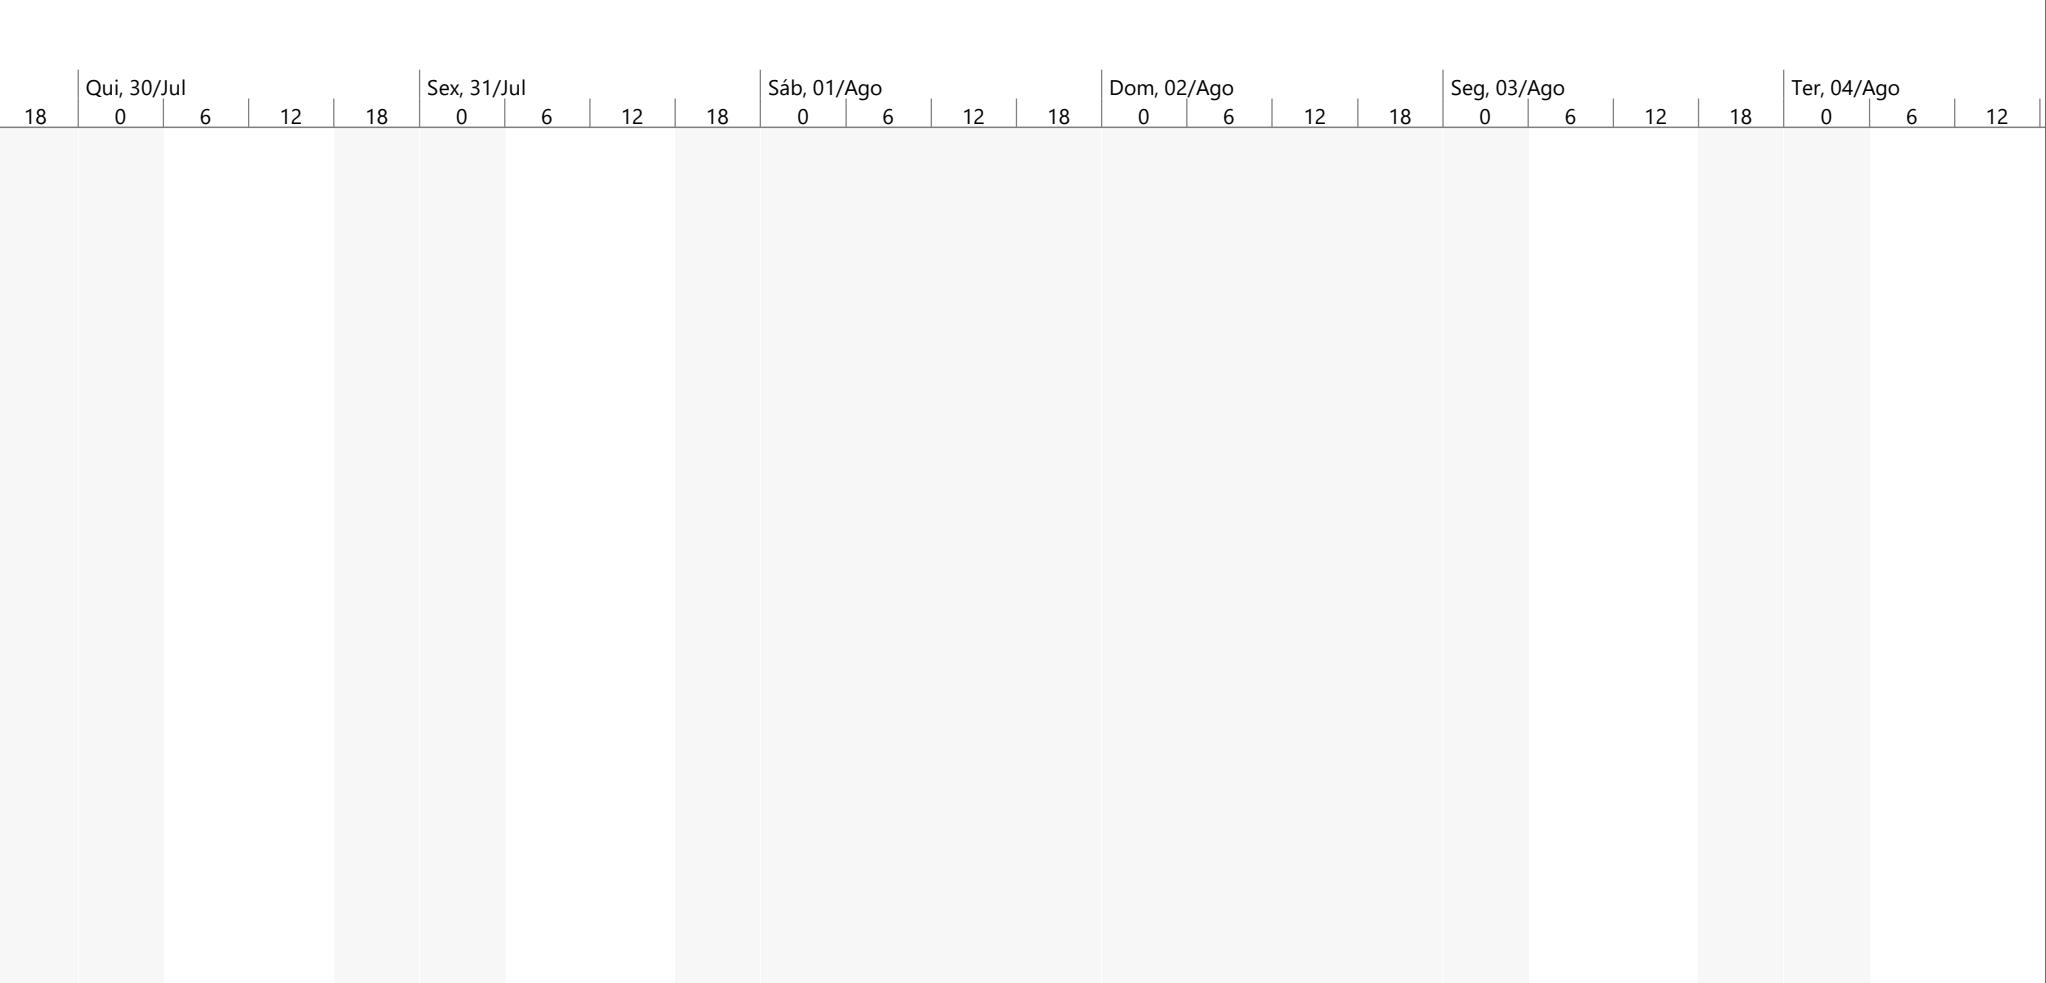

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	Somente término	Somente término
	Marco Inativo	Somente término	Somente término	Somente término




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

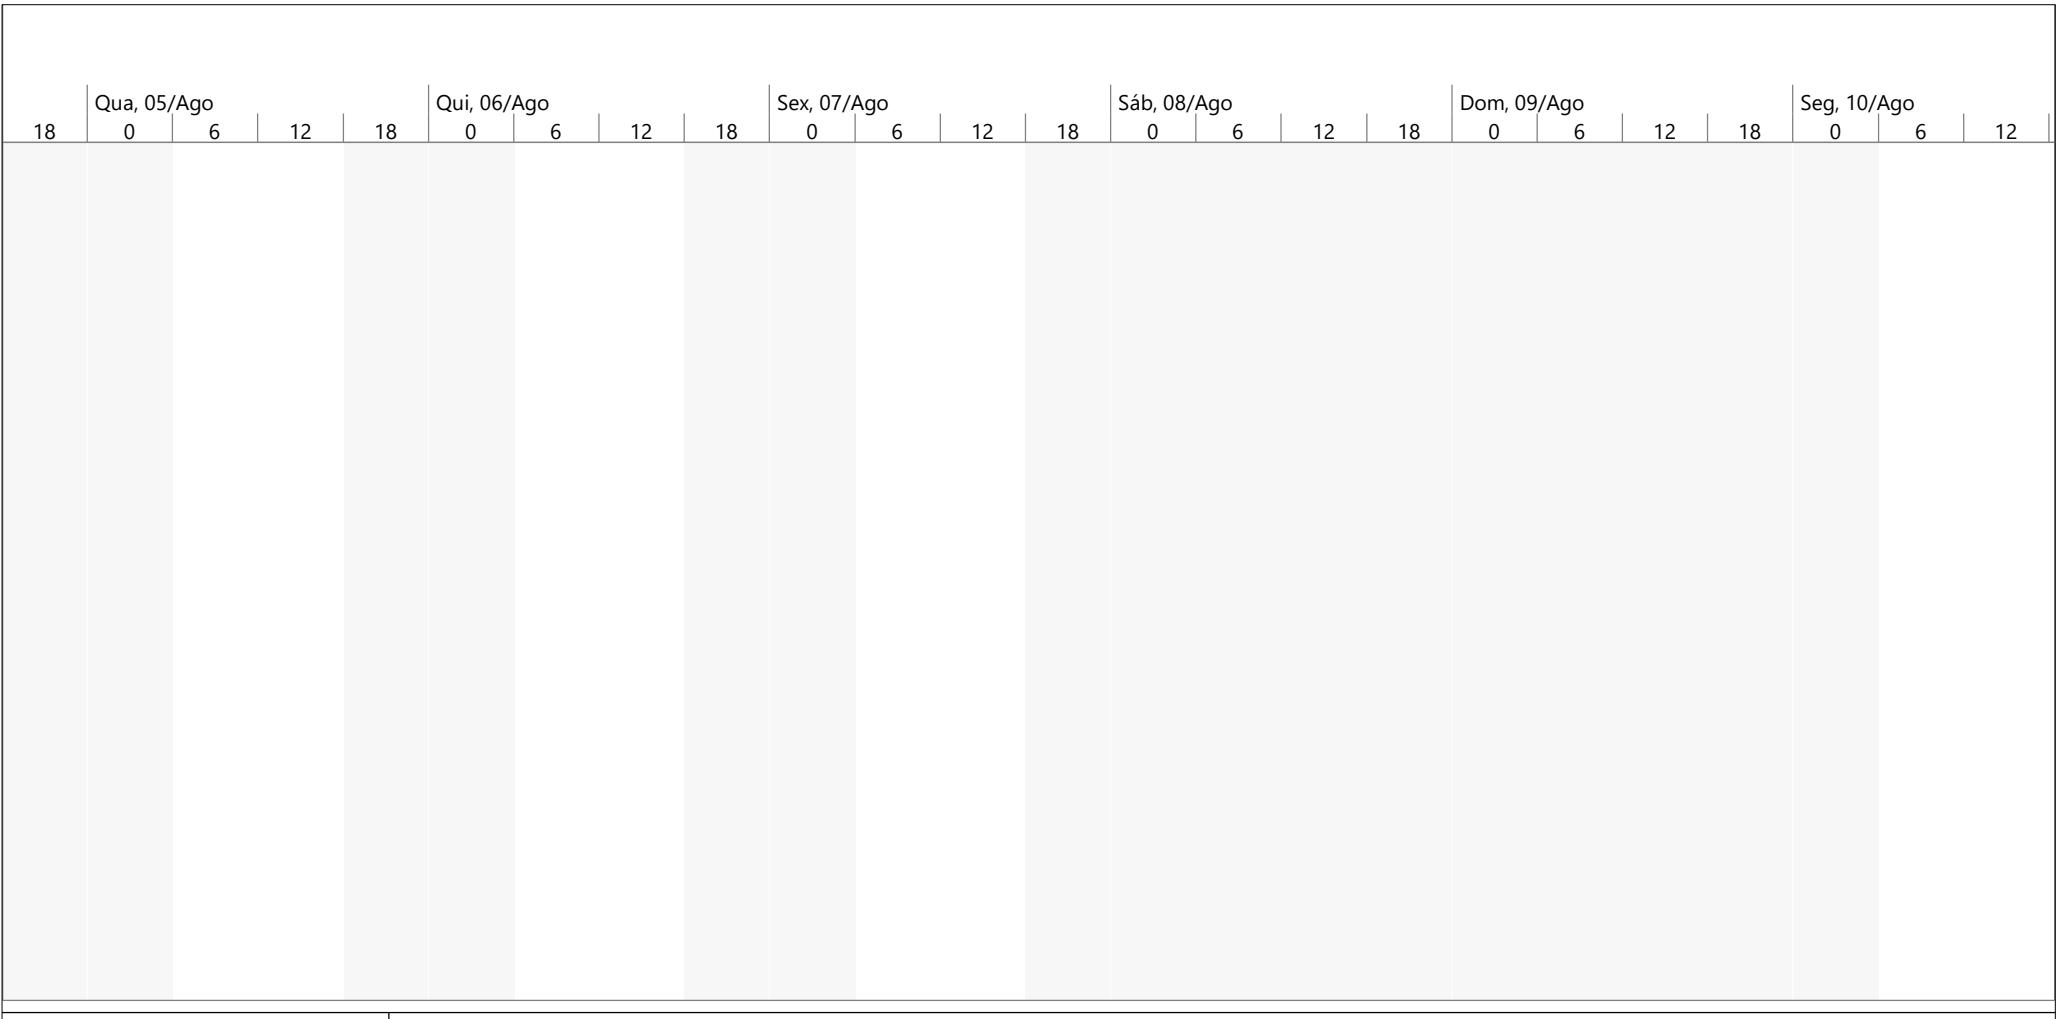

Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

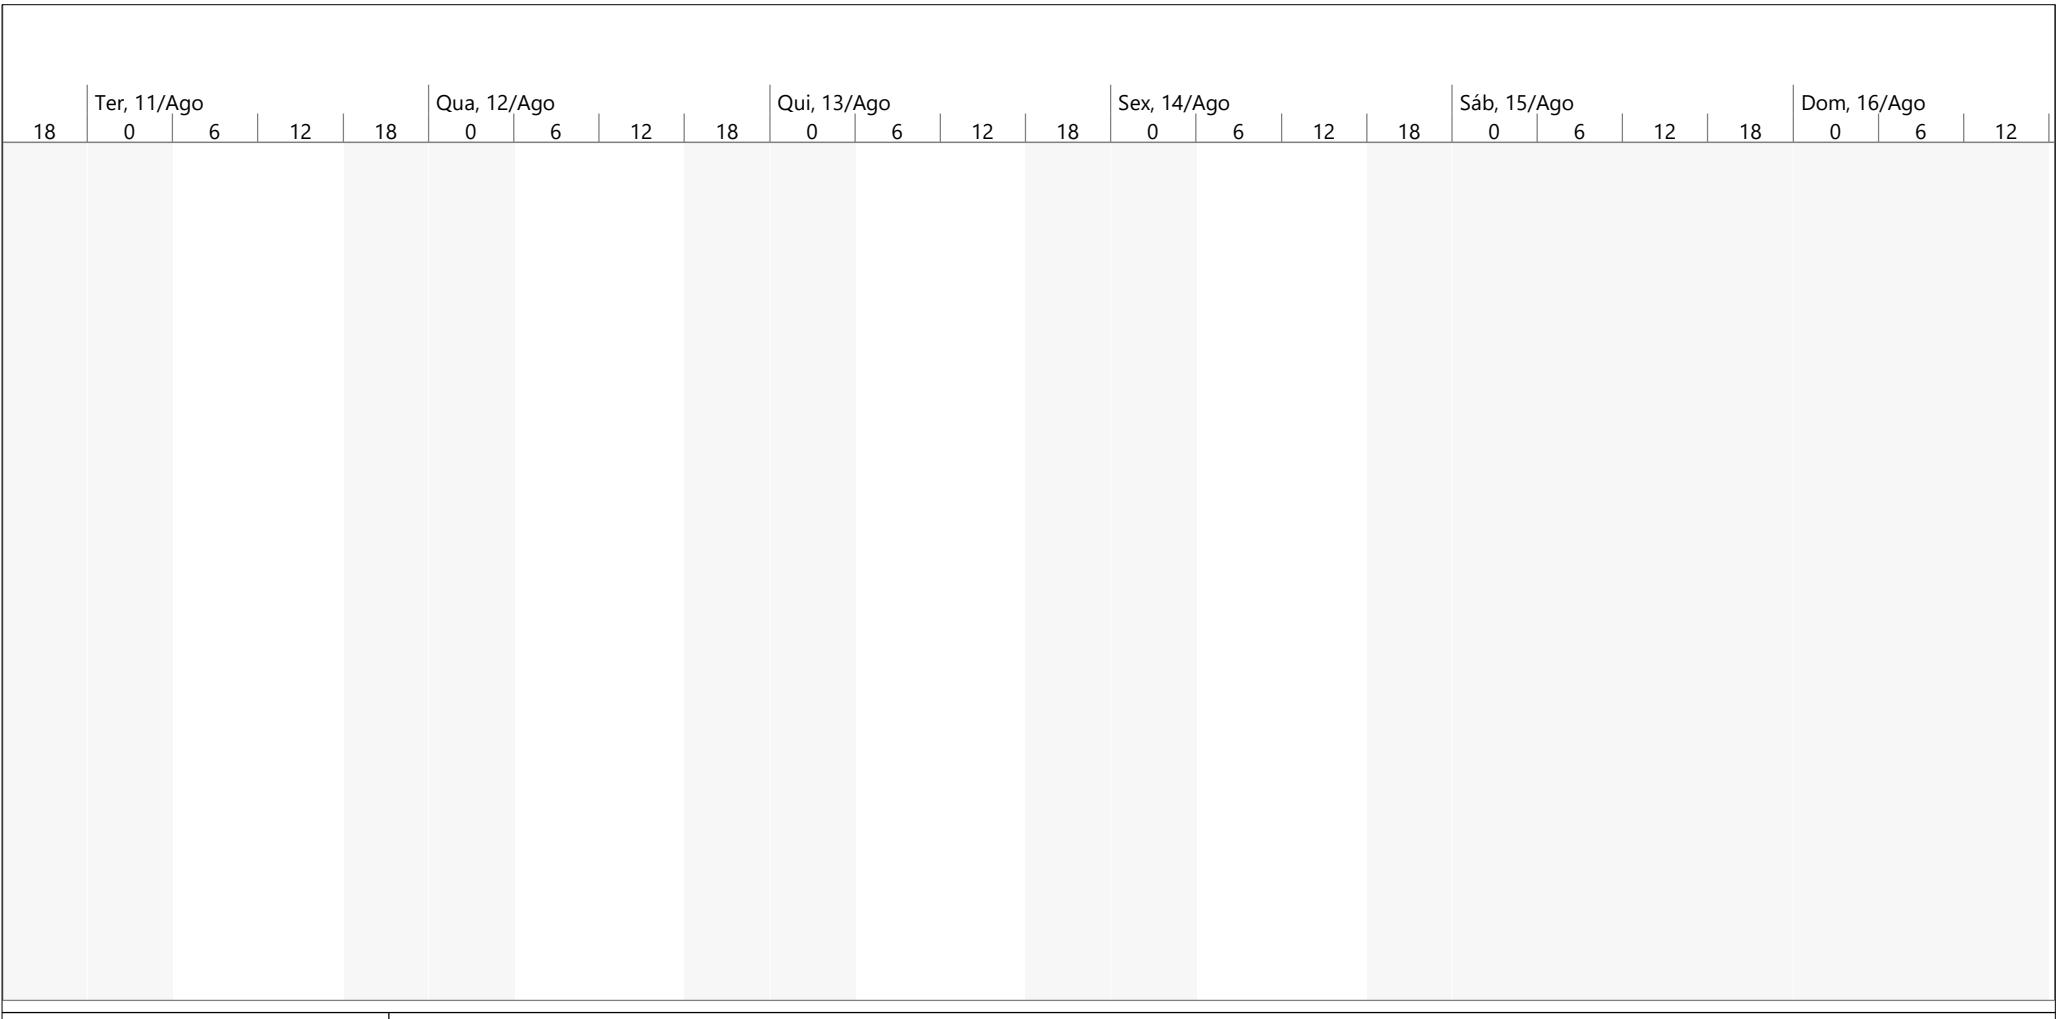

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

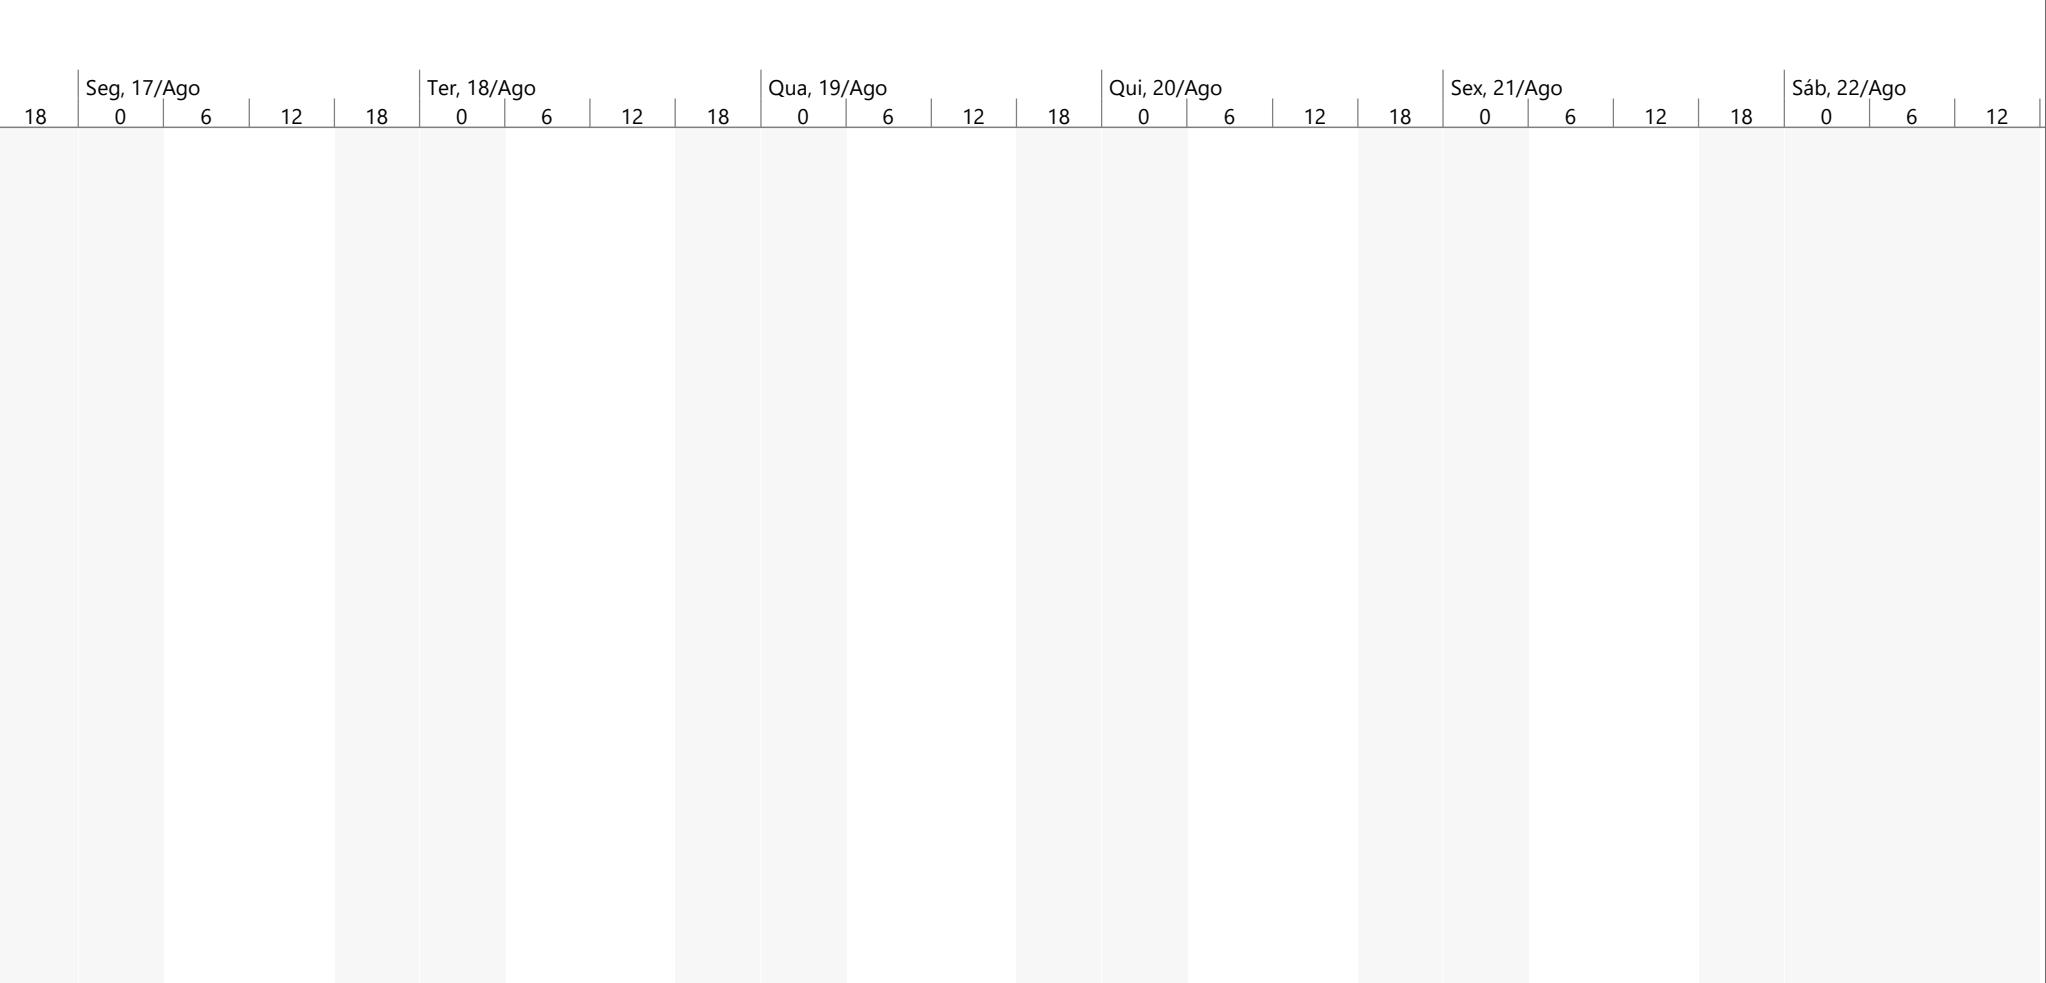



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22






Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

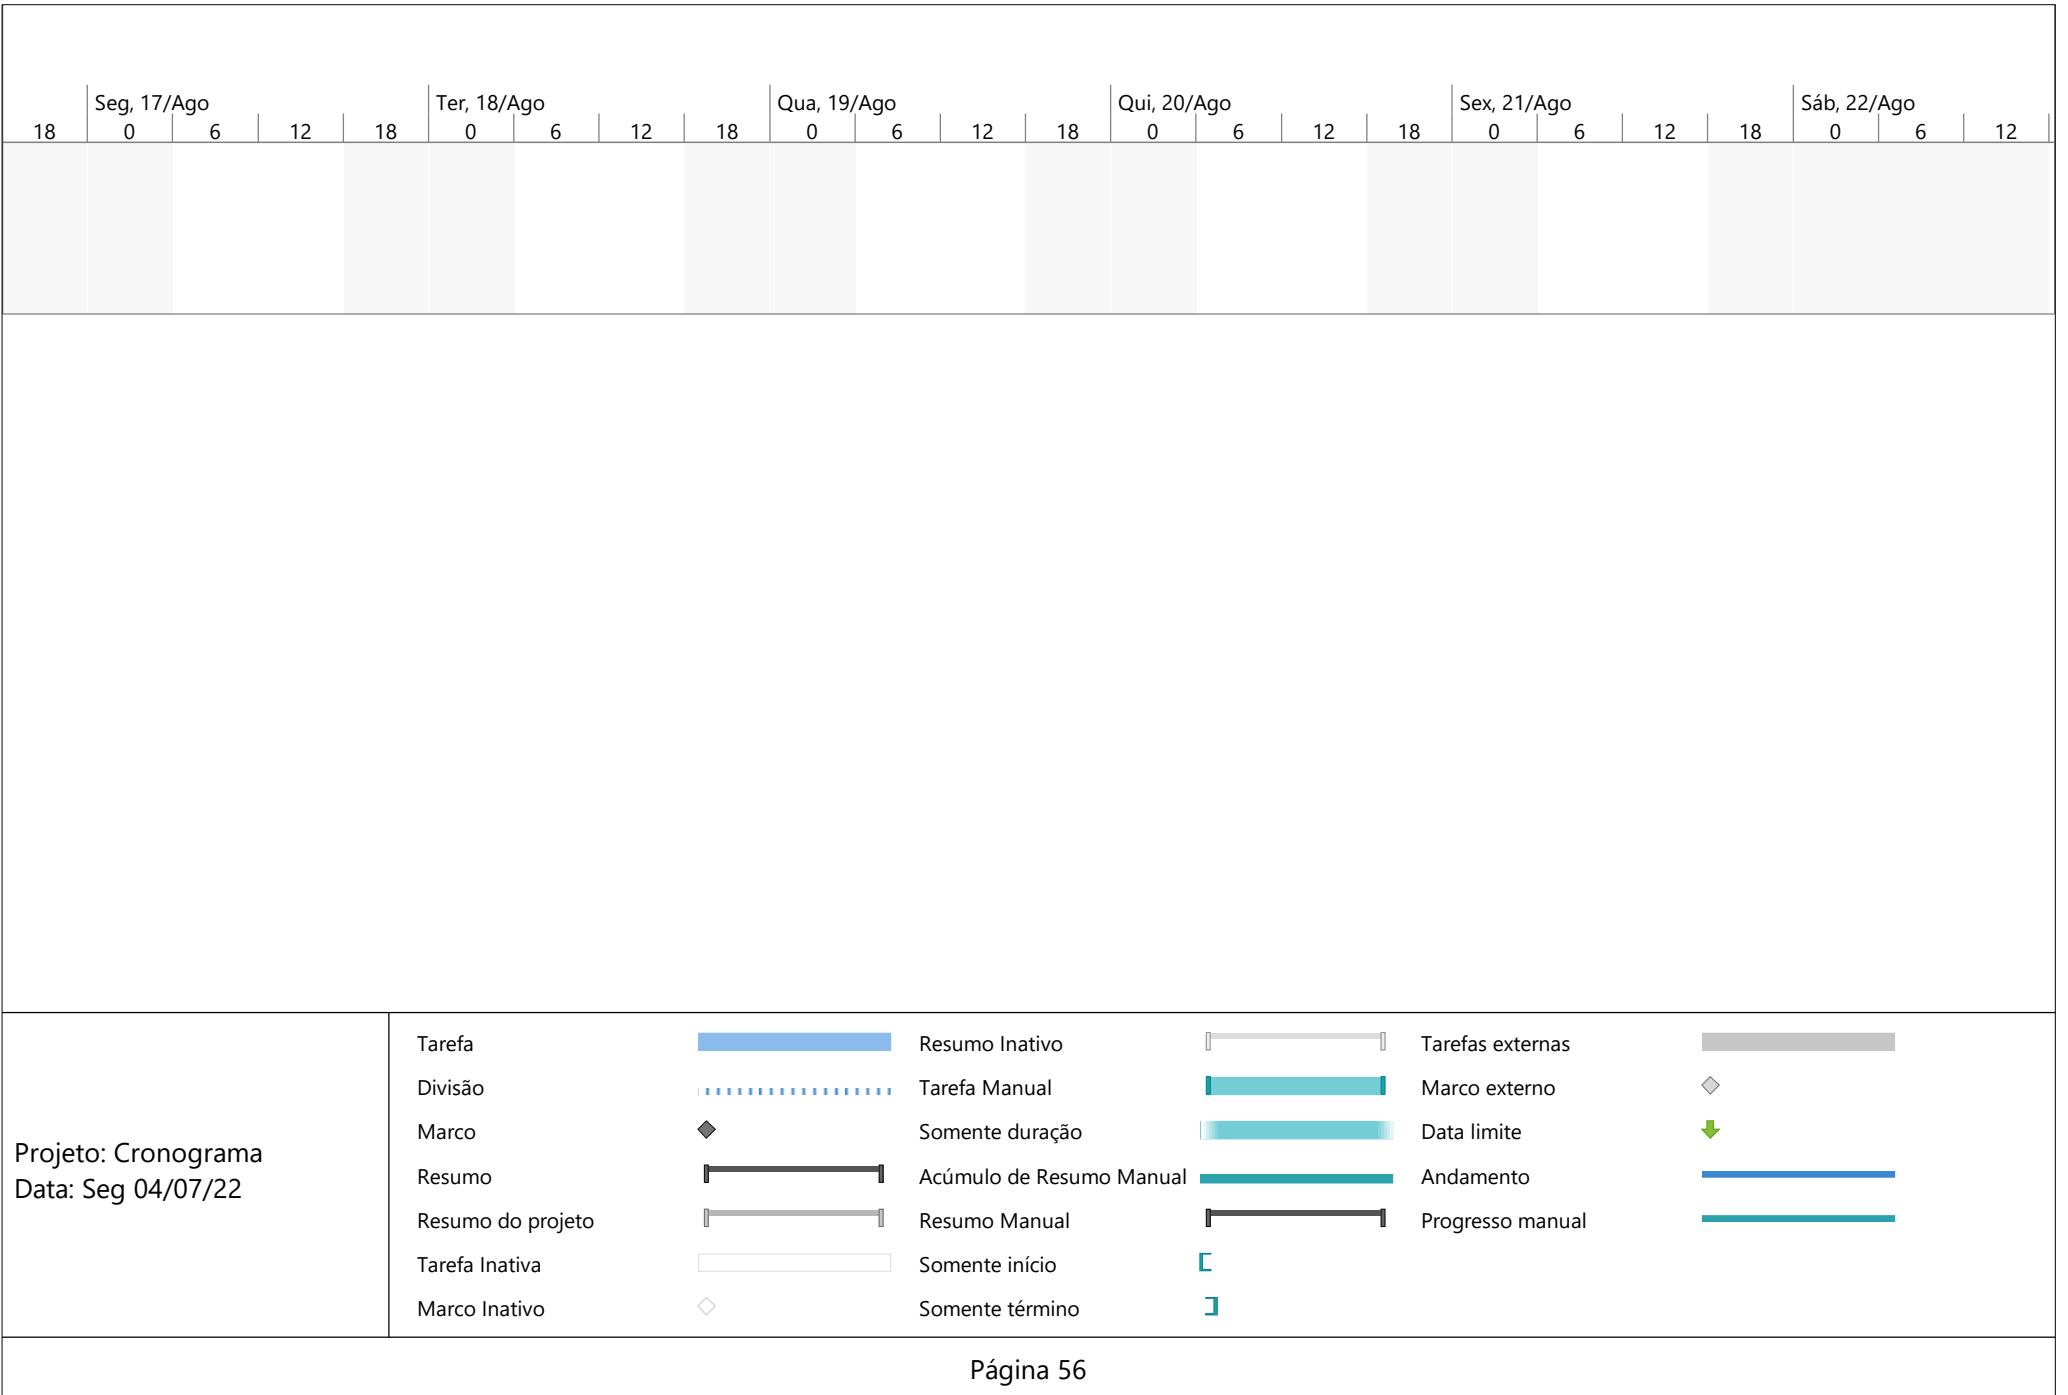

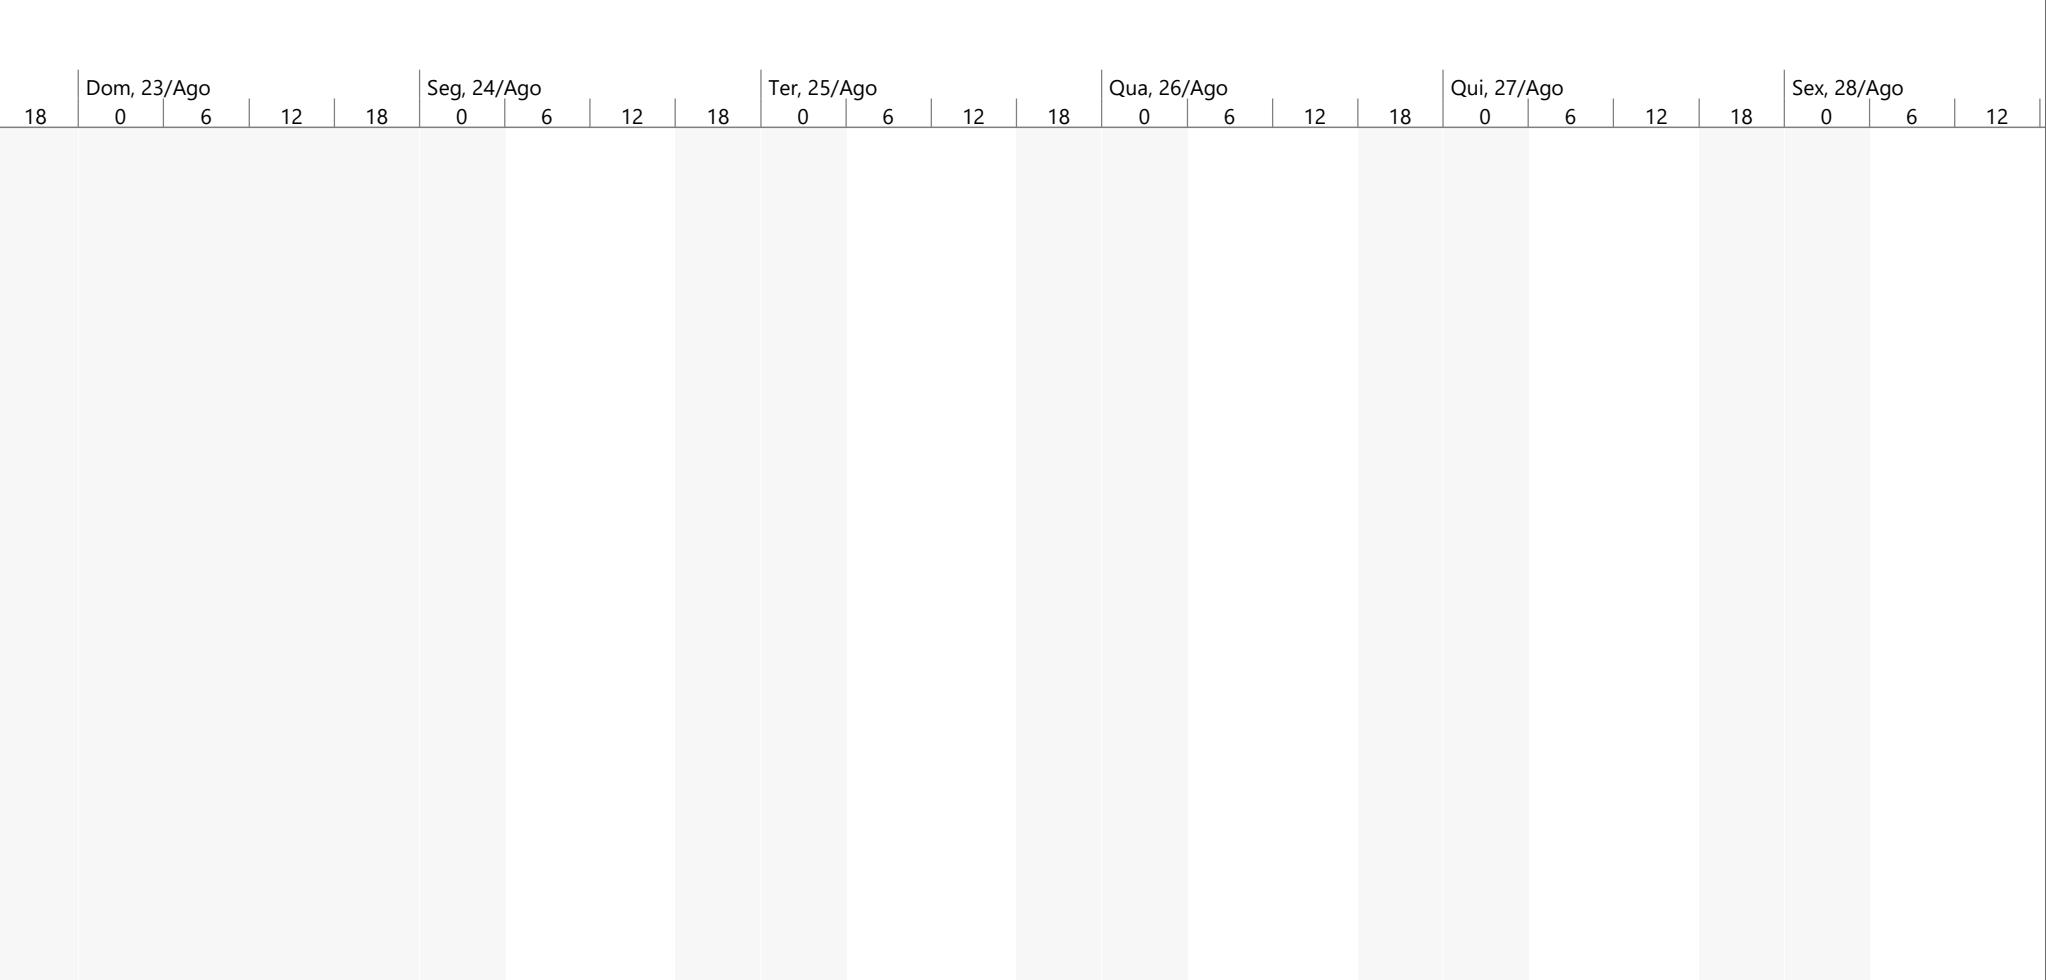


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

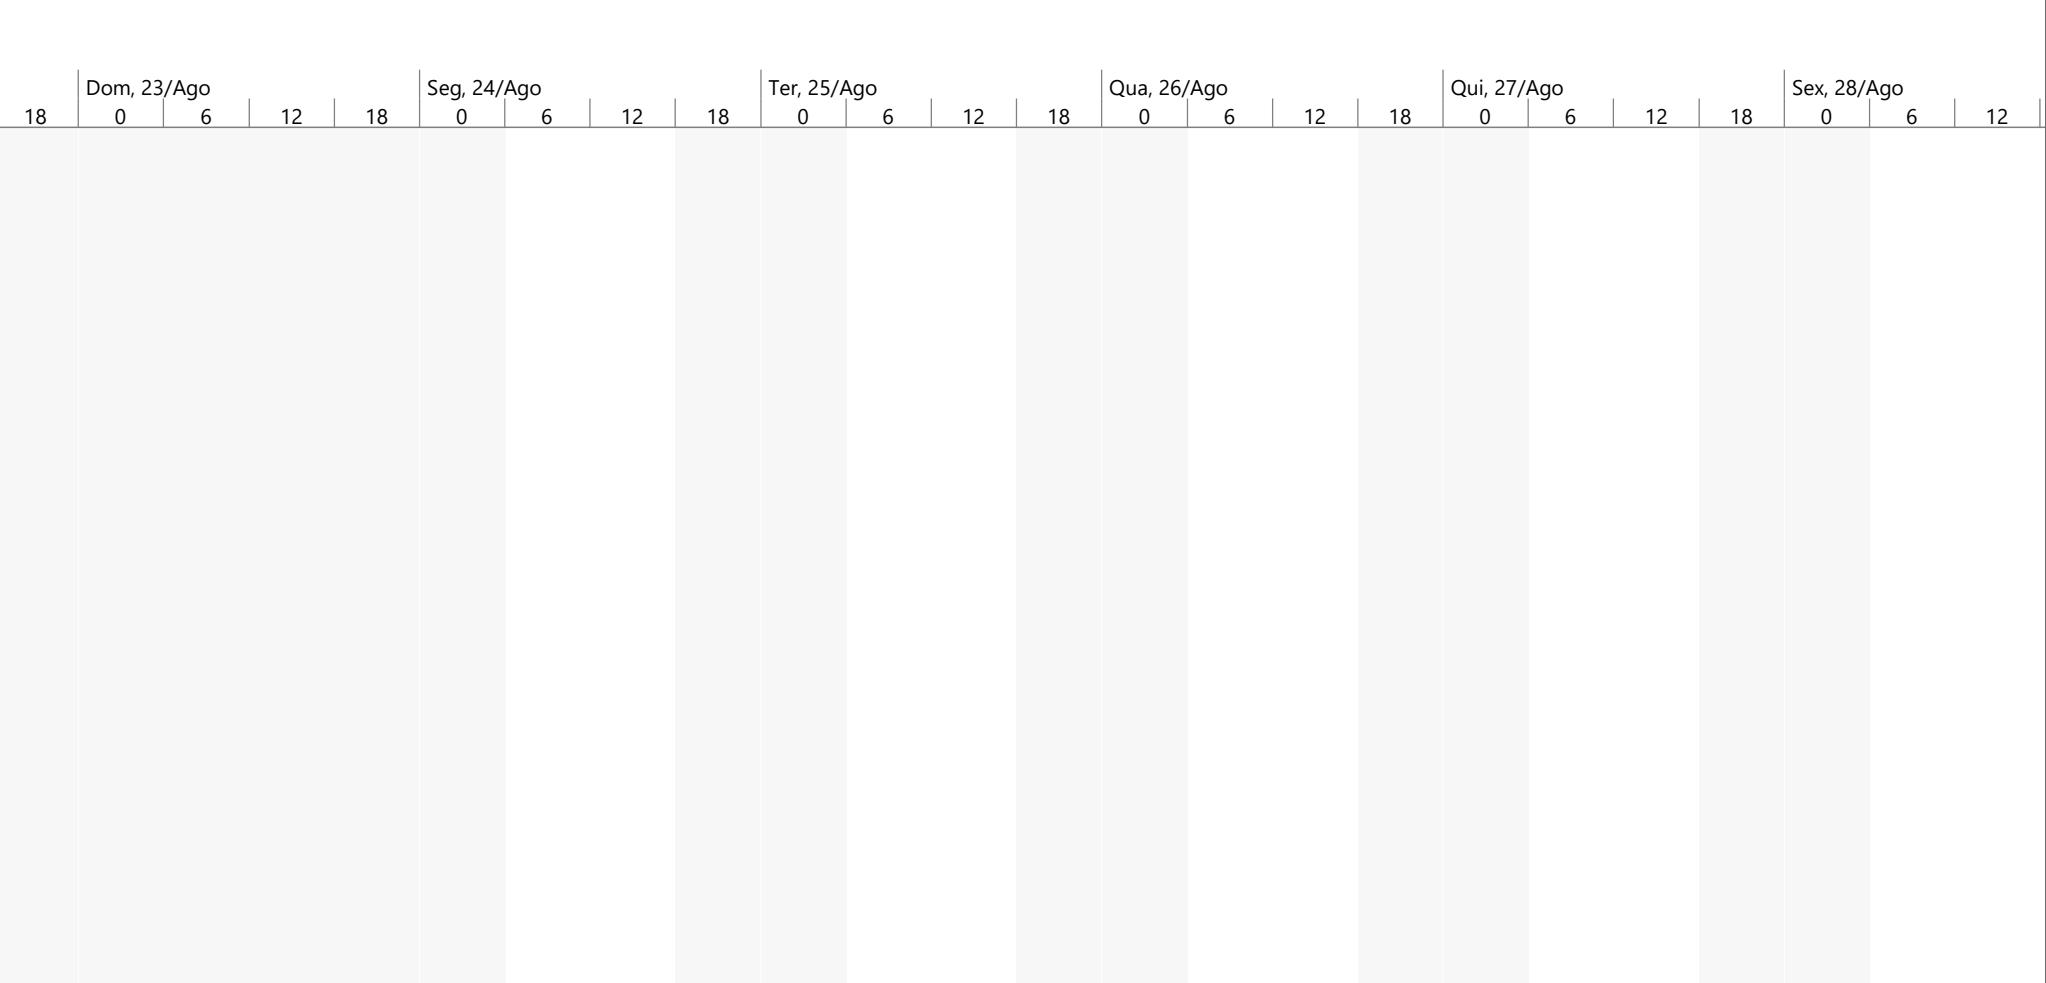


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

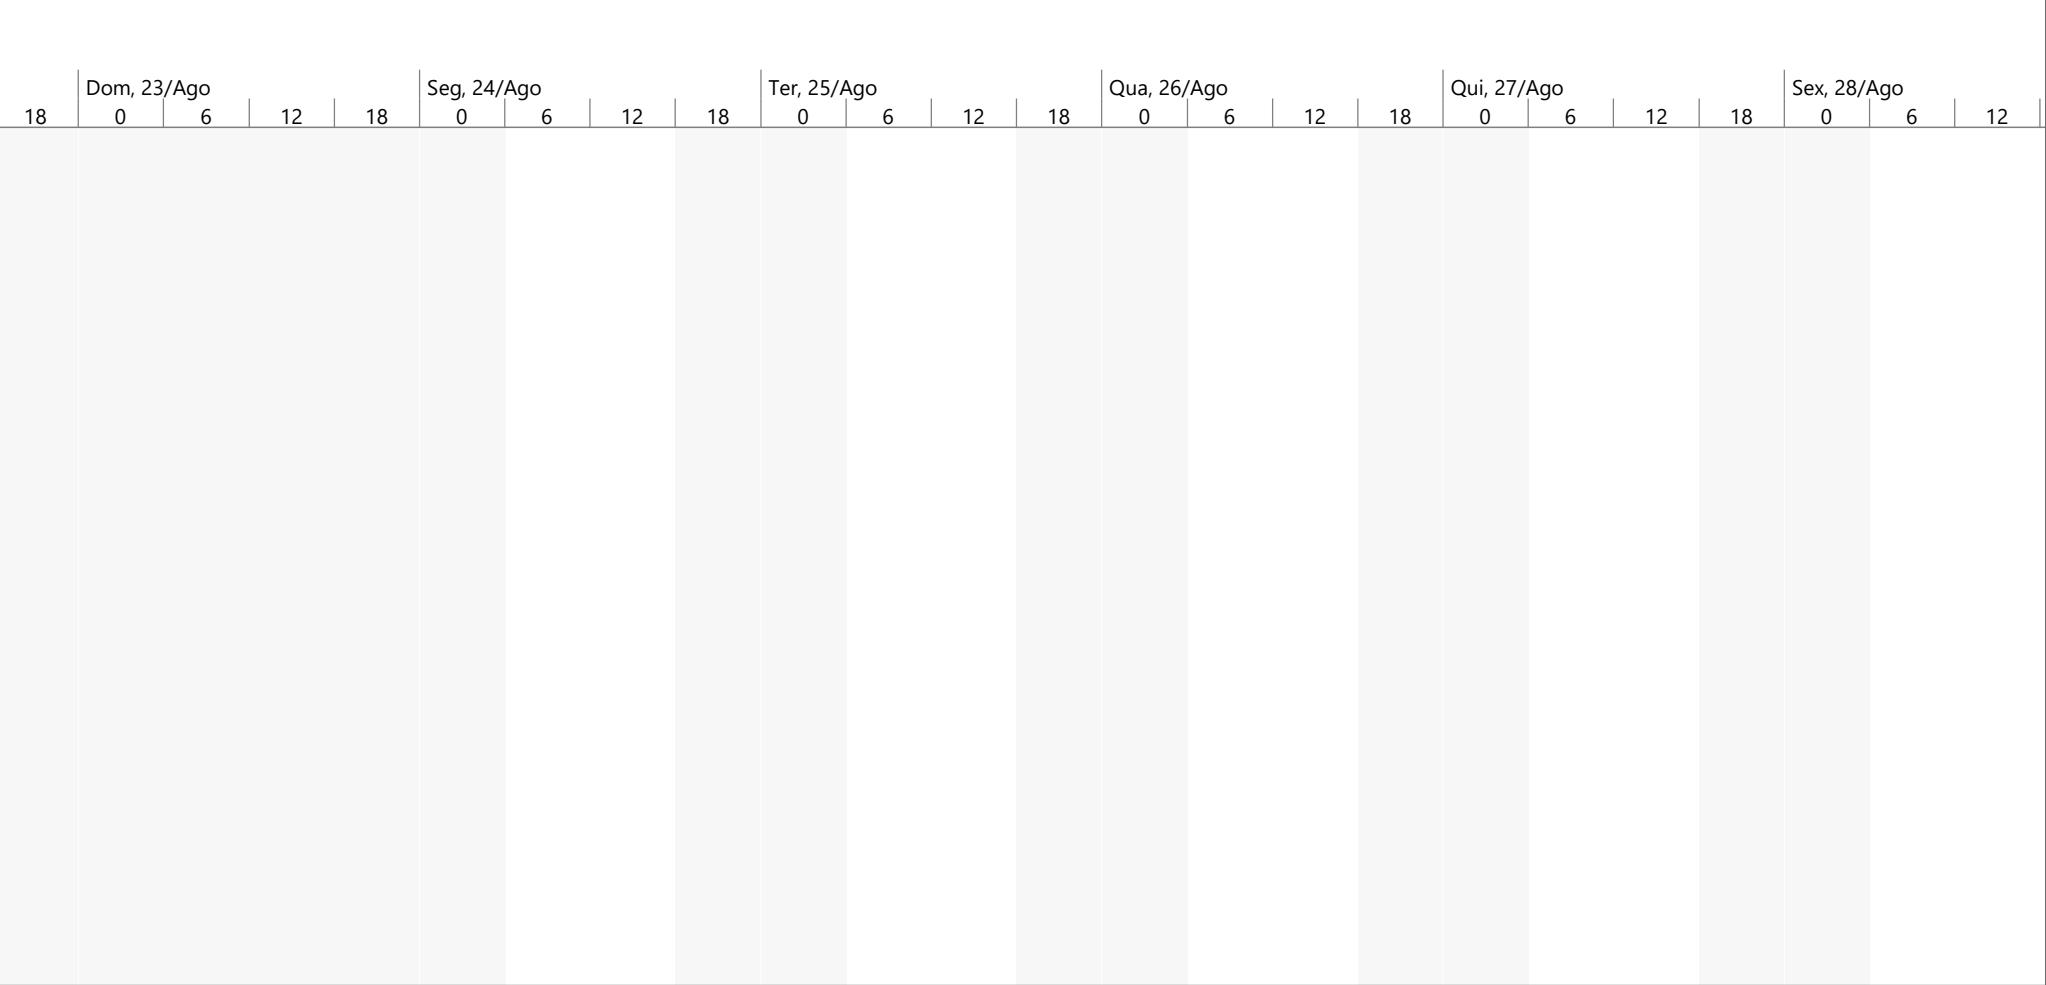

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

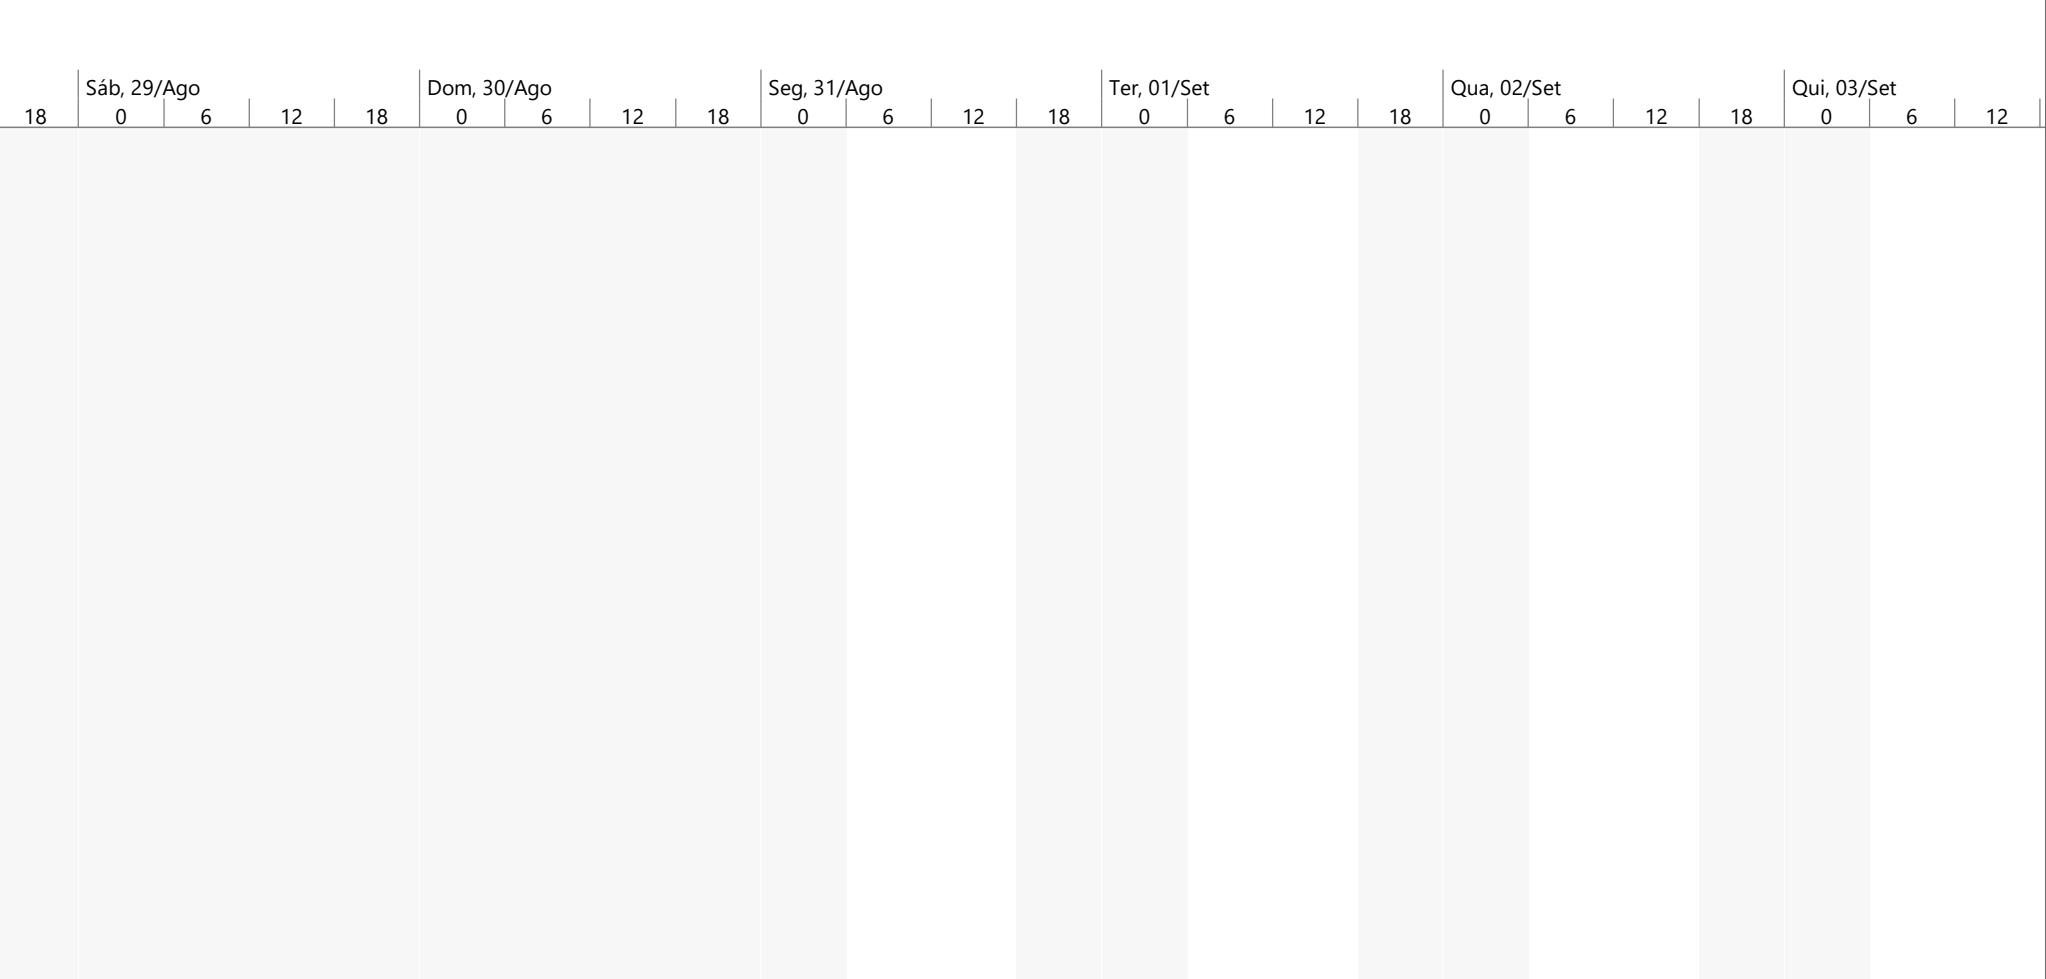


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

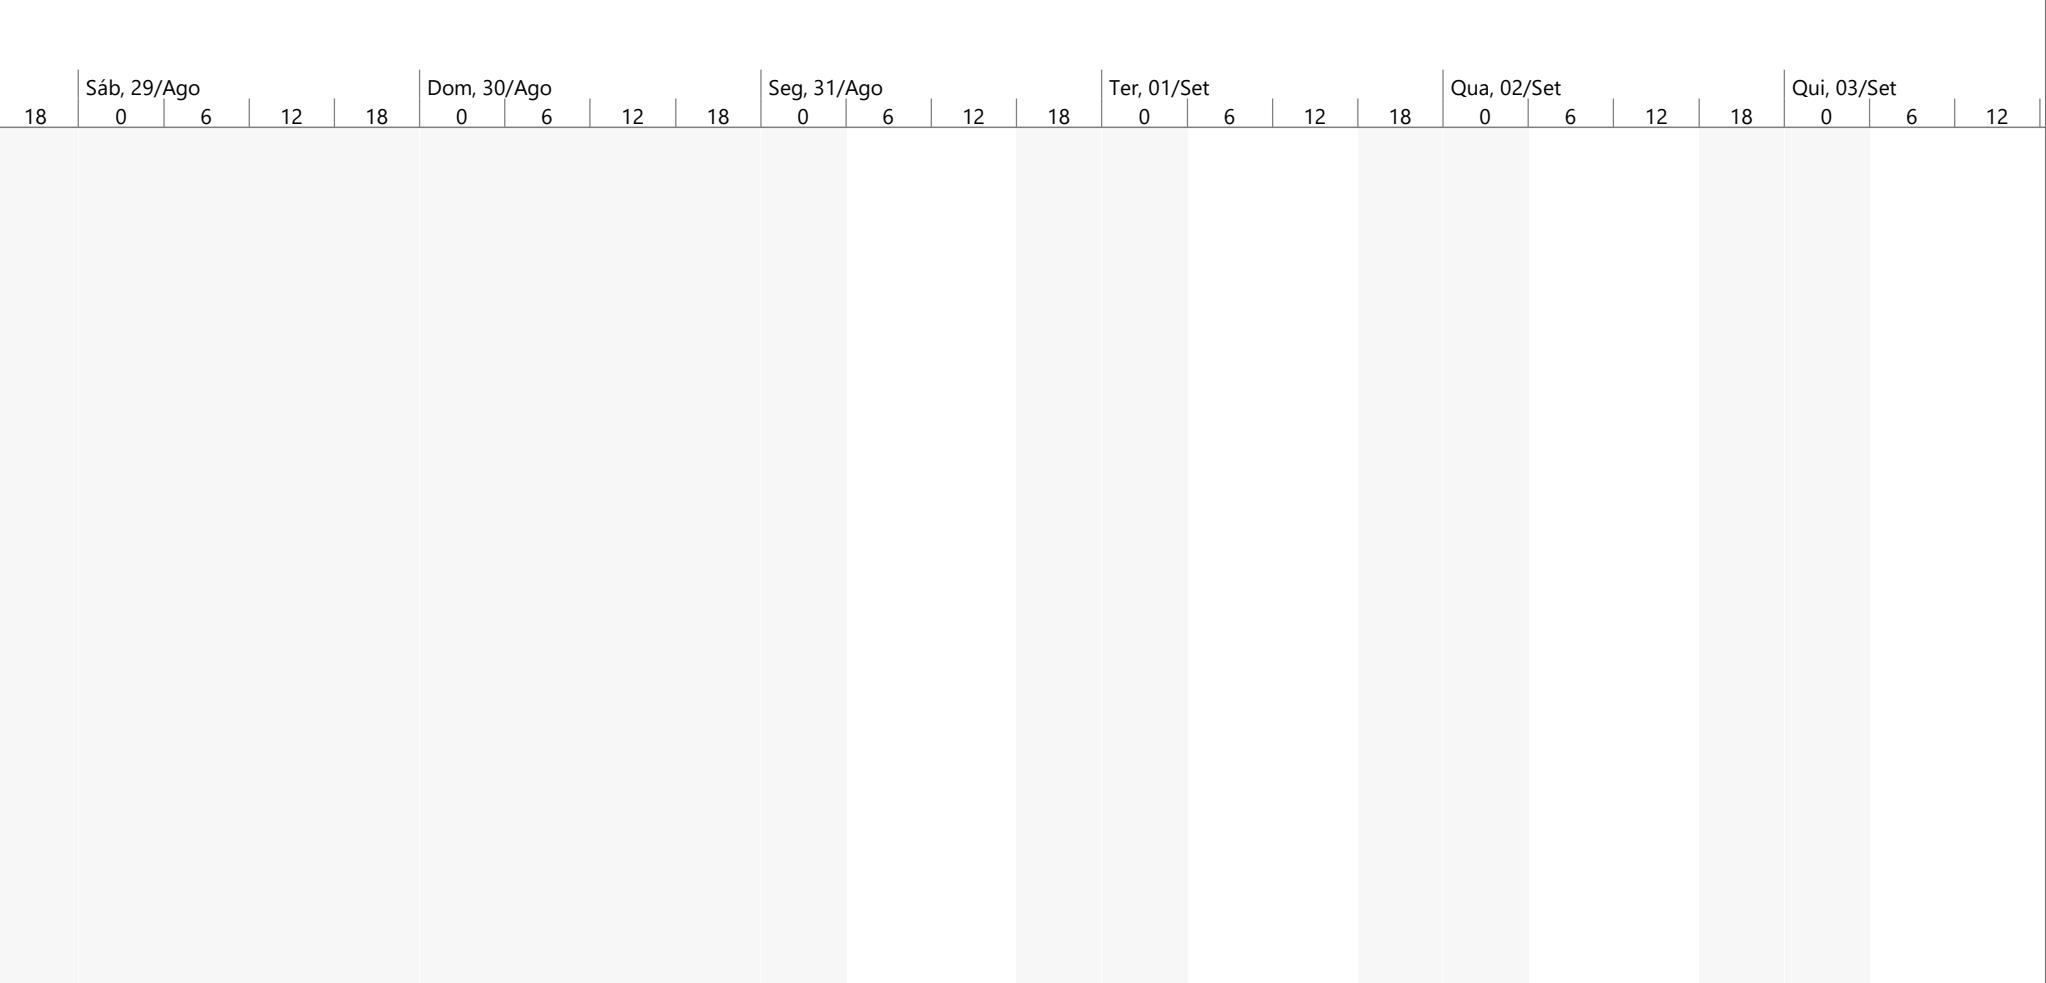

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

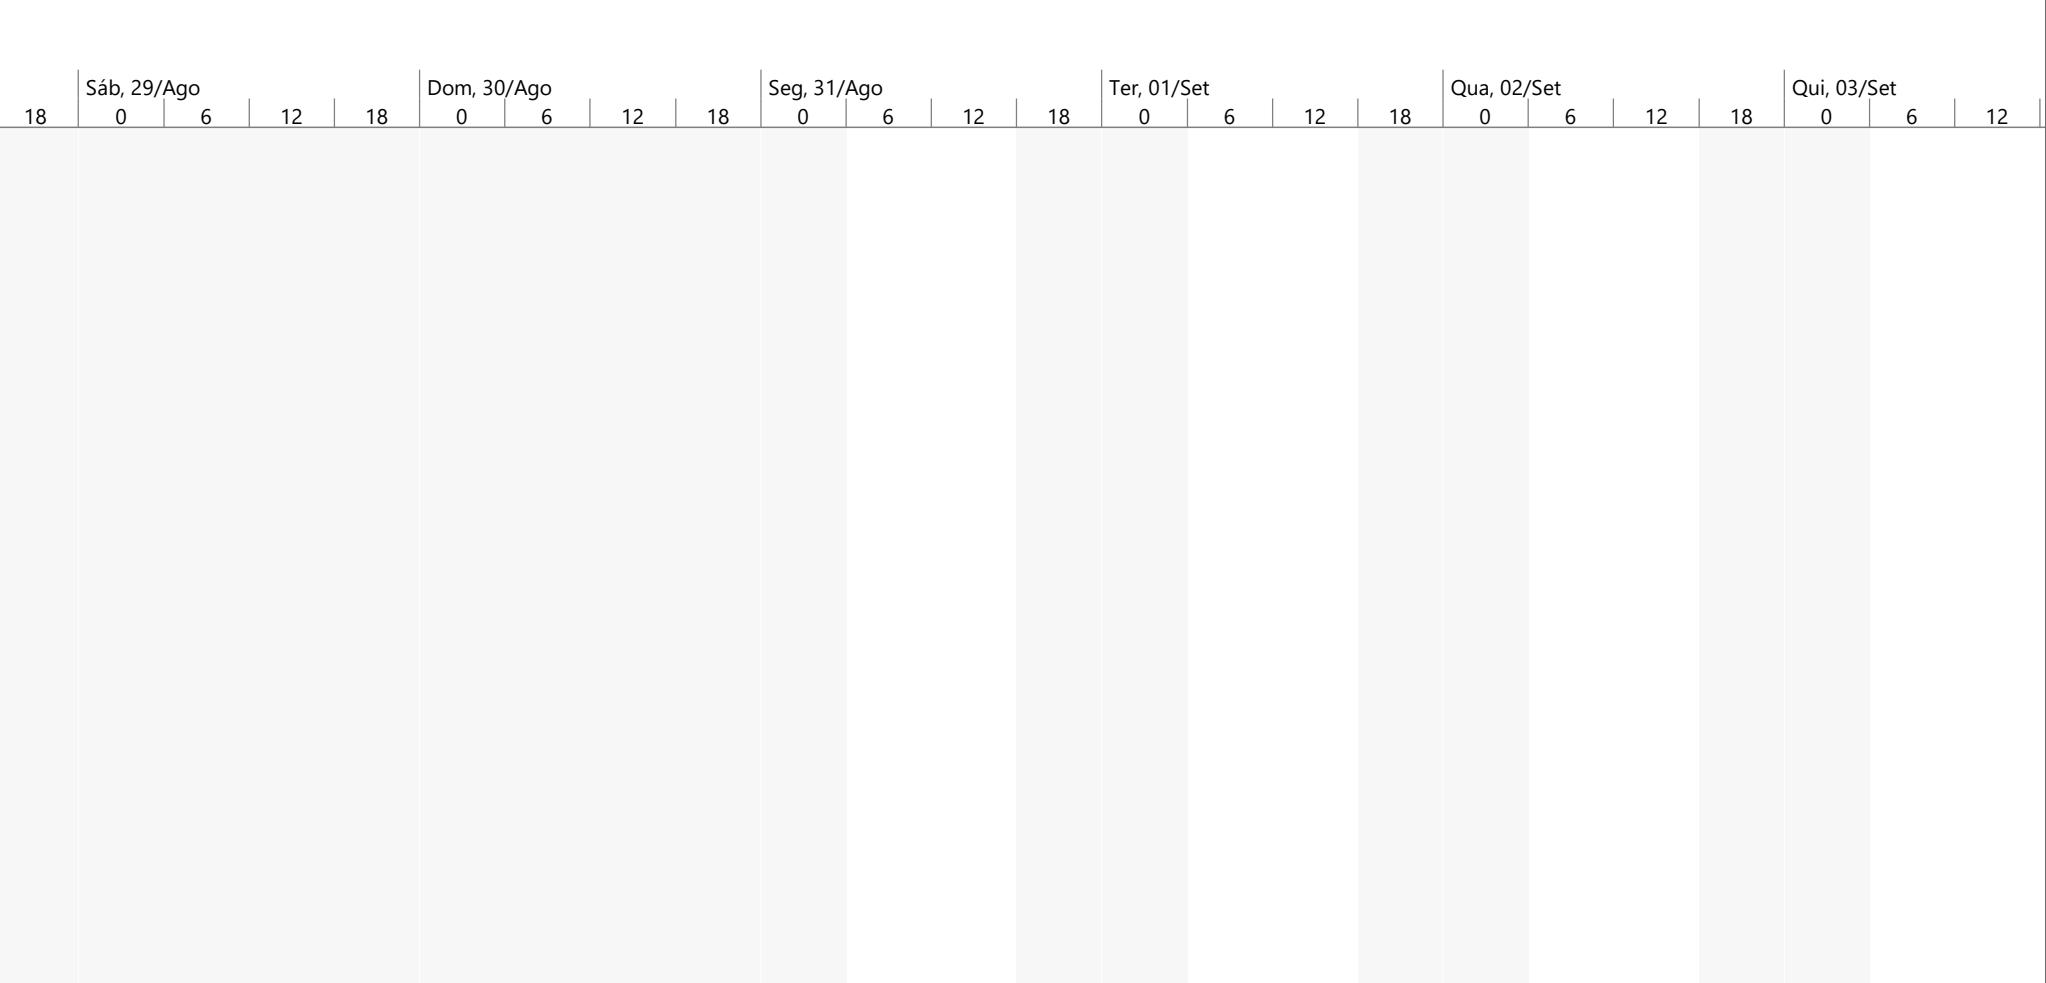


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

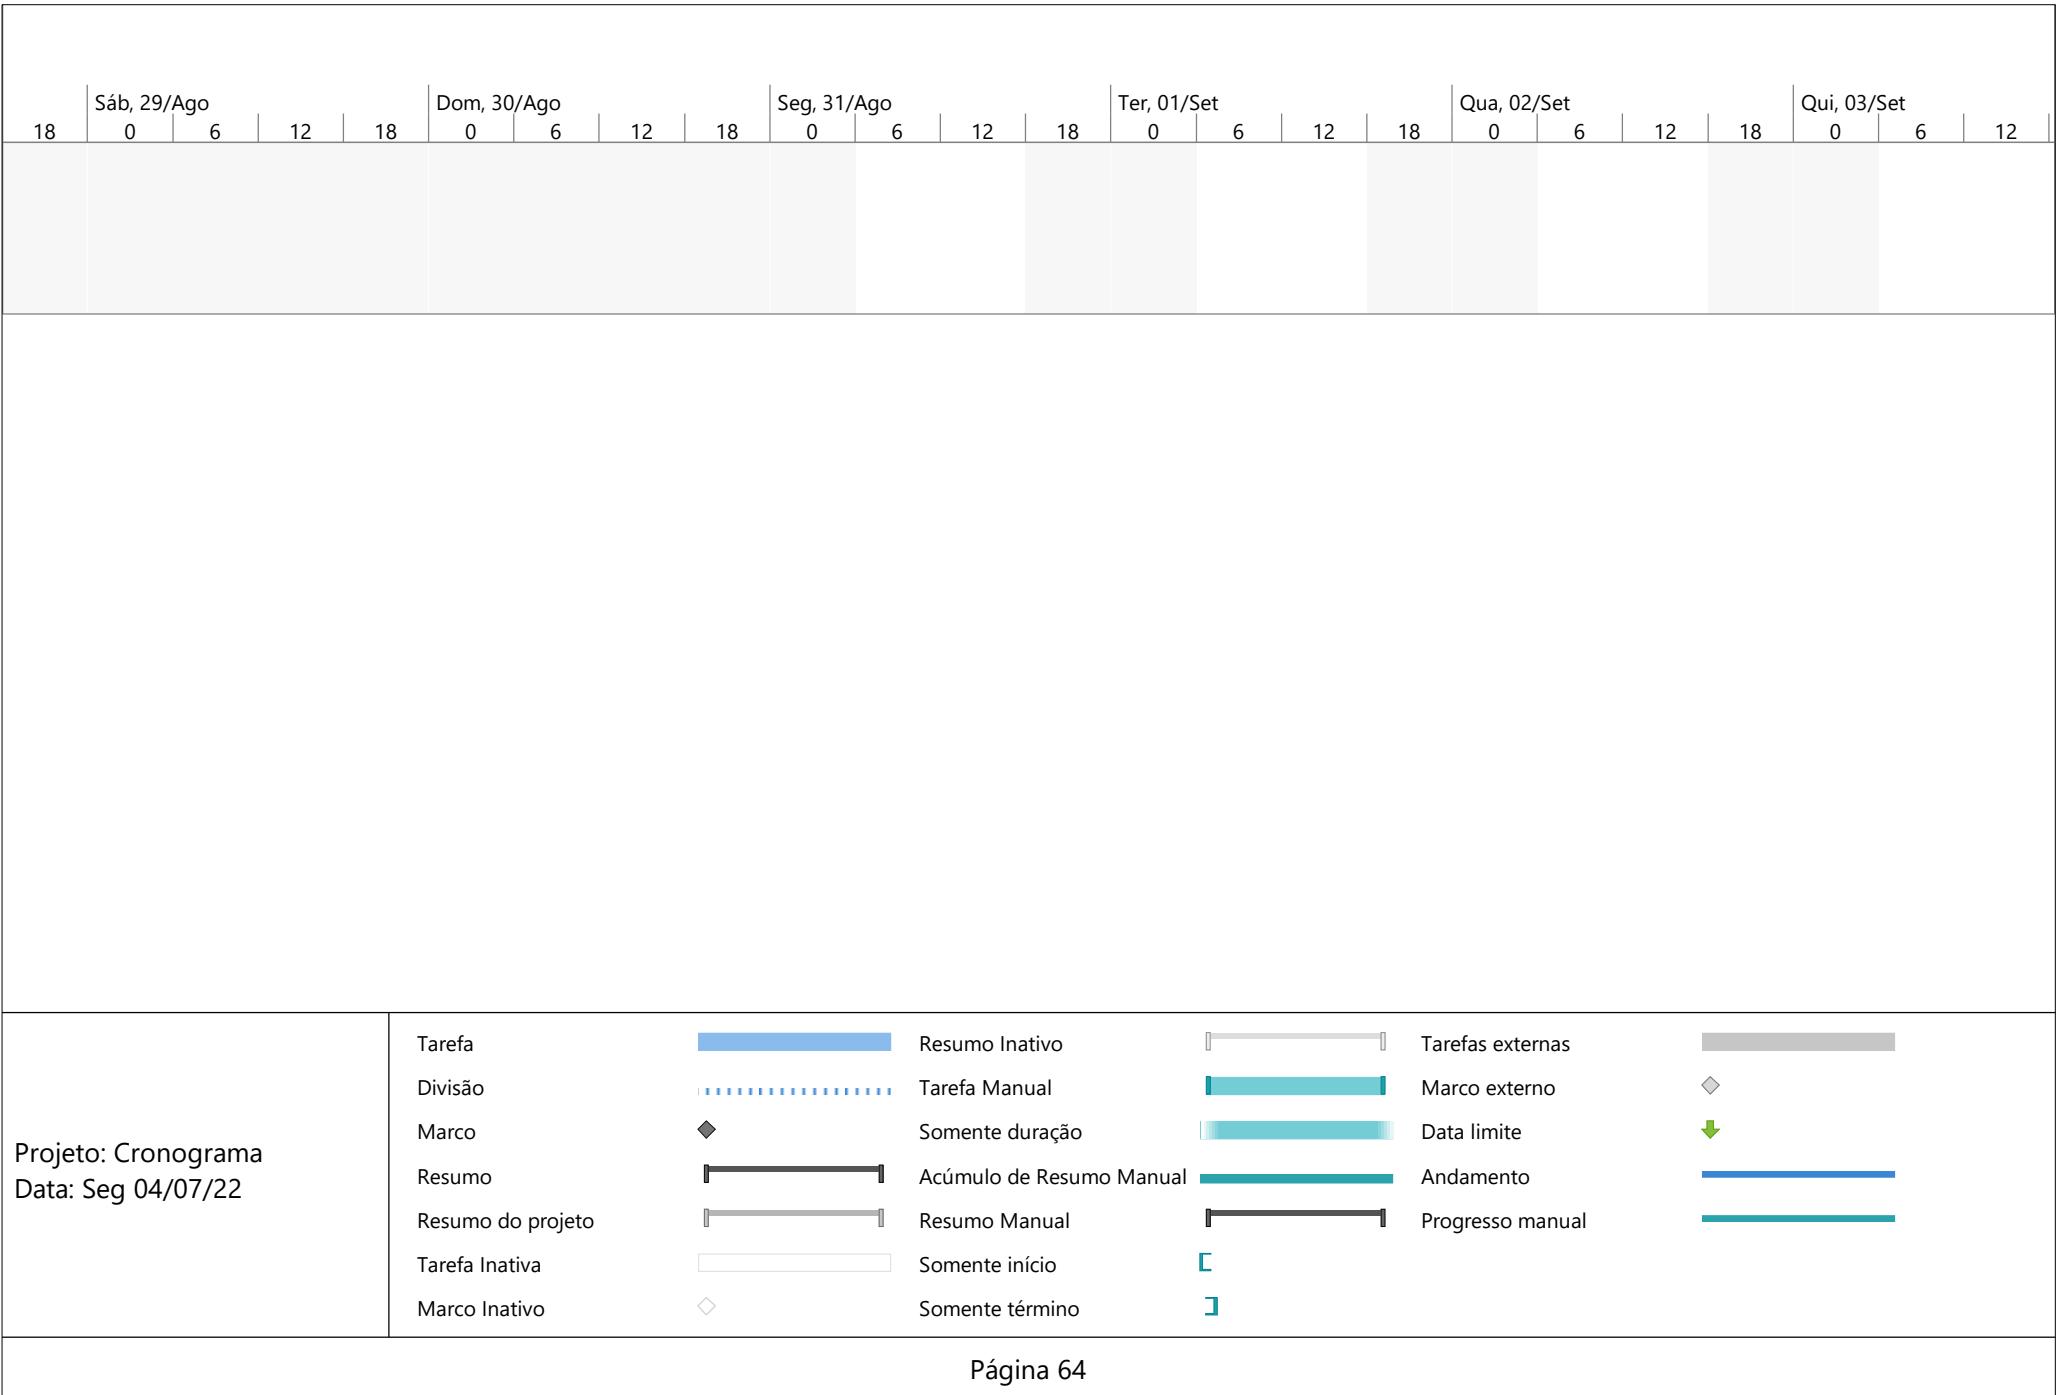


18	Sex, 04/Set	0	6	12	18	Sáb, 05/Set	0	6	12	18	Dom, 06/Set	0	6	12	18	Seg, 07/Set	0	6	12	18	Ter, 08/Set	0	6	12	18	Qua, 09/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22




18	Sex, 04/Set	0	6	12	18	Sáb, 05/Set	0	6	12	18	Dom, 06/Set	0	6	12	18	Seg, 07/Set	0	6	12	18	Ter, 08/Set	0	6	12	18	Qua, 09/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22



18	Sex, 04/Set	0	6	12	18	Sáb, 05/Set	0	6	12	18	Dom, 06/Set	0	6	12	18	Seg, 07/Set	0	6	12	18	Ter, 08/Set	0	6	12	18	Qua, 09/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22







Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18	Qui, 10/Set	0	6	12	18	Sex, 11/Set	0	6	12	18	Sáb, 12/Set	0	6	12	18	Dom, 13/Set	0	6	12	18	Seg, 14/Set	0	6	12	18	Ter, 15/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

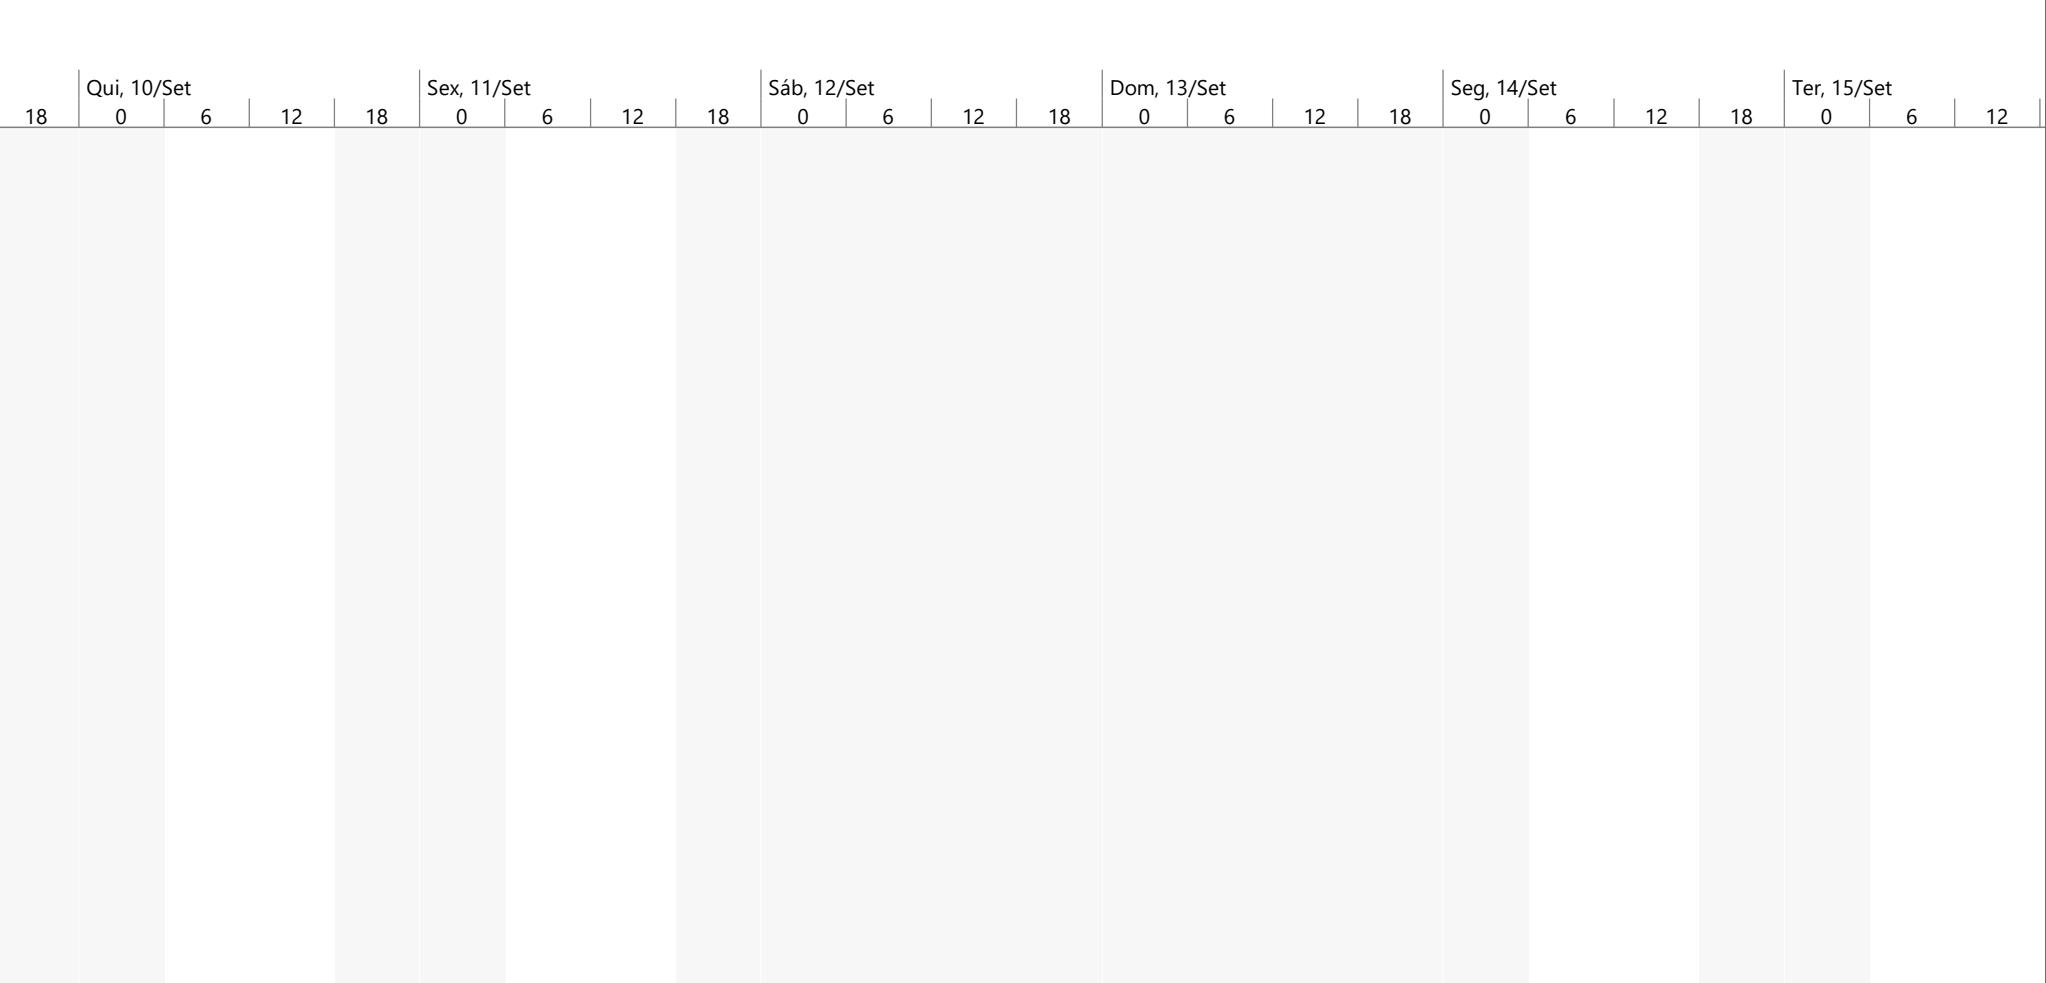

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

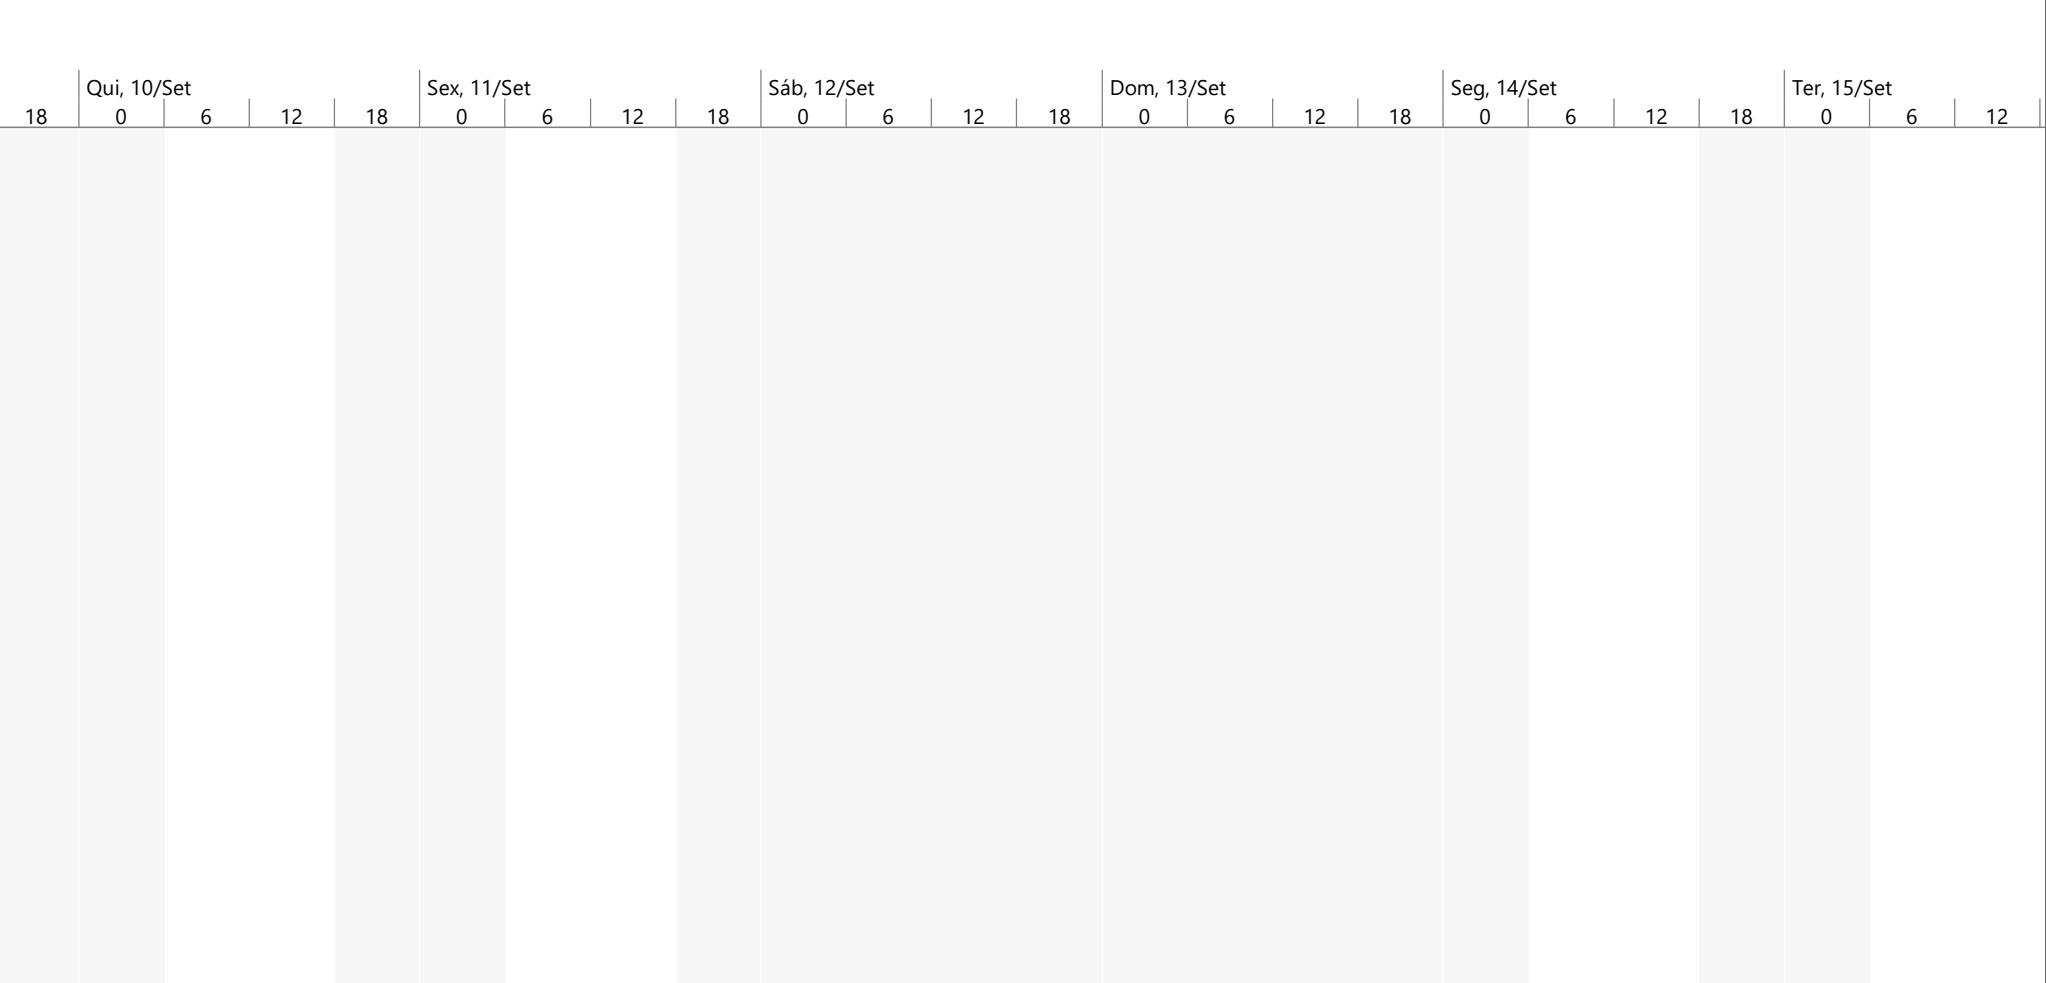

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

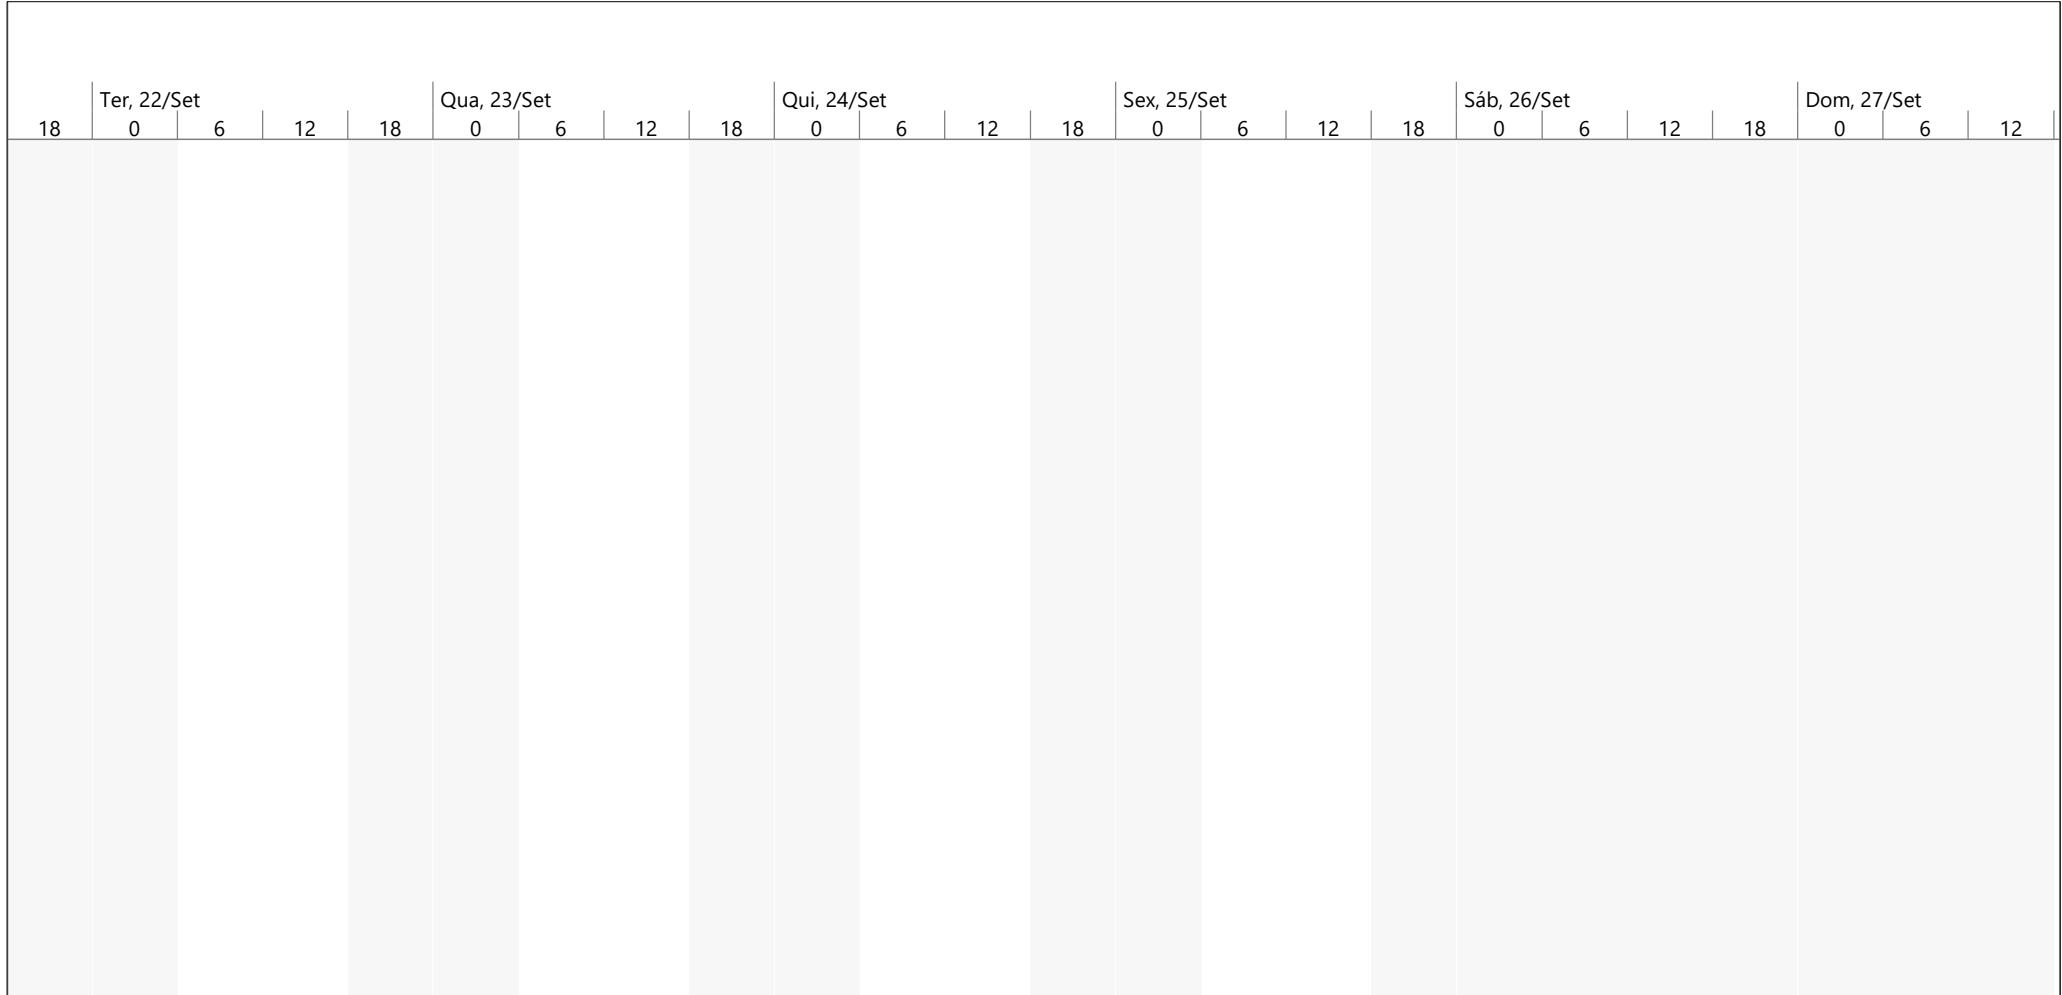


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

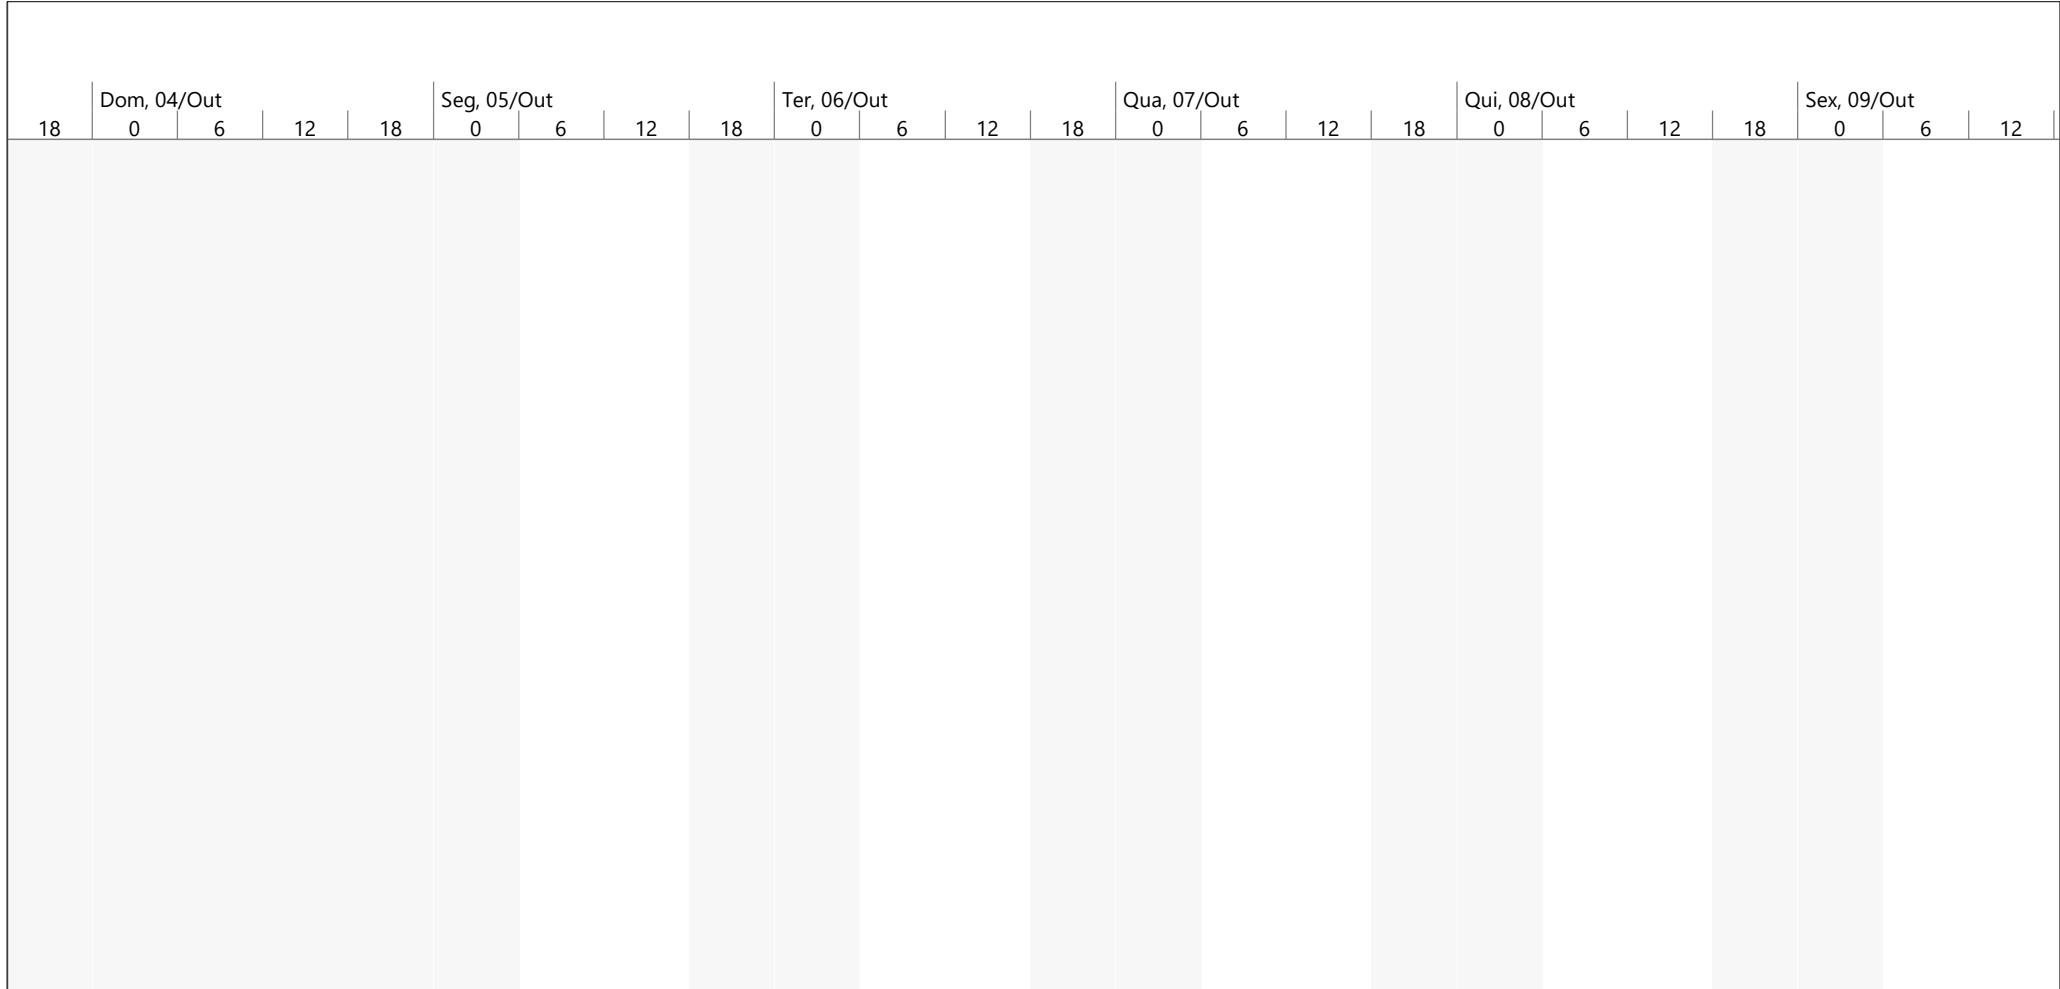


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

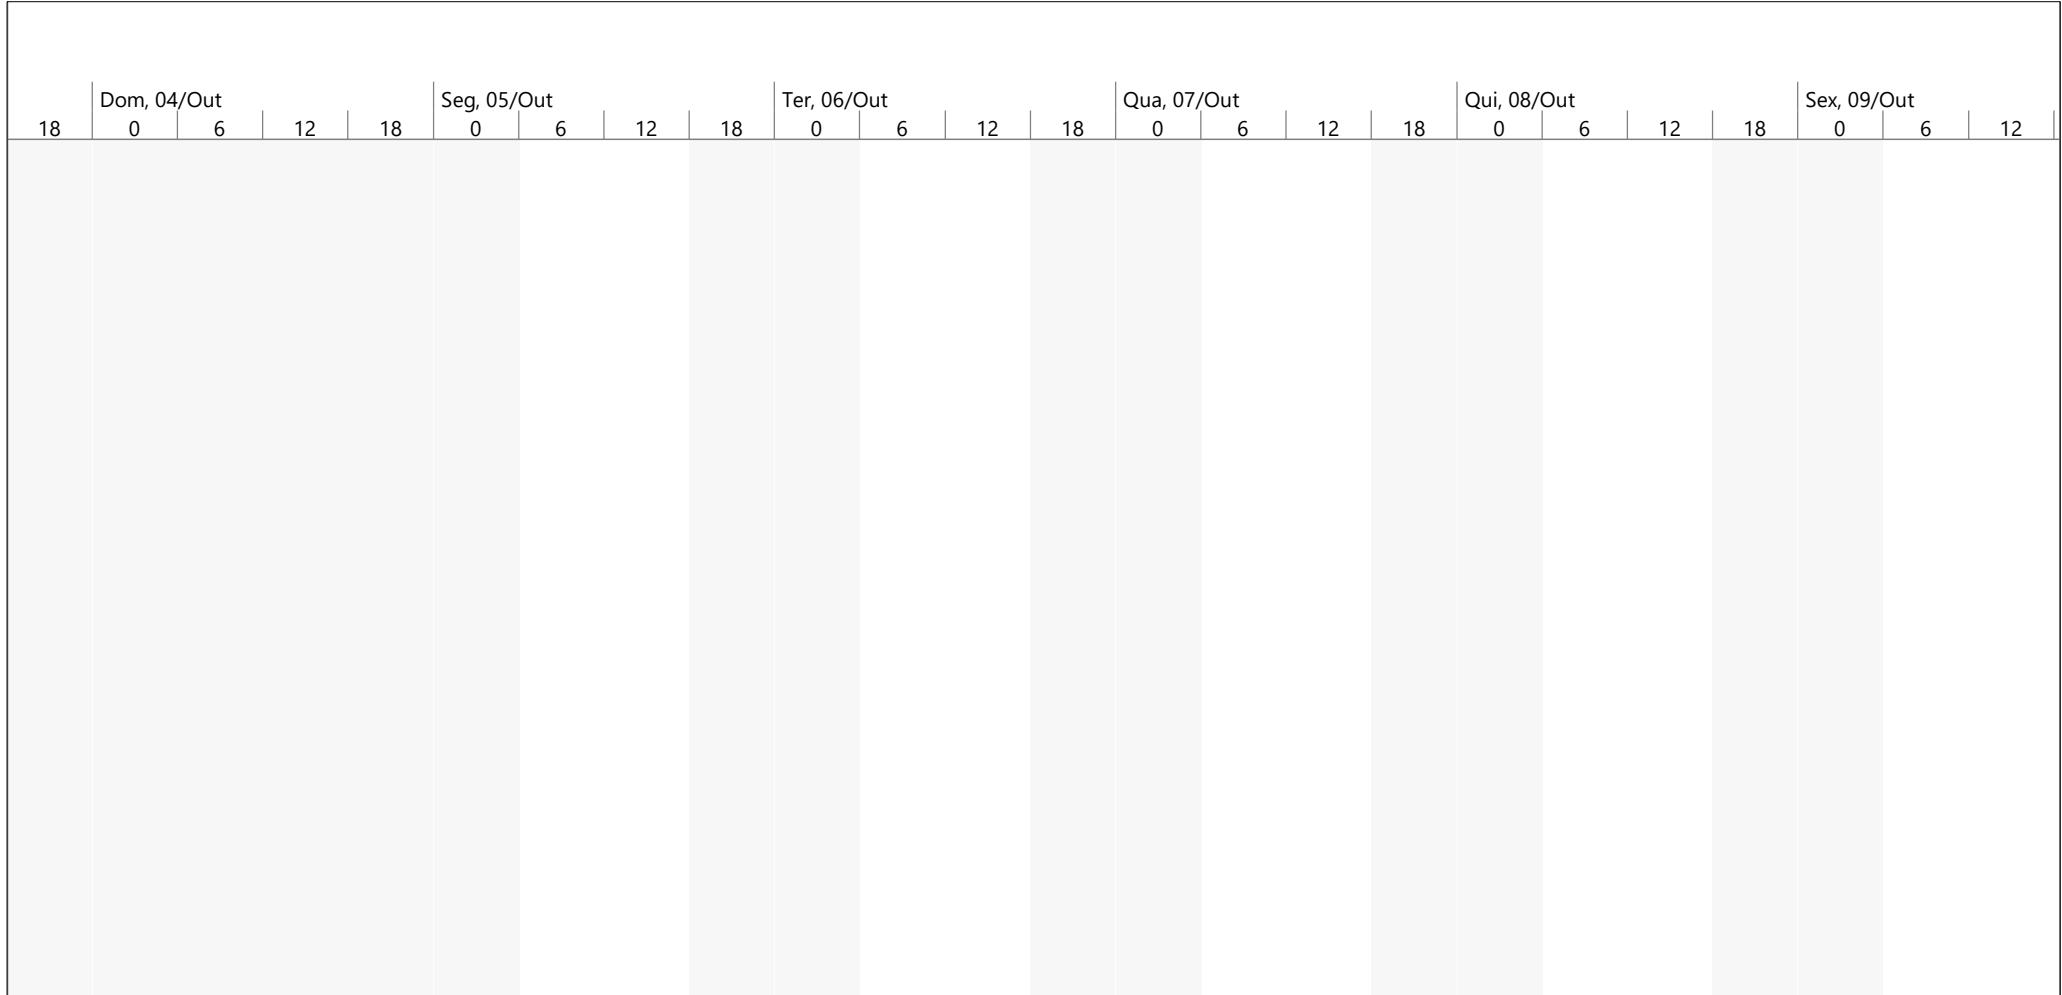

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

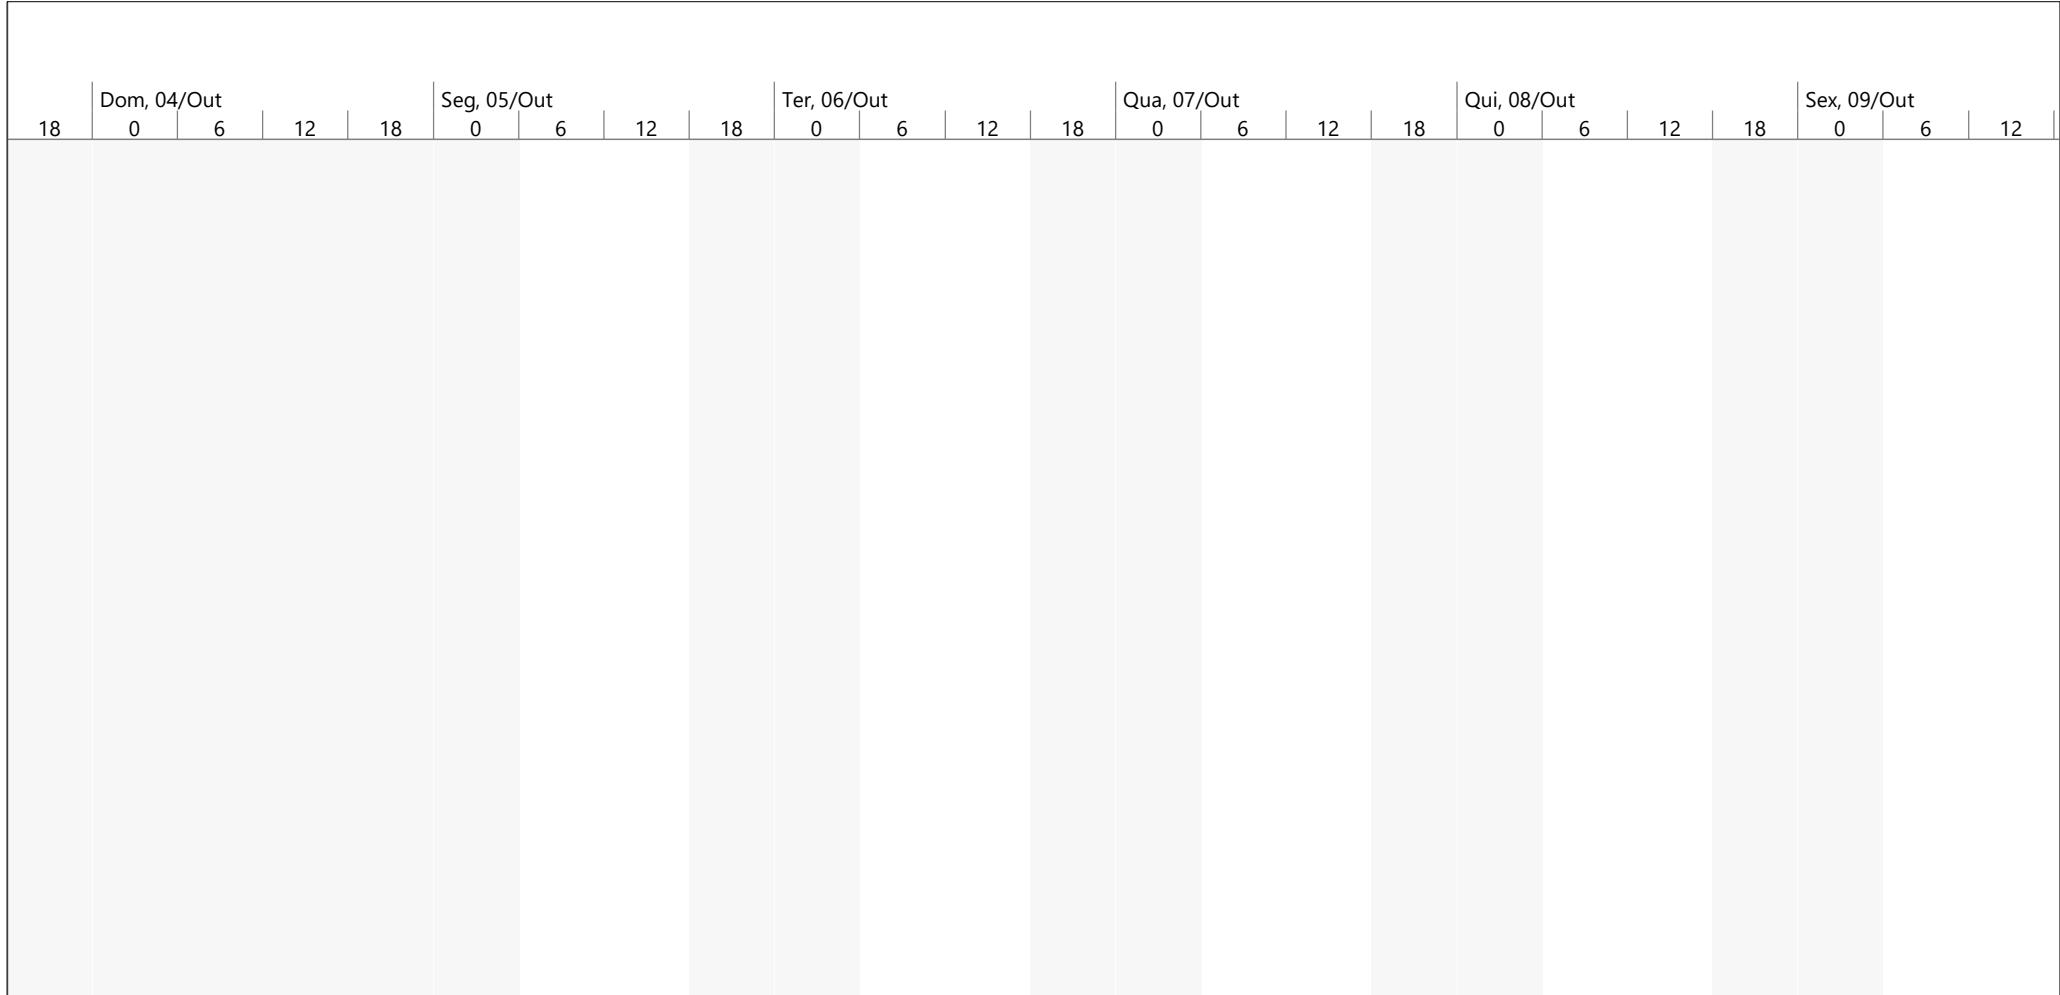

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

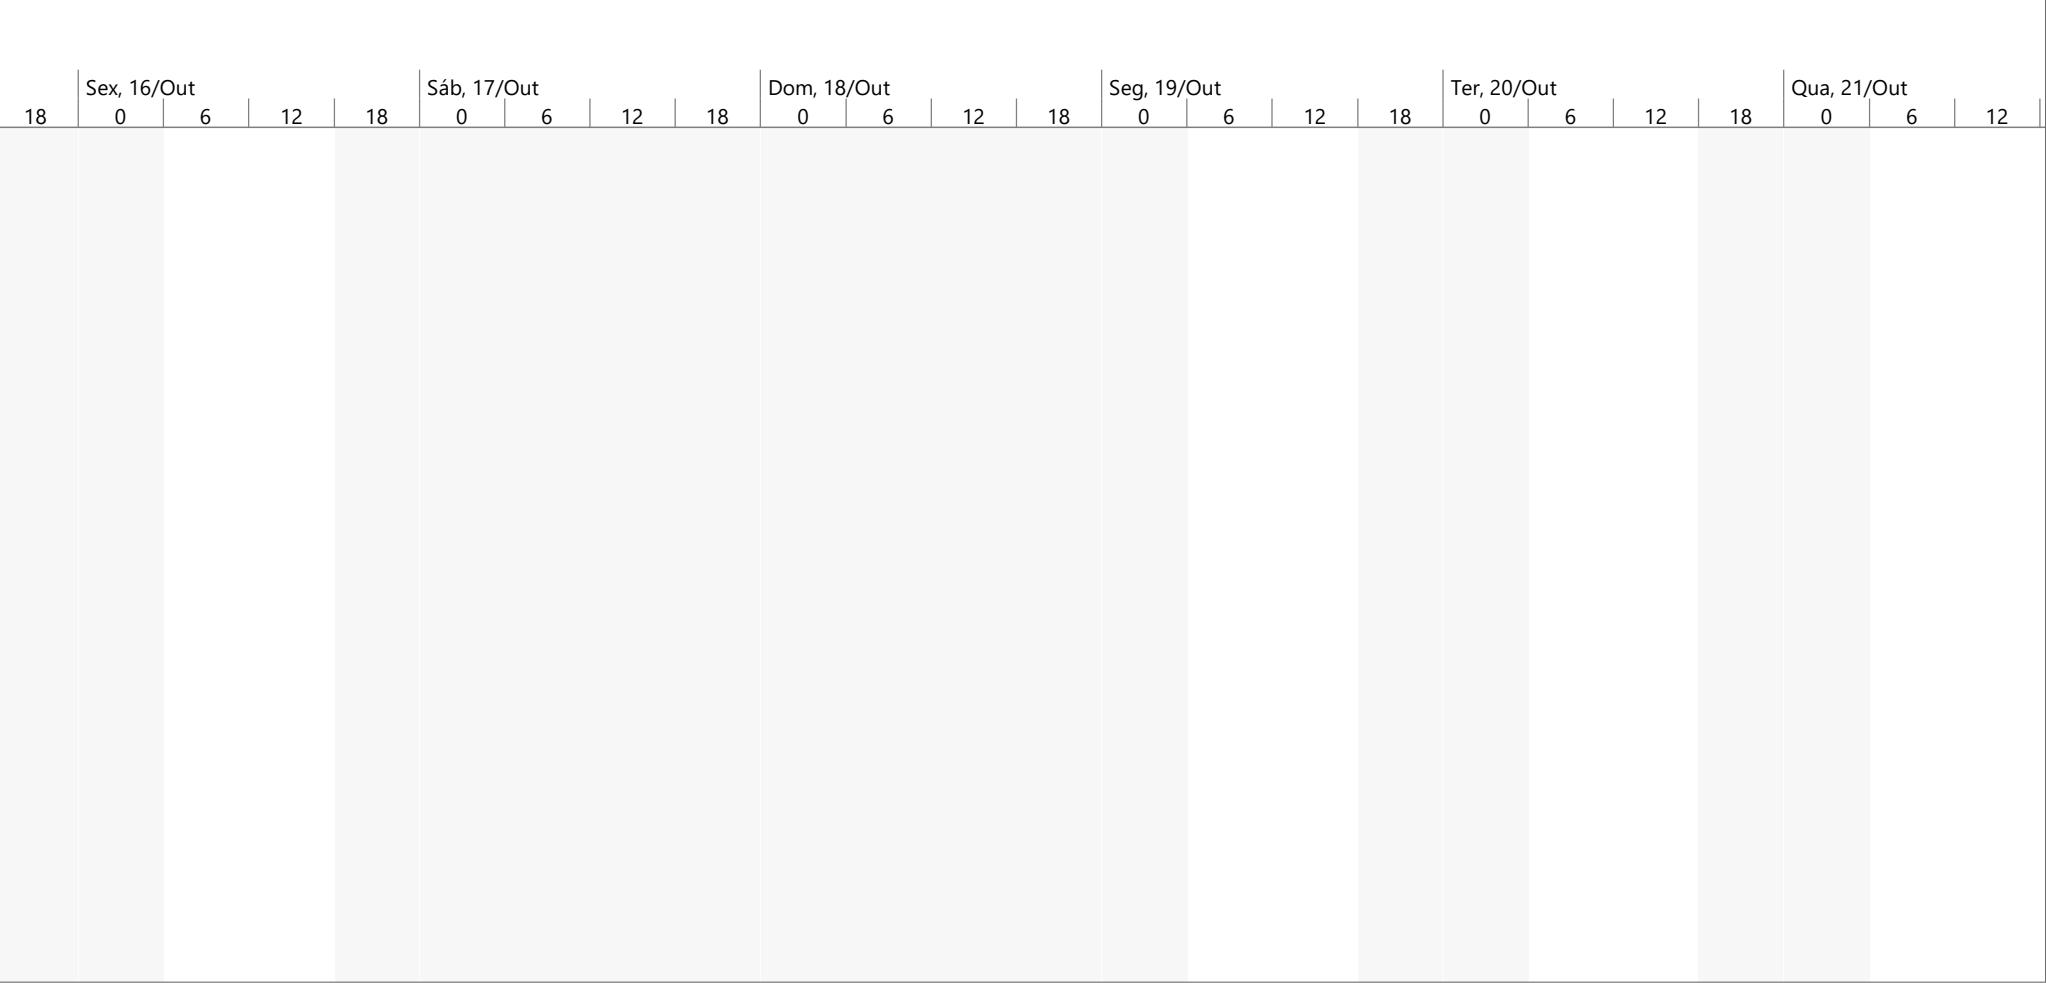



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

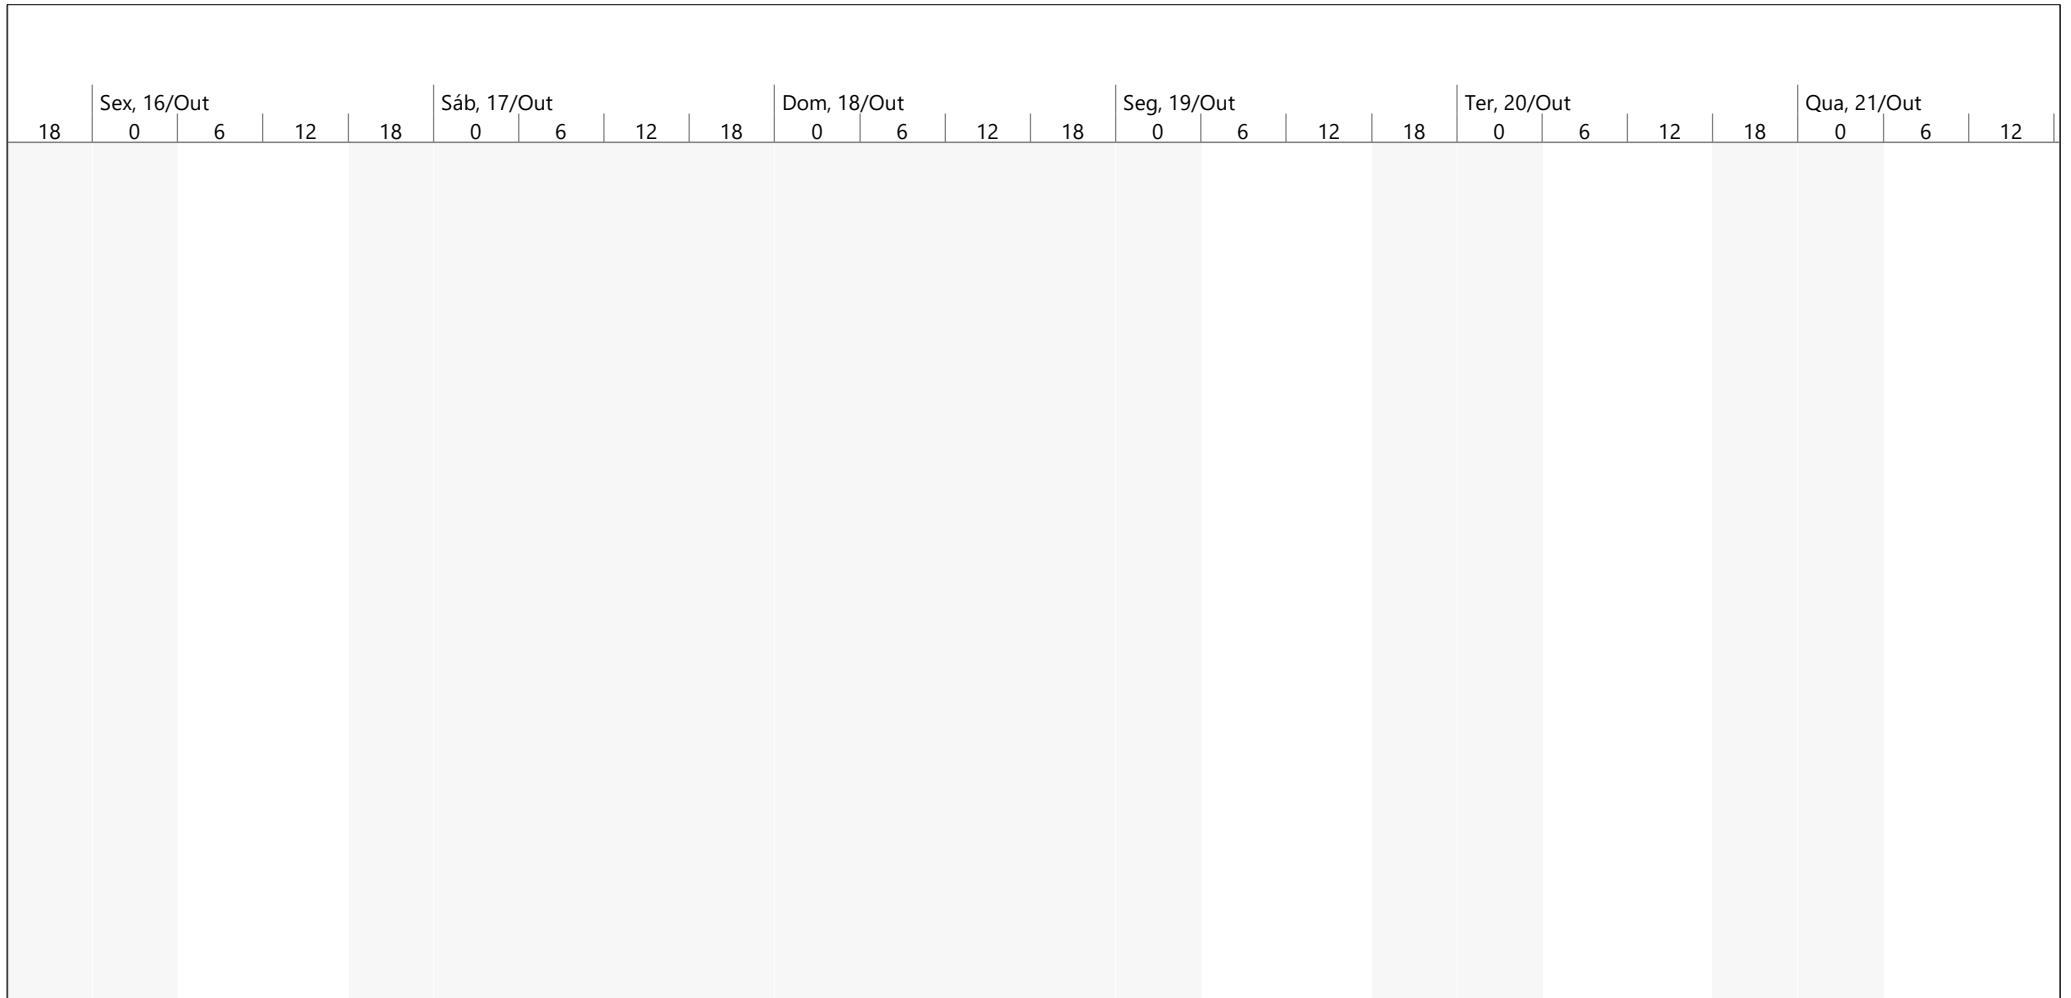


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

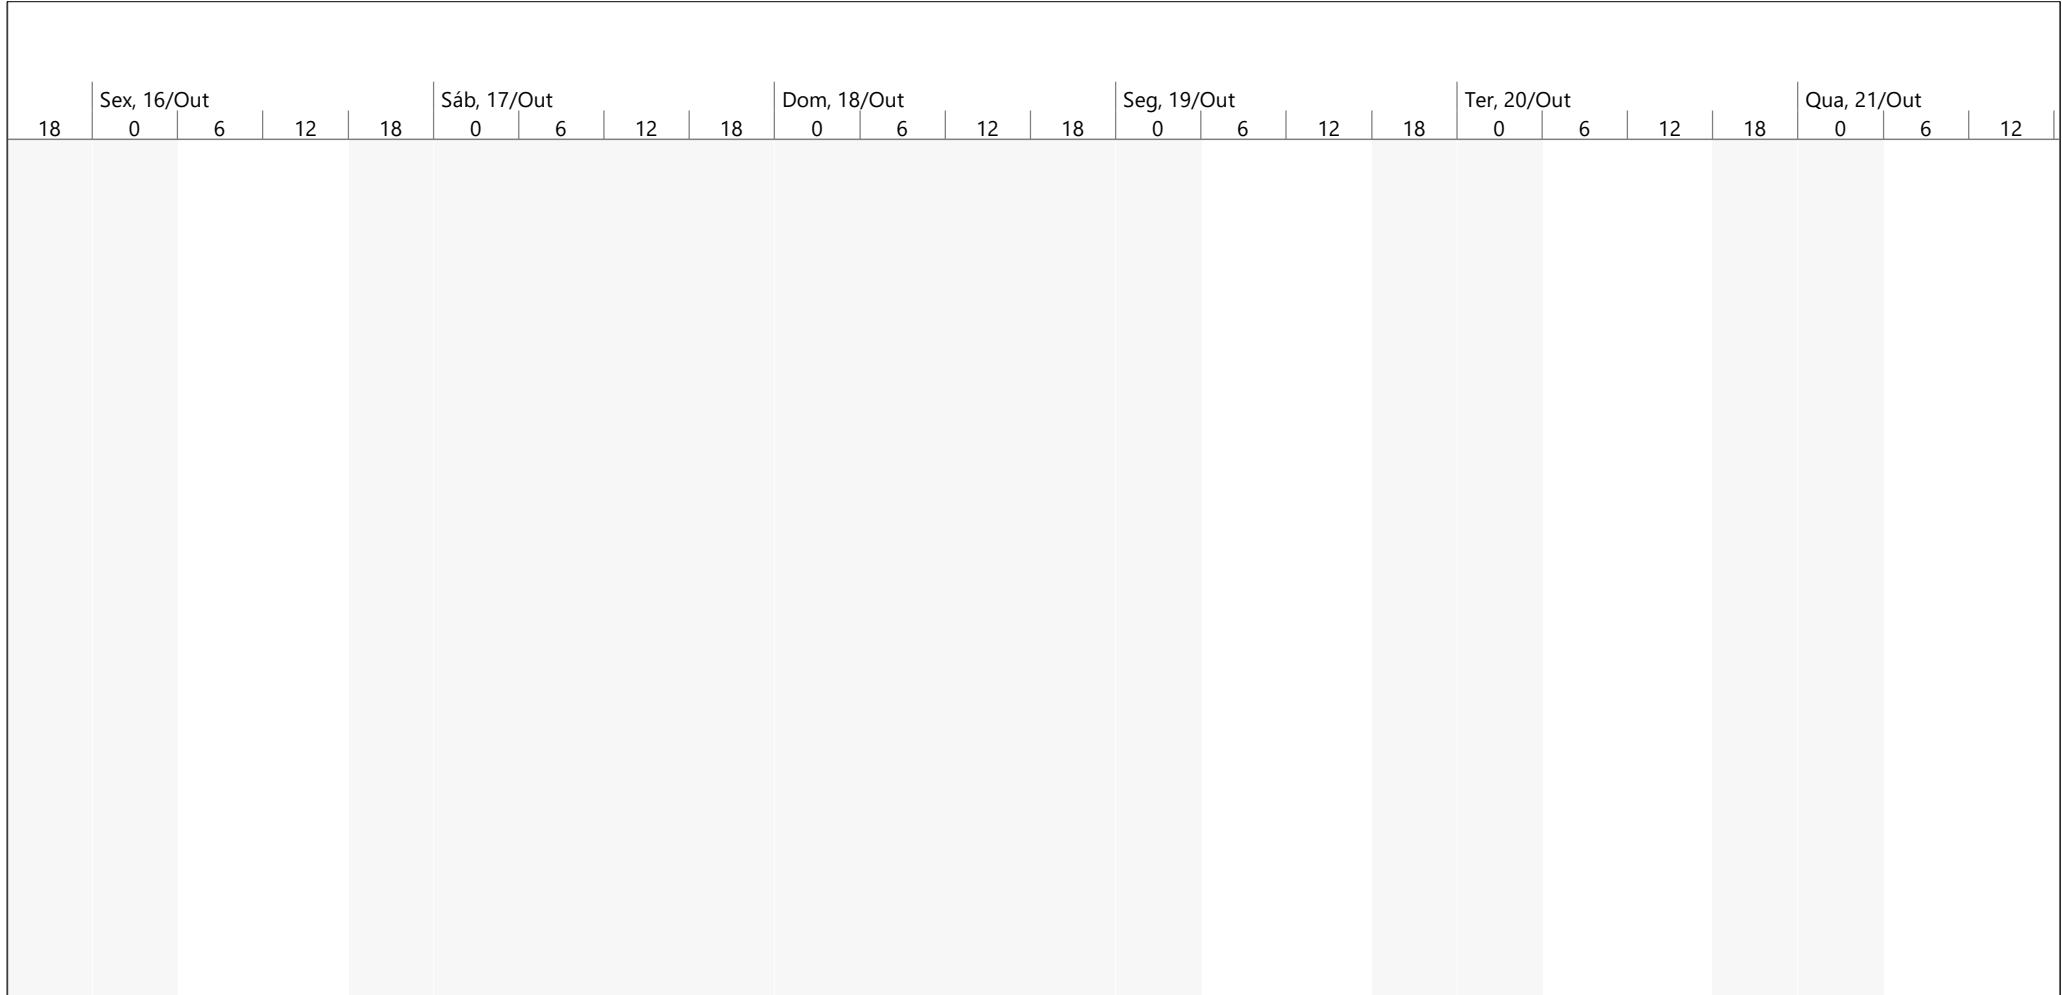


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



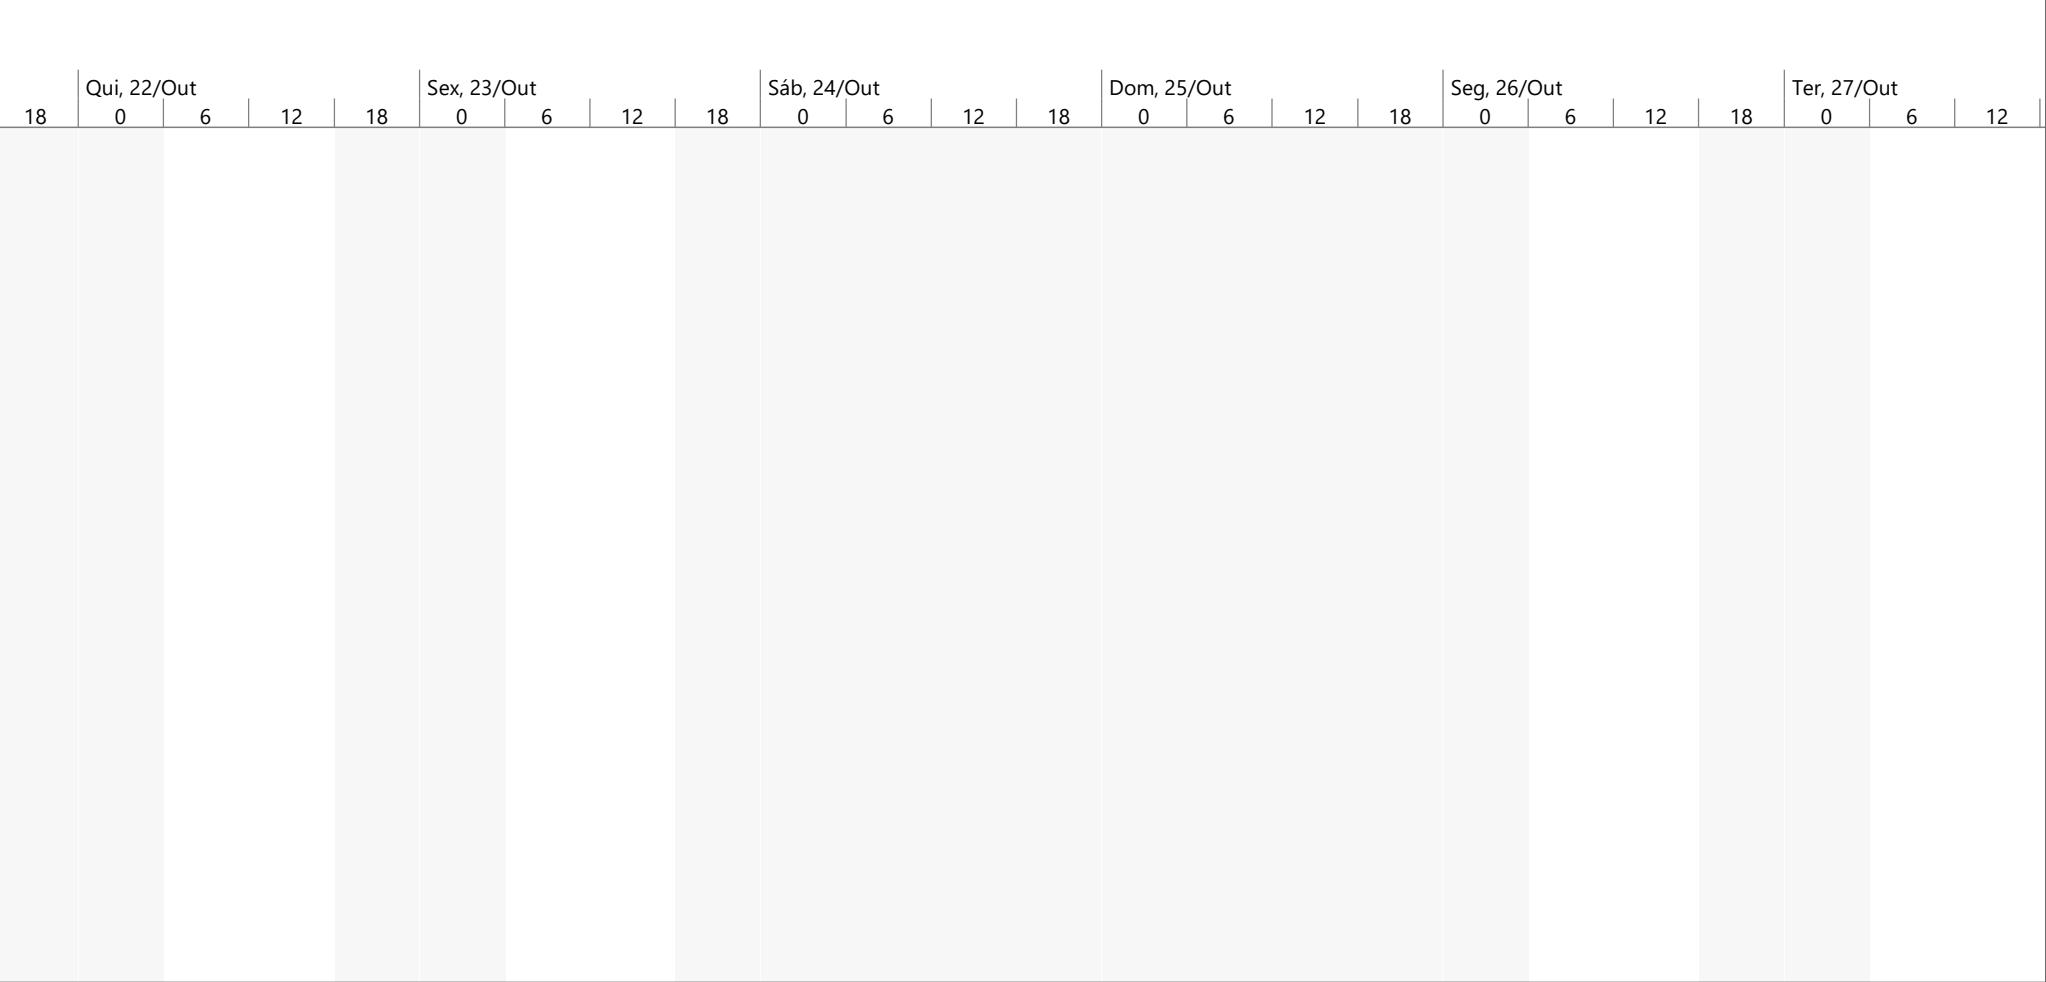


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

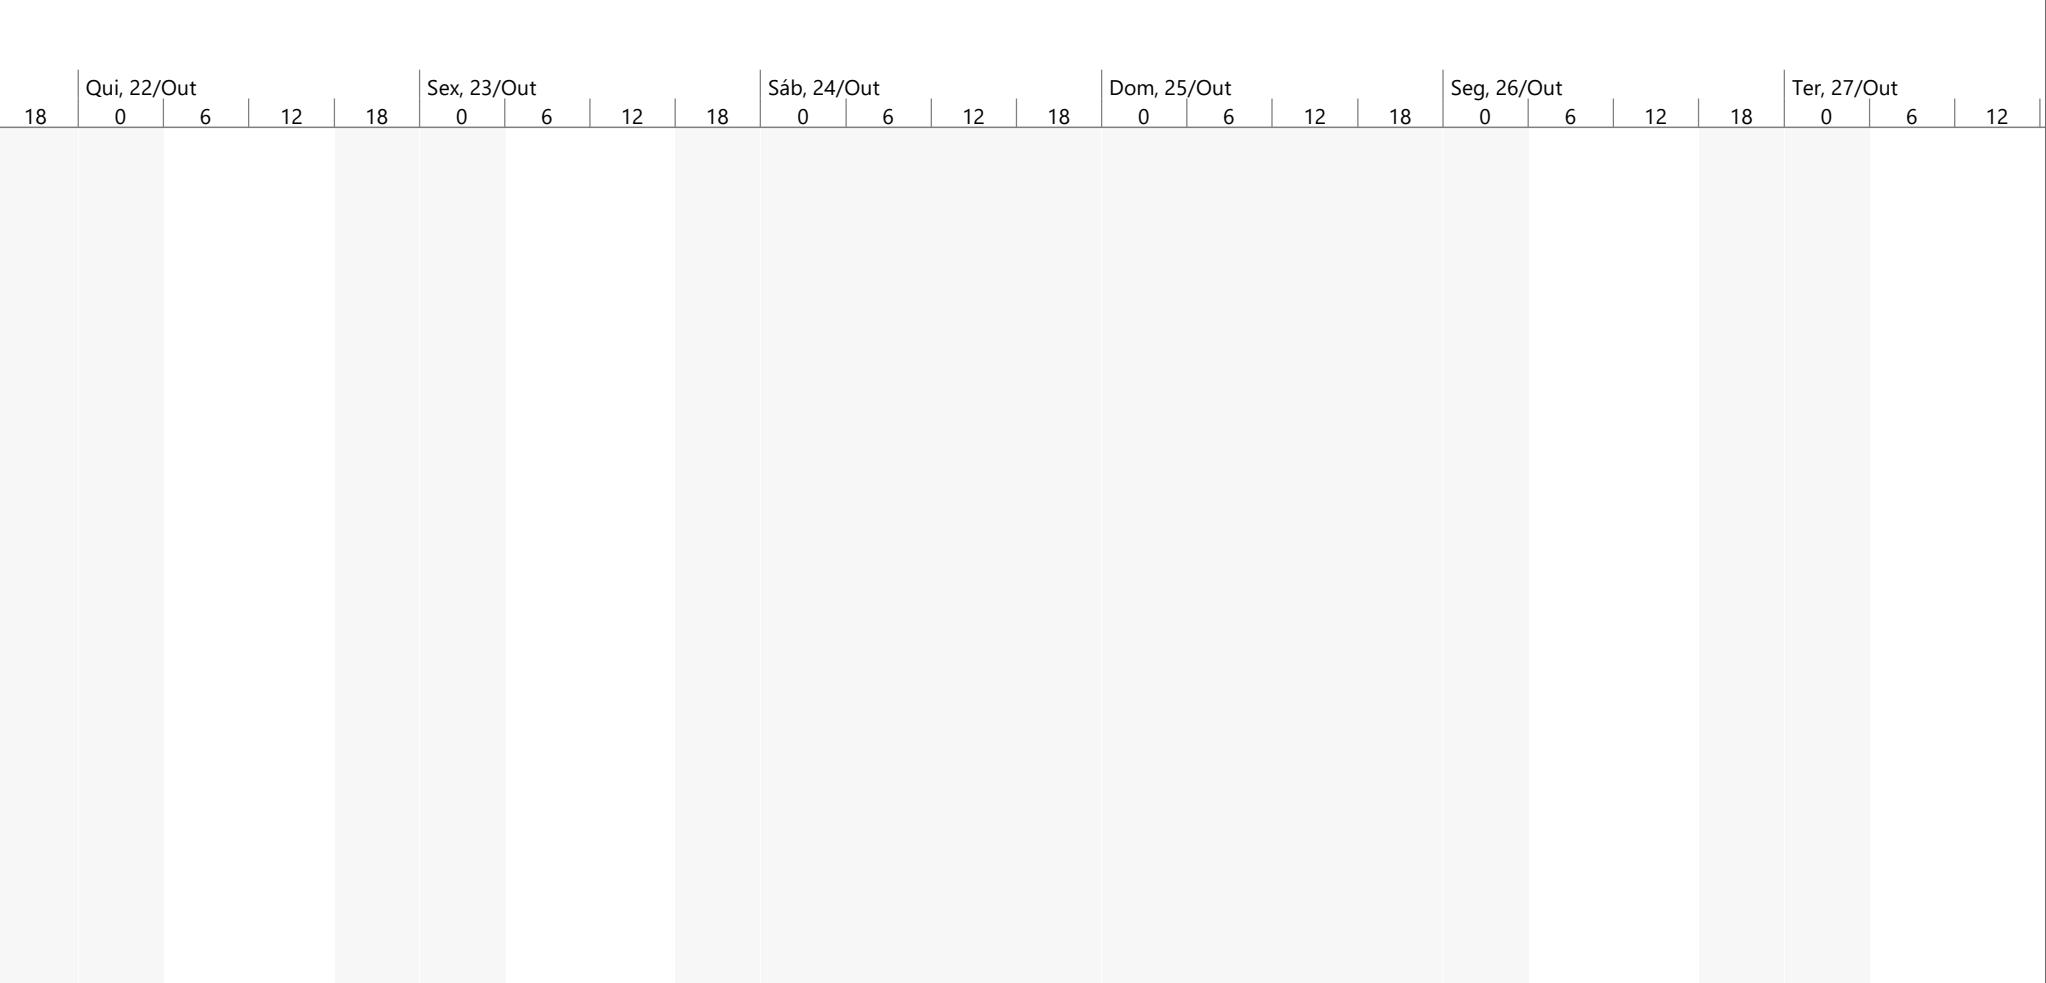

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

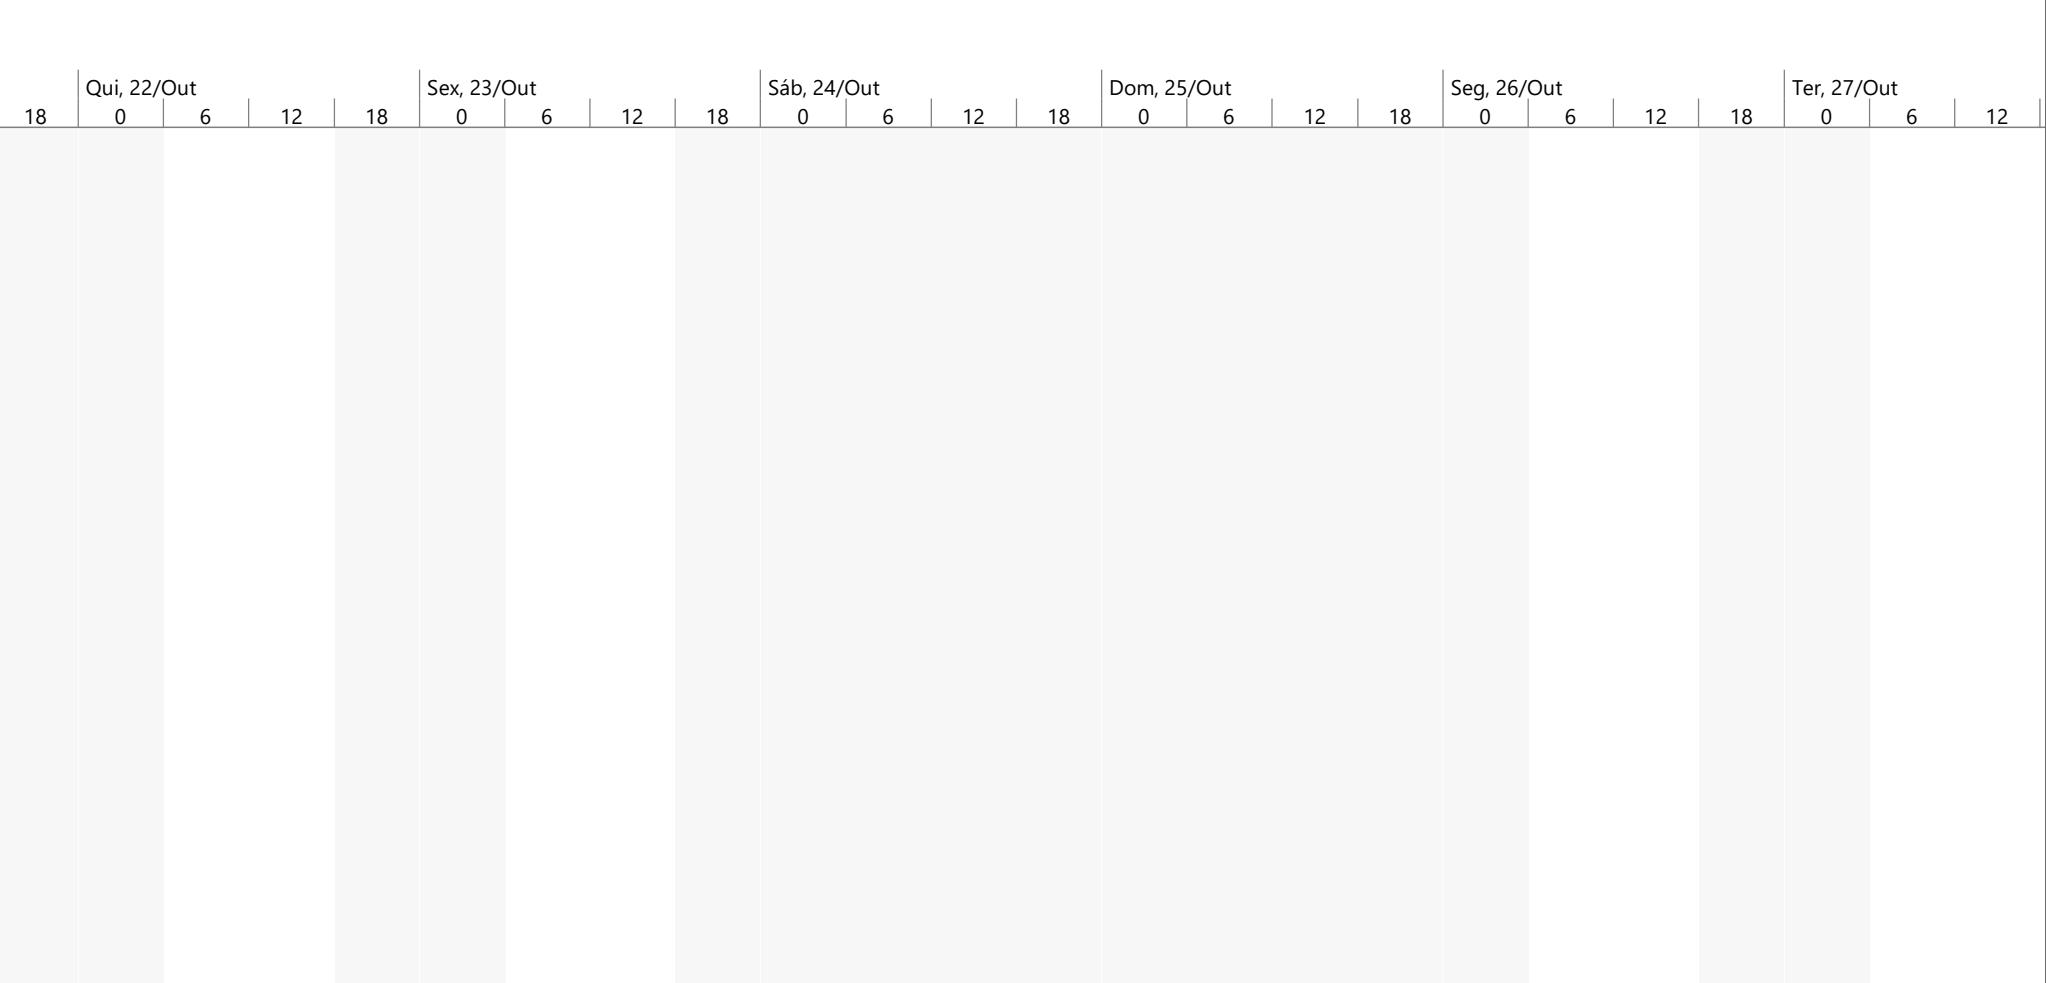

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

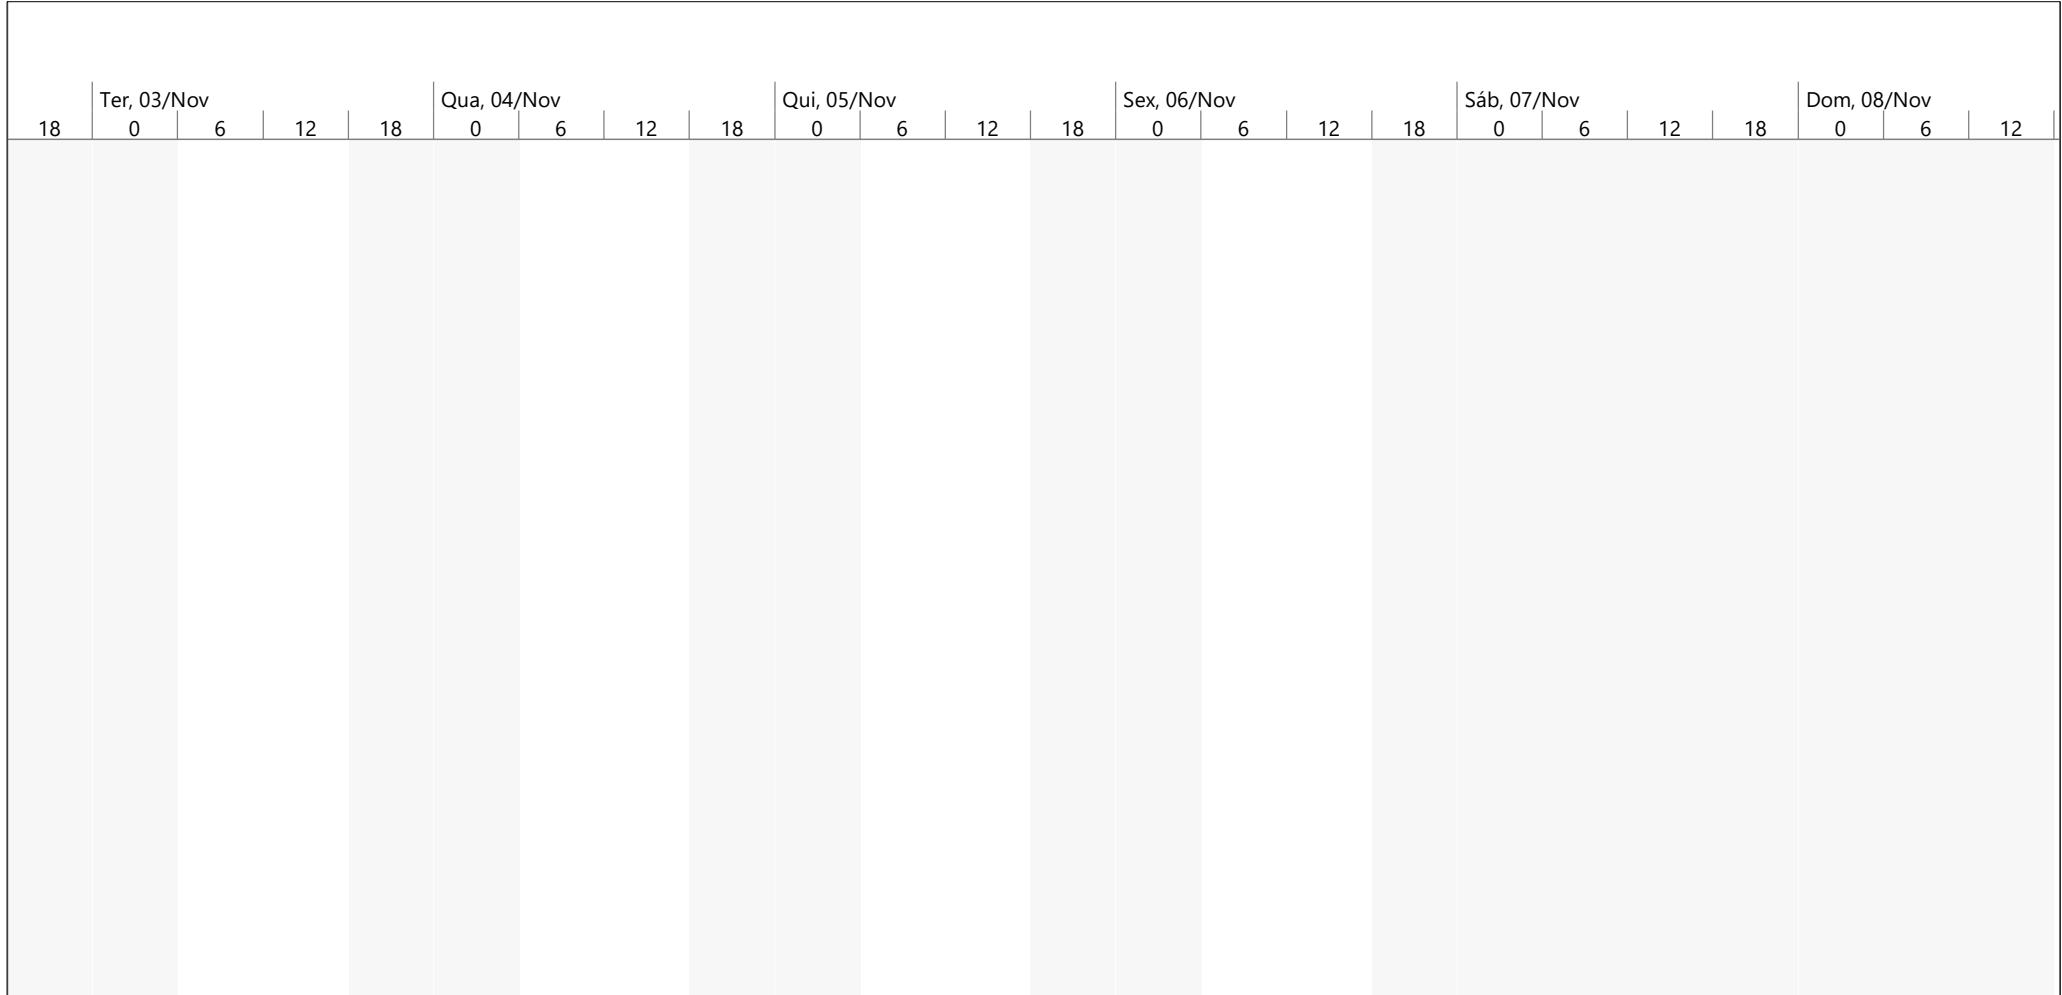


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

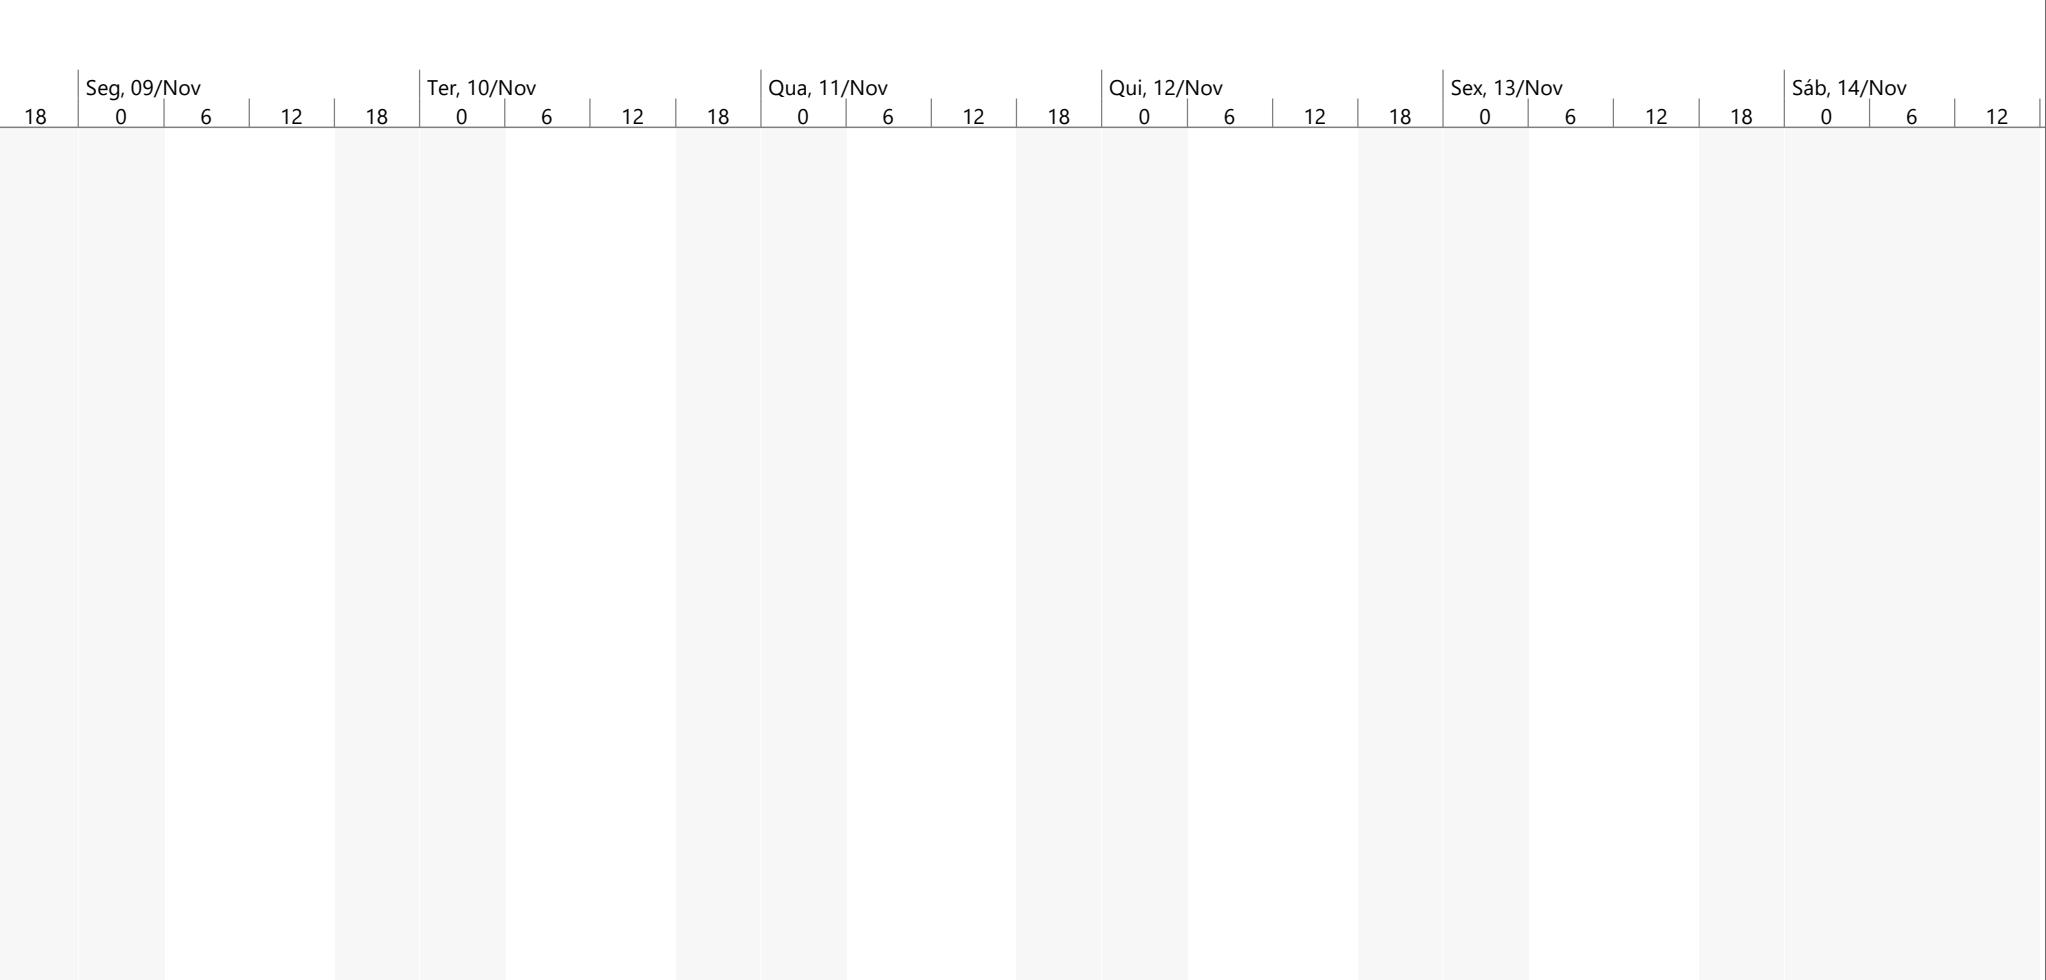


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22







Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

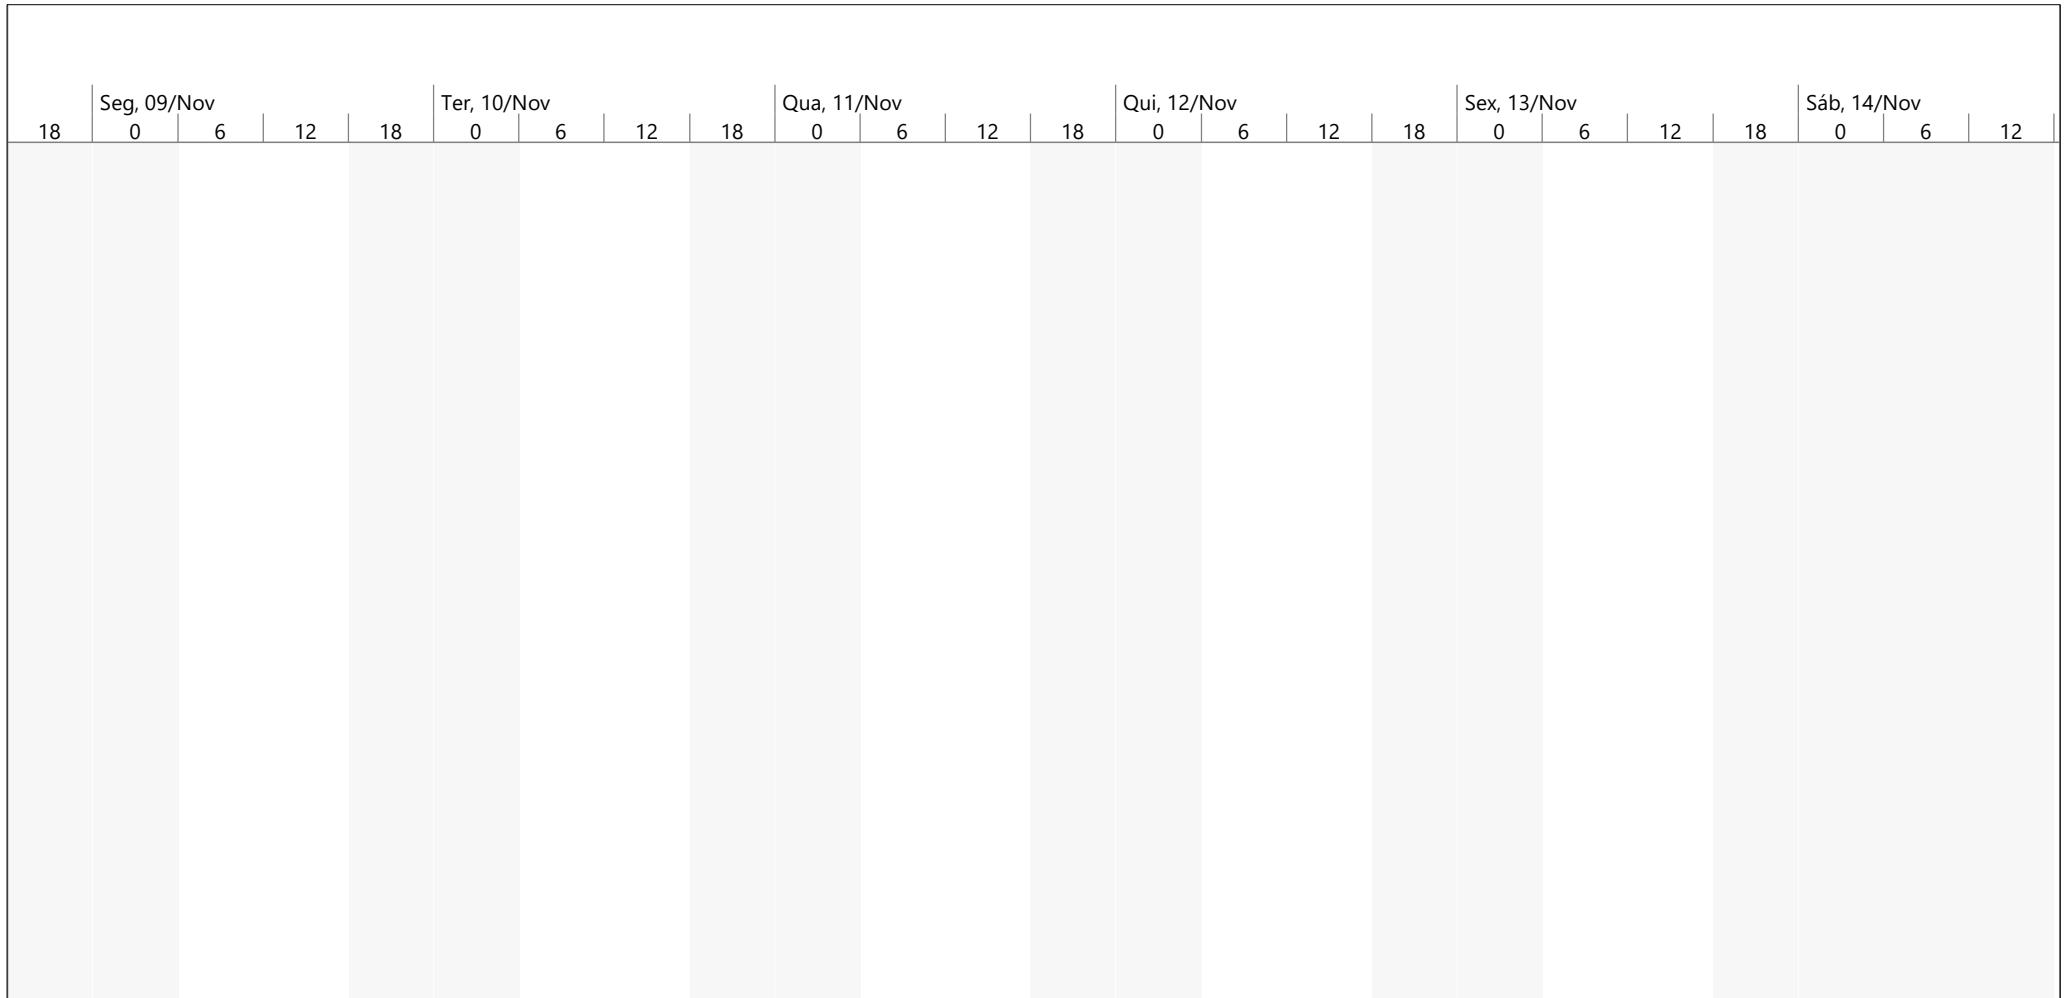


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

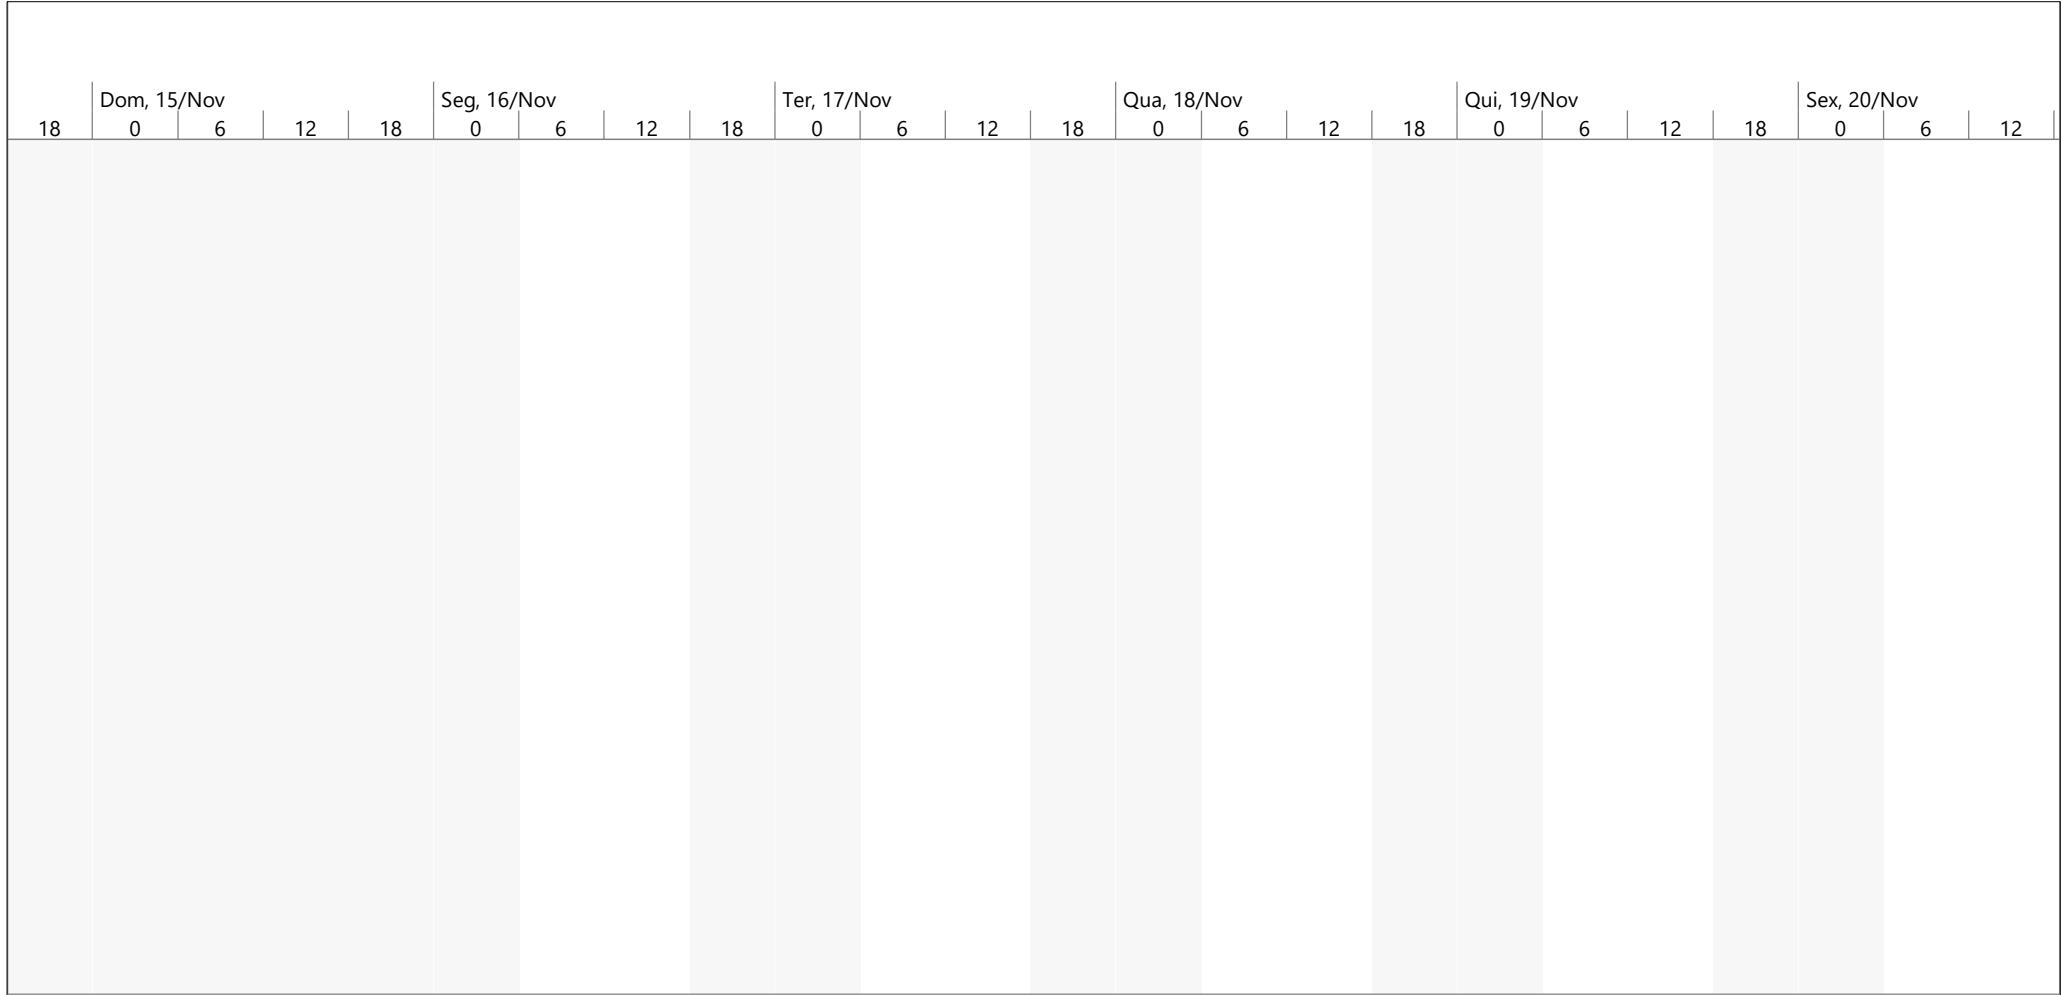

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

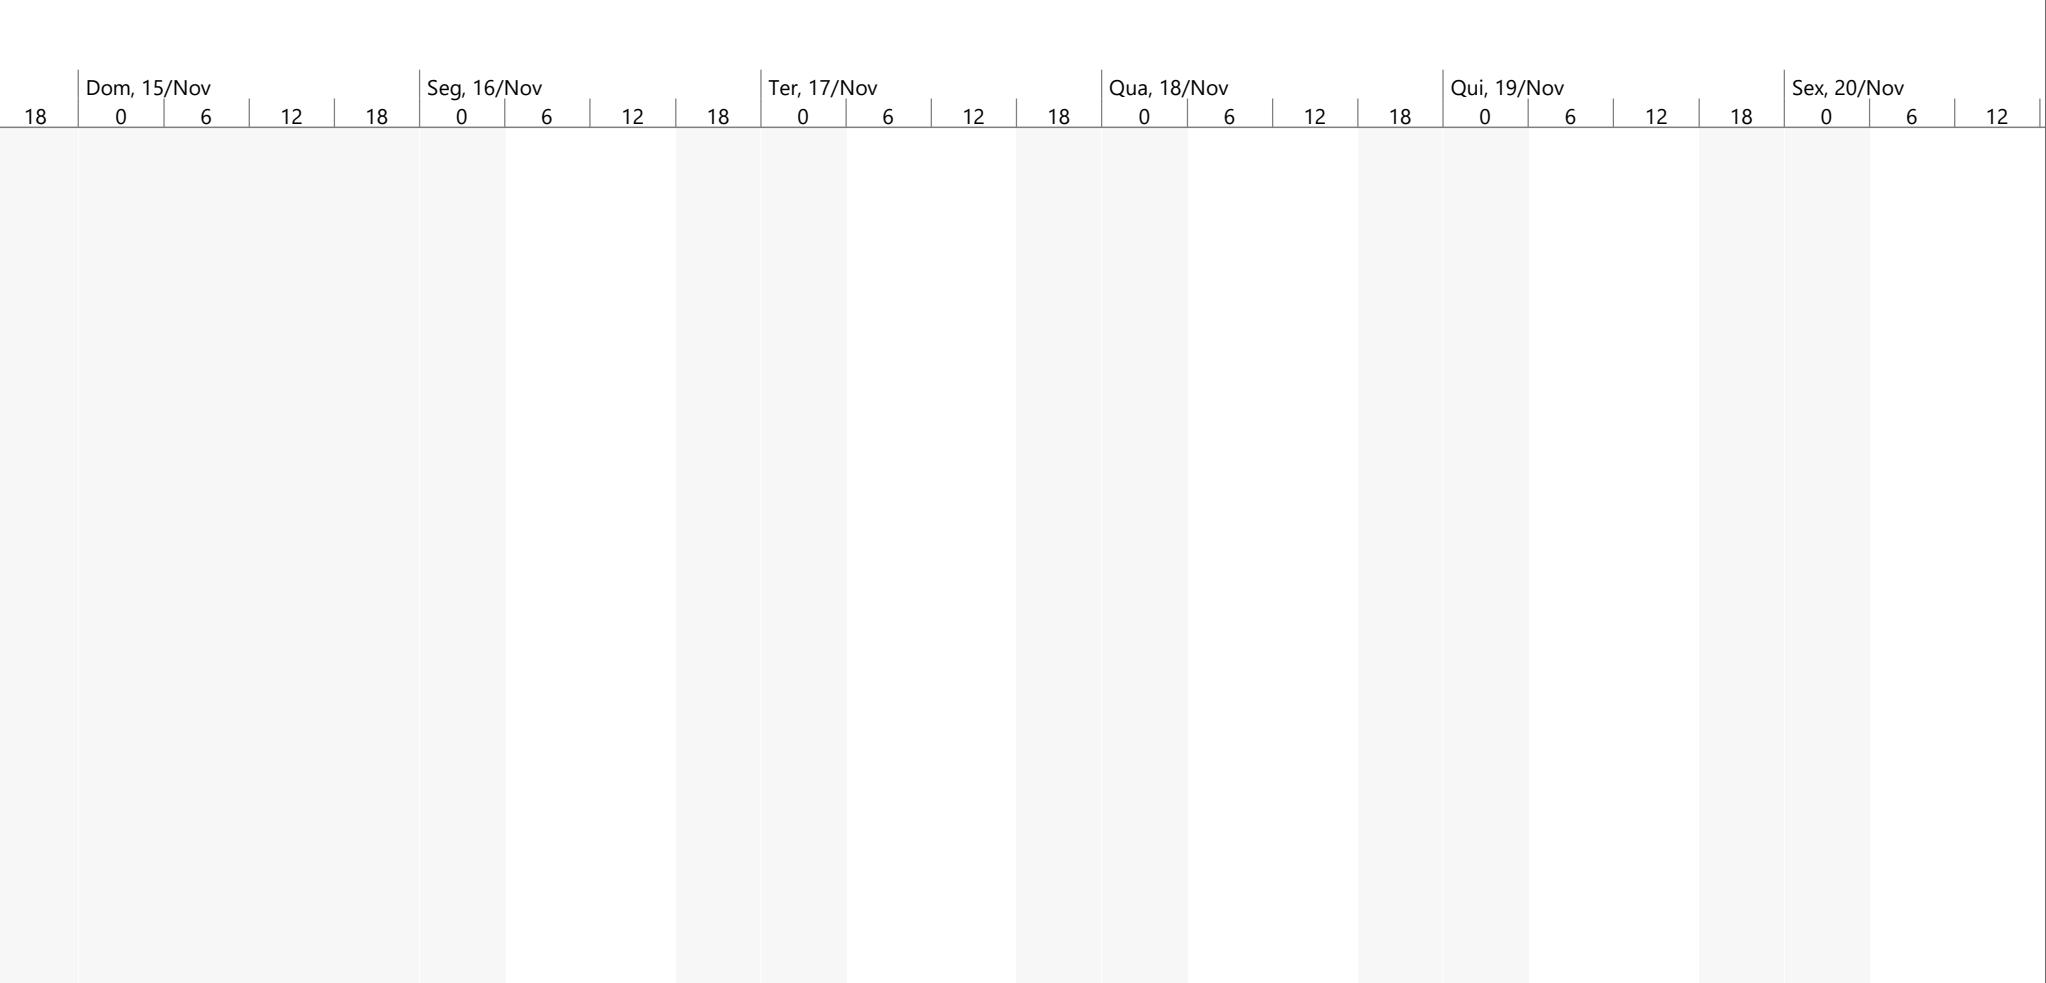

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa Resumo Inativo Tarefas externas

Divisão Tarefa Manual Marco externo


Marco Somente duração Data limite

Resumo Acúmulo de Resumo Manual Andamento


Resumo do projeto Resumo Manual Progresso manual

Tarefa Inativa Somente início


Marco Inativo Somente término

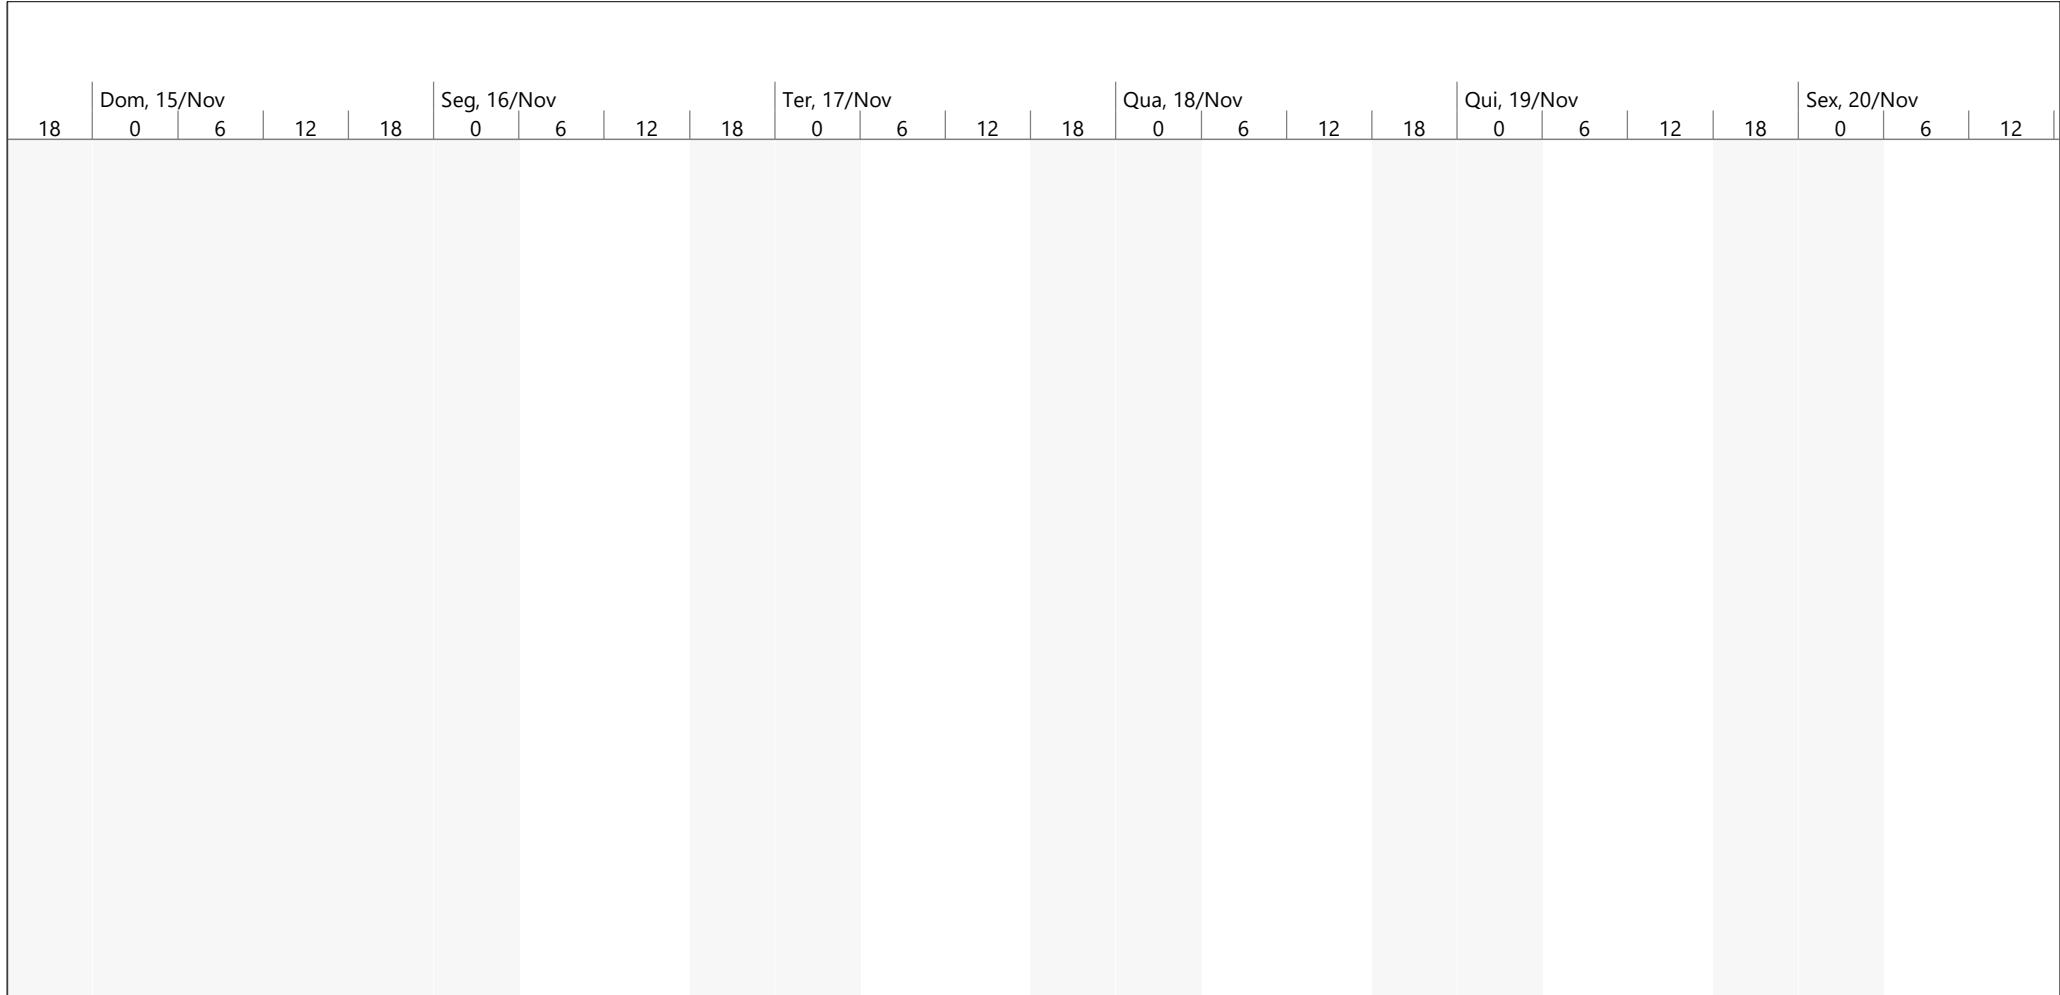


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

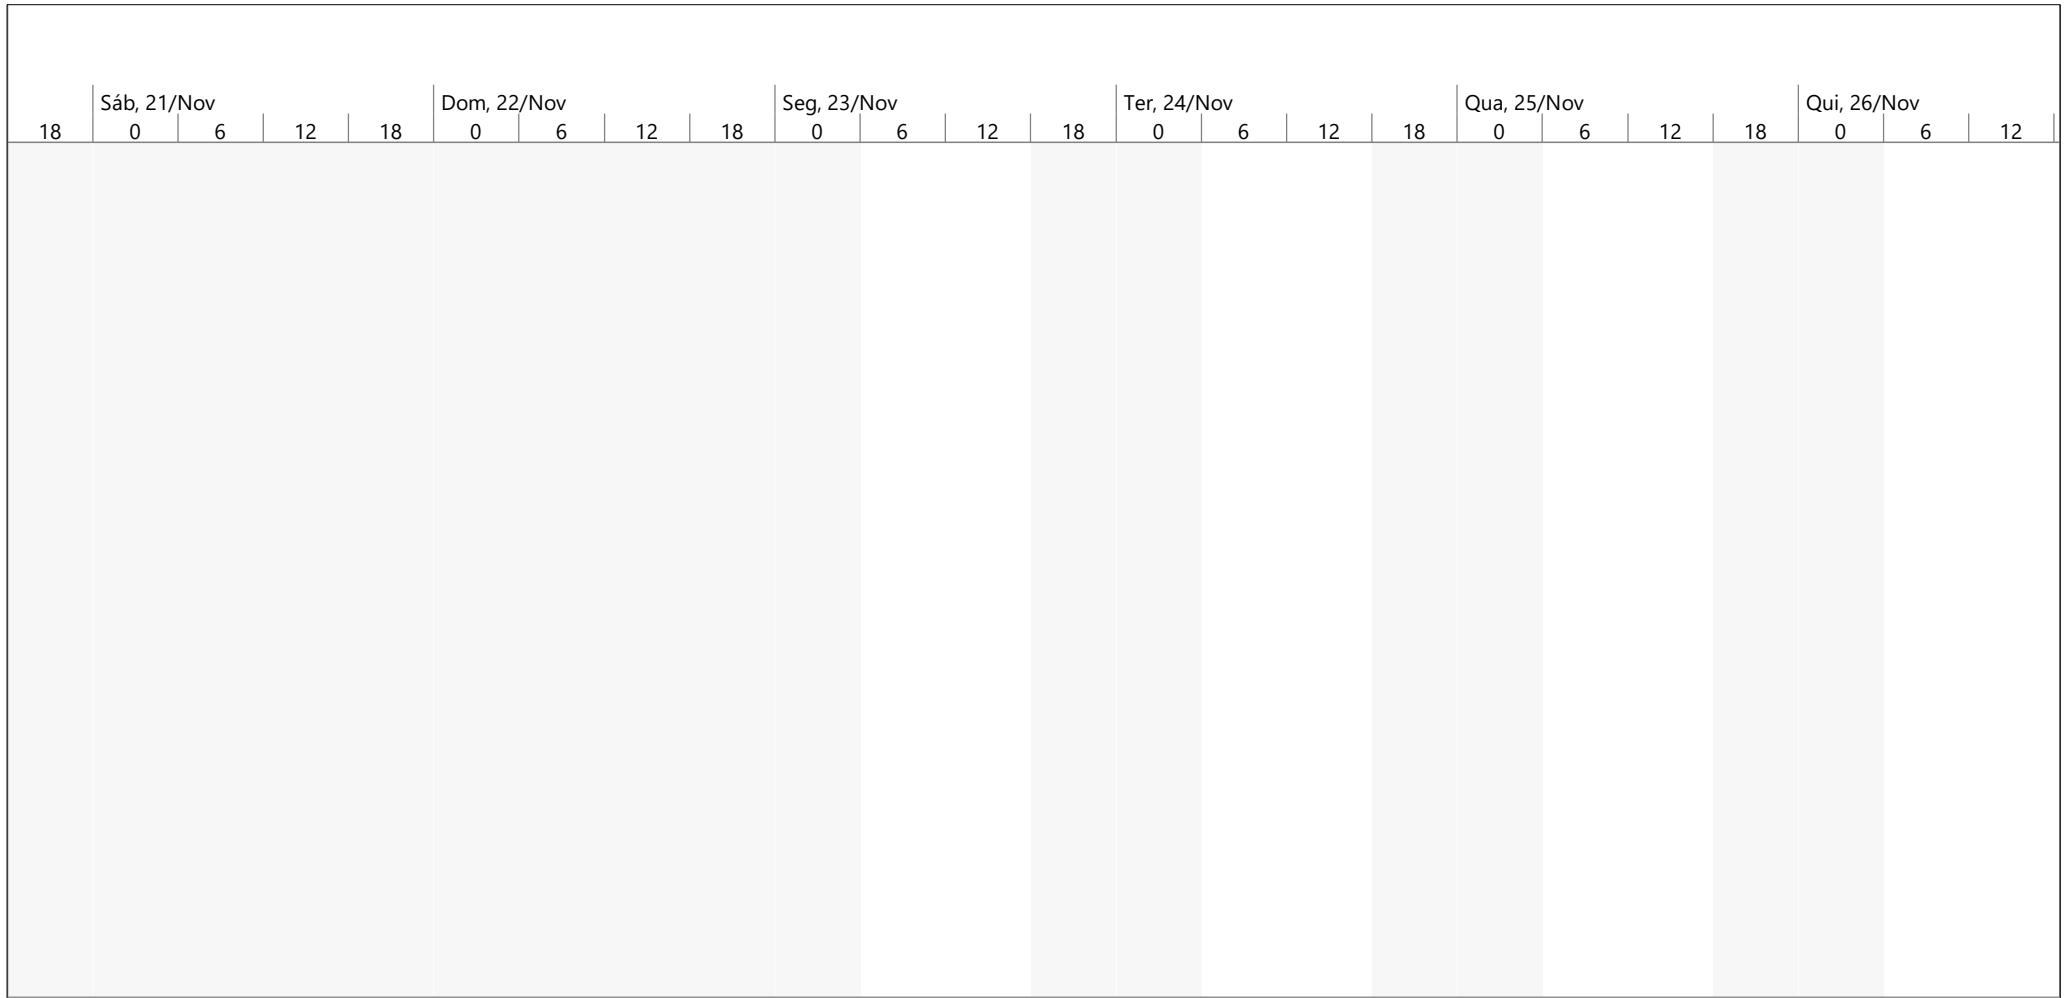


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

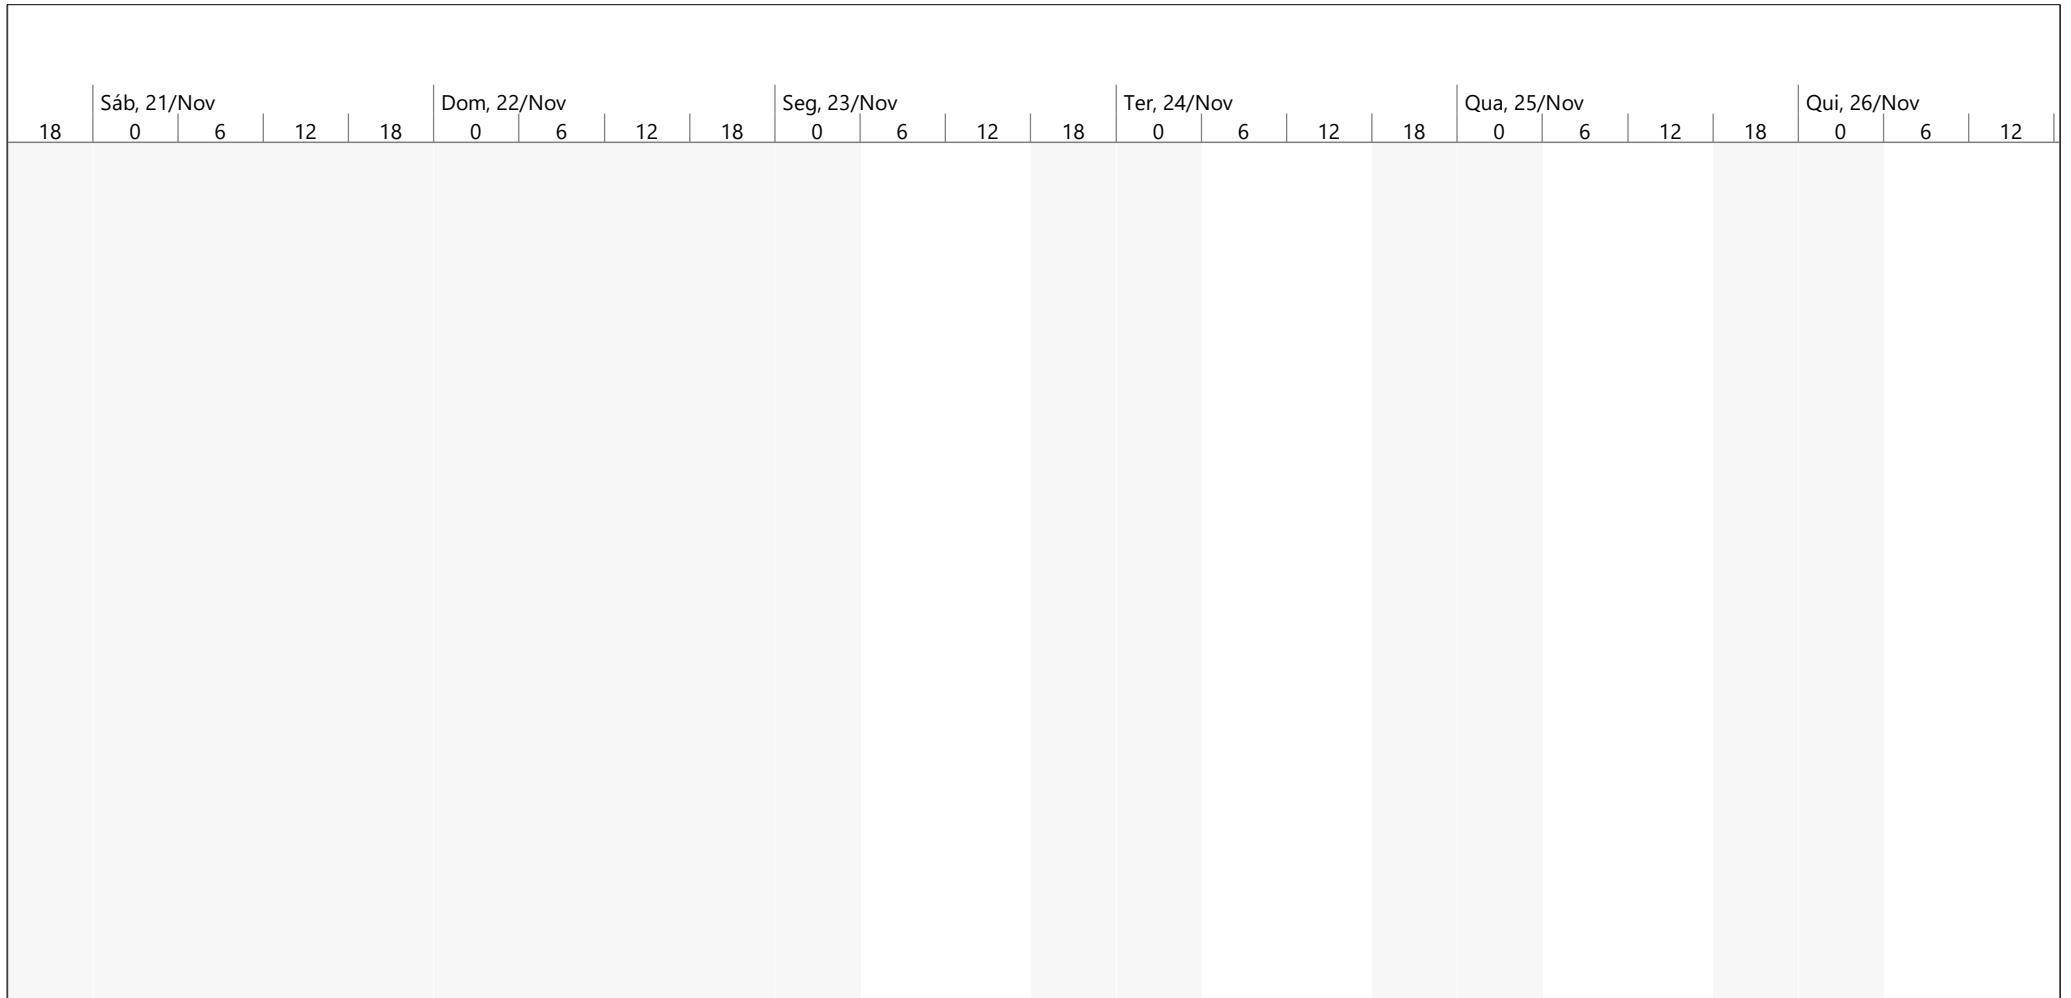


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

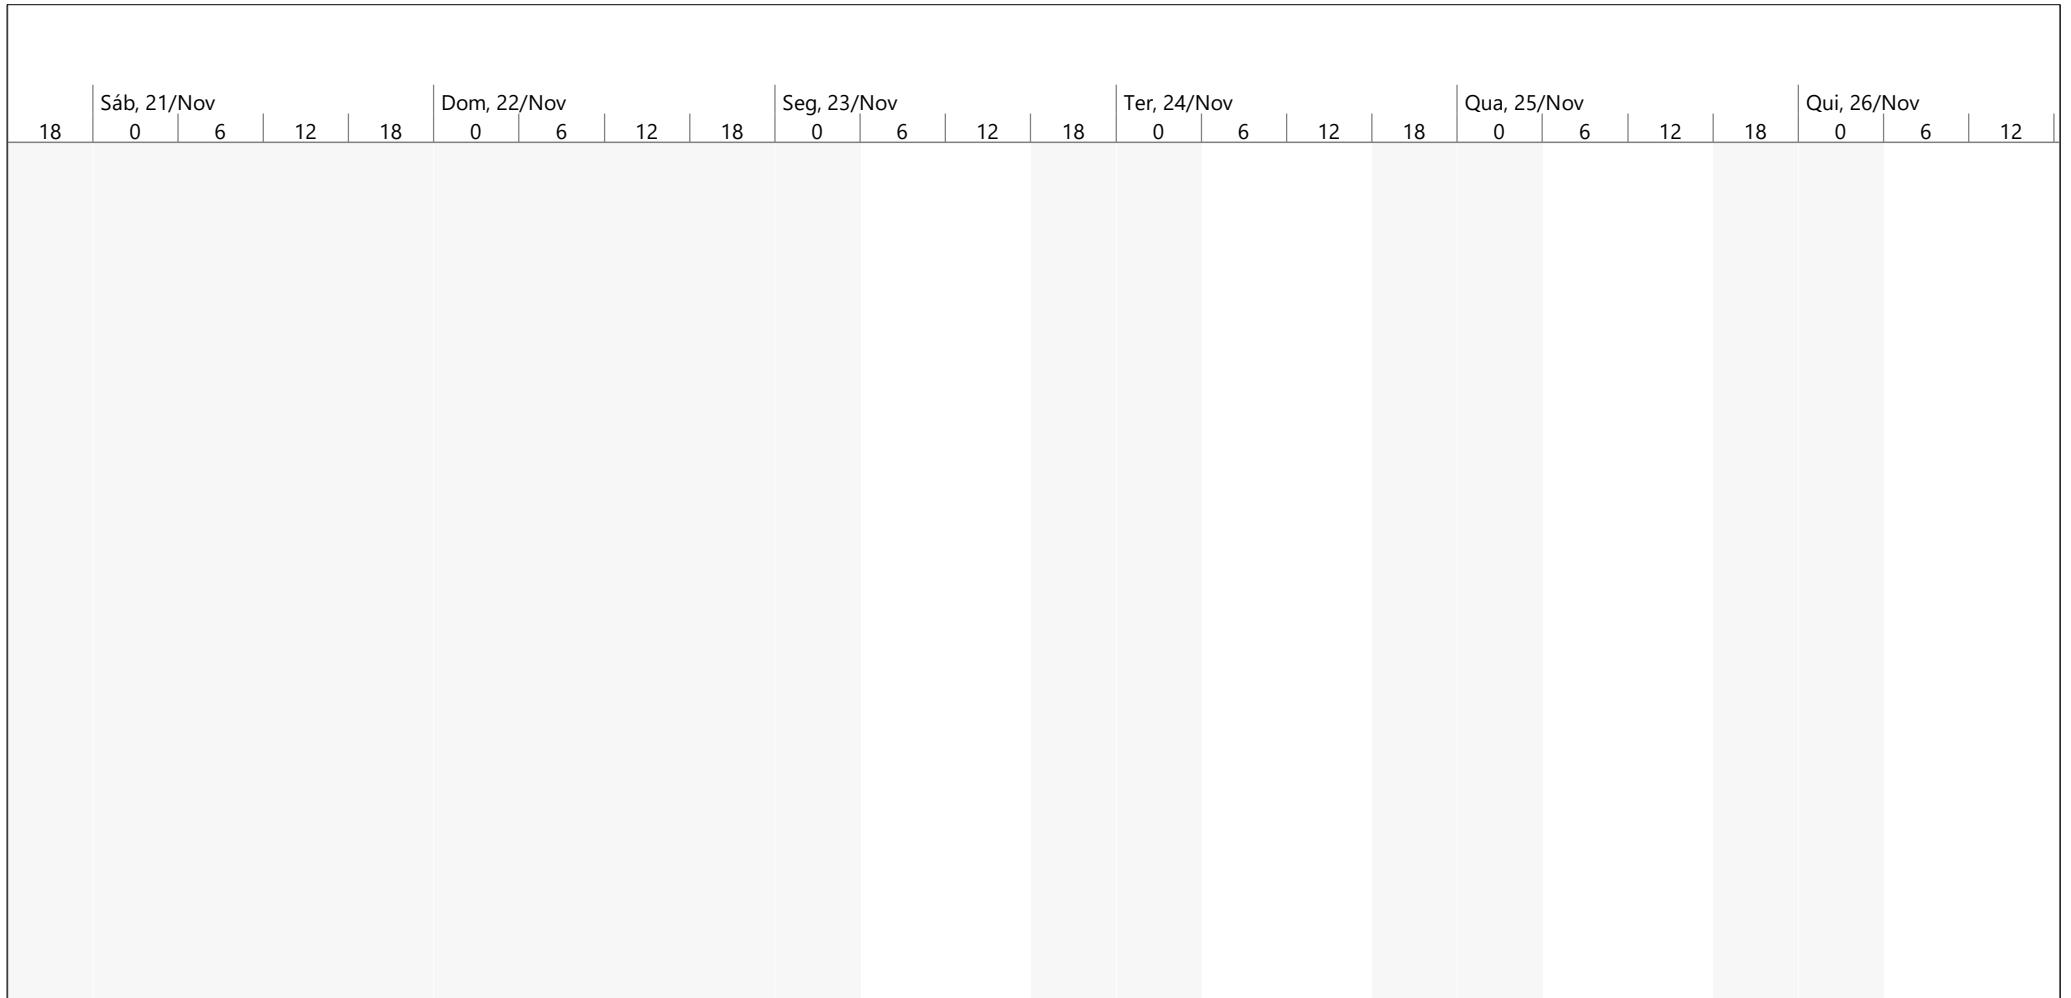


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

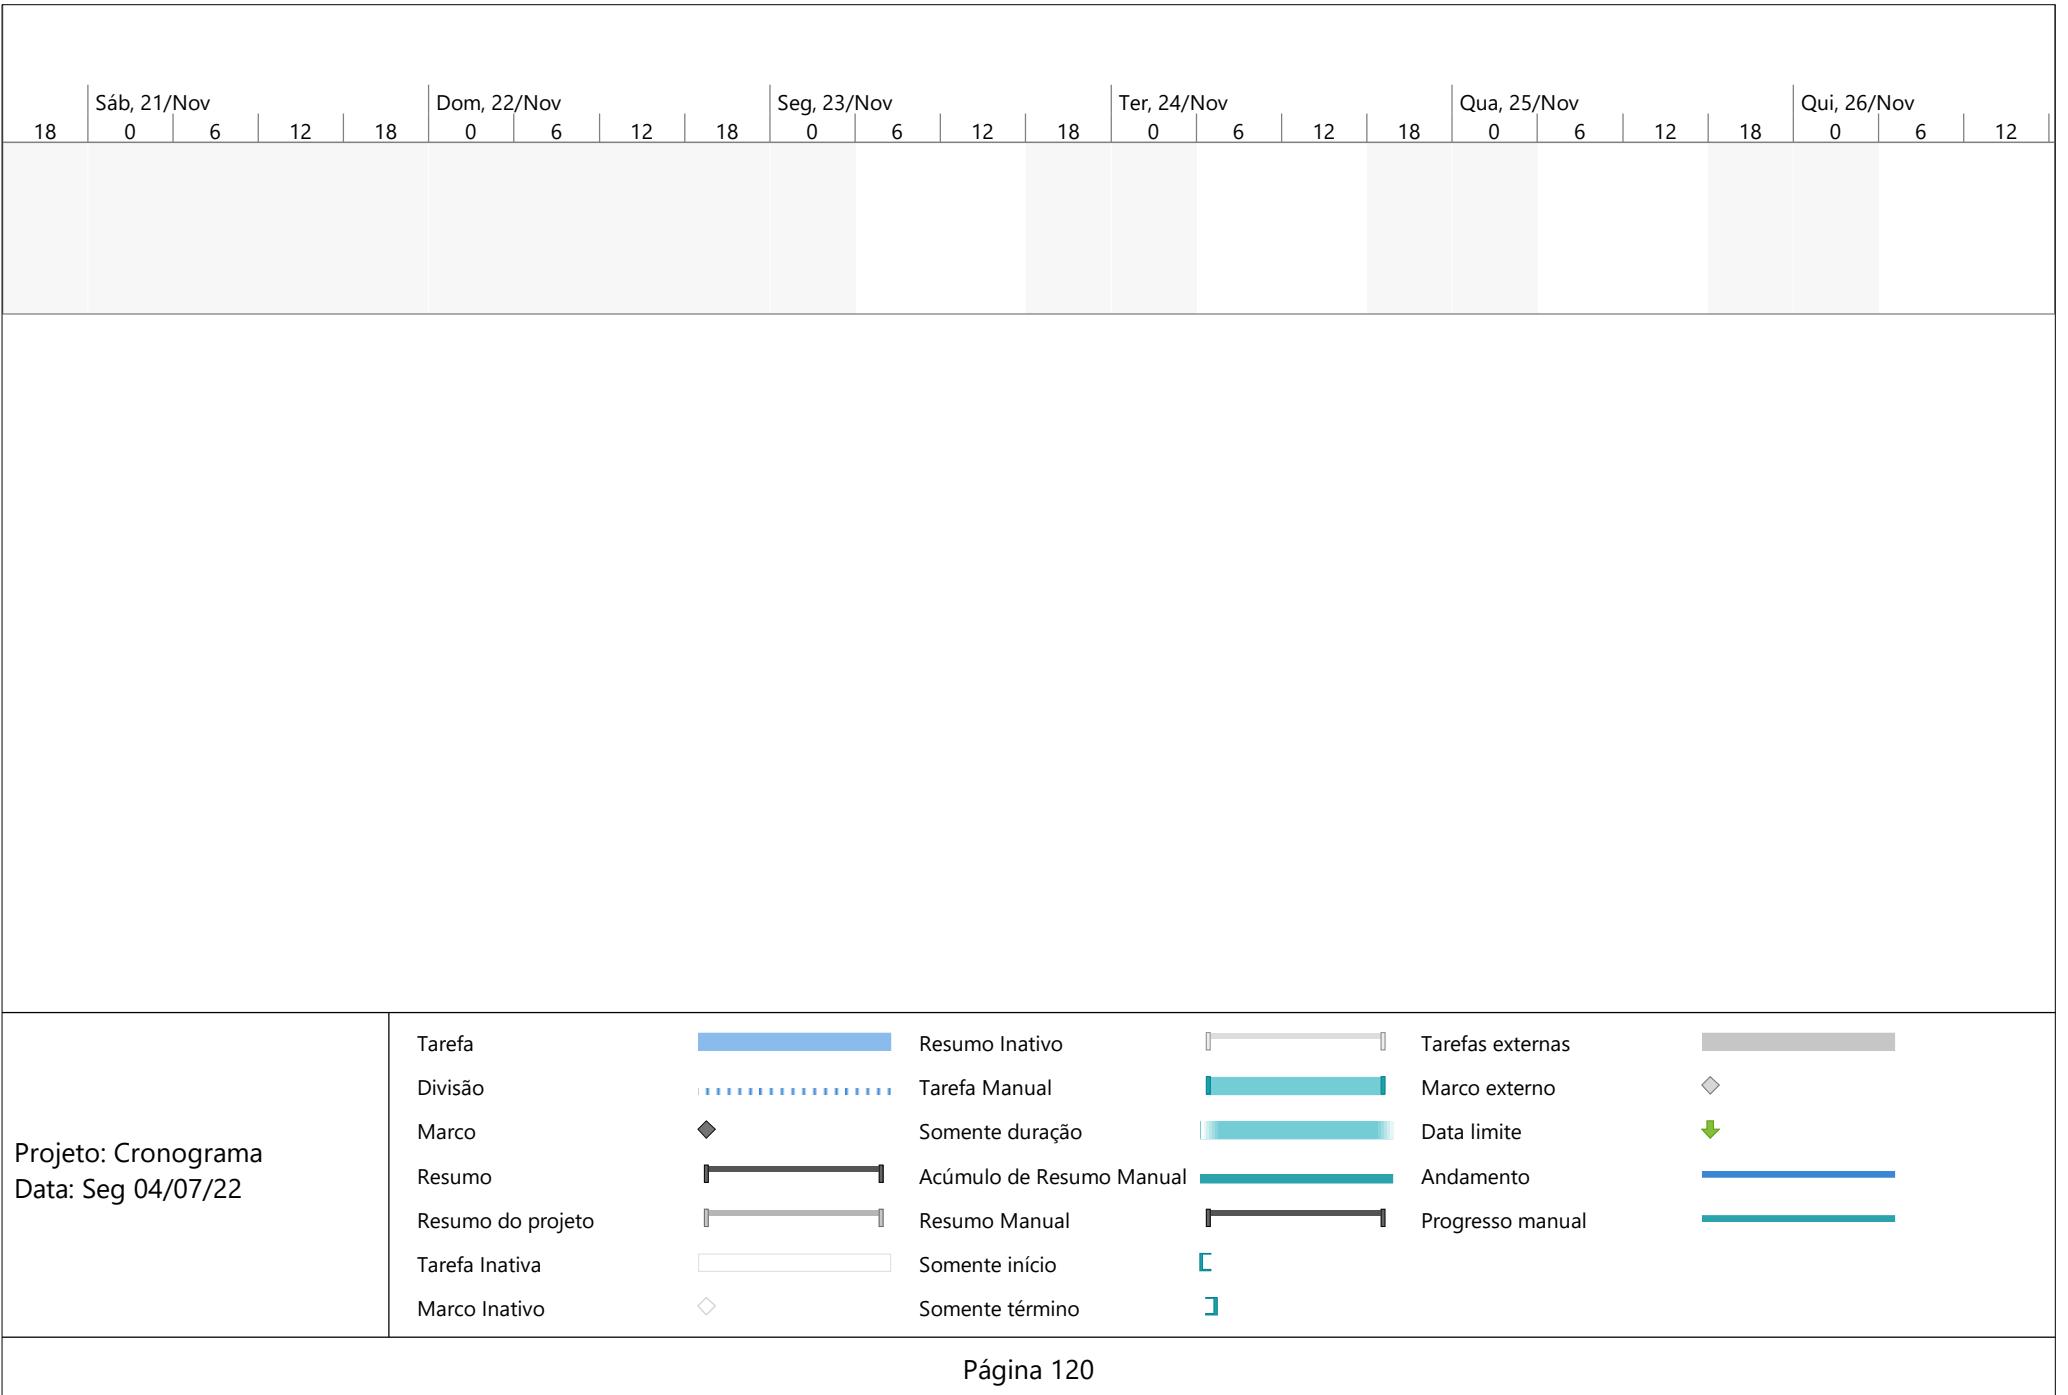


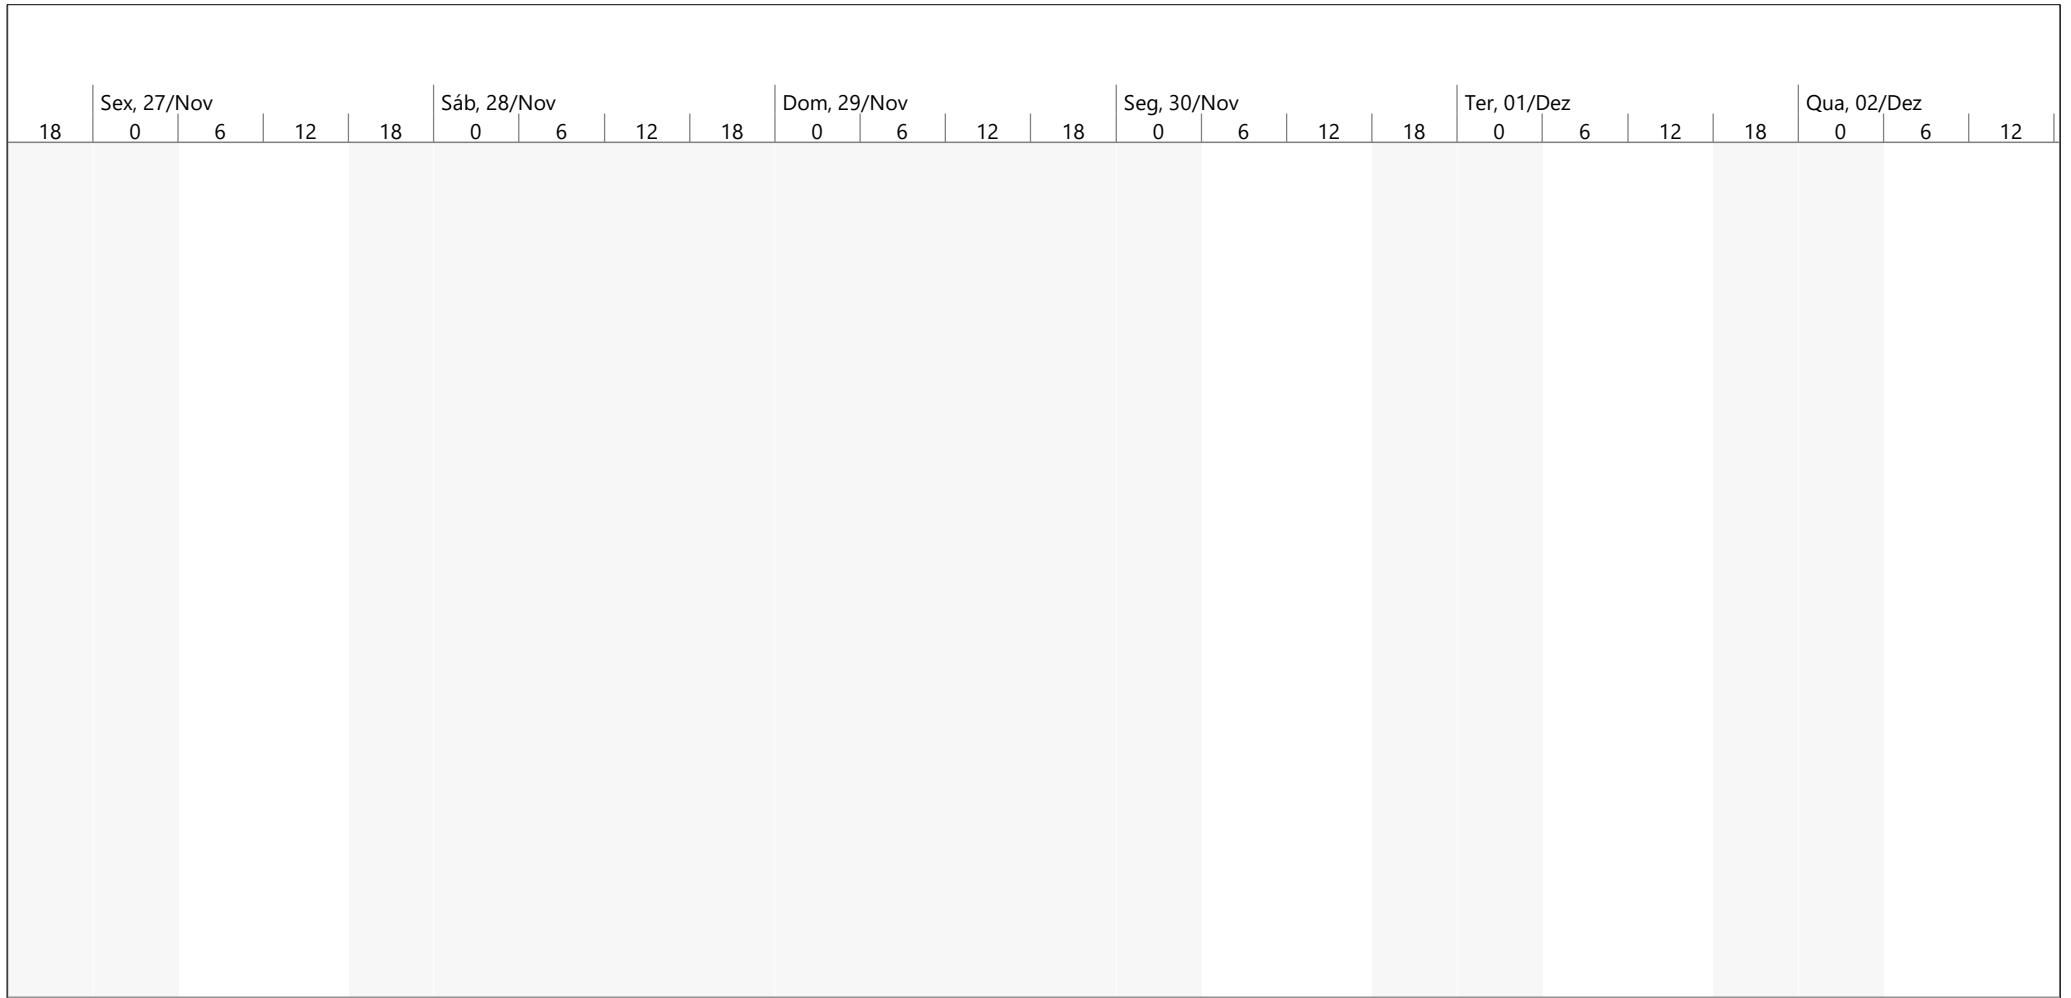


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

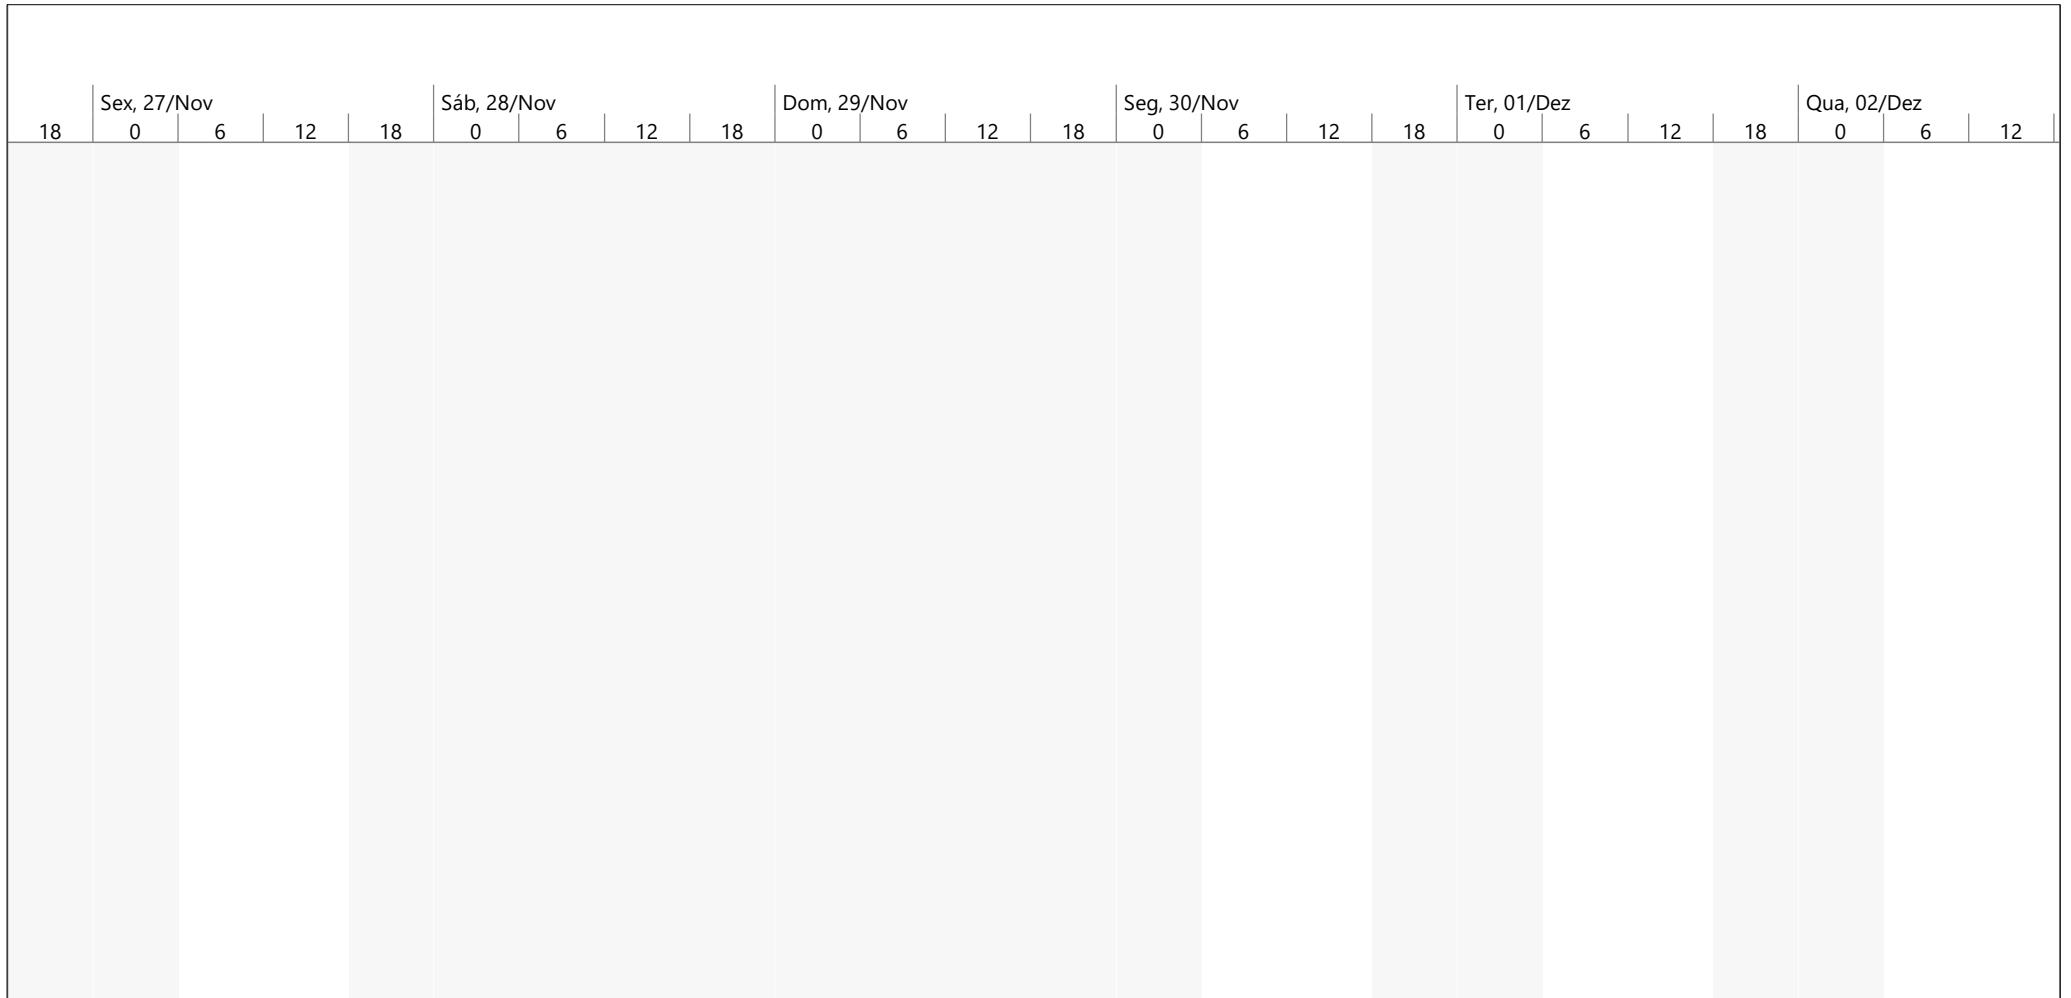


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

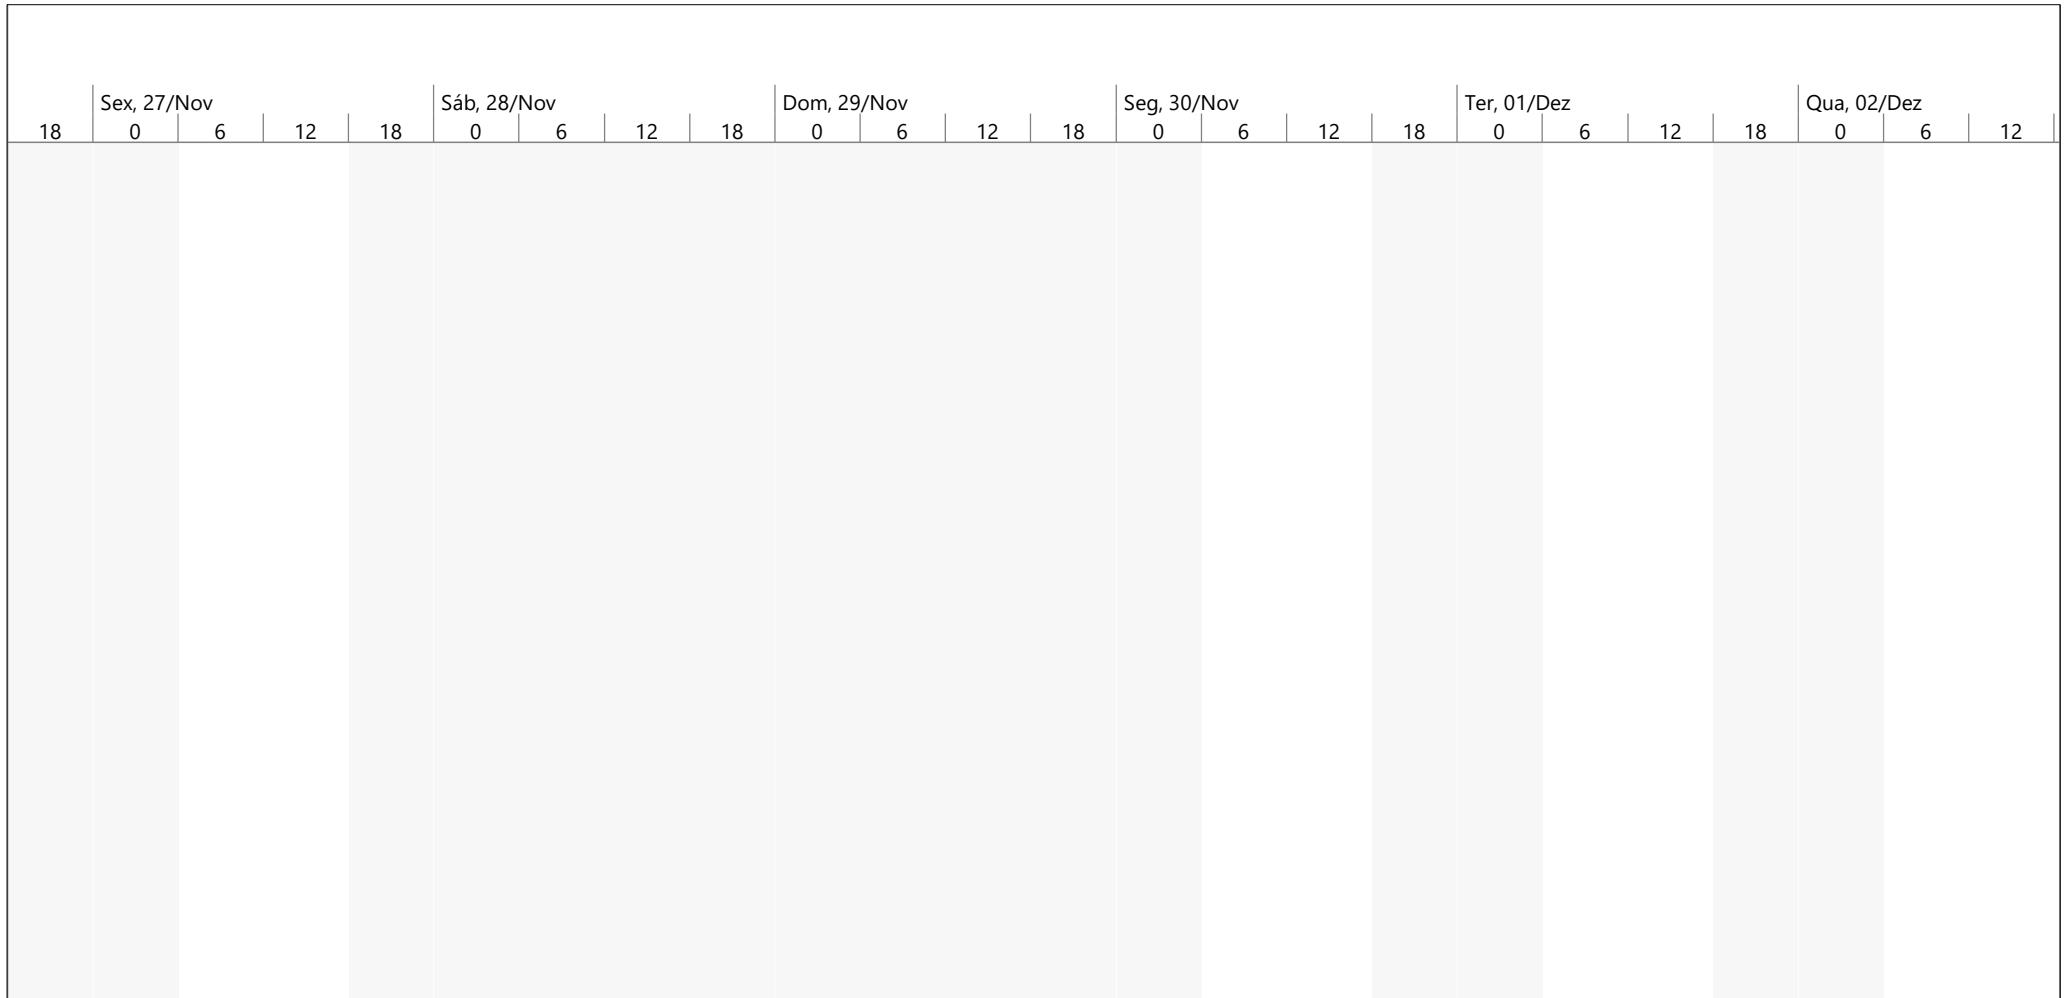

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

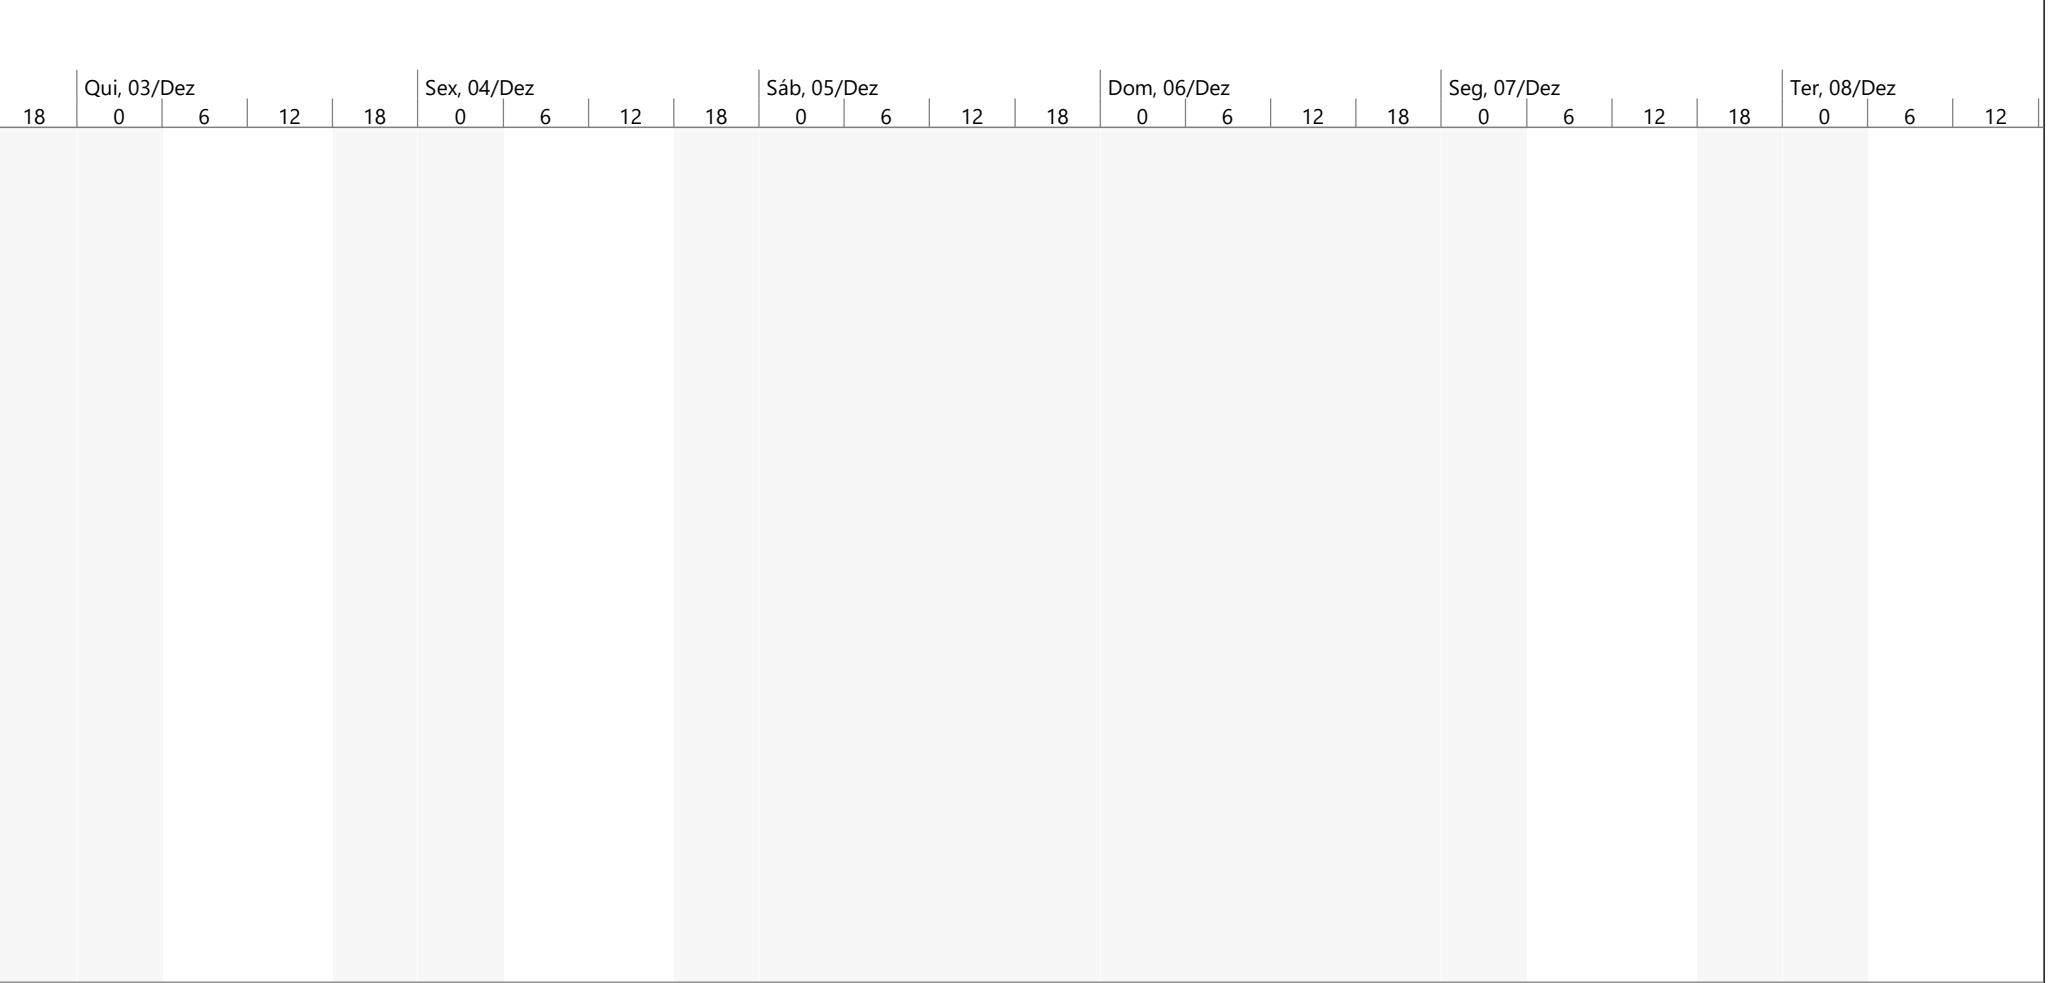


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	


18	Qua, 09/Dez	0	6	12	18	Qui, 10/Dez	0	6	12	18	Sex, 11/Dez	0	6	12	18	Sáb, 12/Dez	0	6	12	18	Dom, 13/Dez	0	6	12	18	Seg, 14/Dez	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

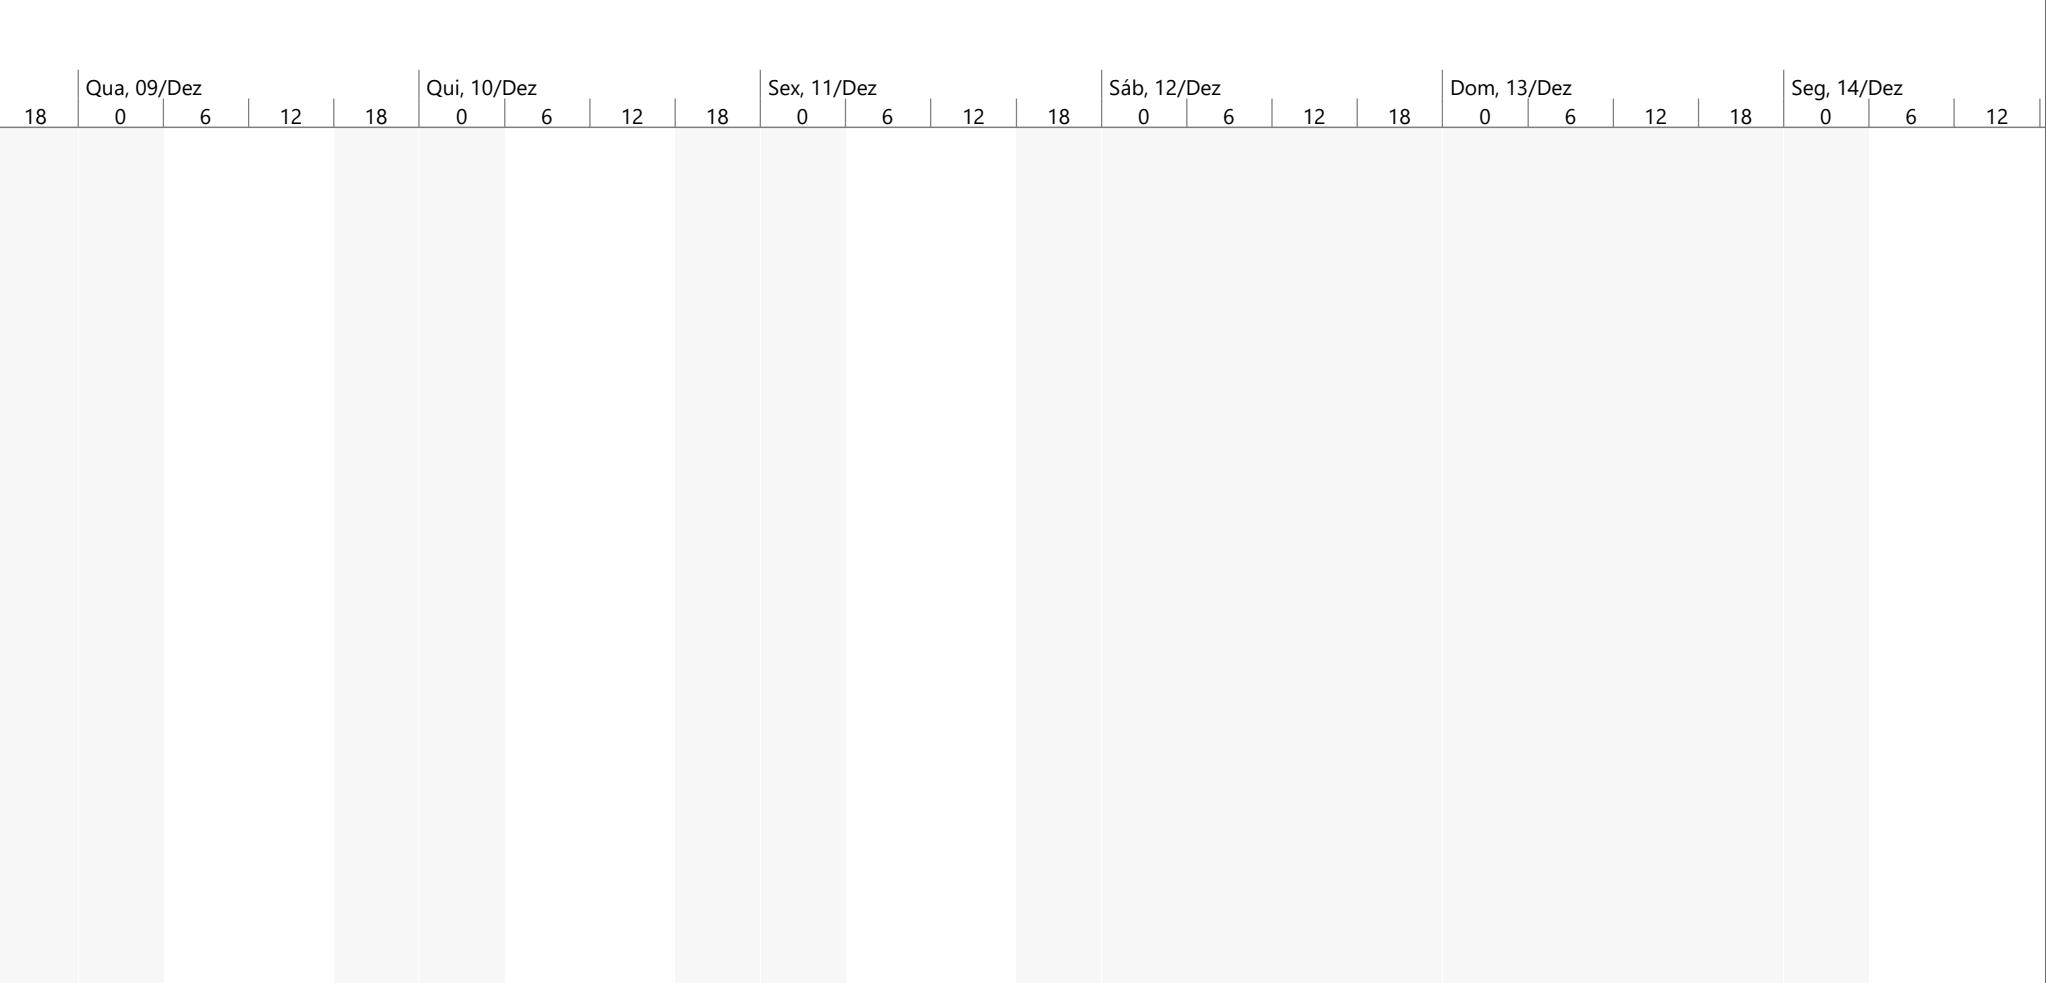

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

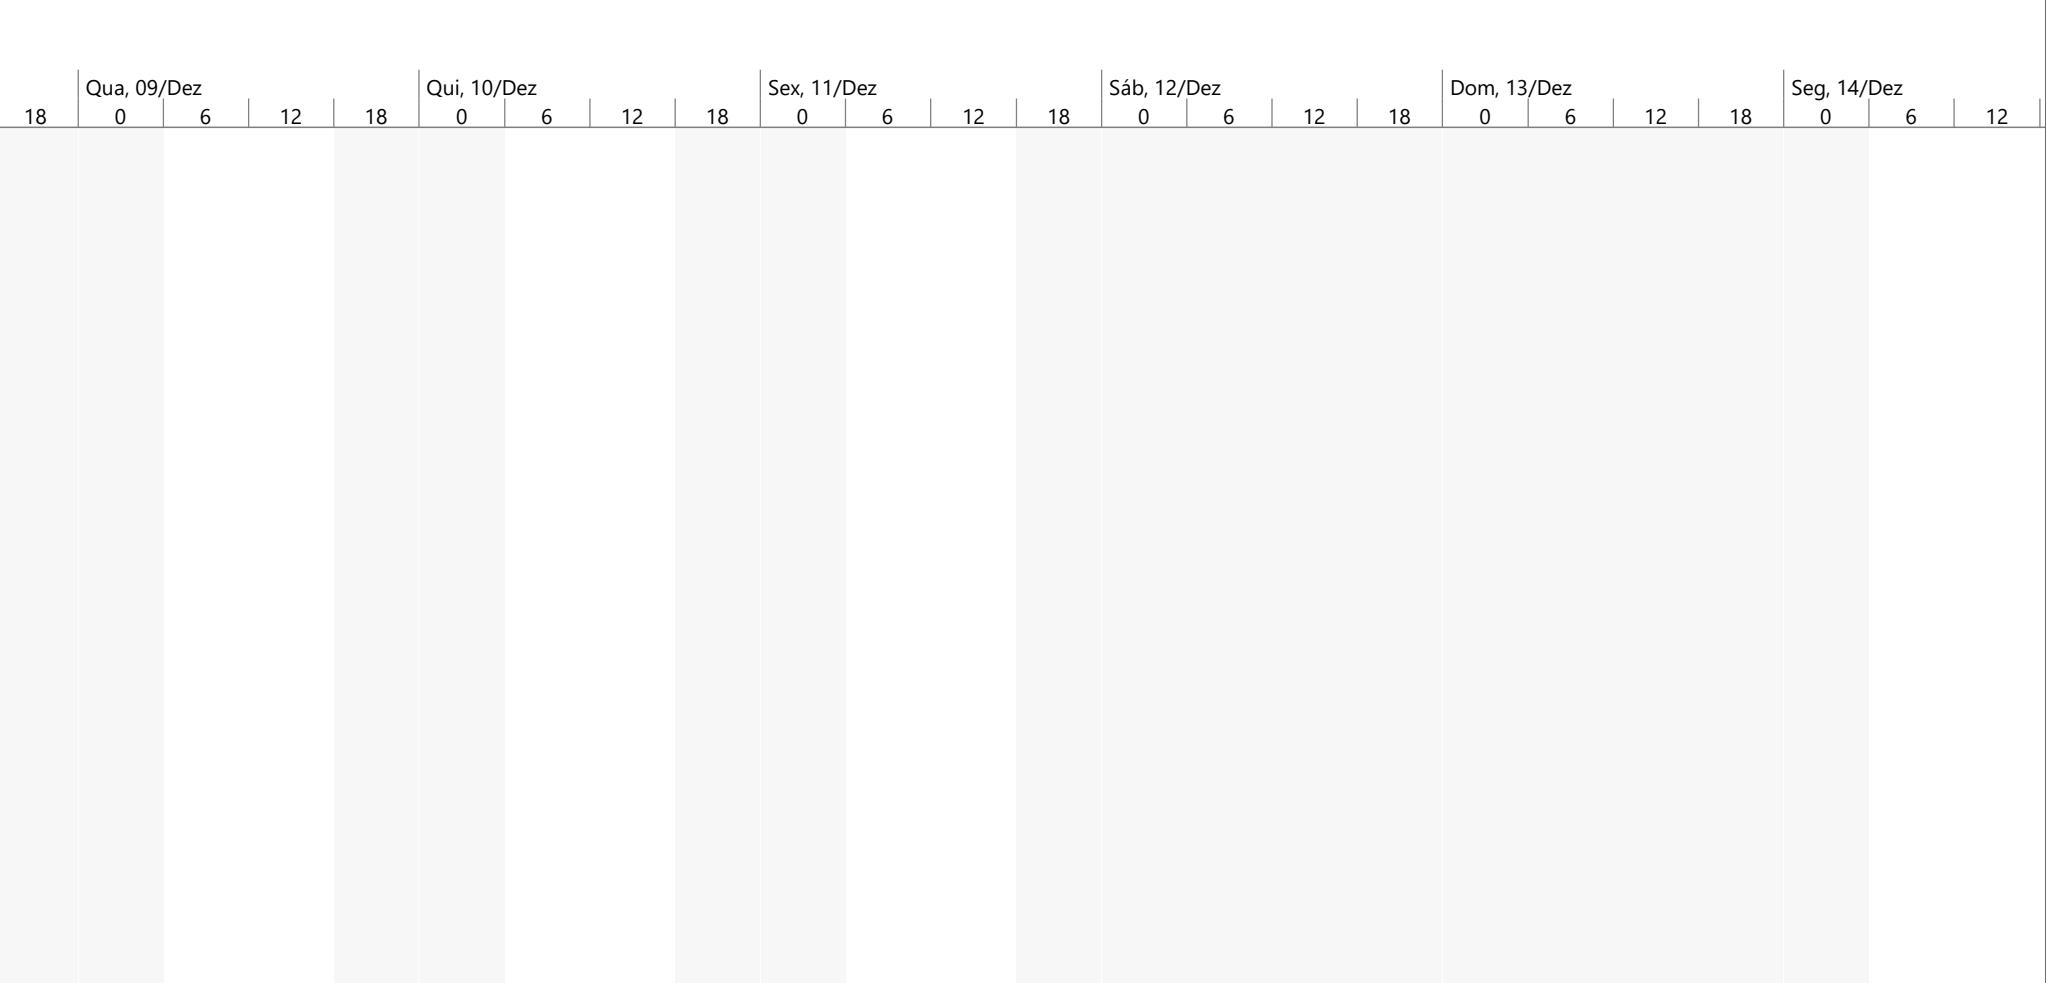


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

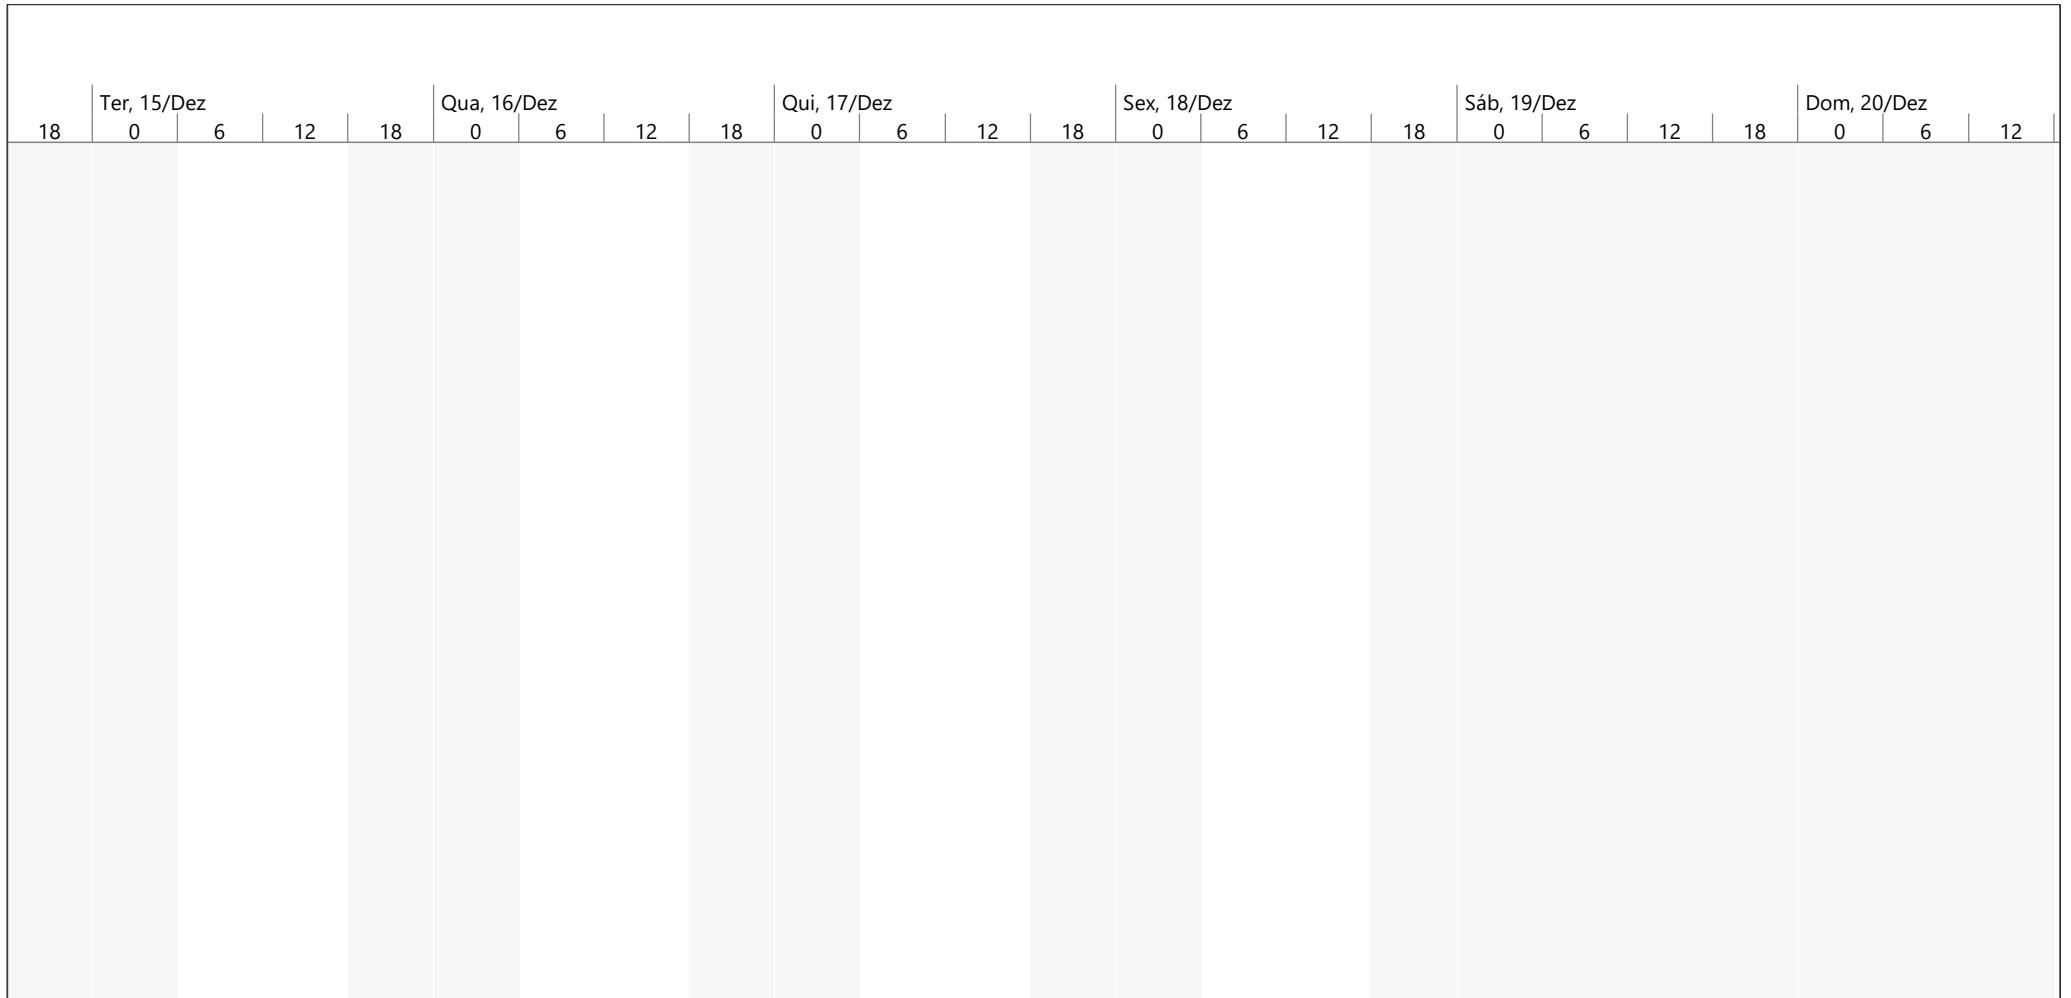


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

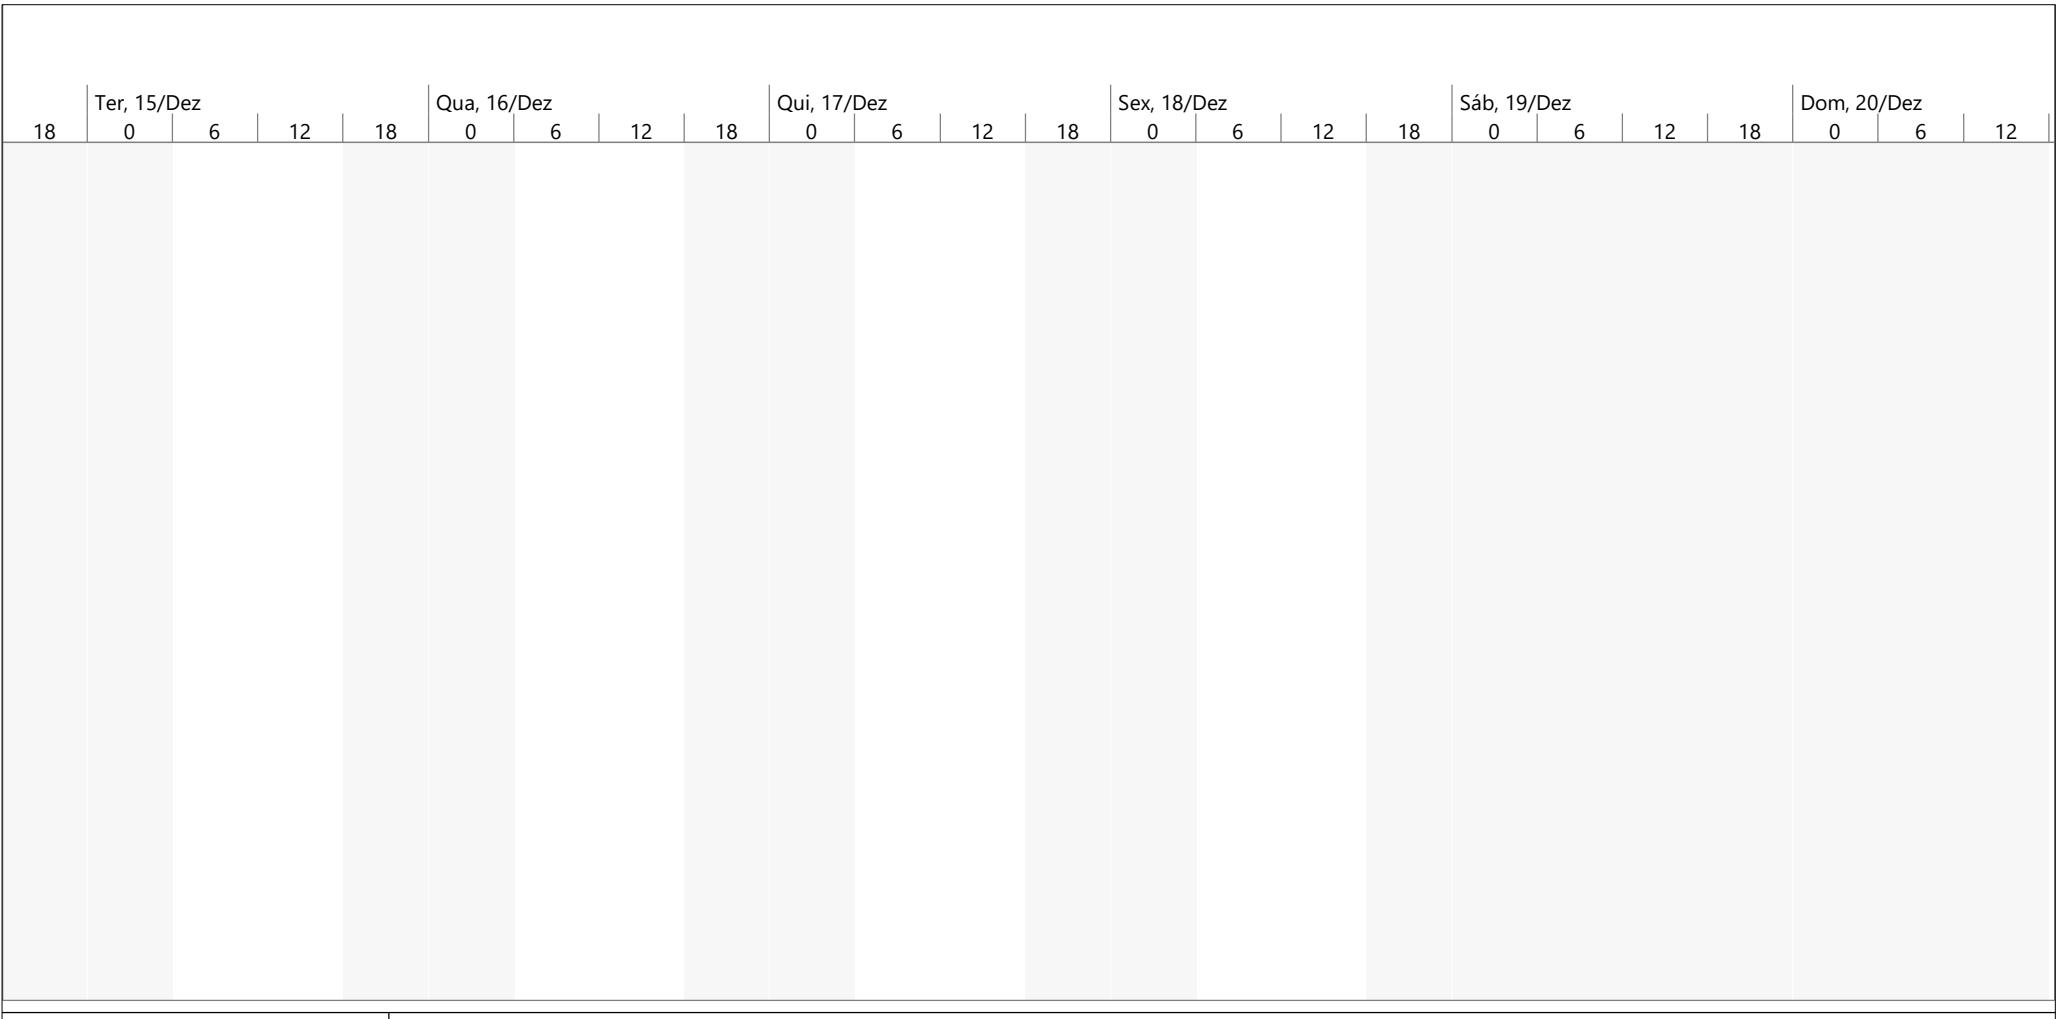

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

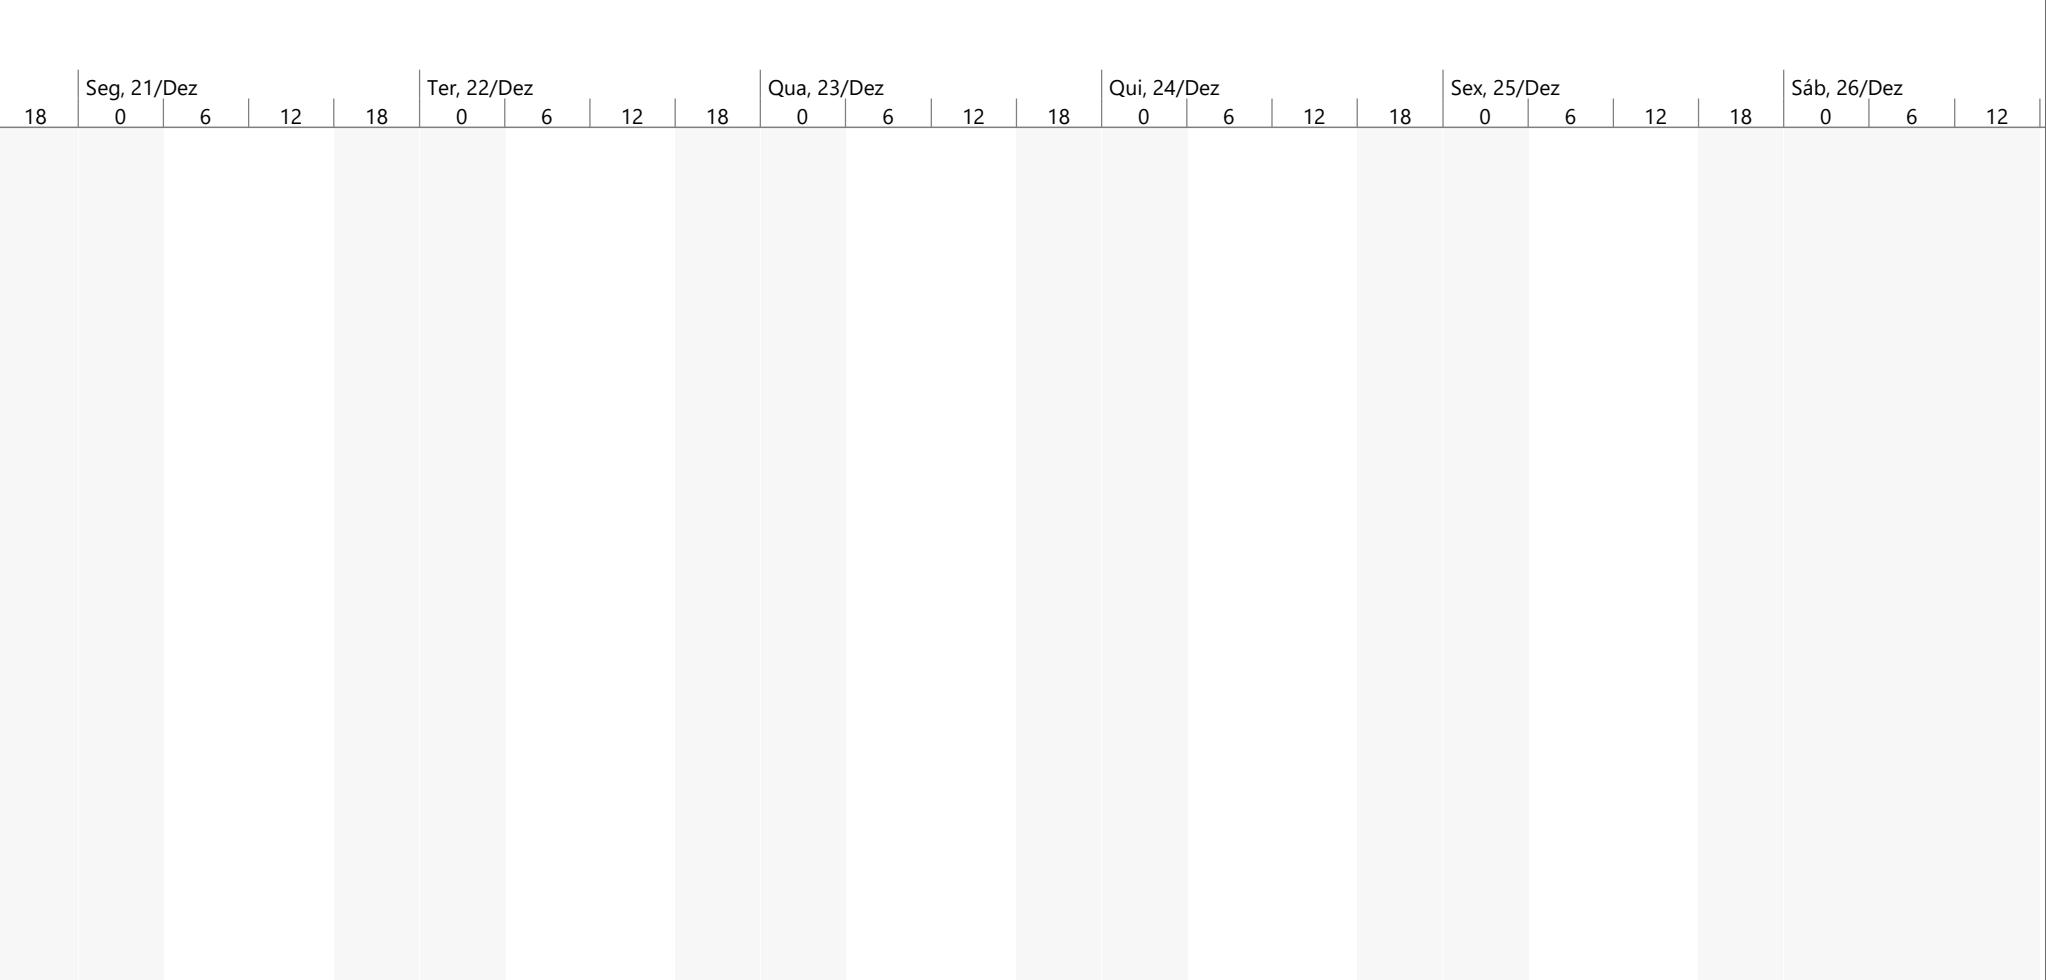


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

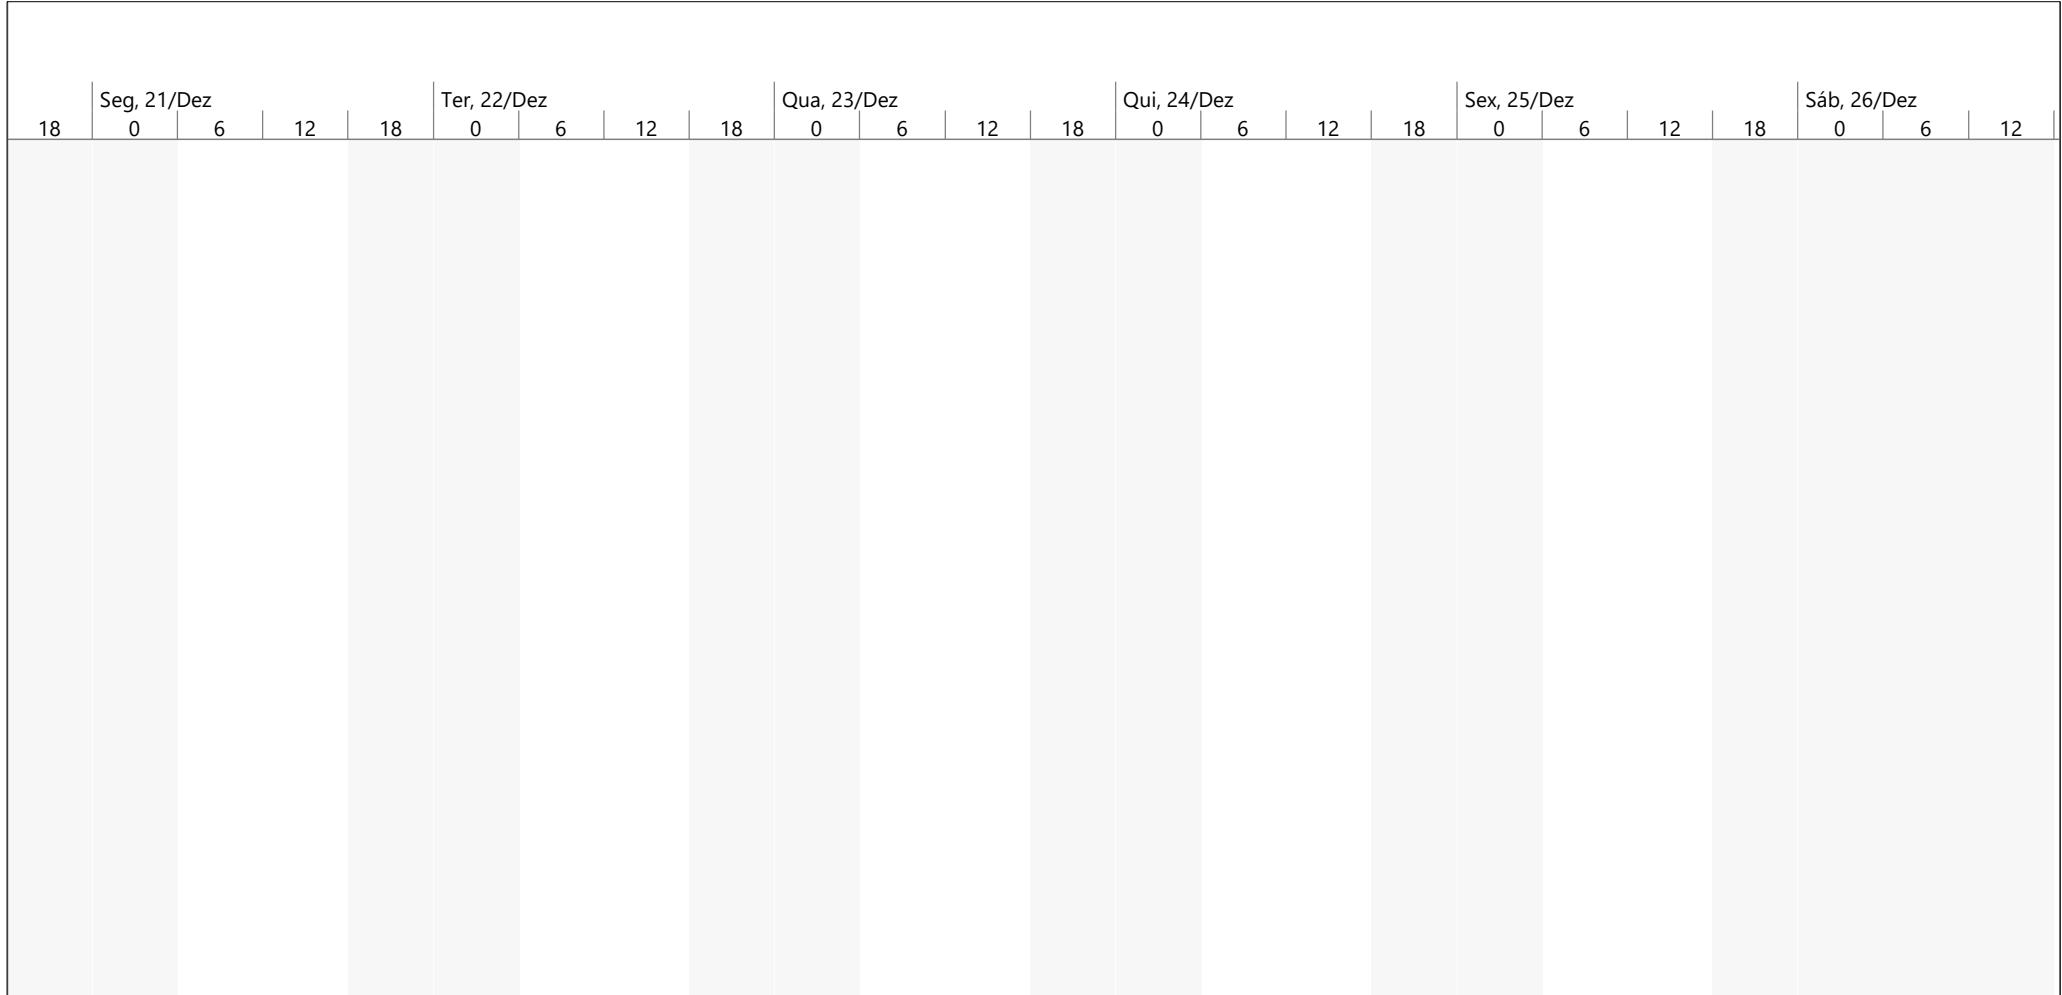


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

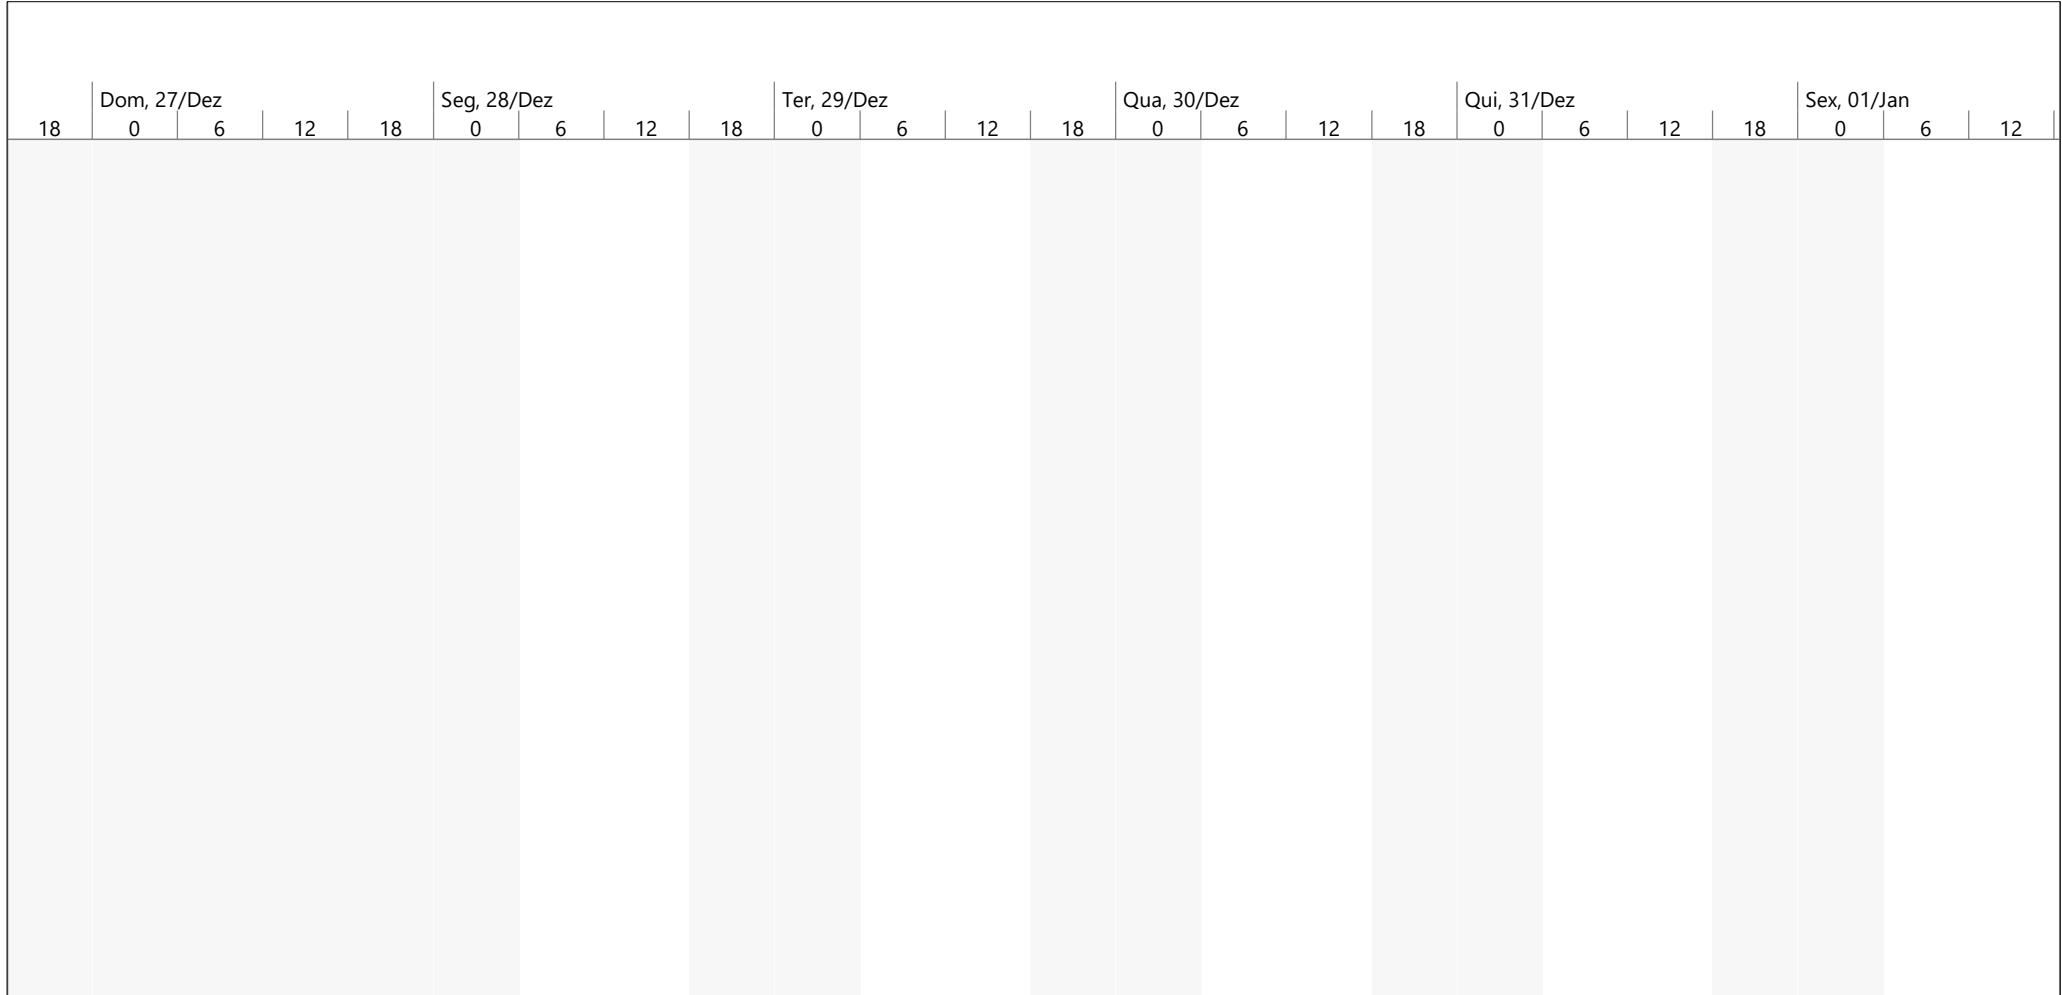


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

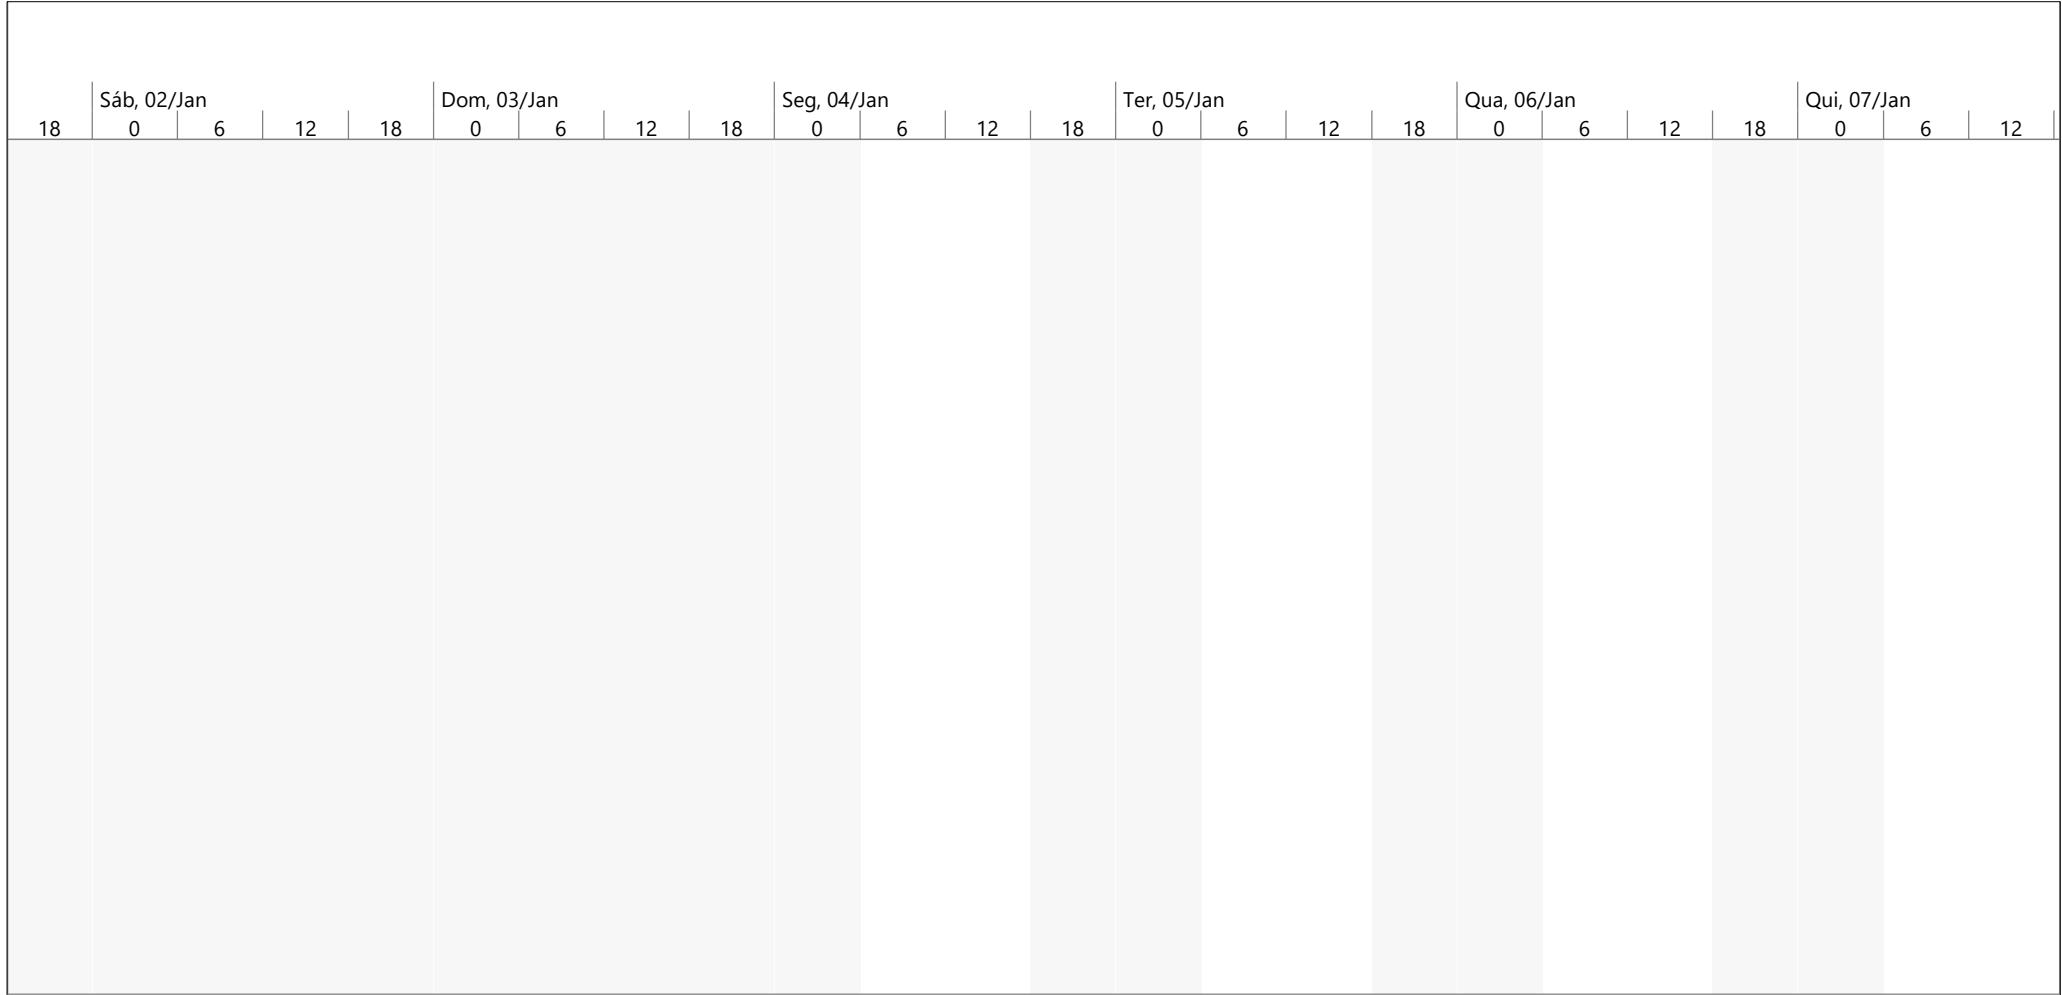


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

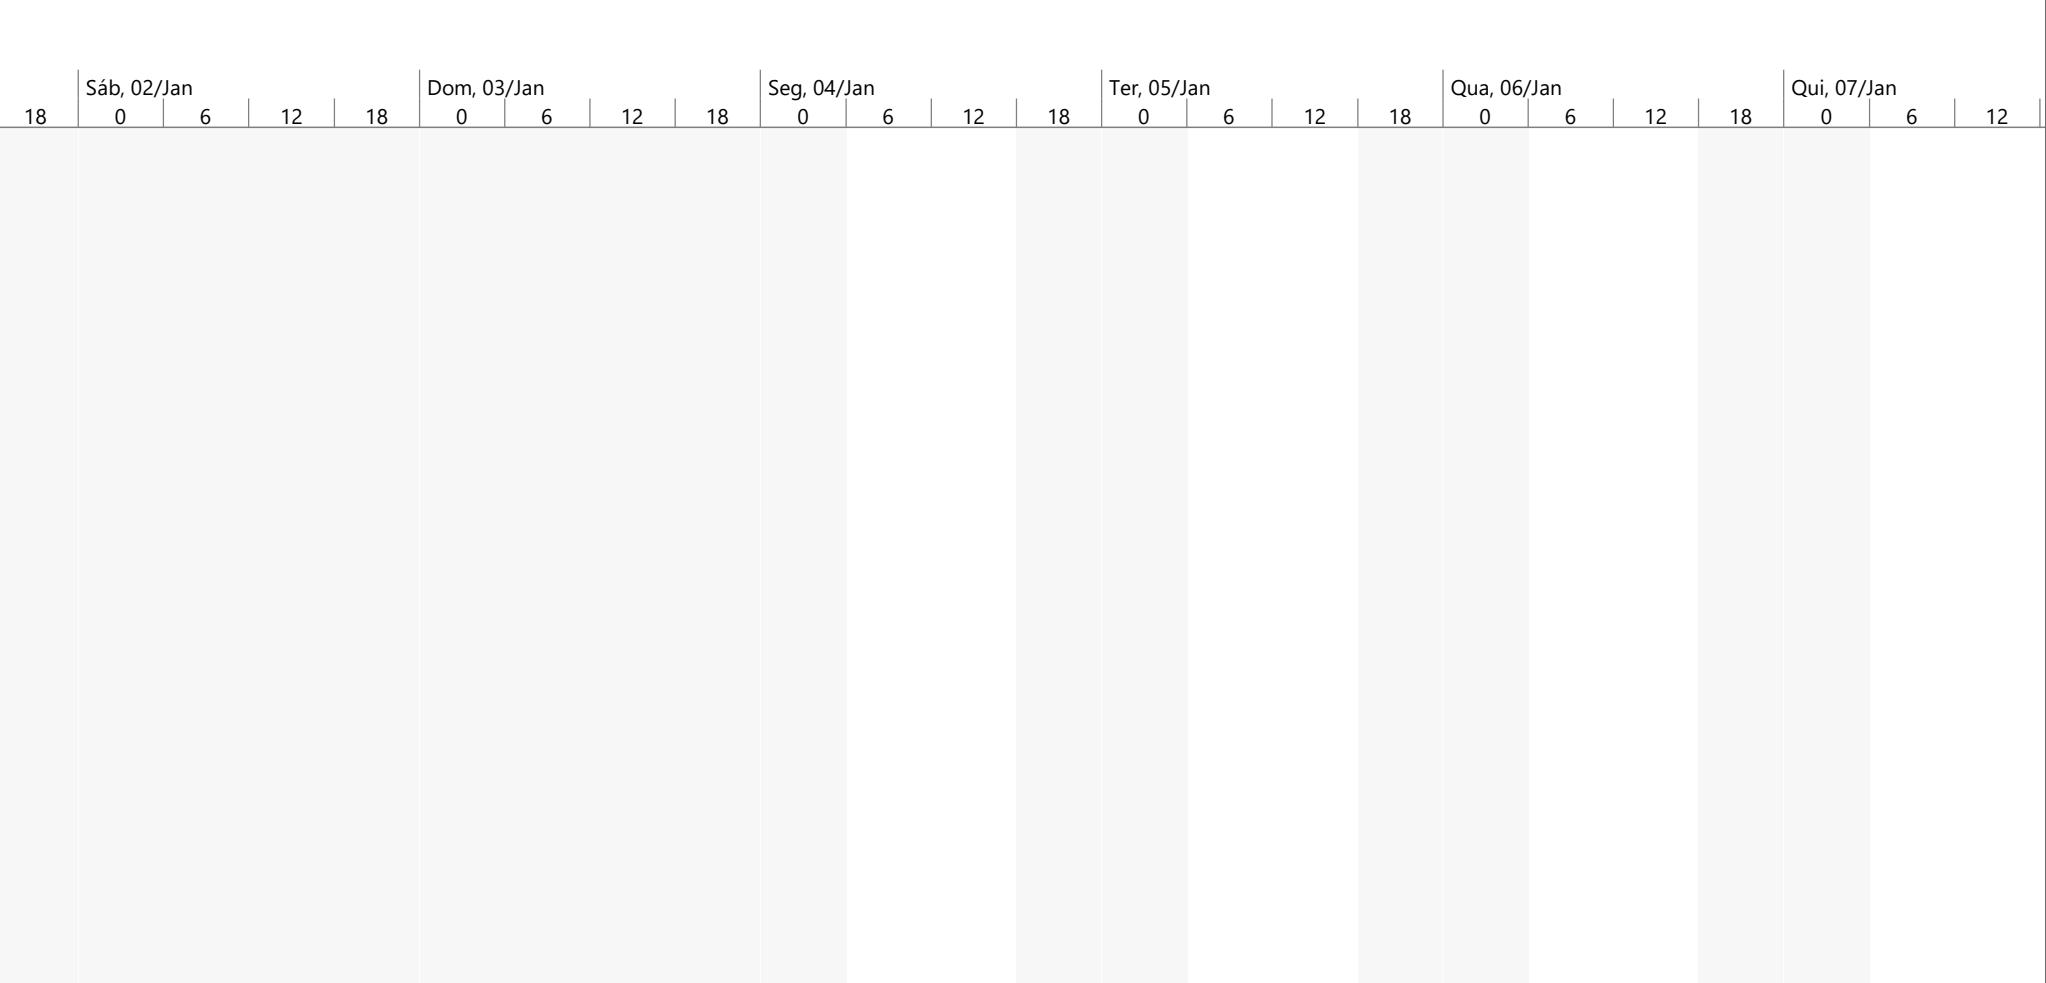


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

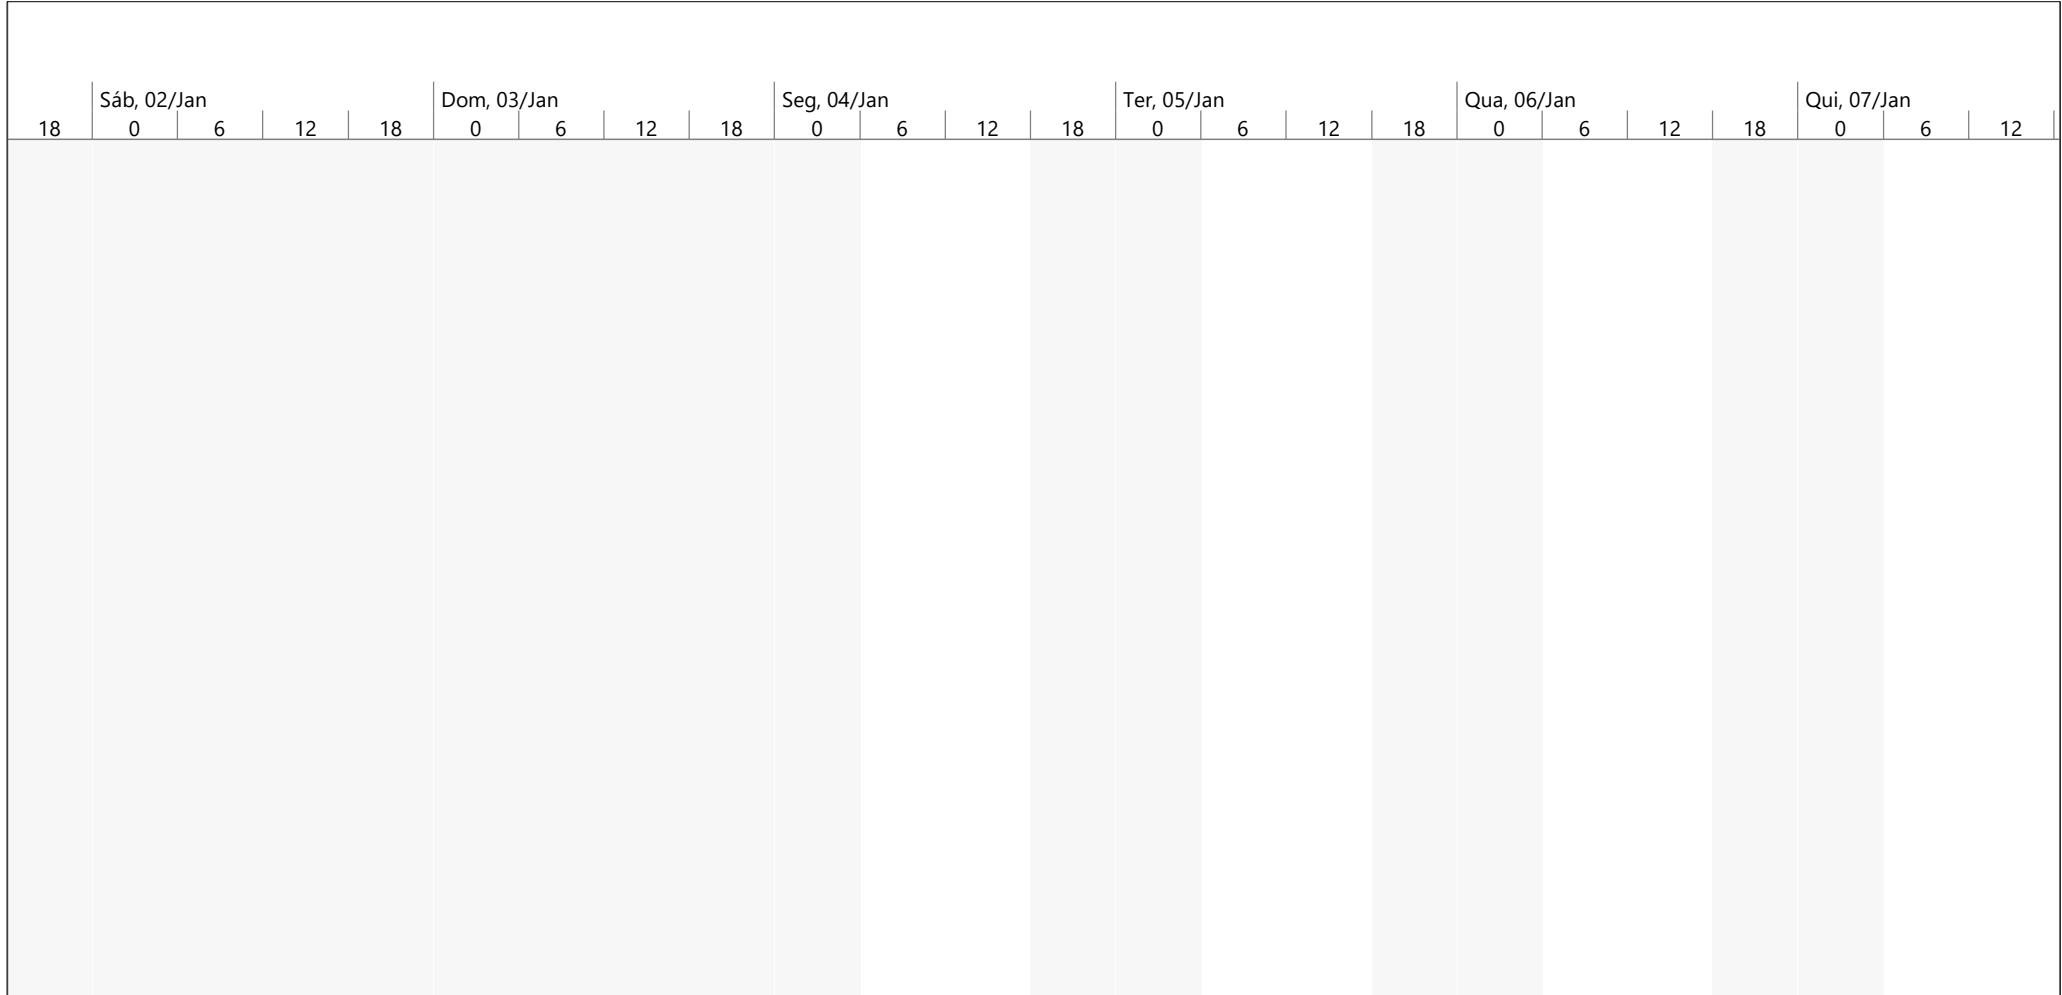


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

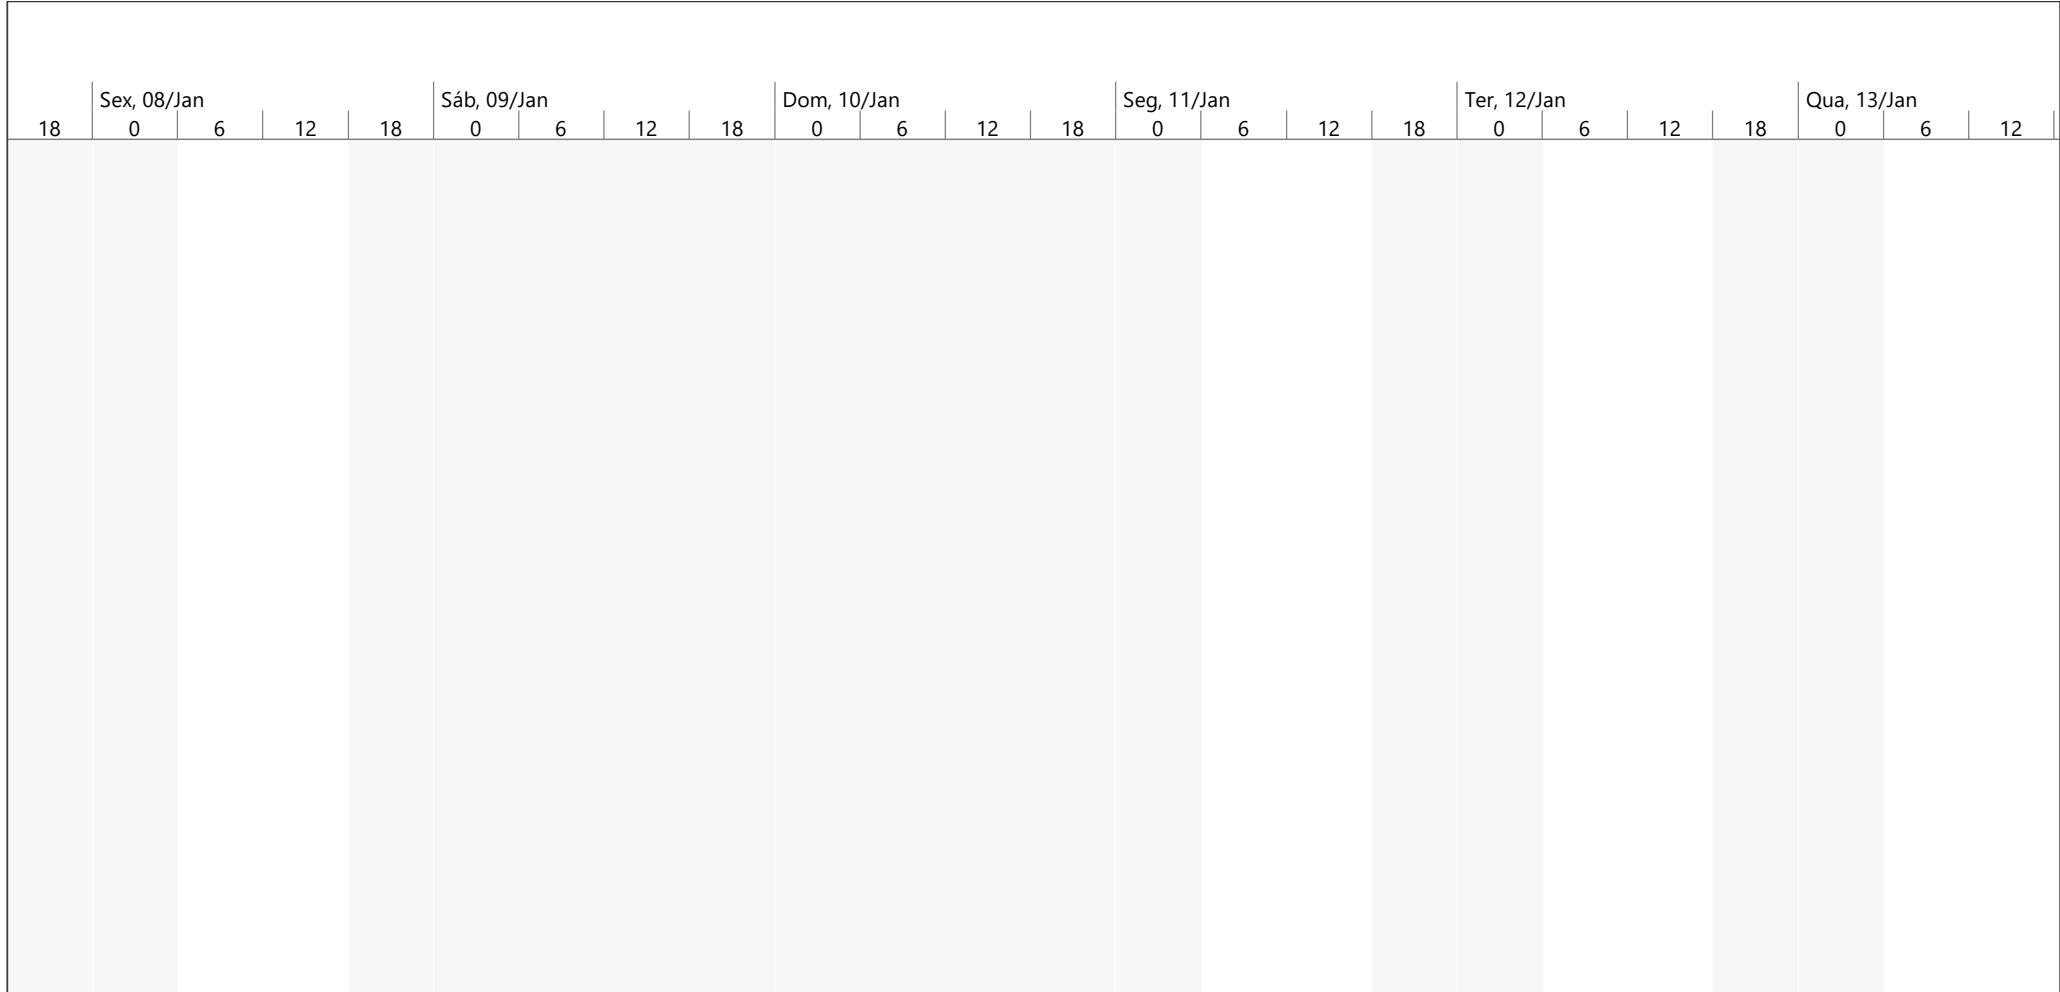


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

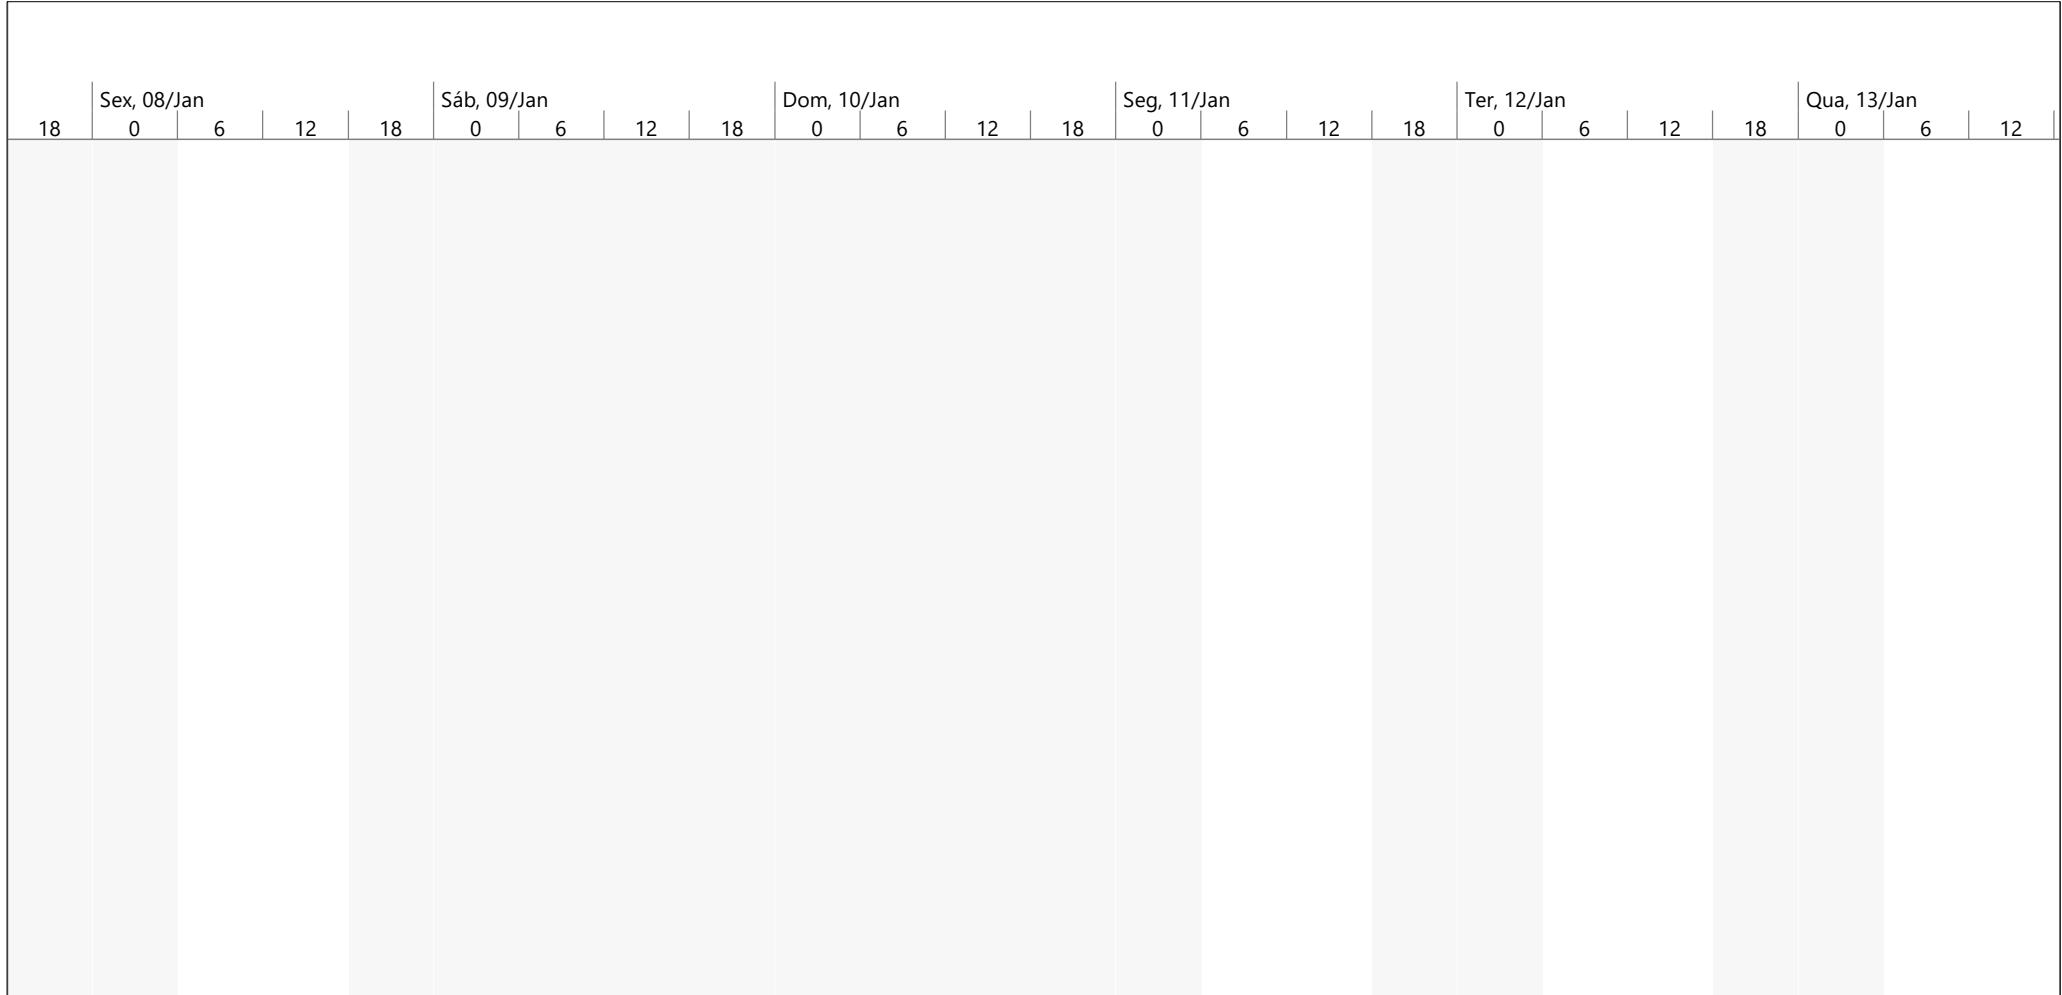


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

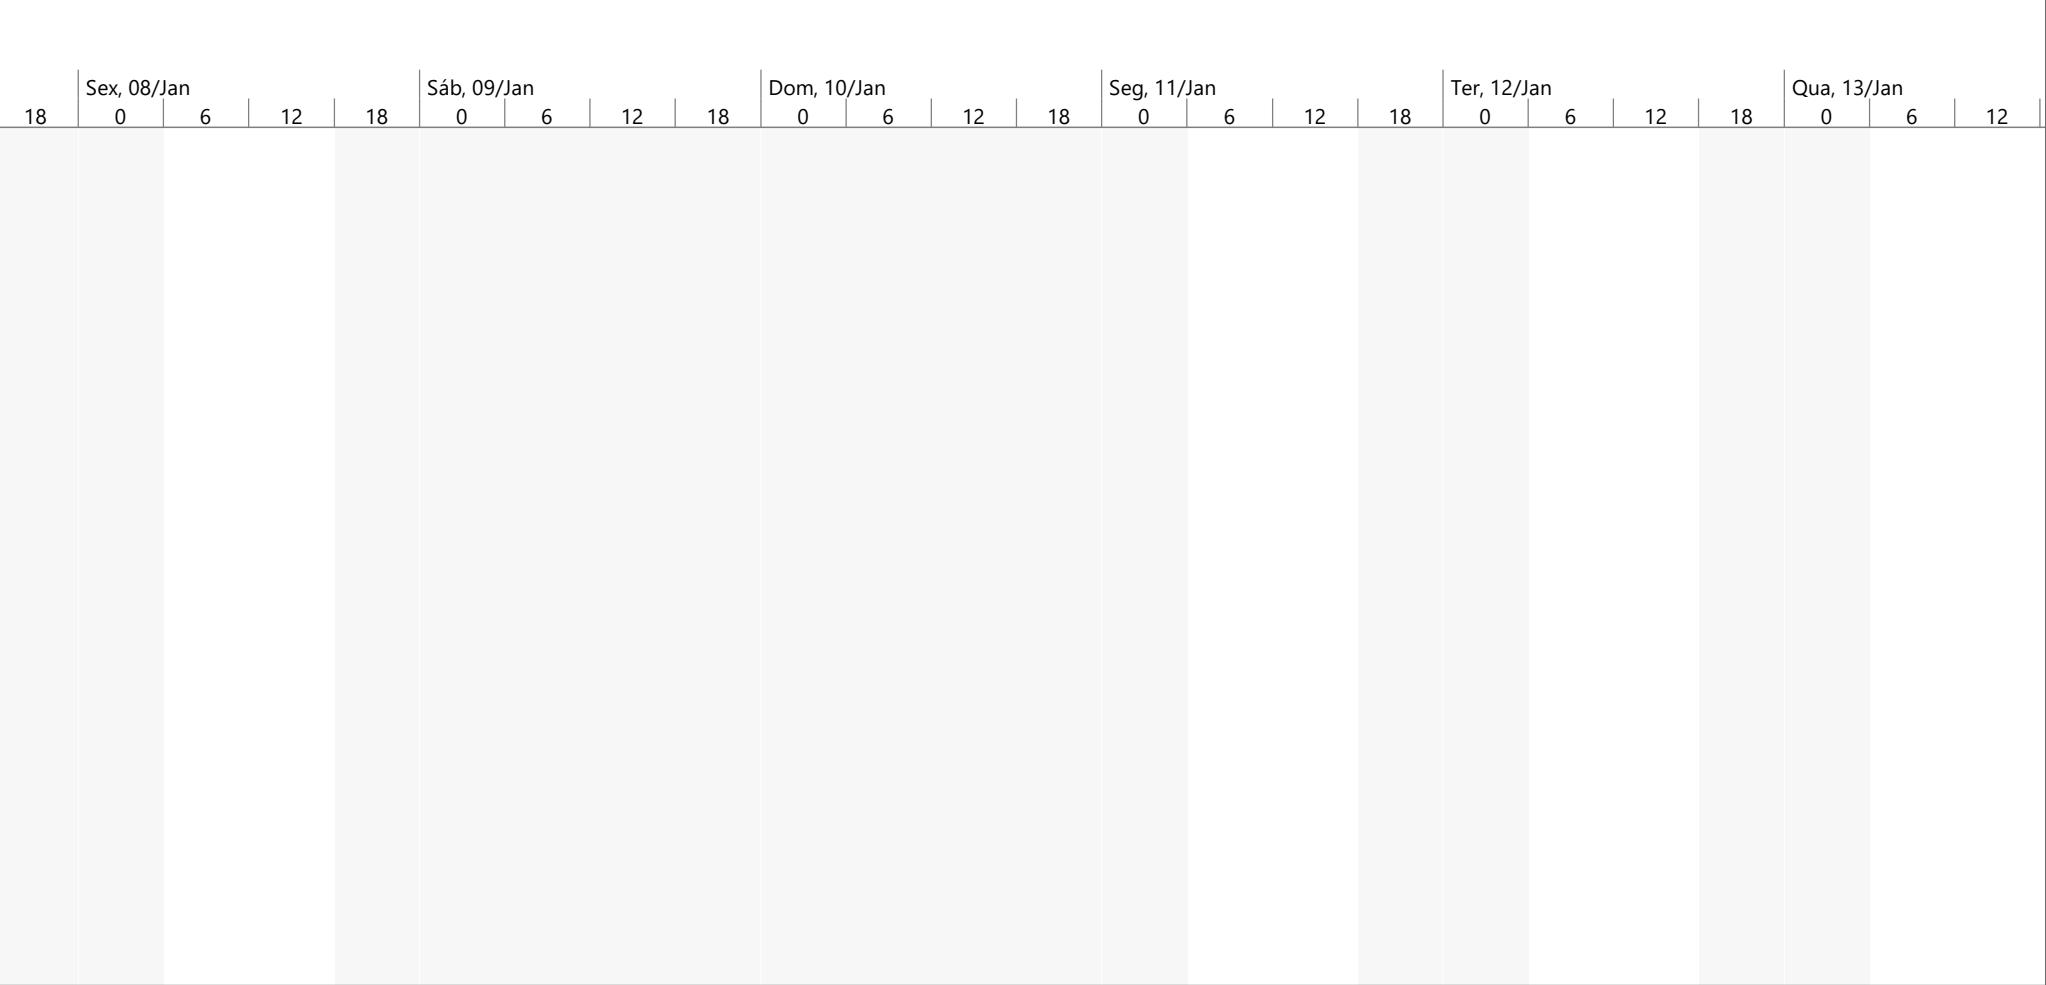


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

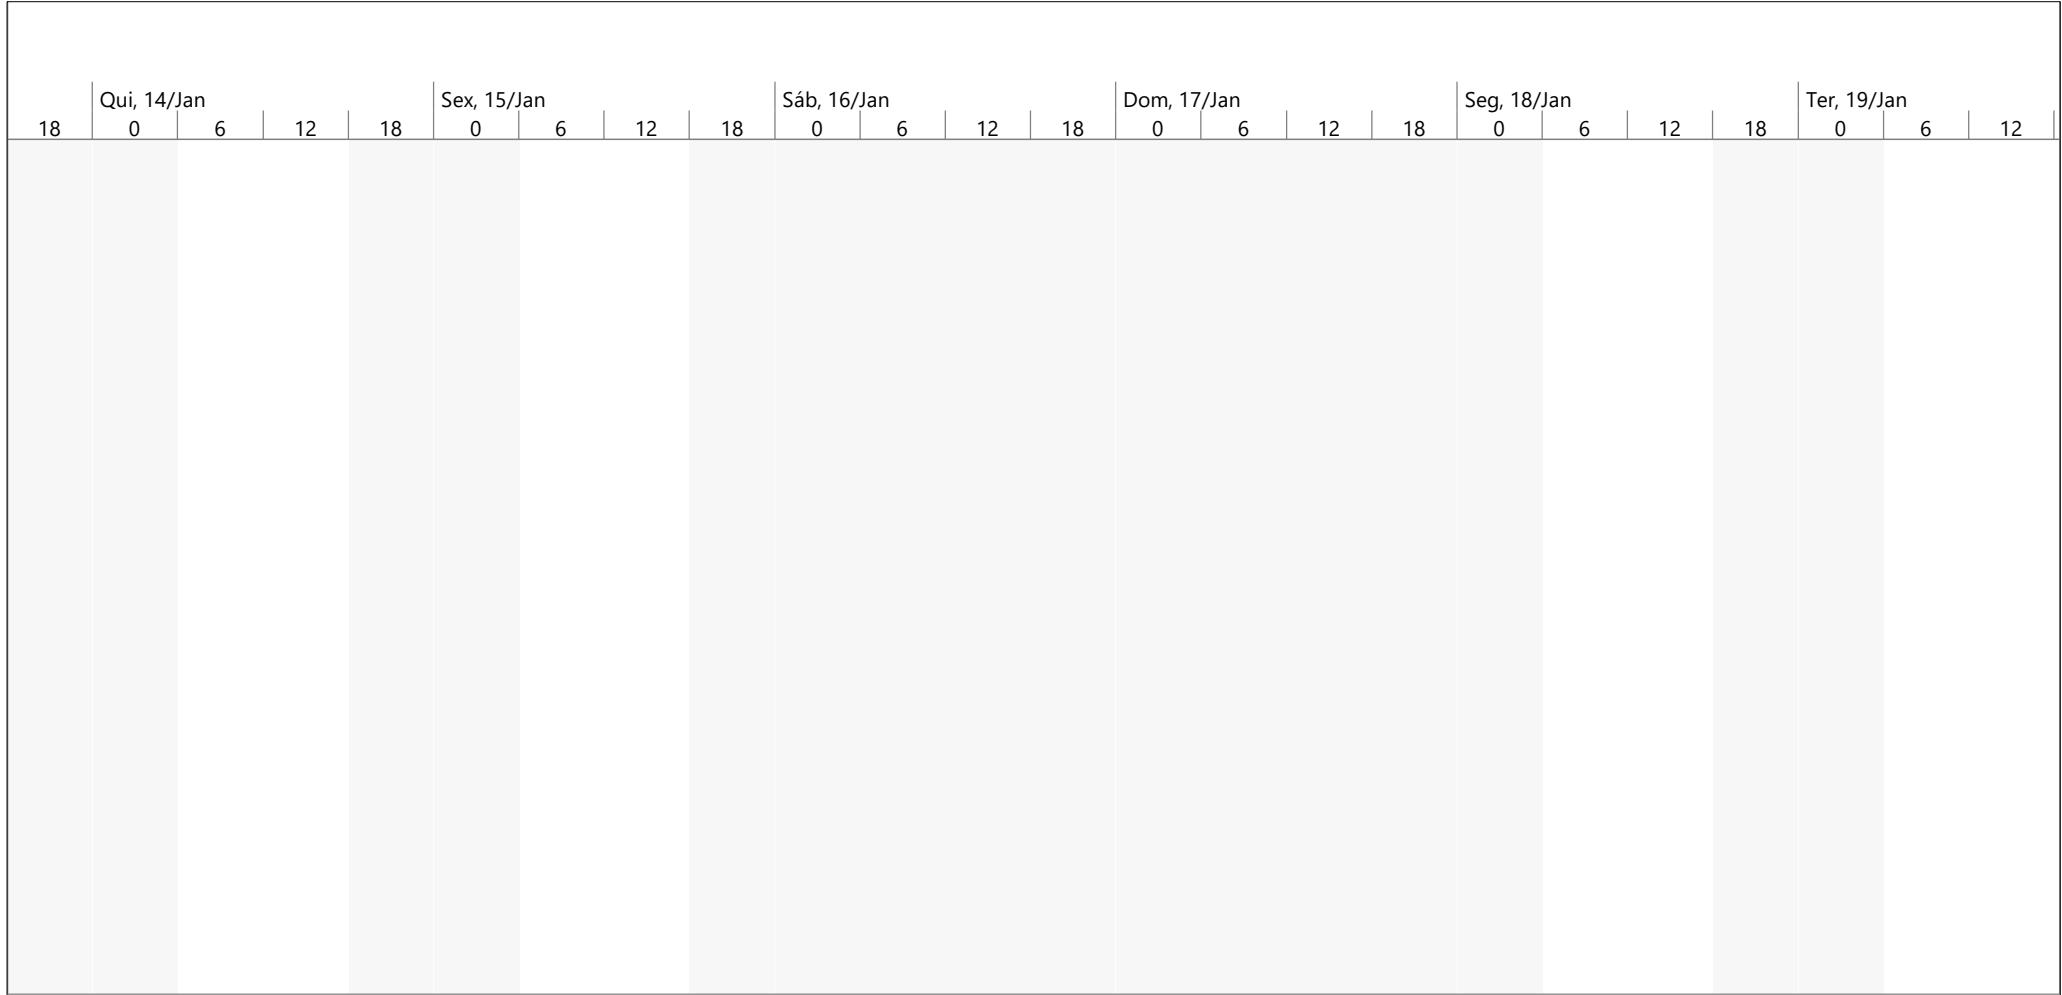

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

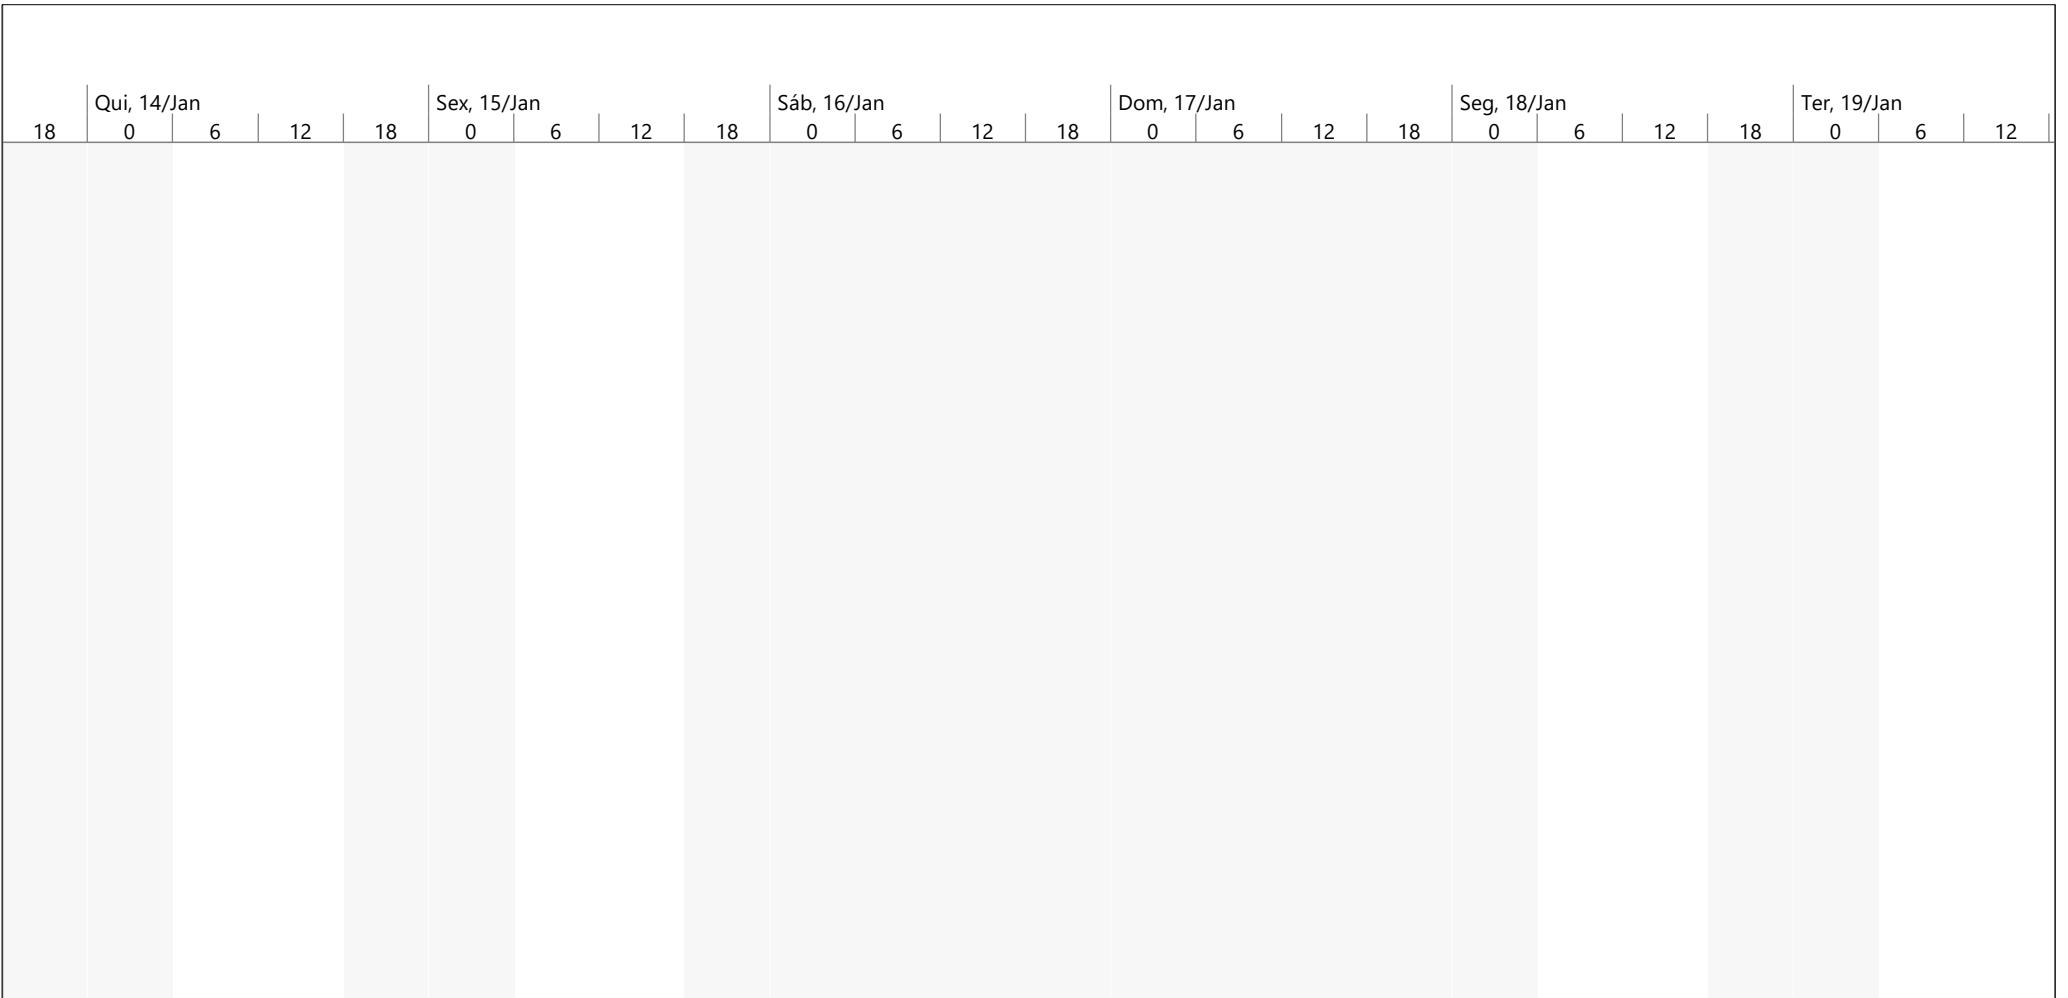


Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			


18	Qui, 14/Jan	0	6	12	18	Sex, 15/Jan	0	6	12	18	Sáb, 16/Jan	0	6	12	18	Dom, 17/Jan	0	6	12	18	Seg, 18/Jan	0	6	12	18	Ter, 19/Jan	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

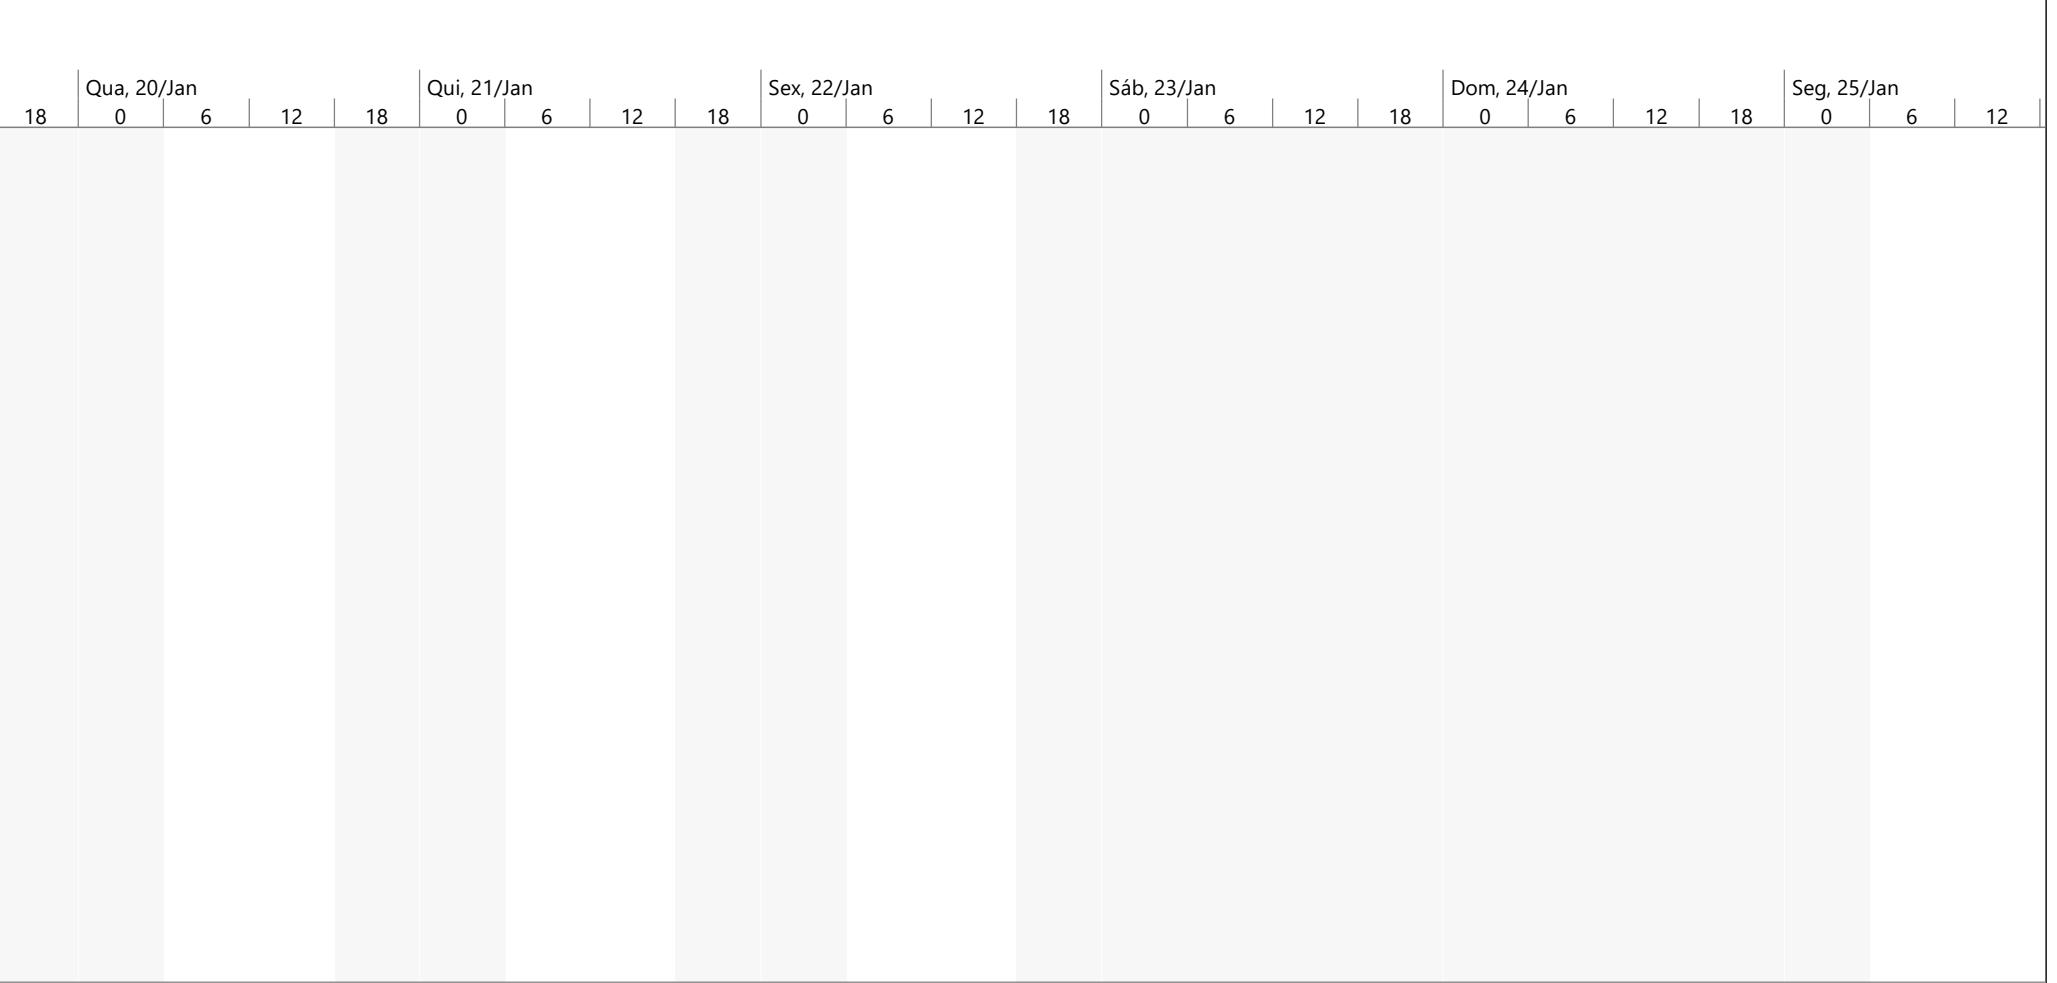


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

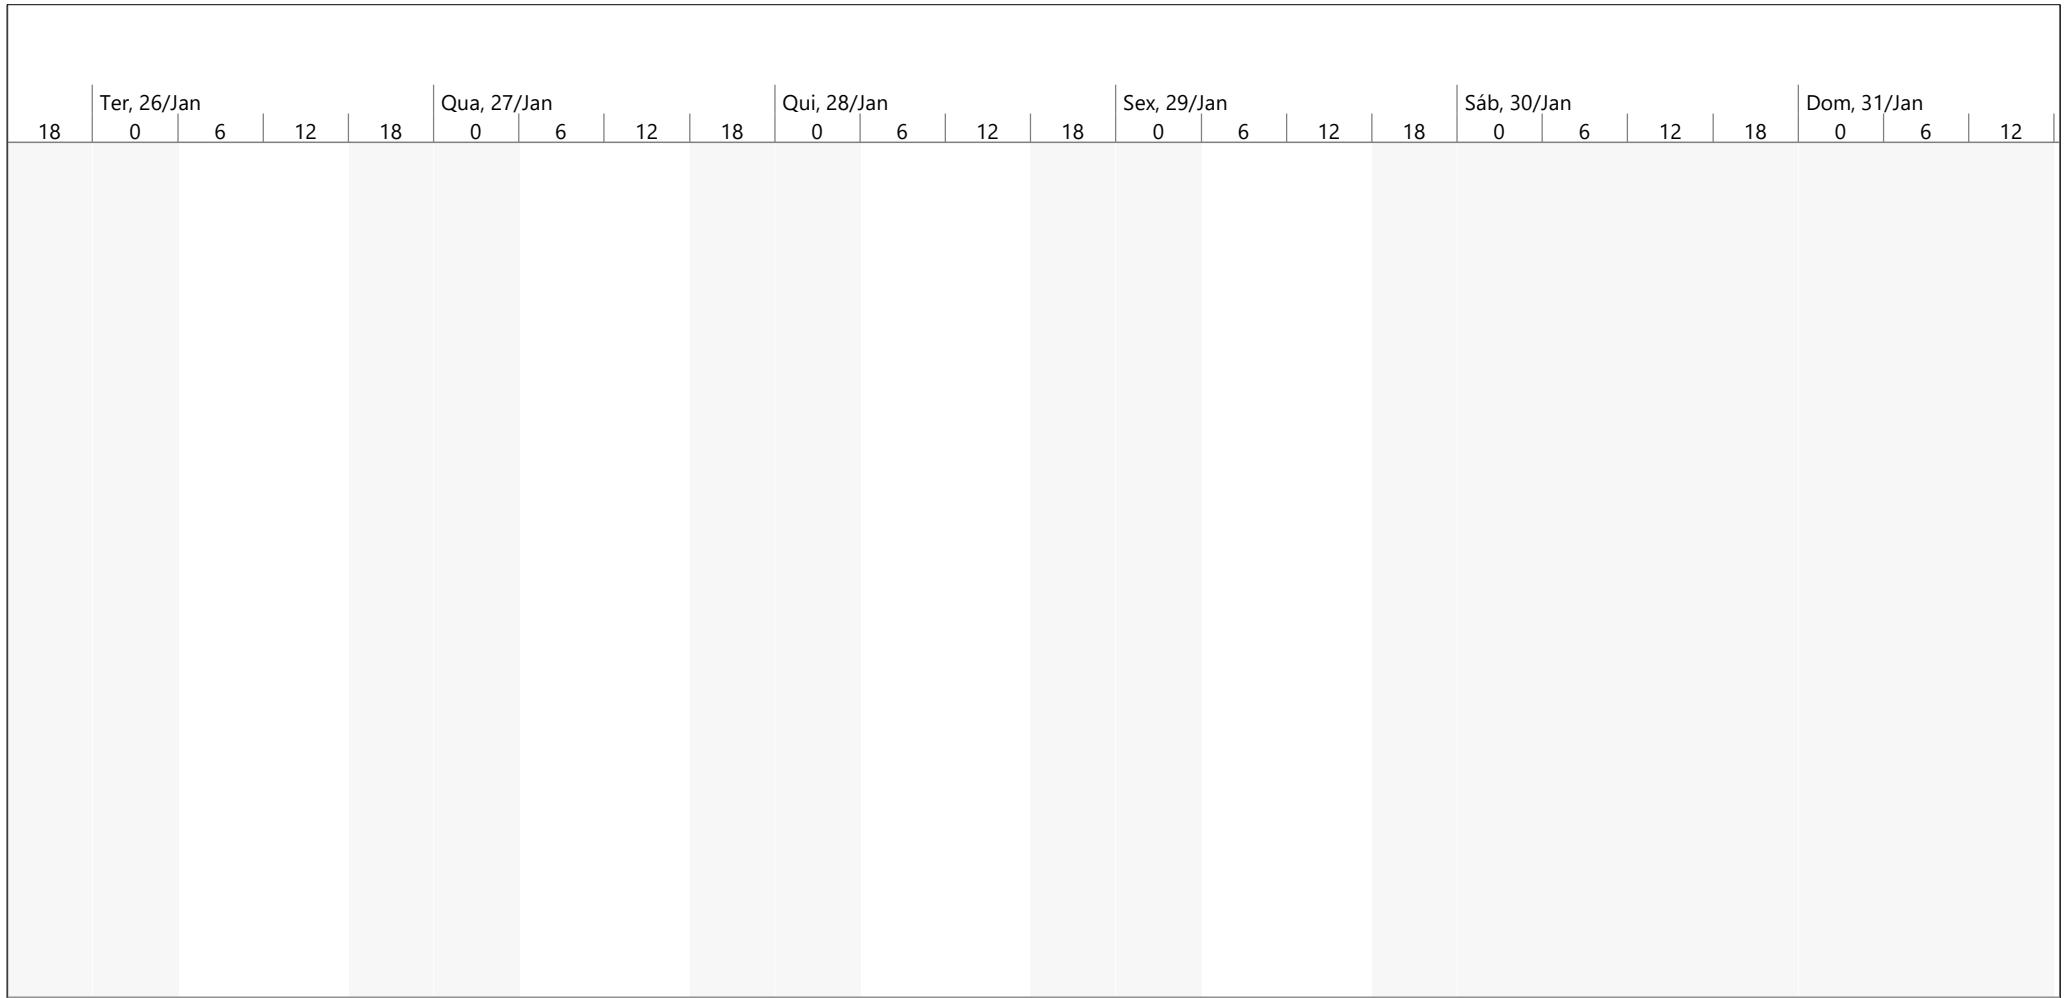


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

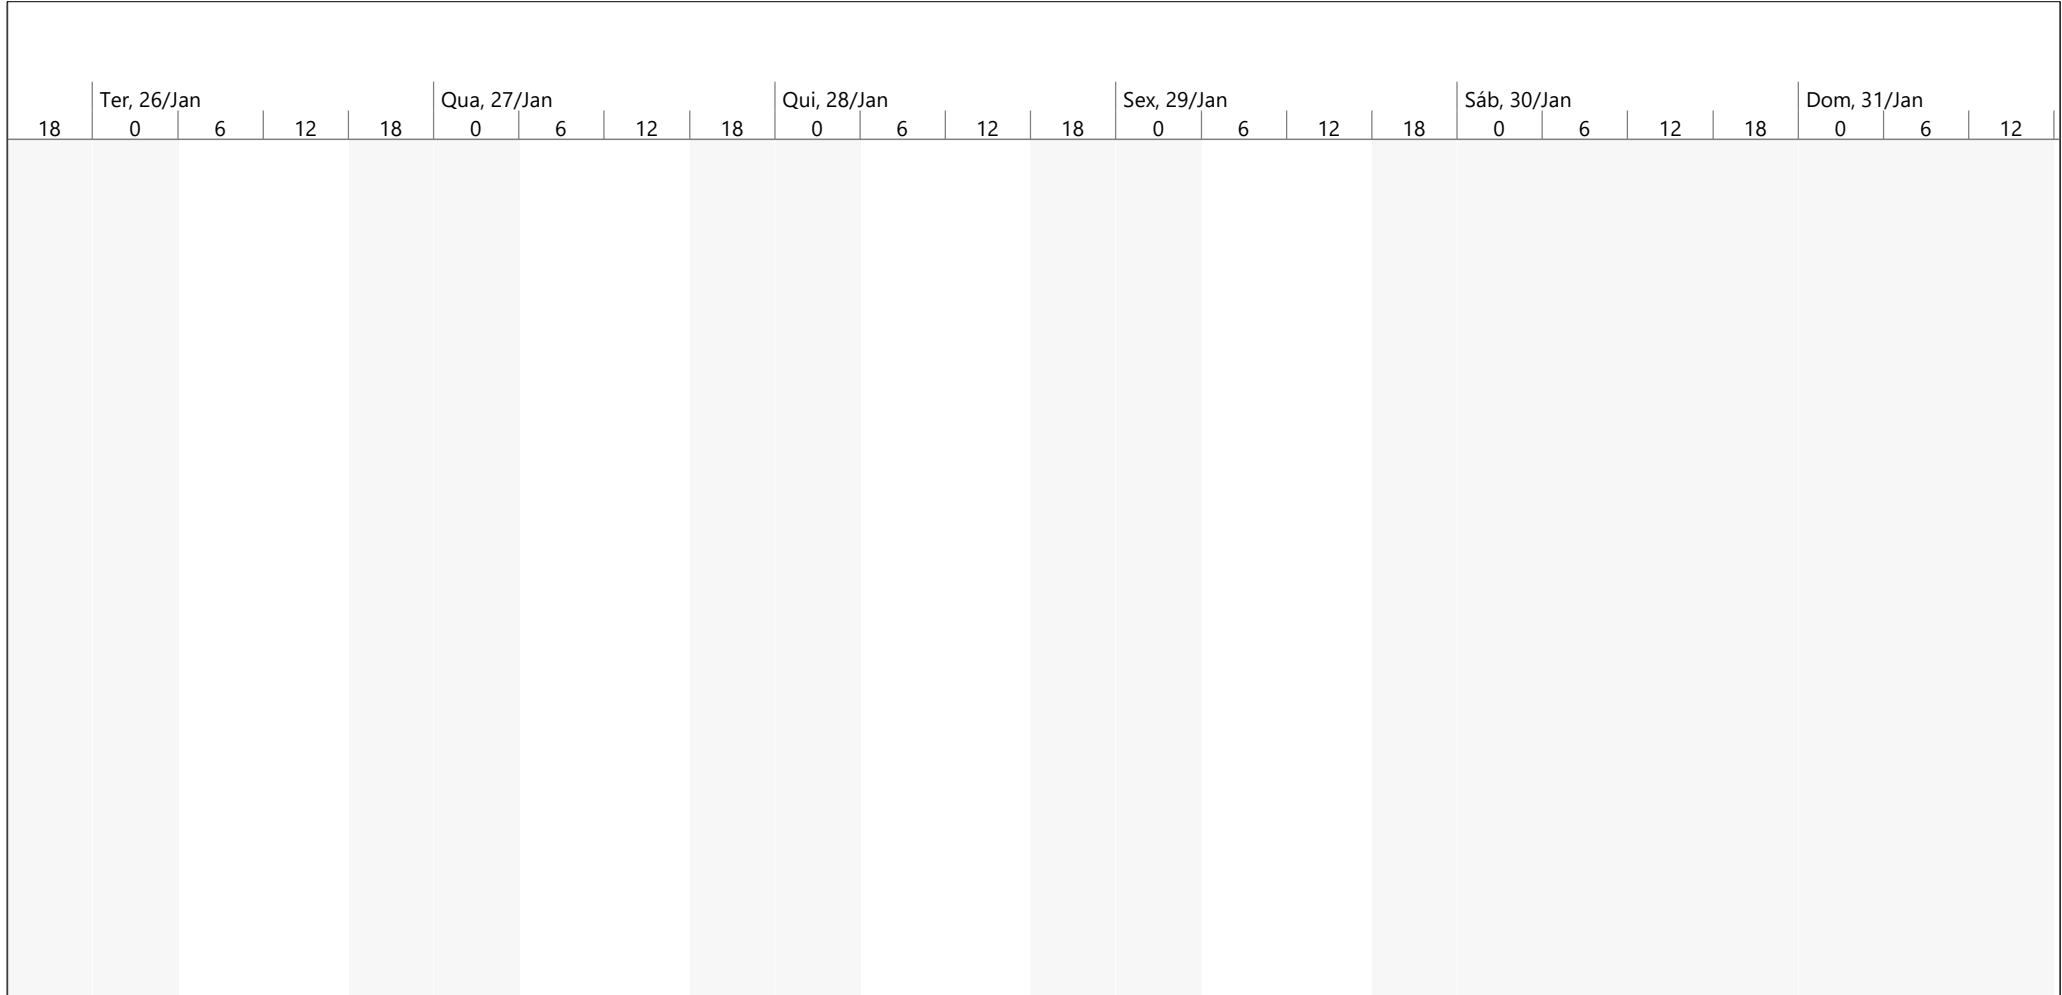


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

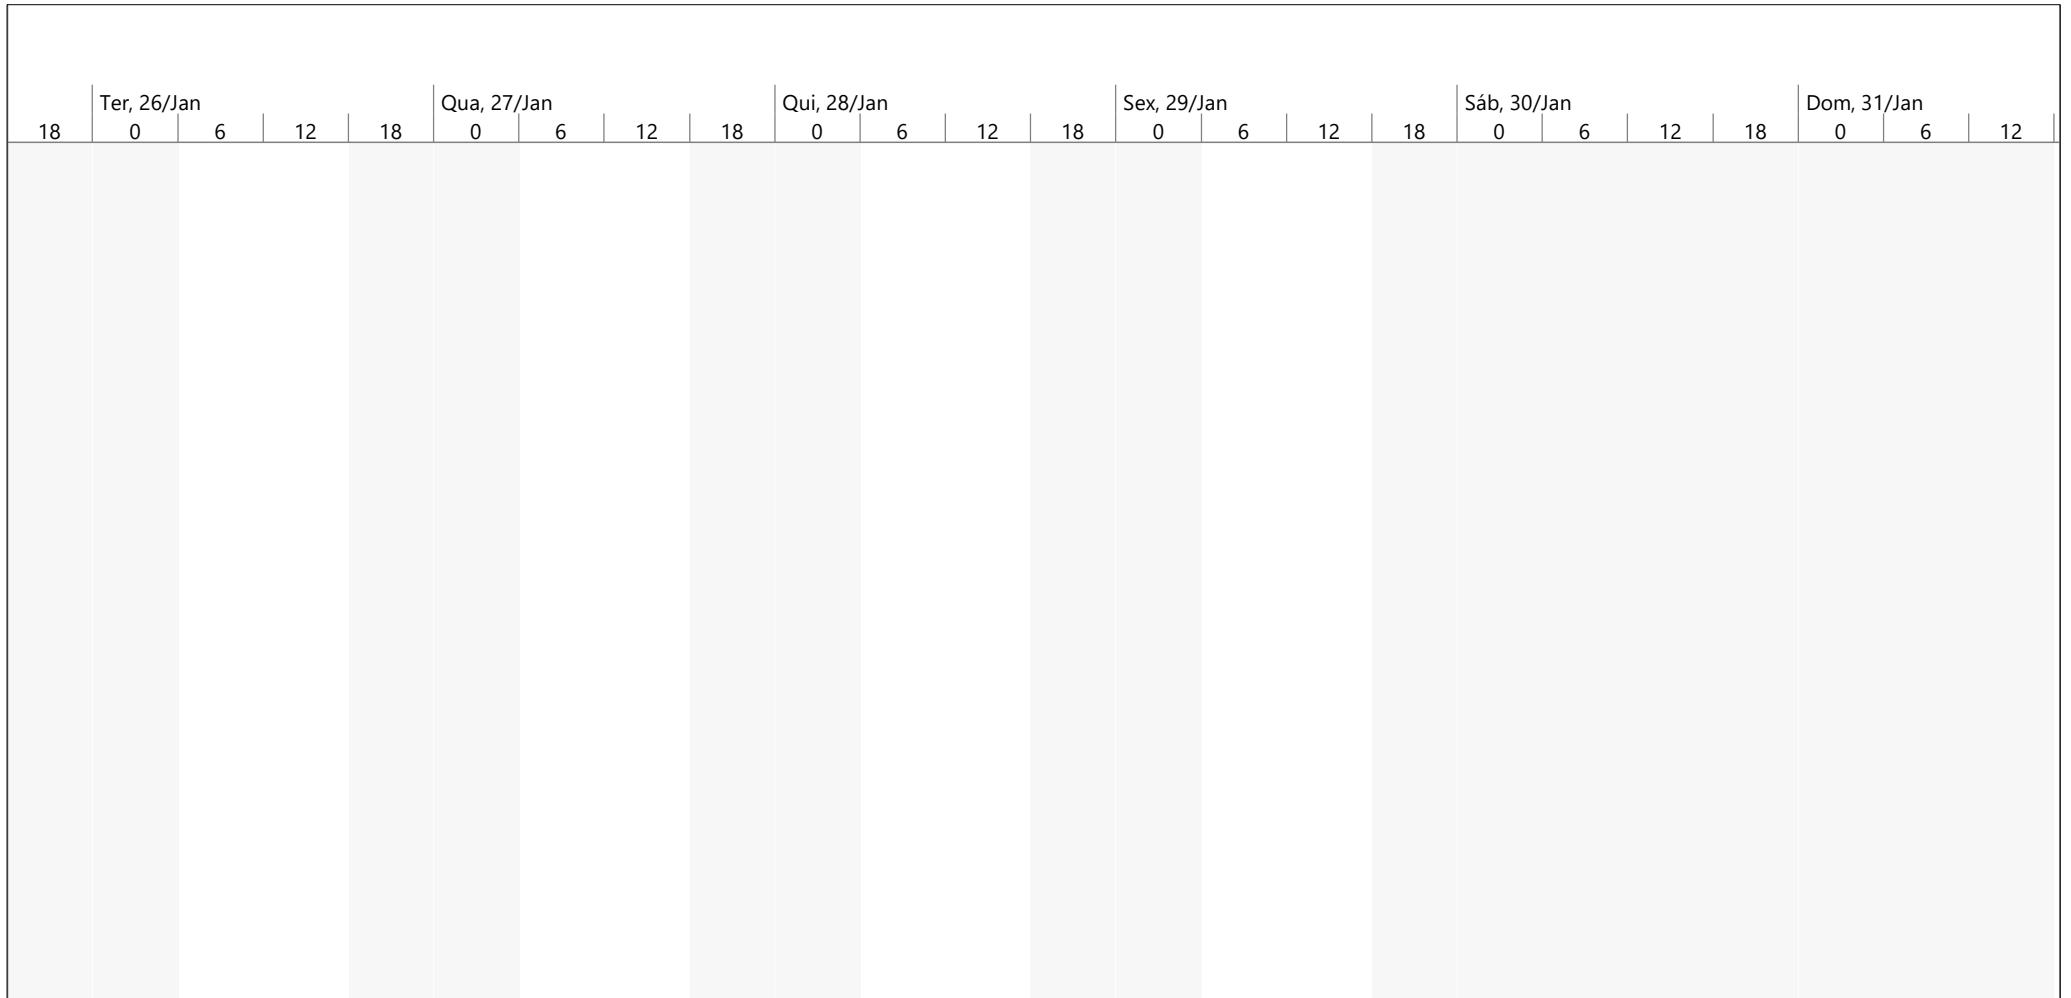


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

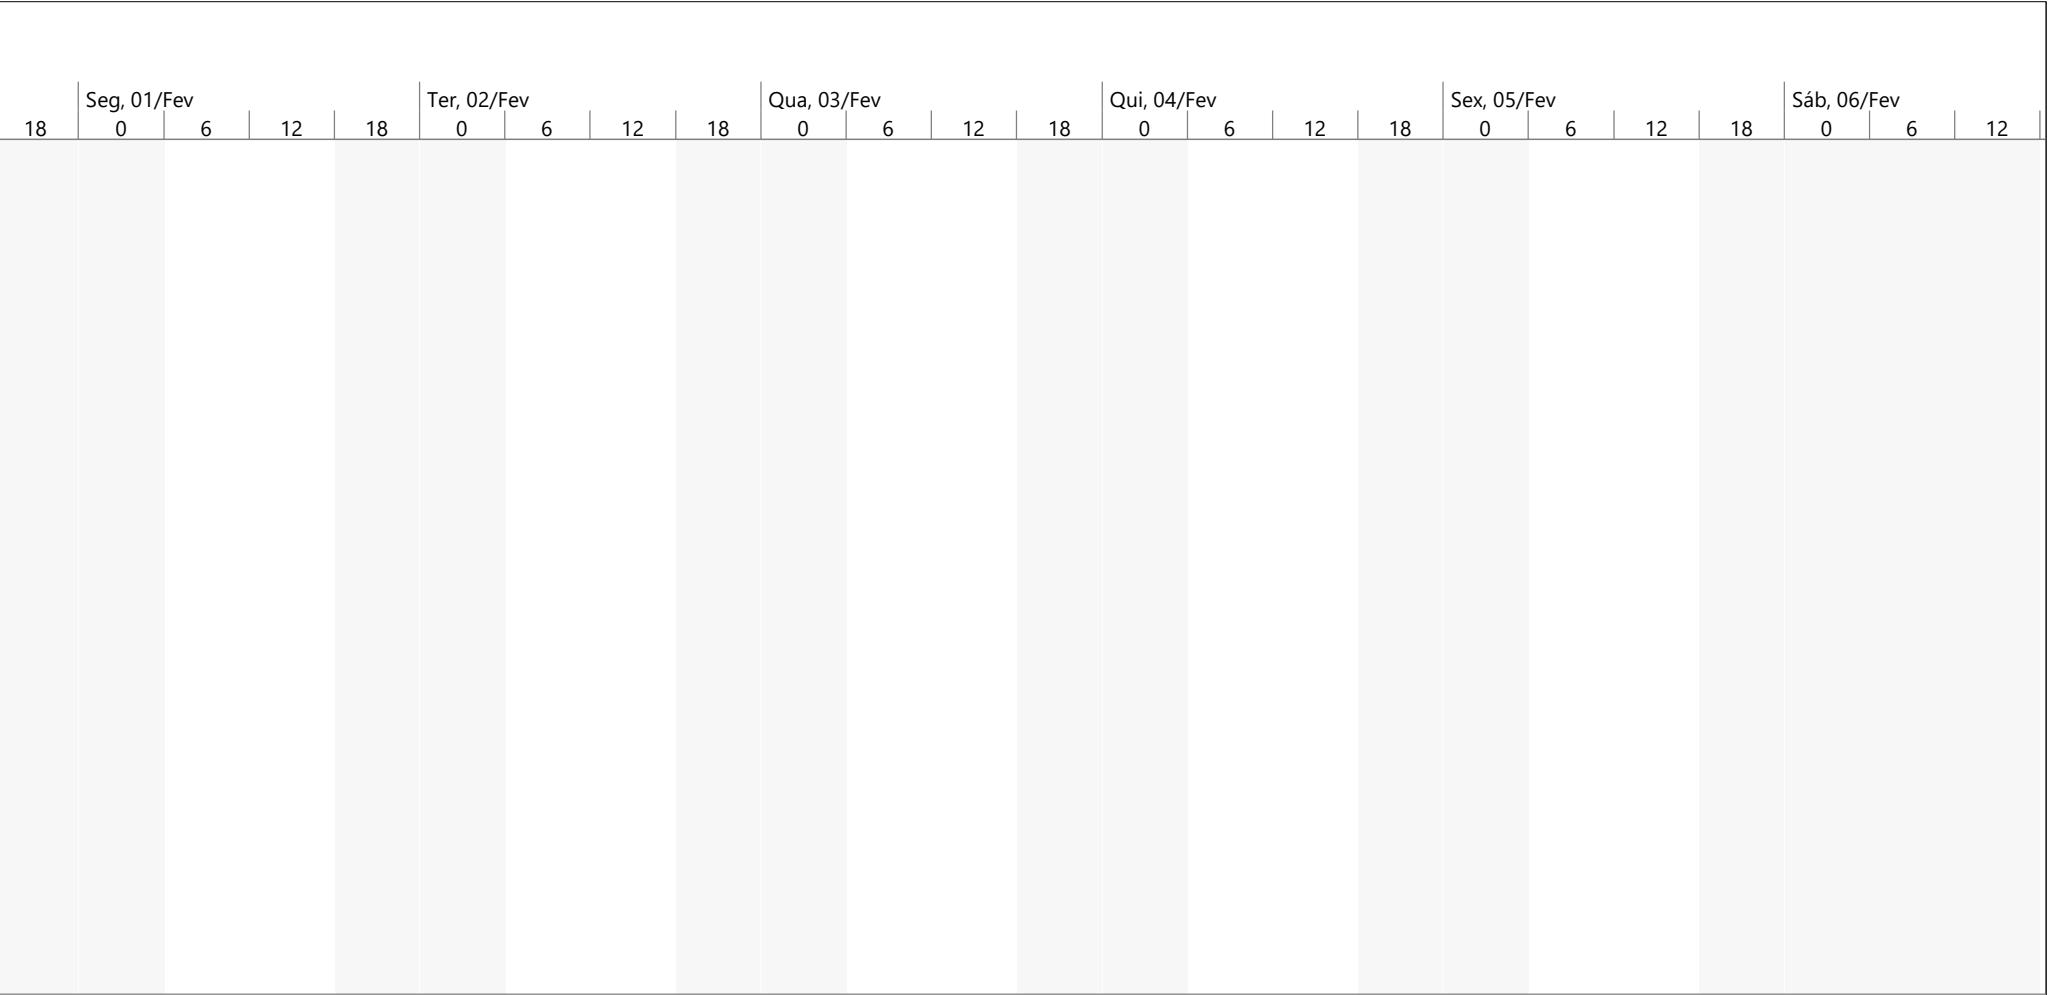


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

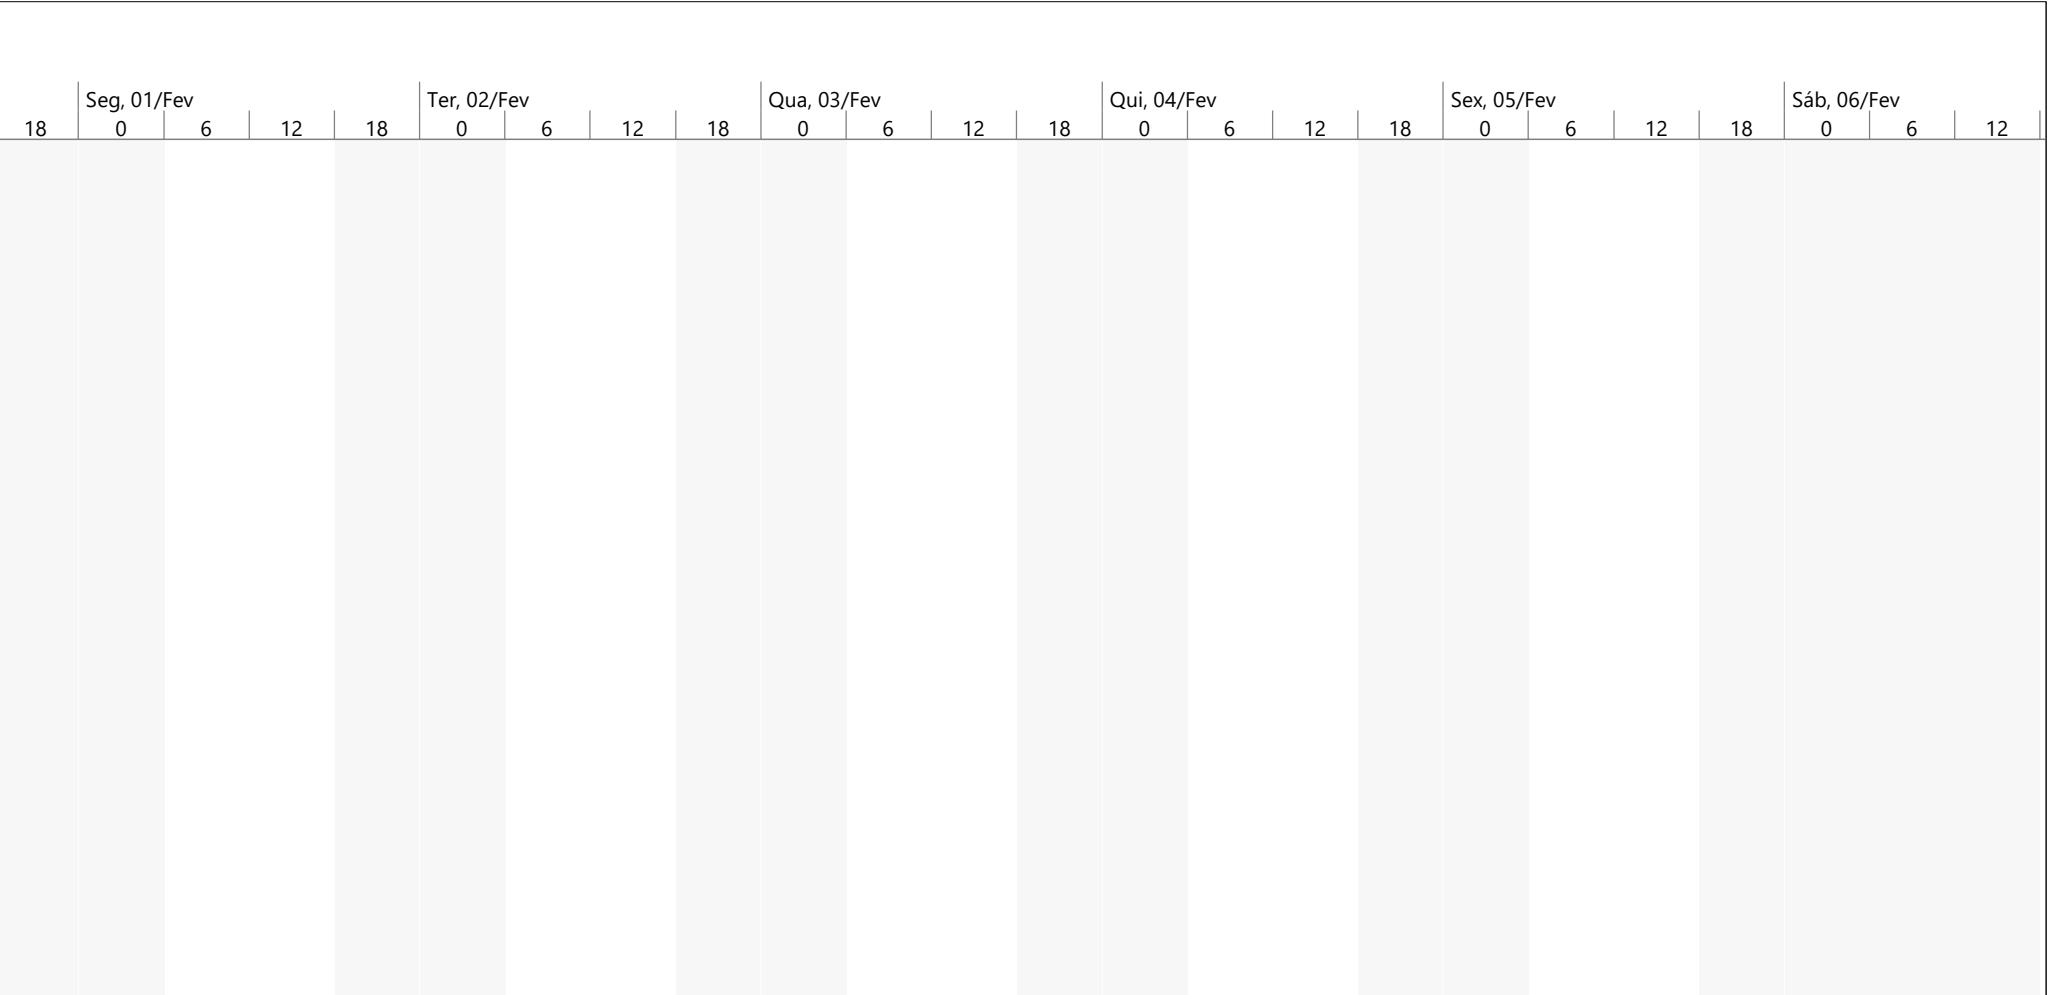


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

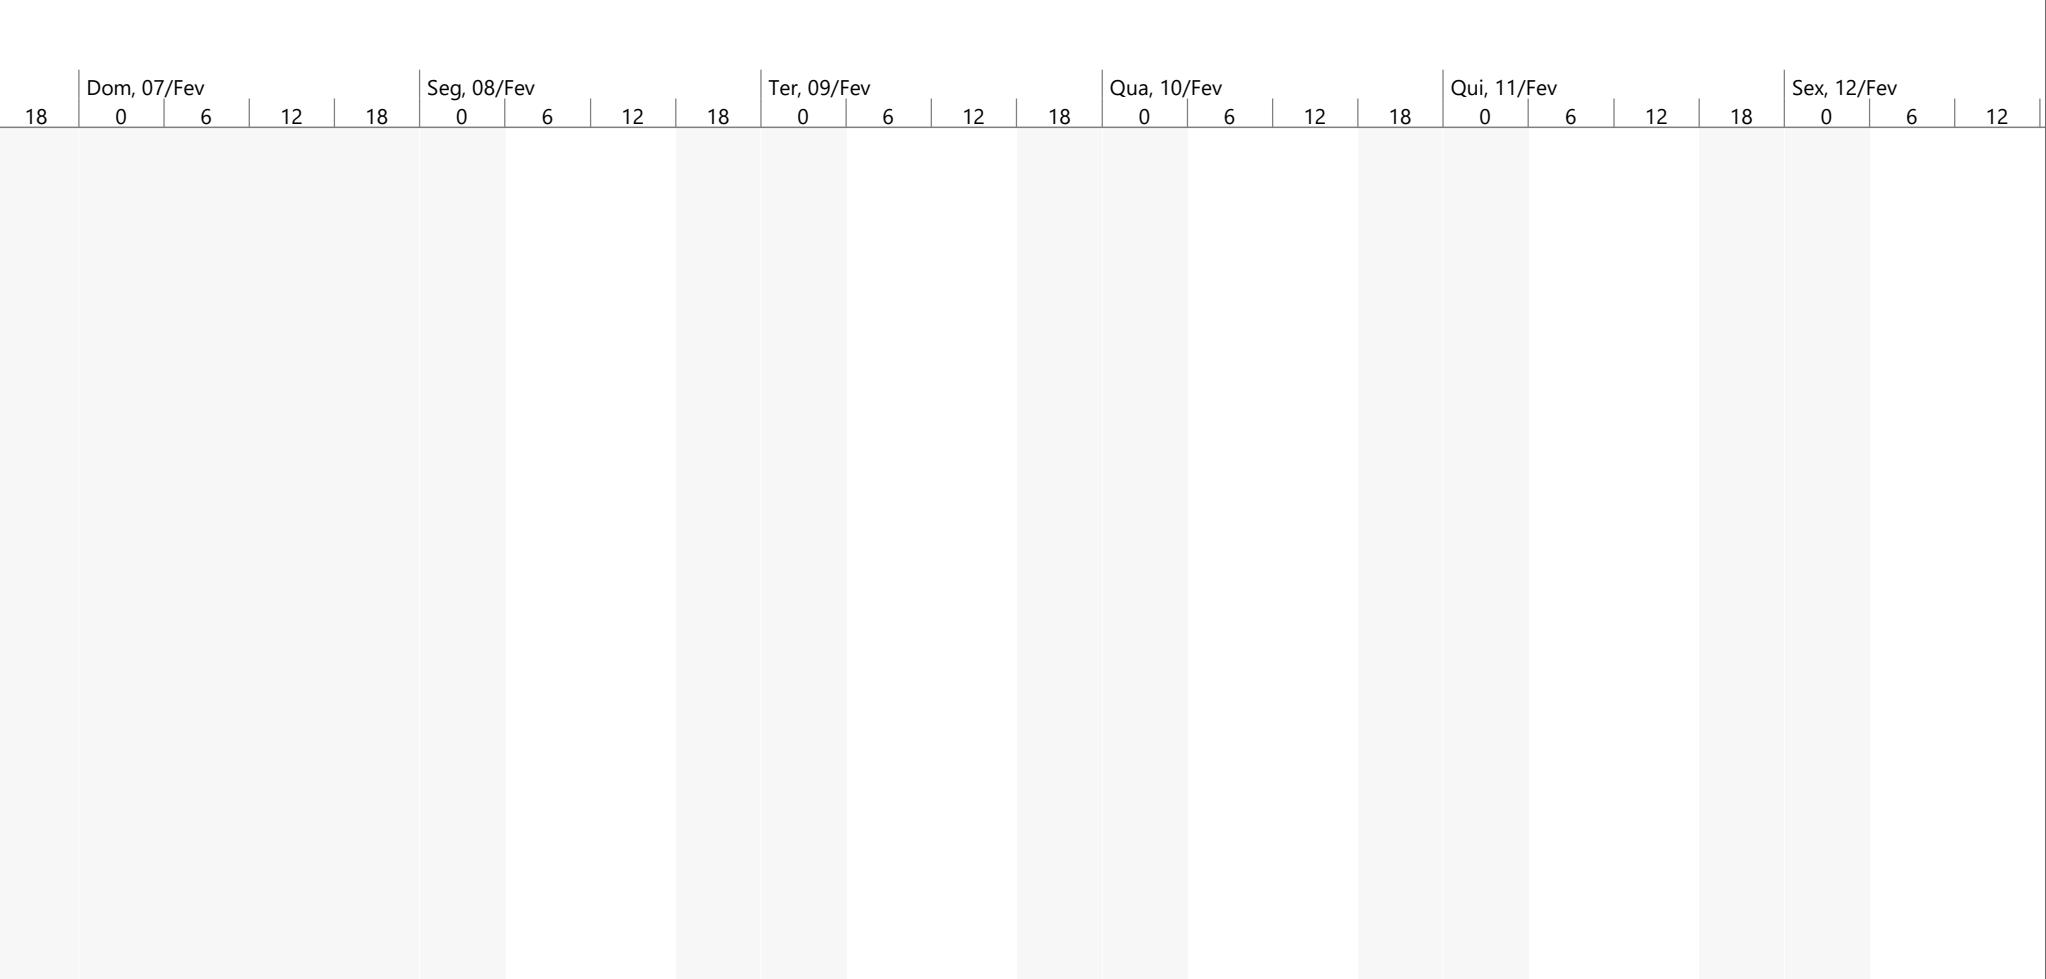


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

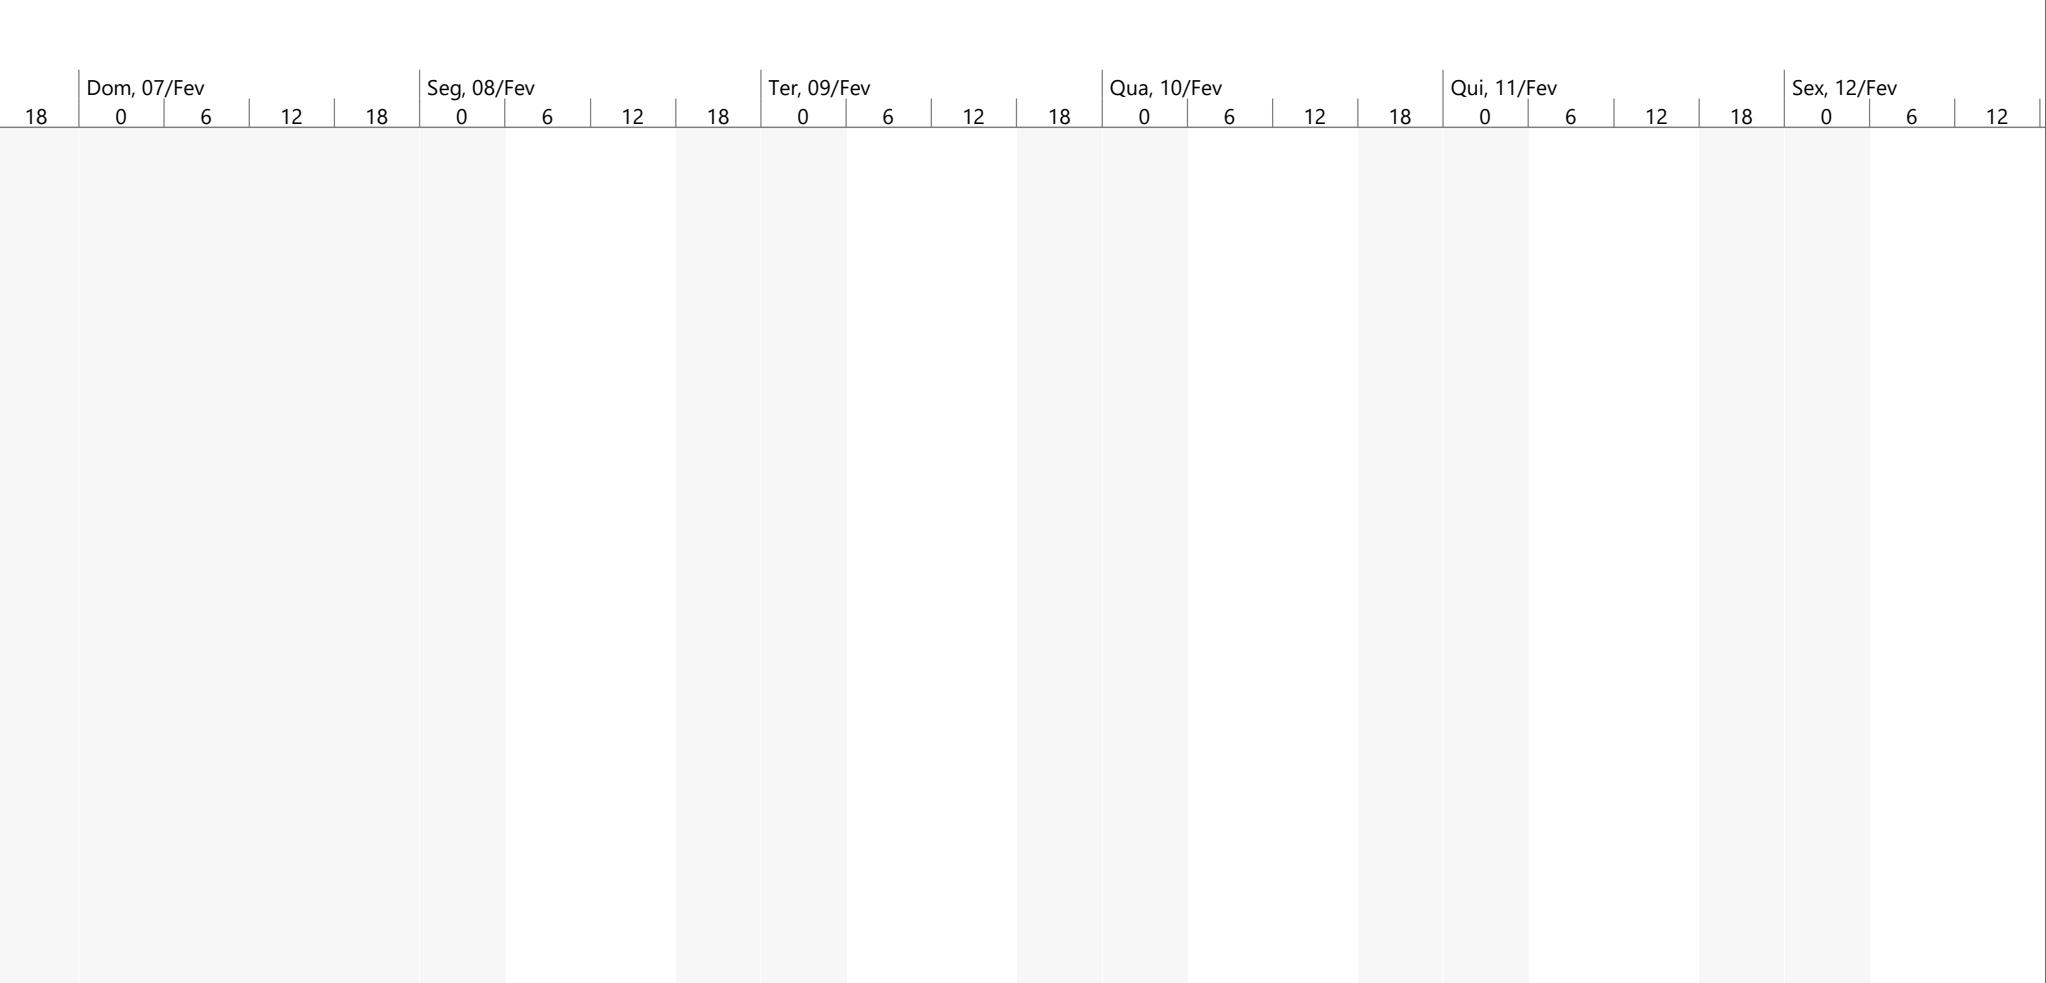

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

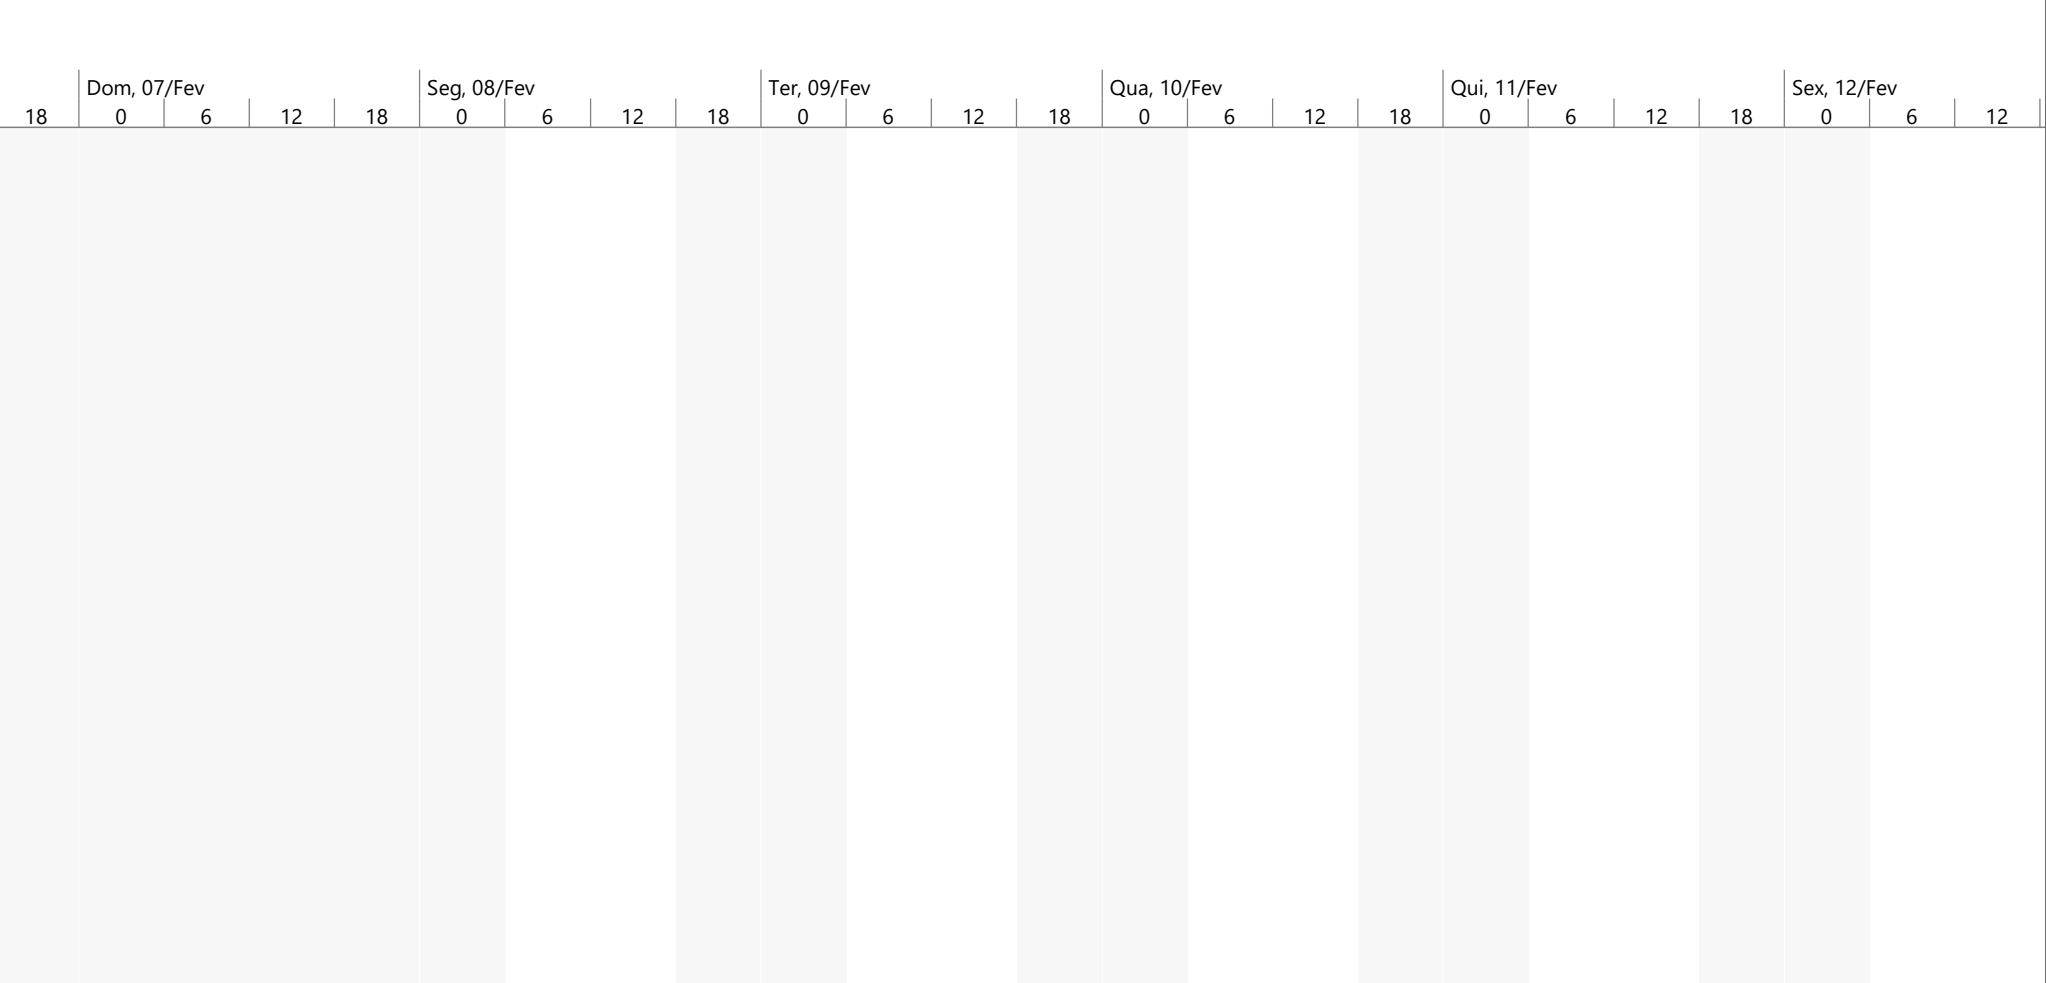

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

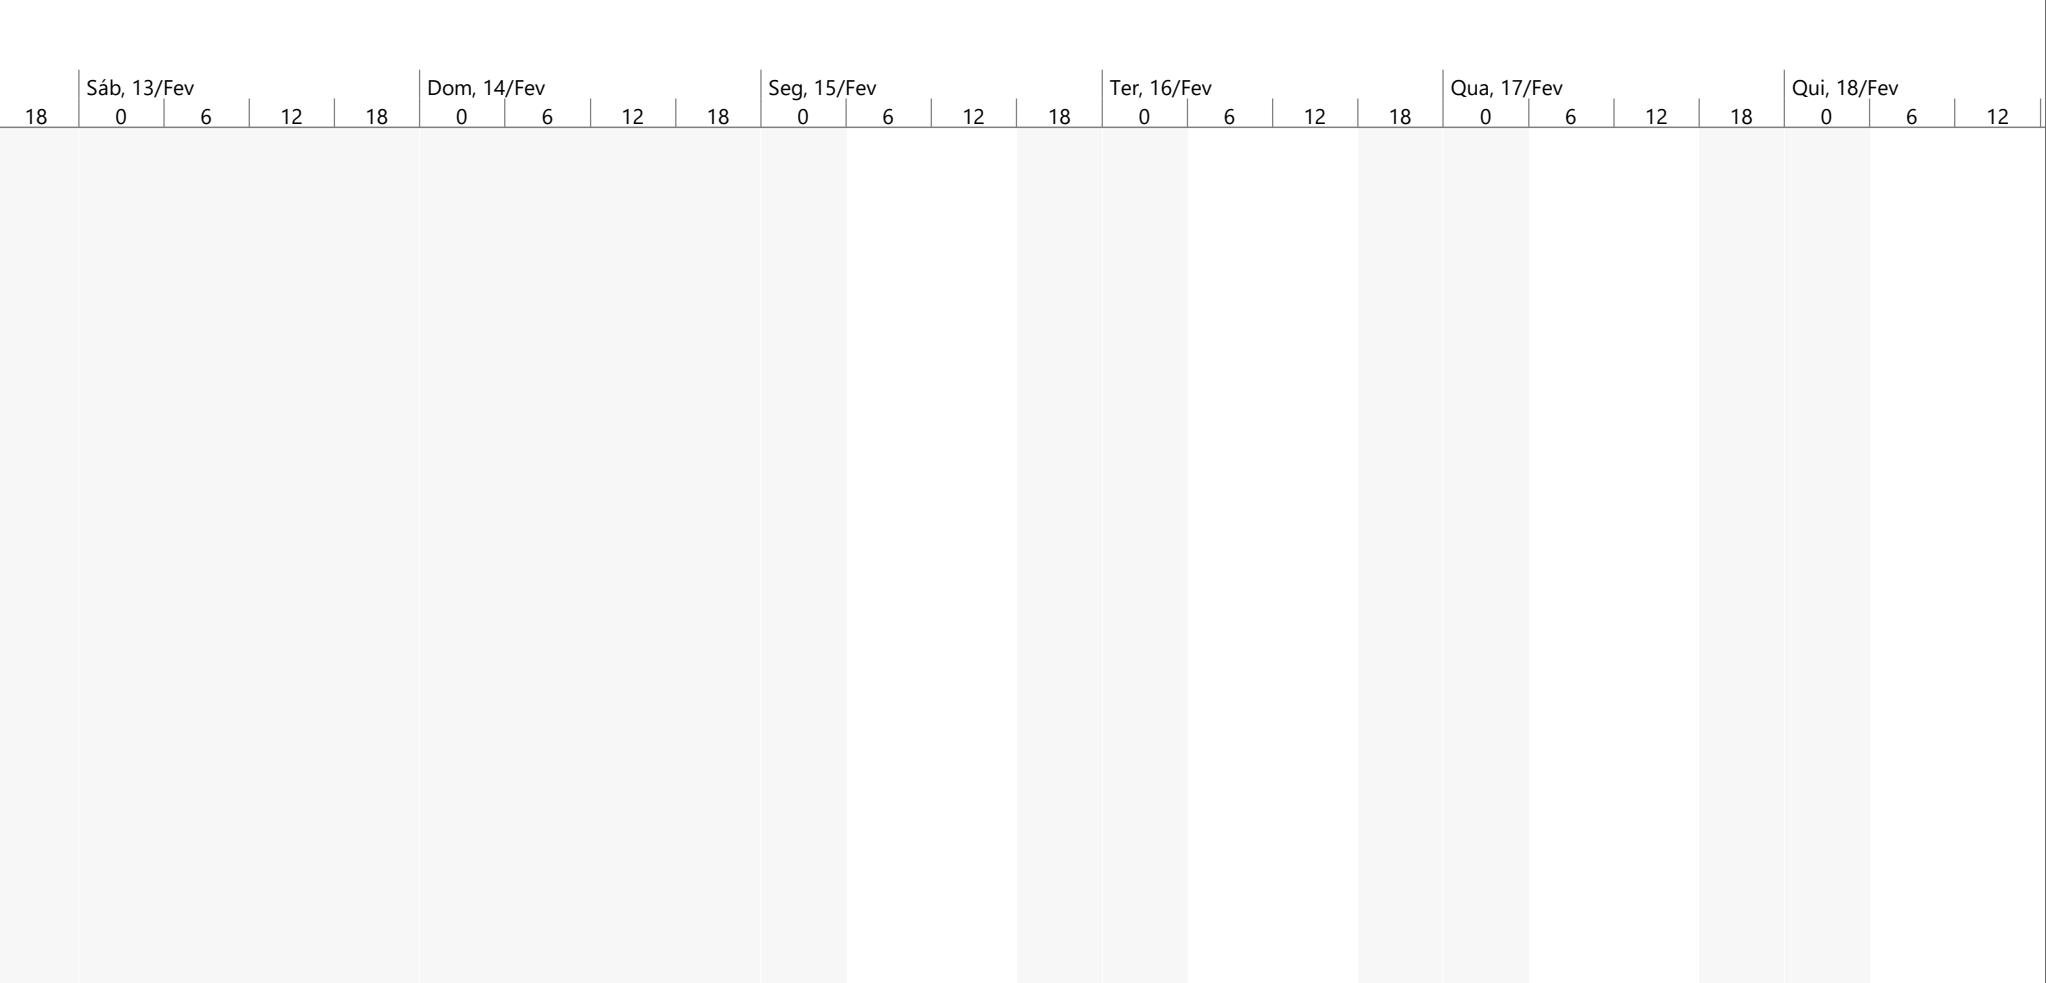


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas	
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo	
	Marco	Somente duração	Data limite	
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento	
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual	
	Tarefa Inativa	Somente início		
	Marco Inativo	Somente término		

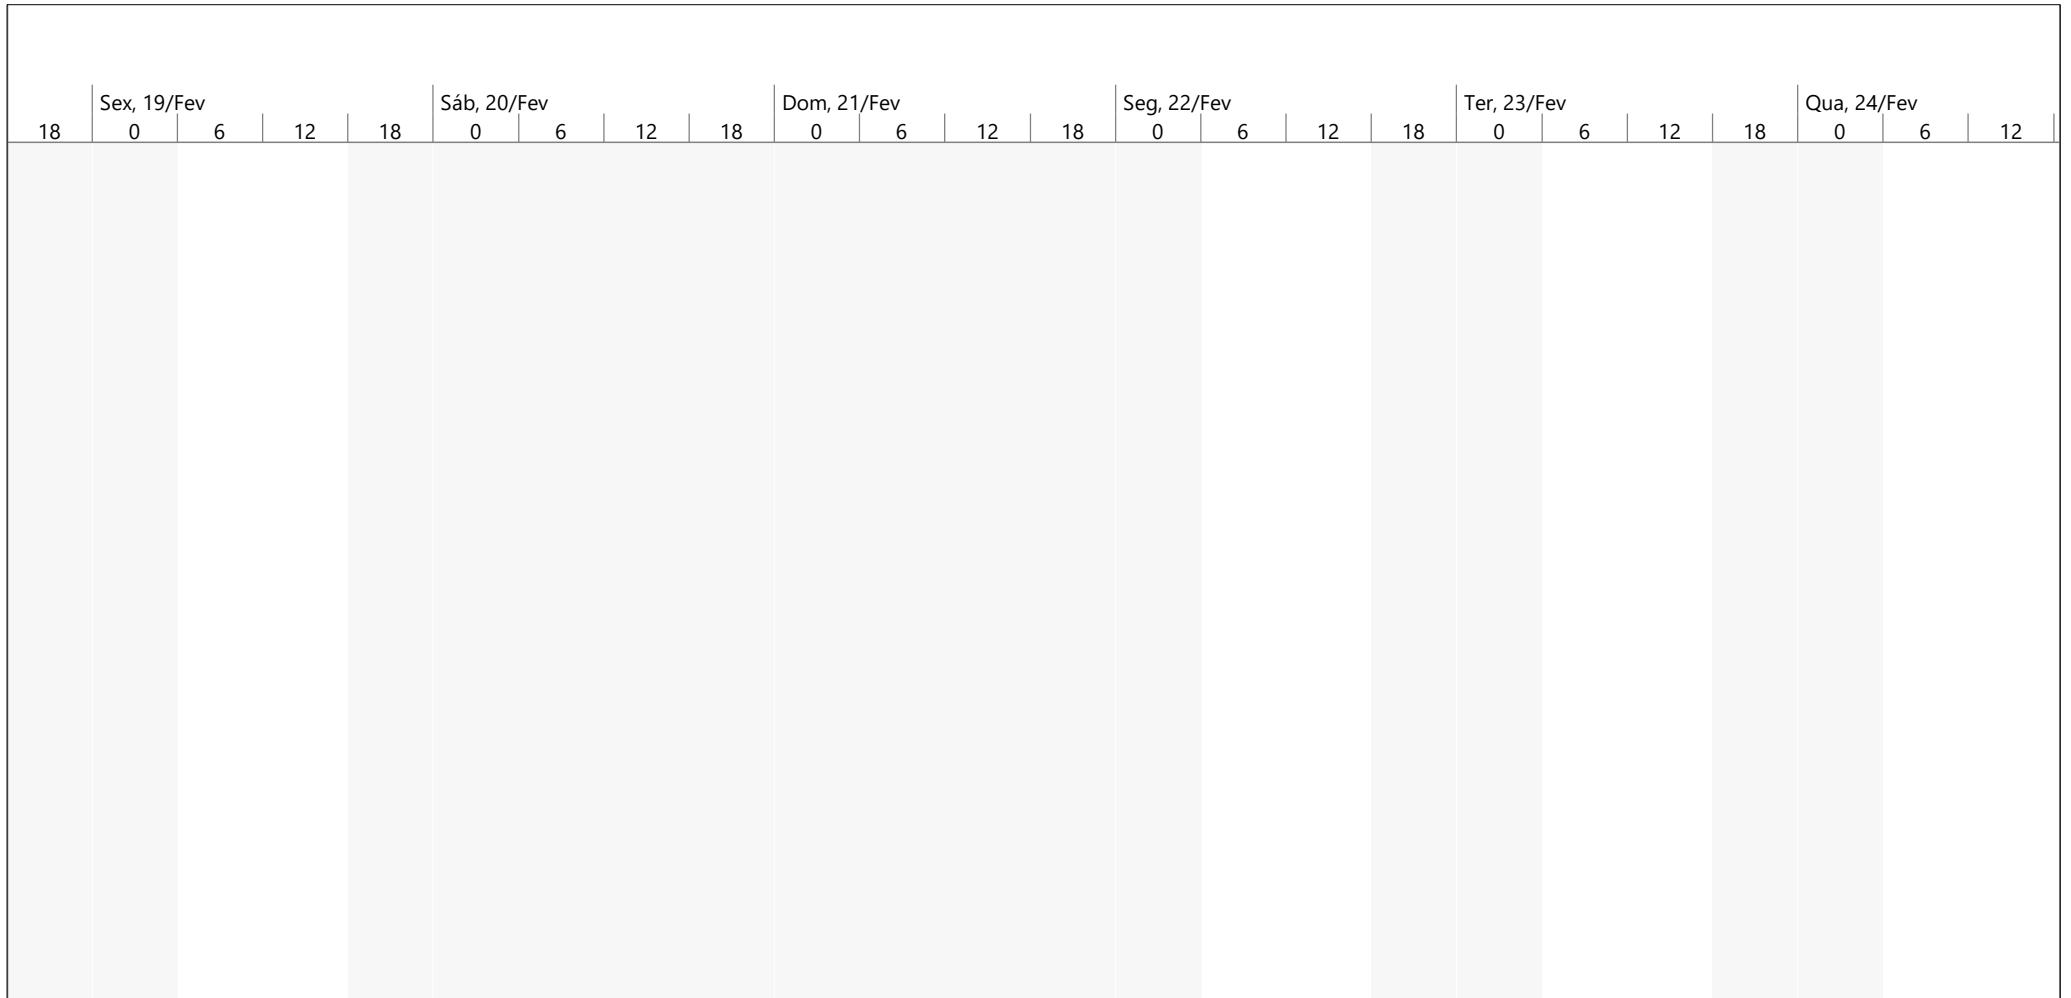


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

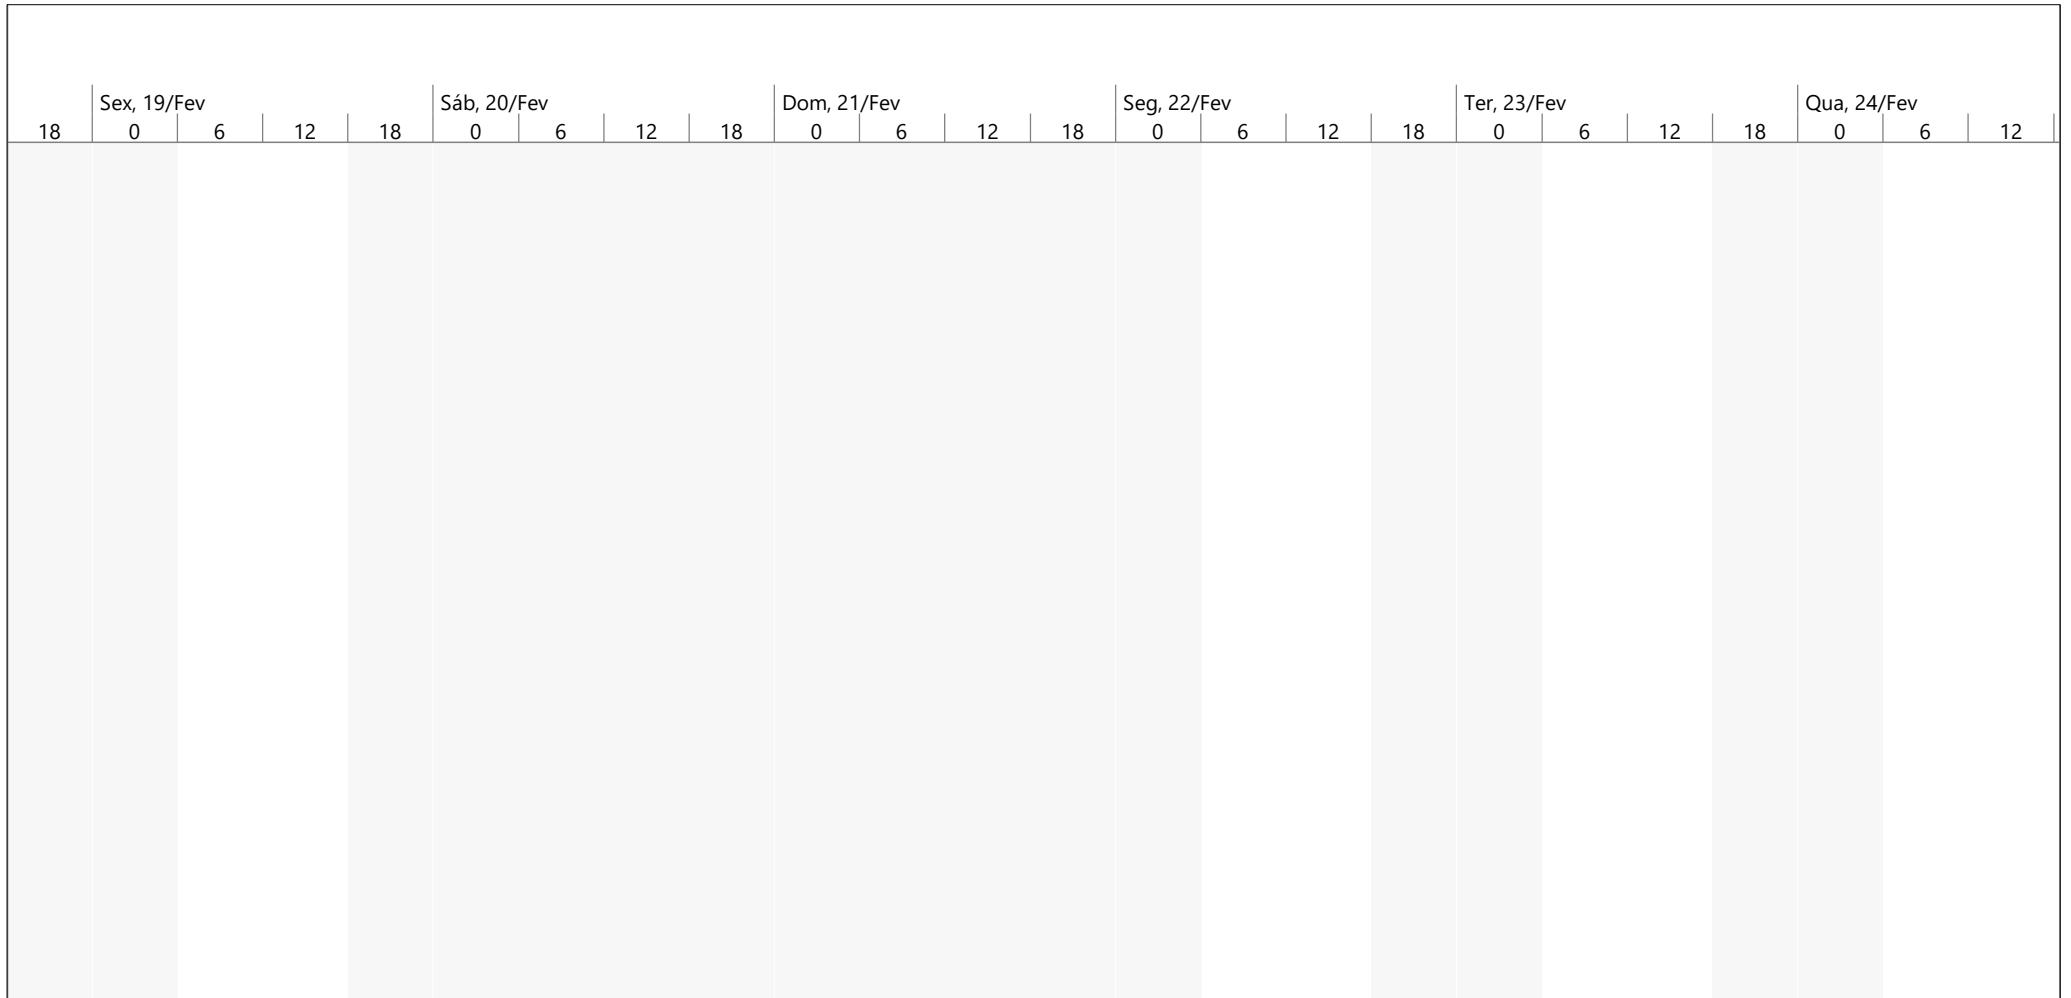

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

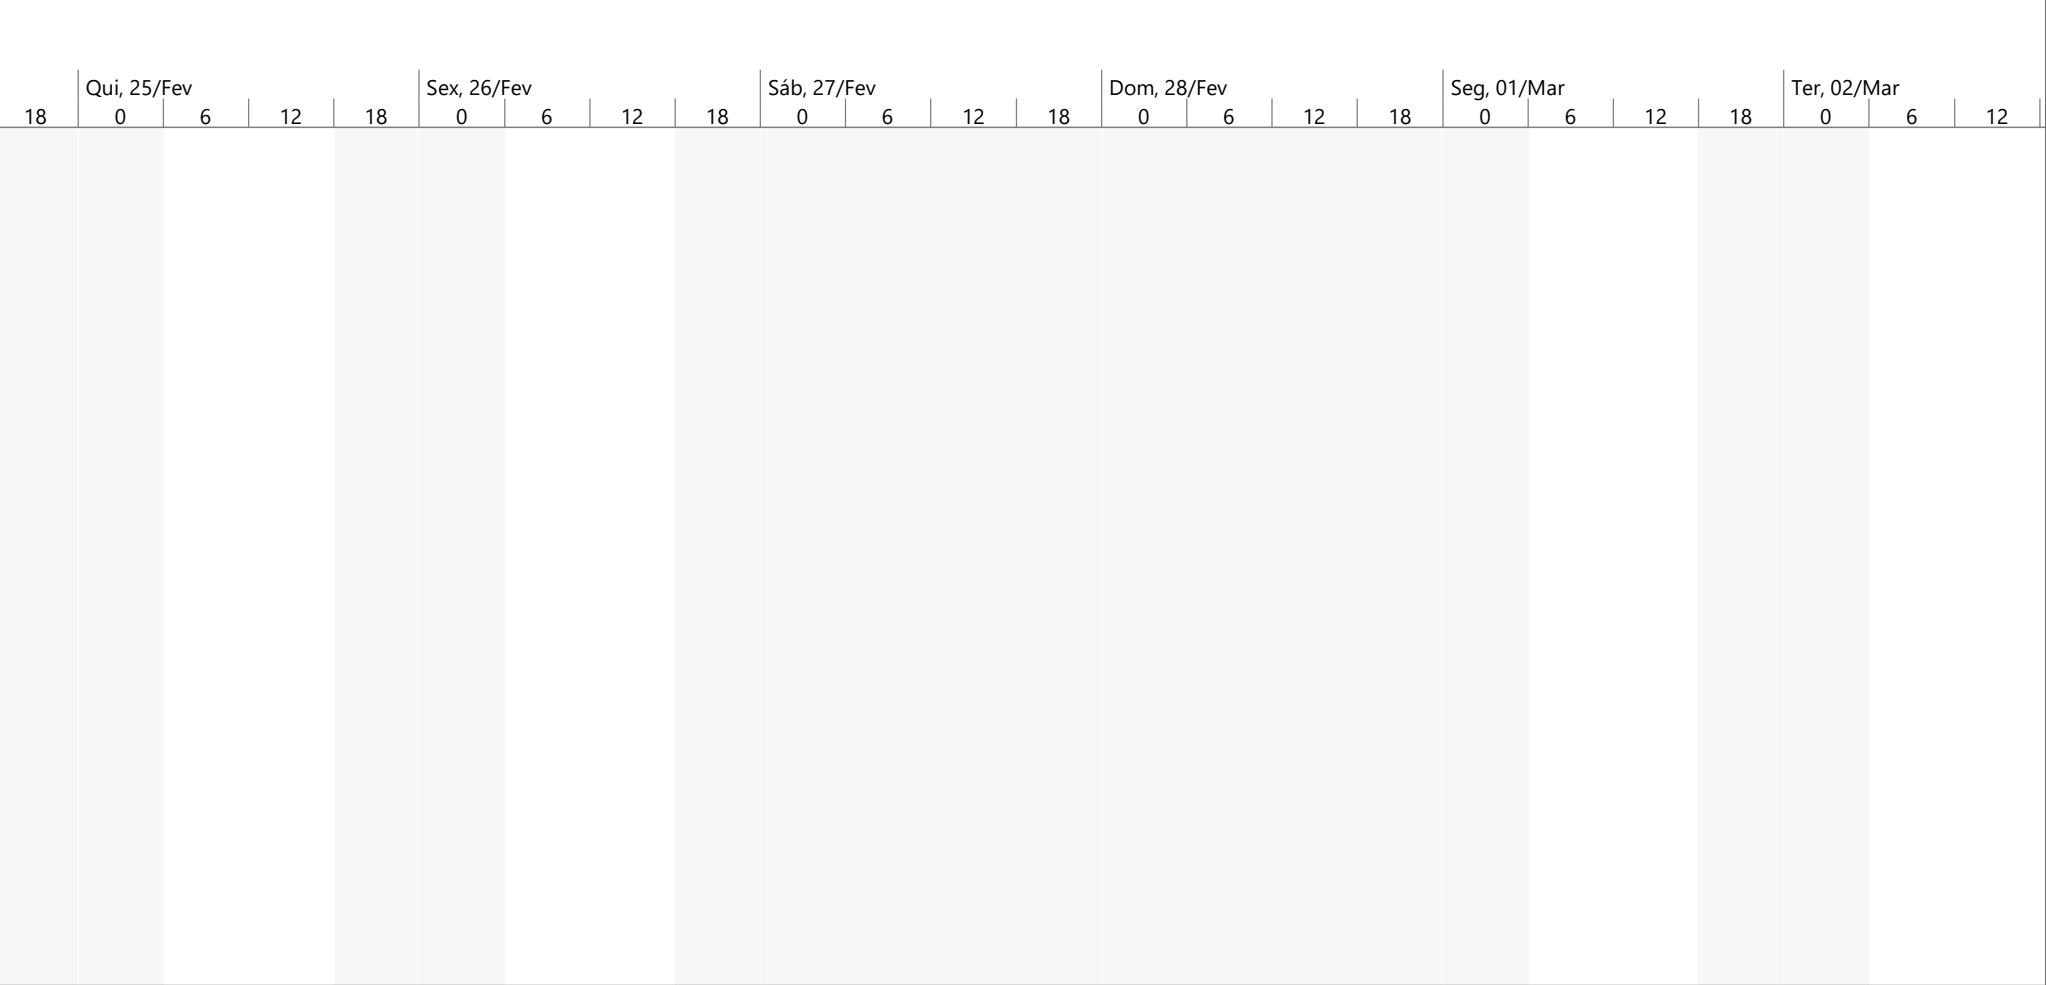


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

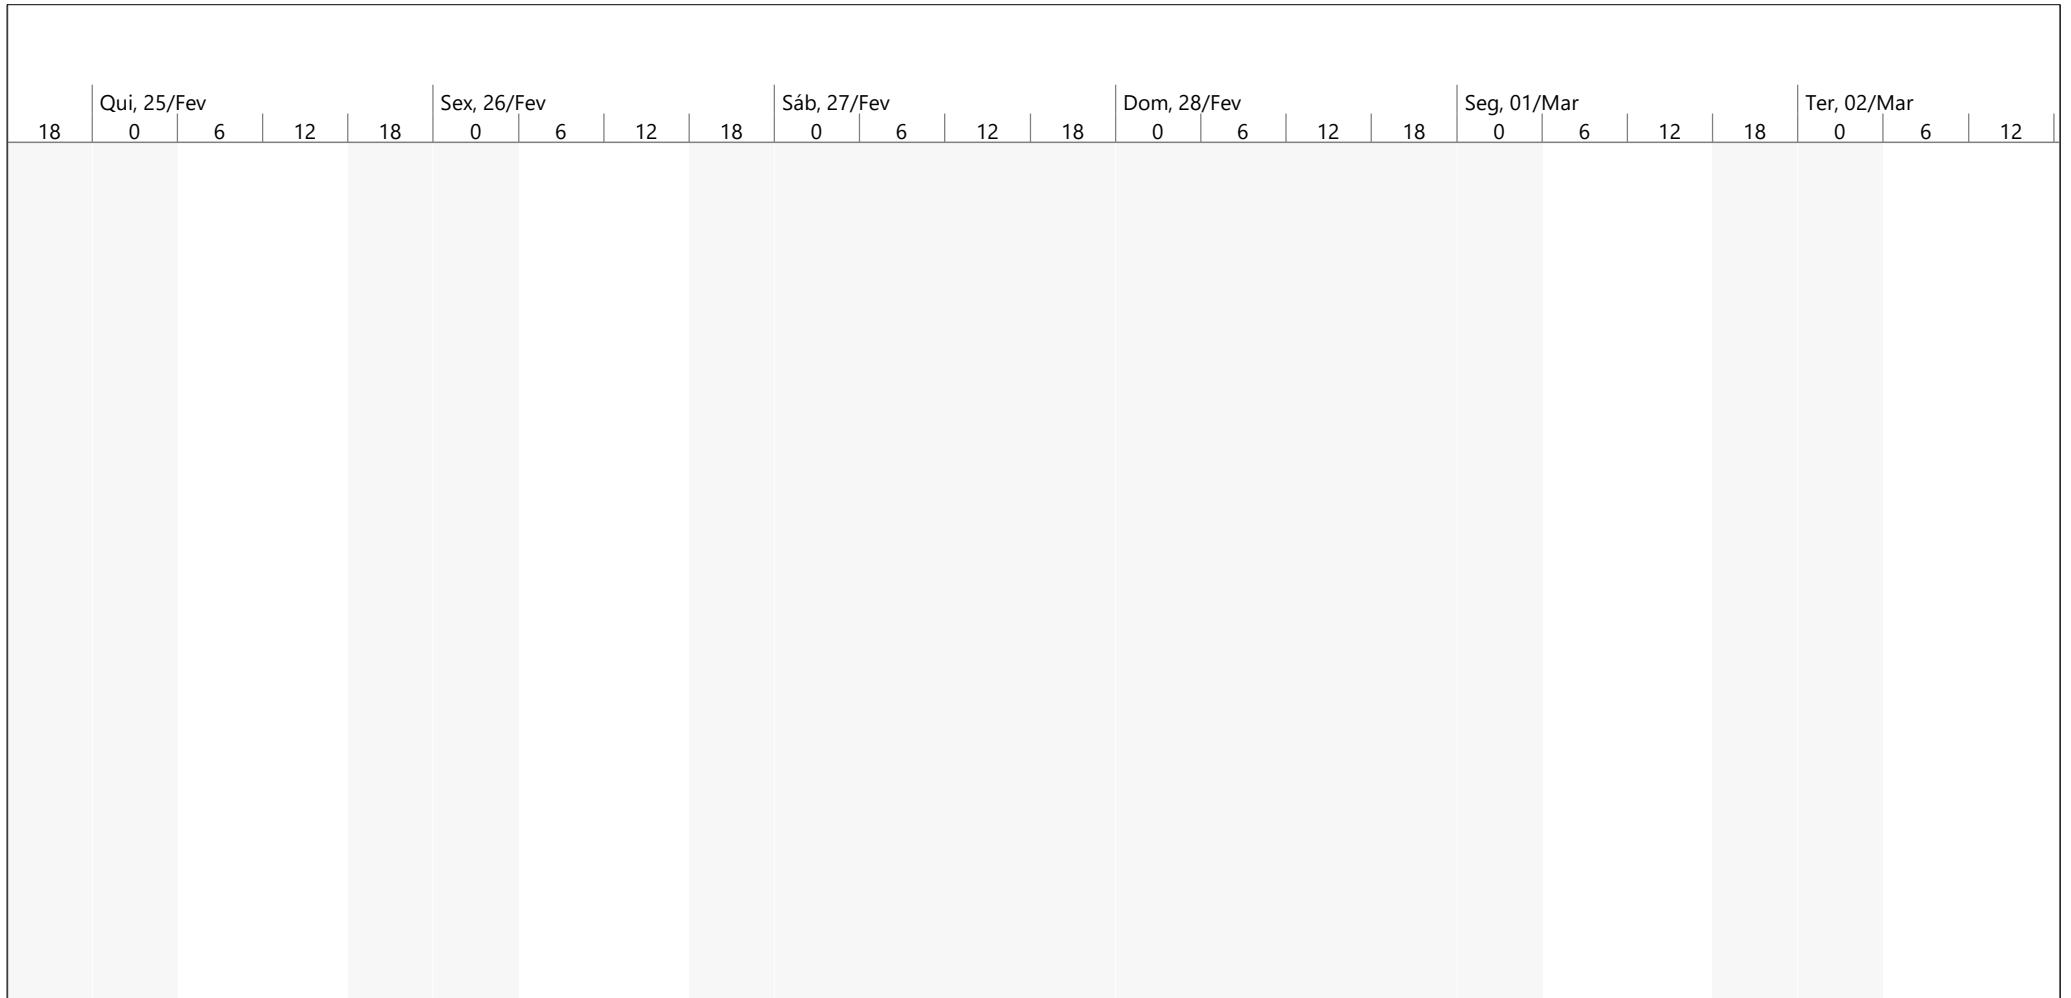


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

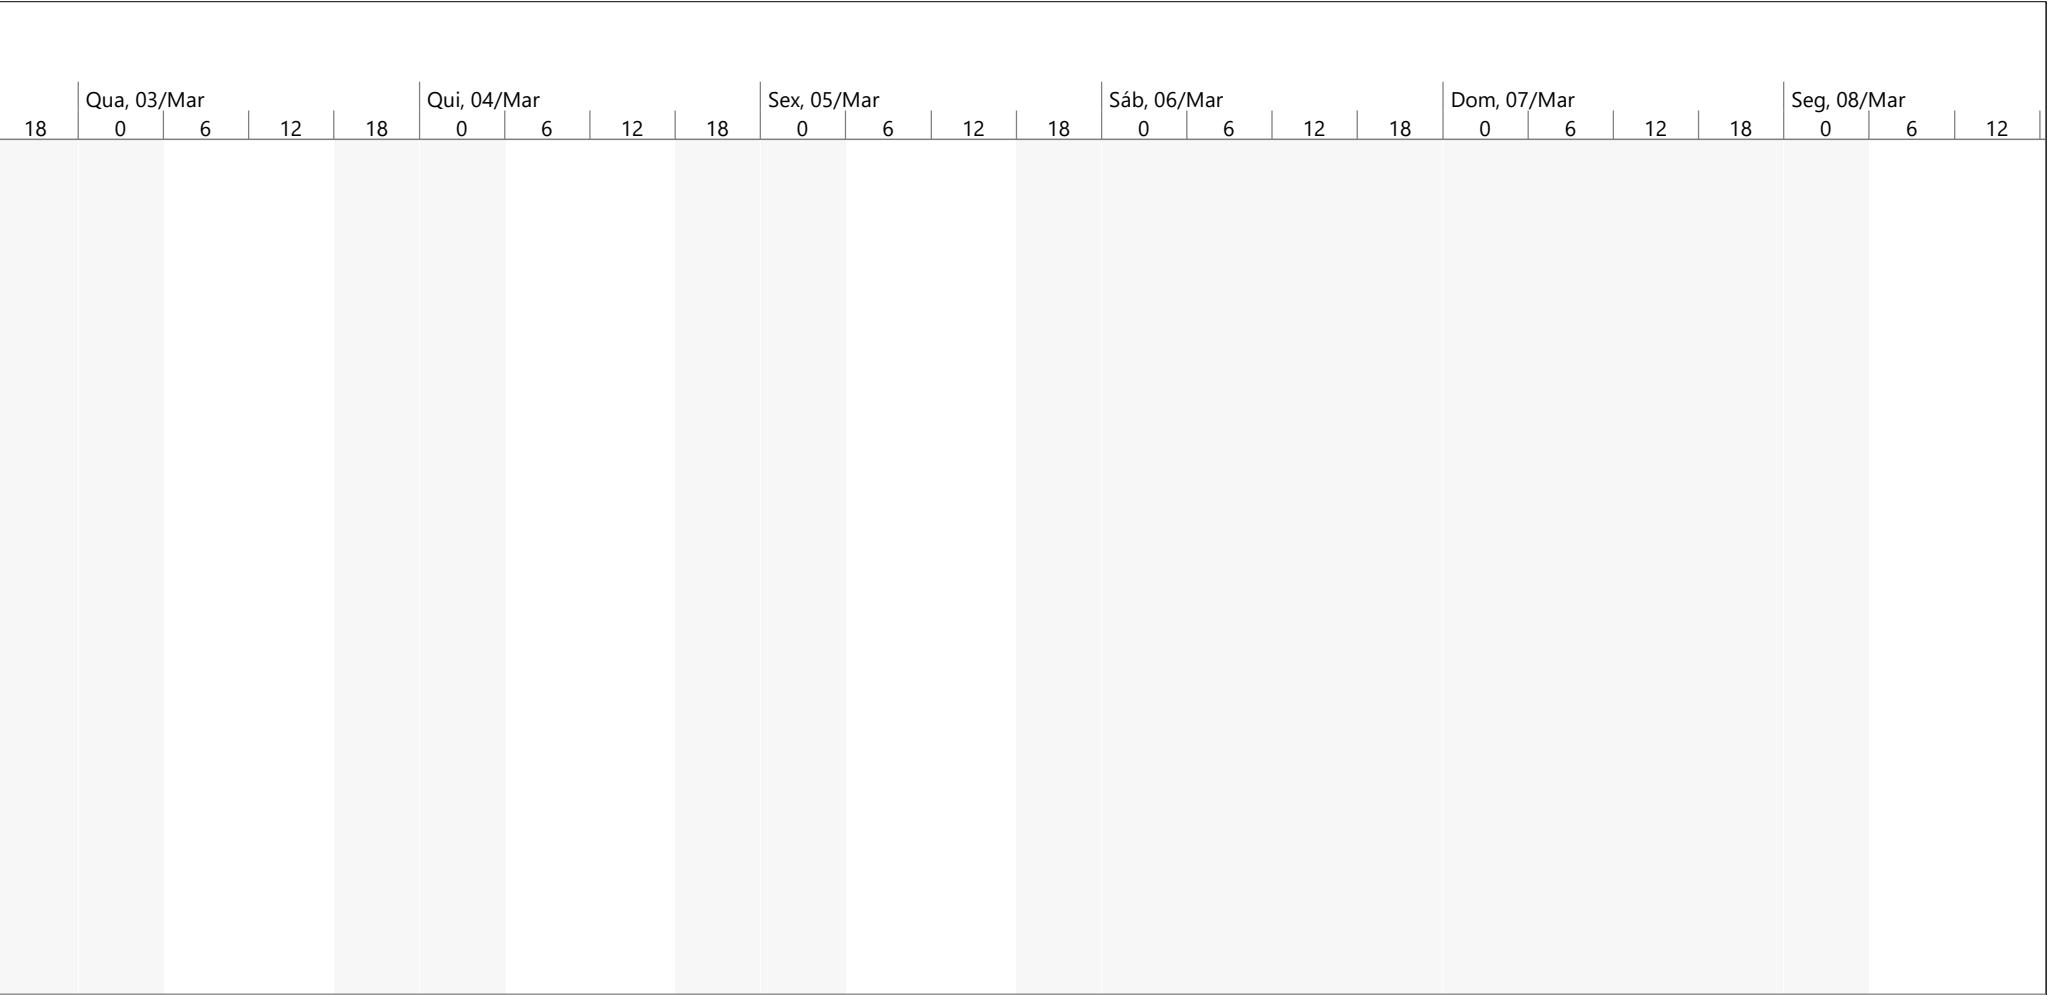


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

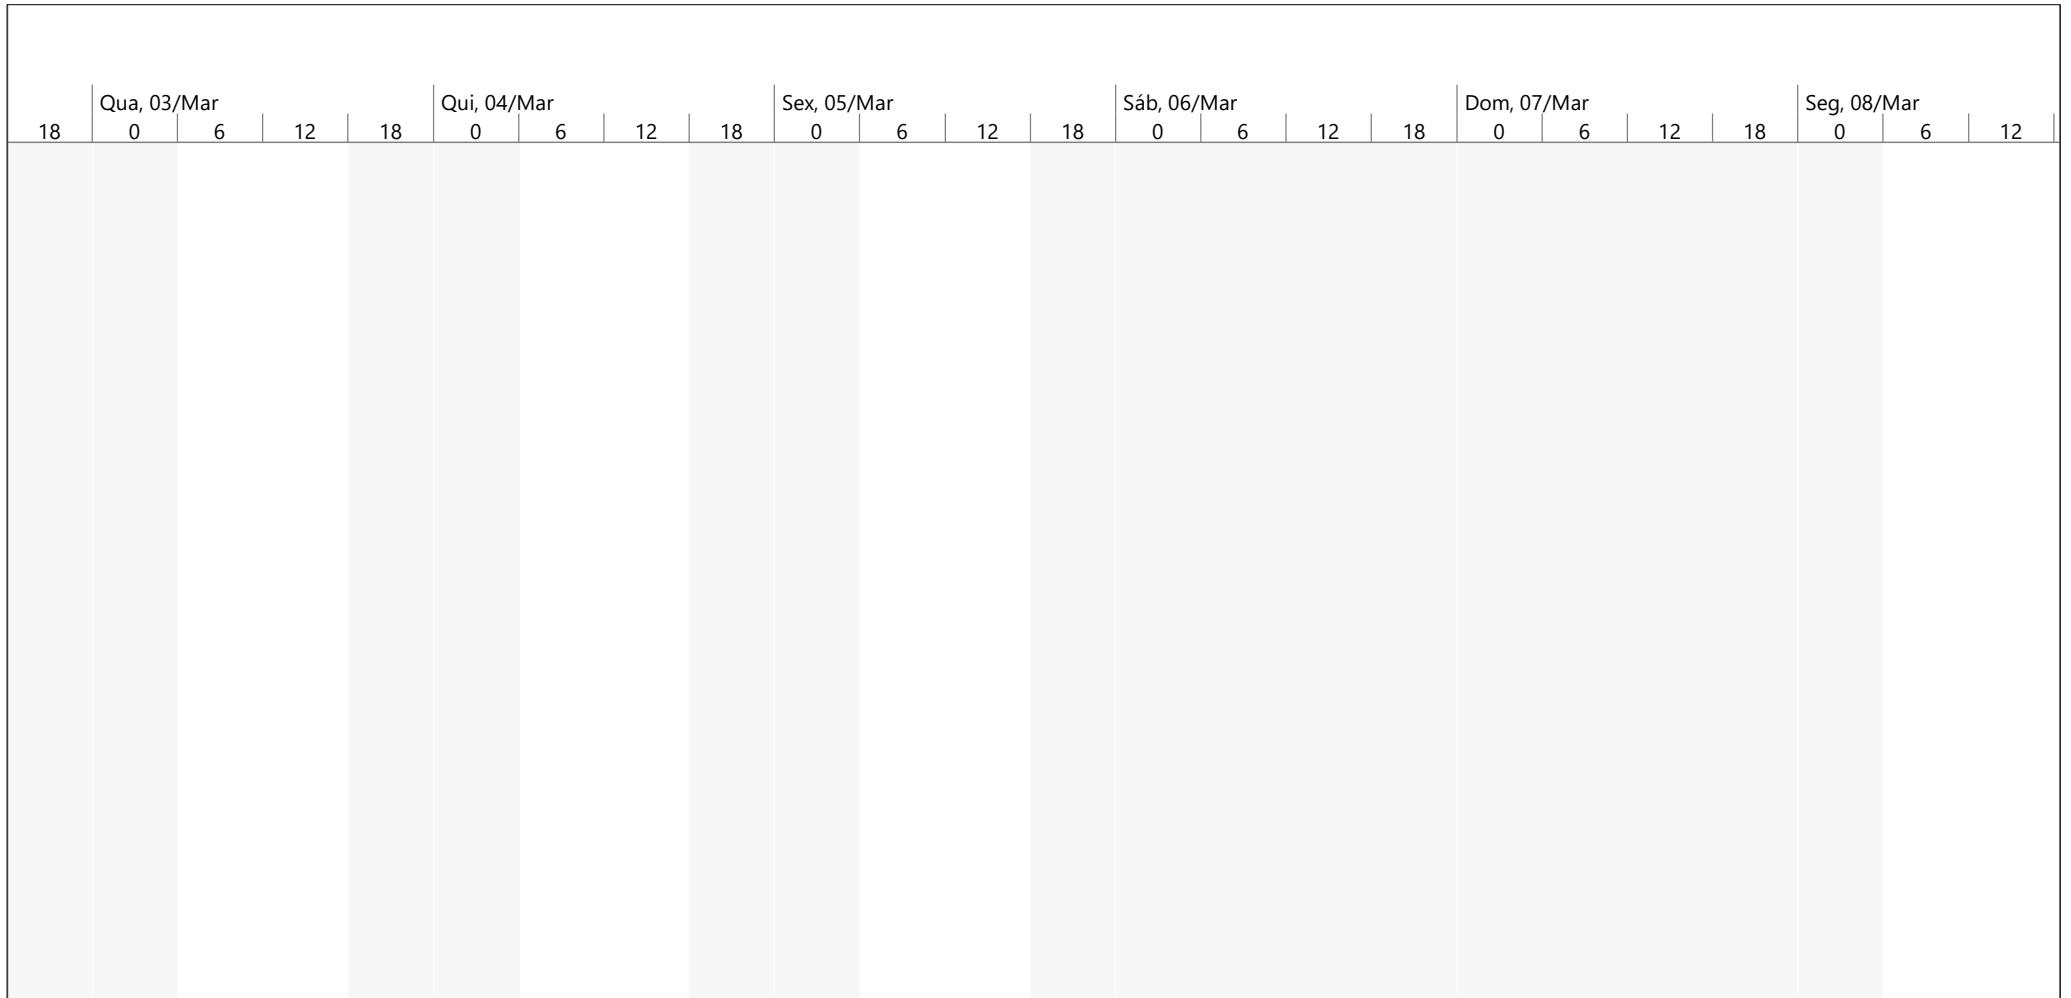

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

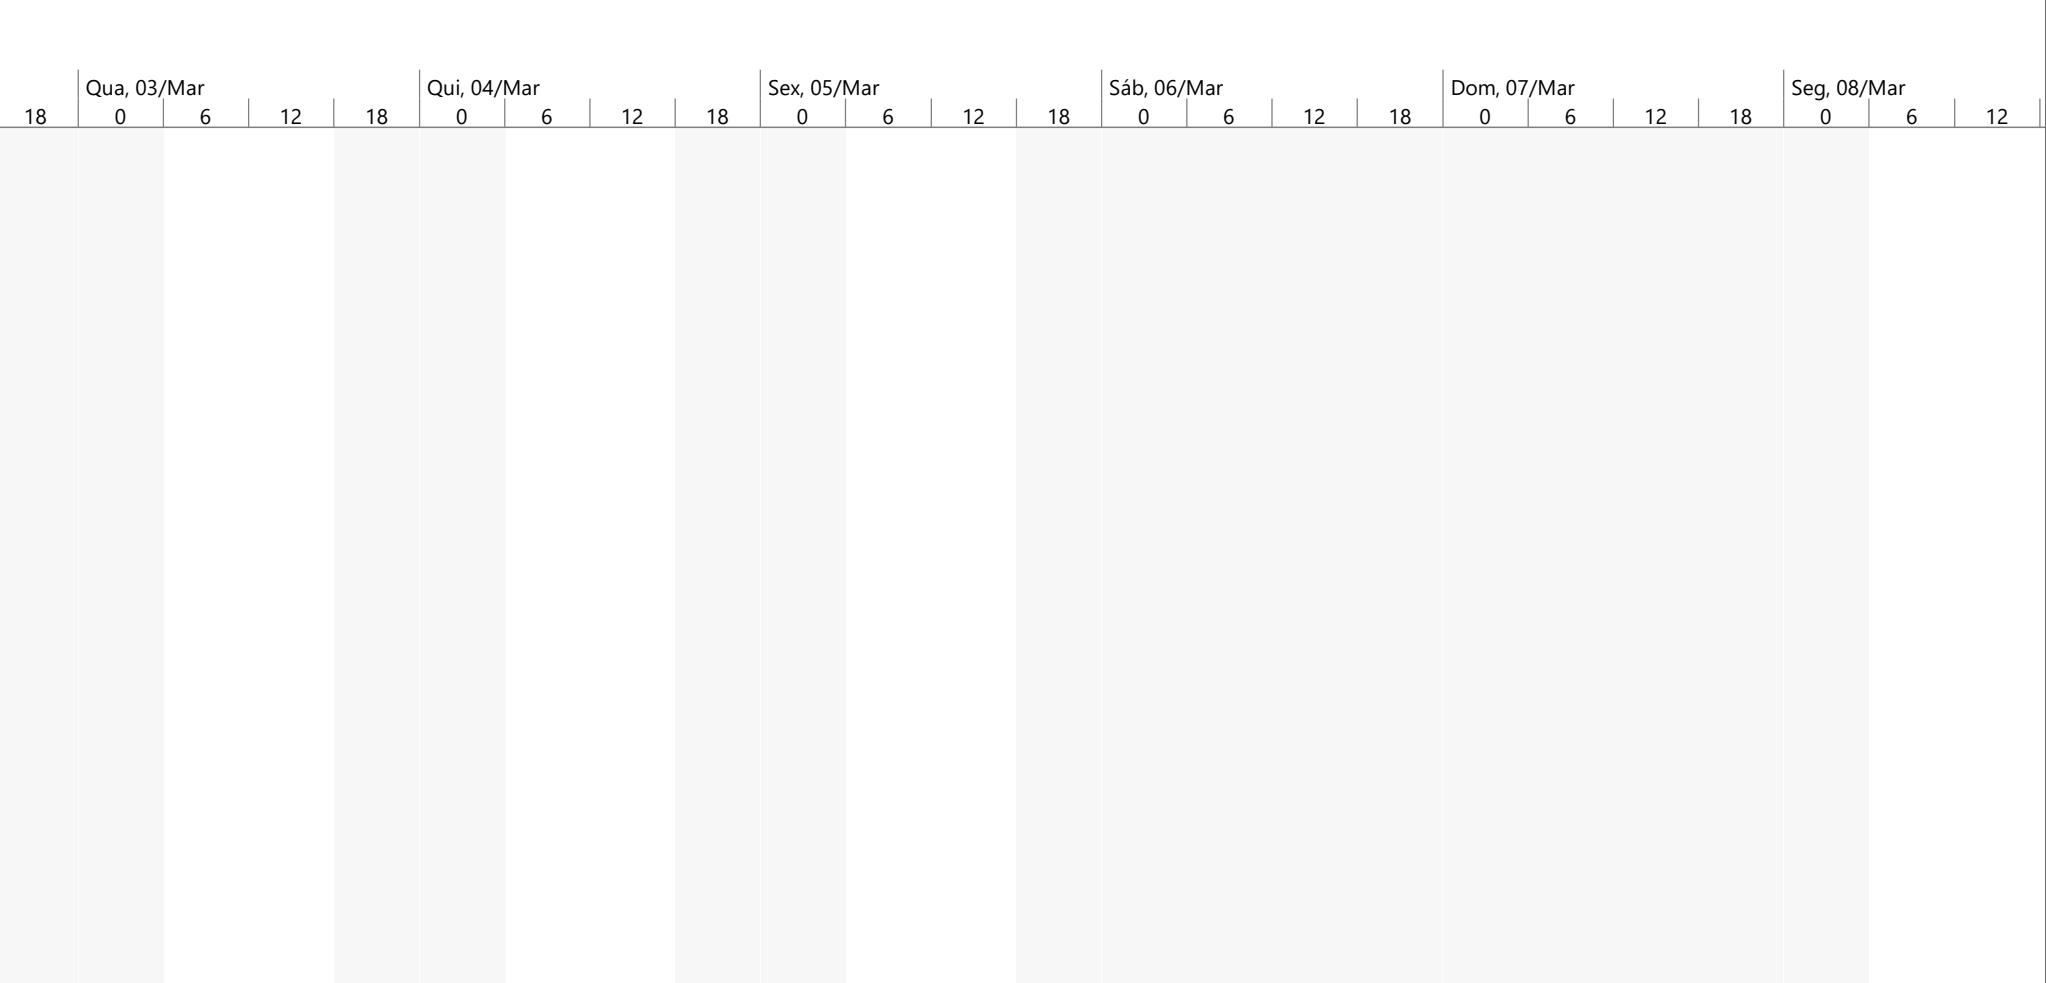


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

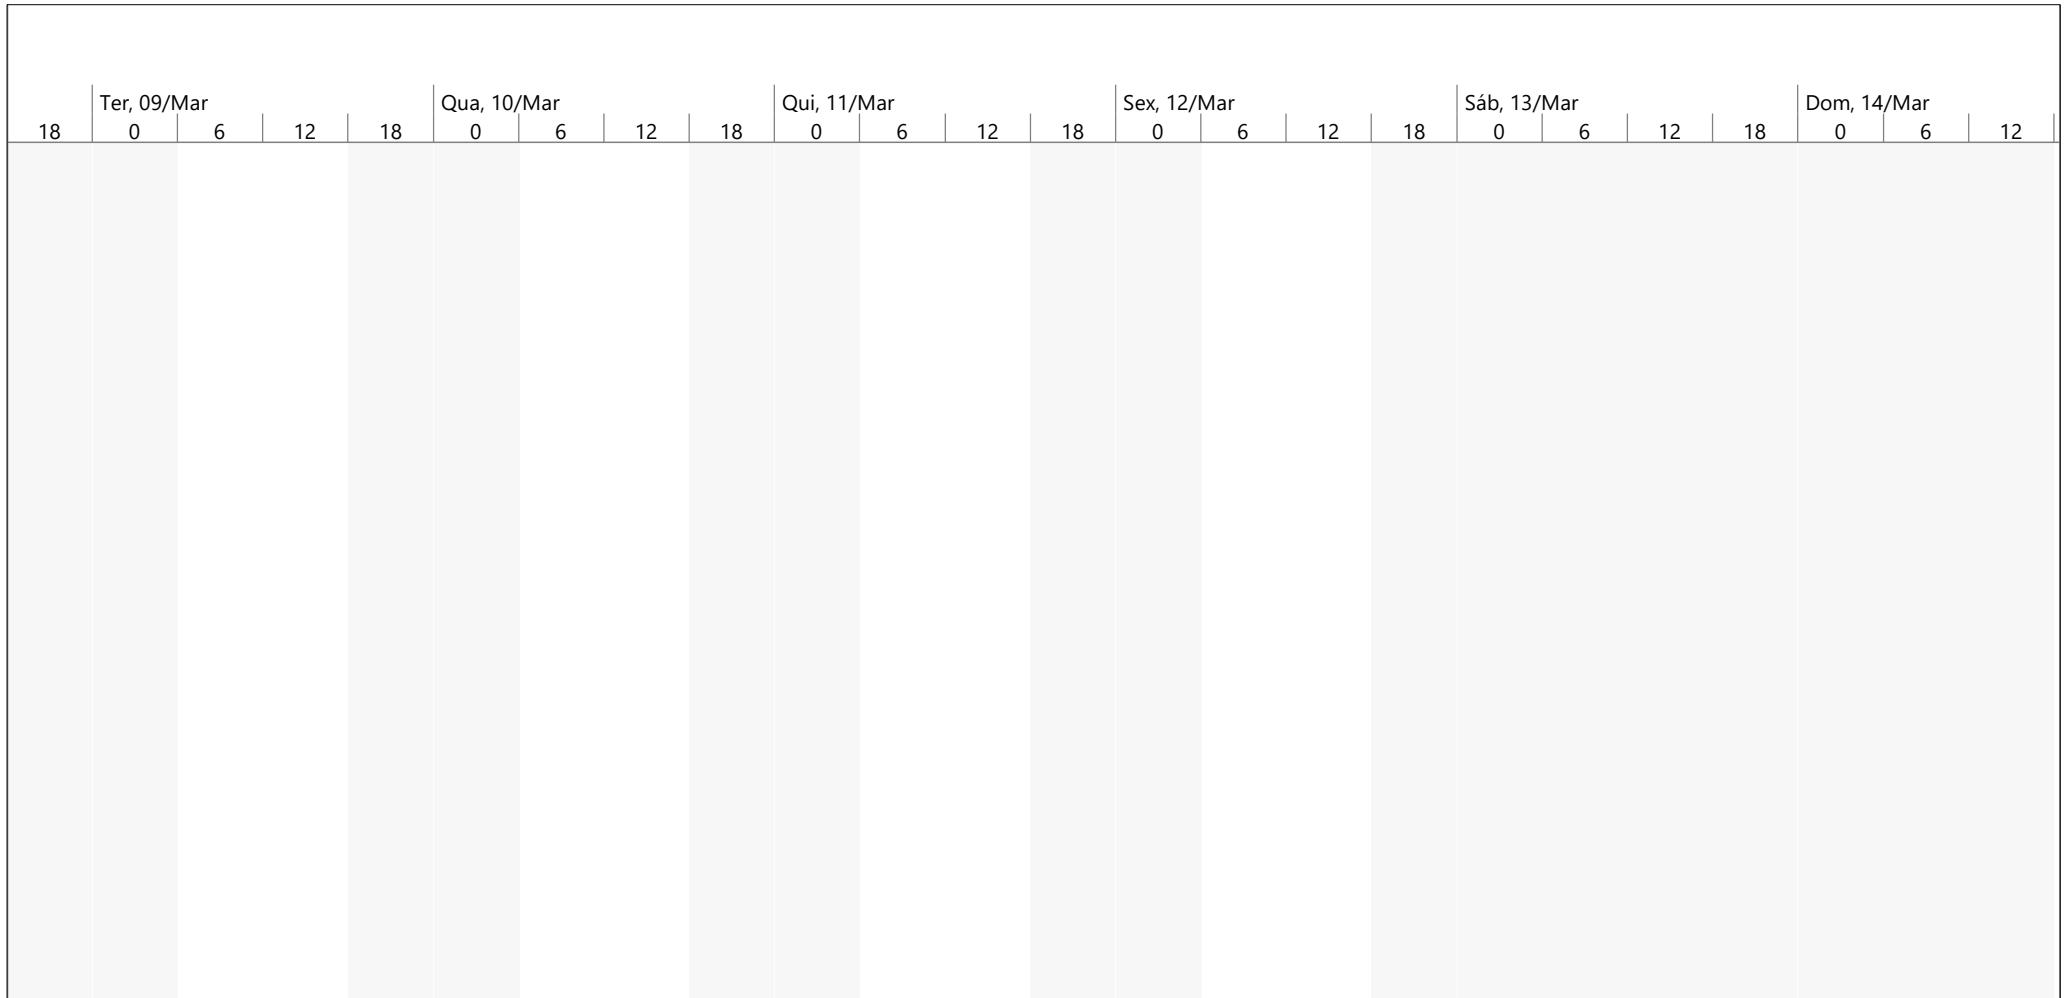


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

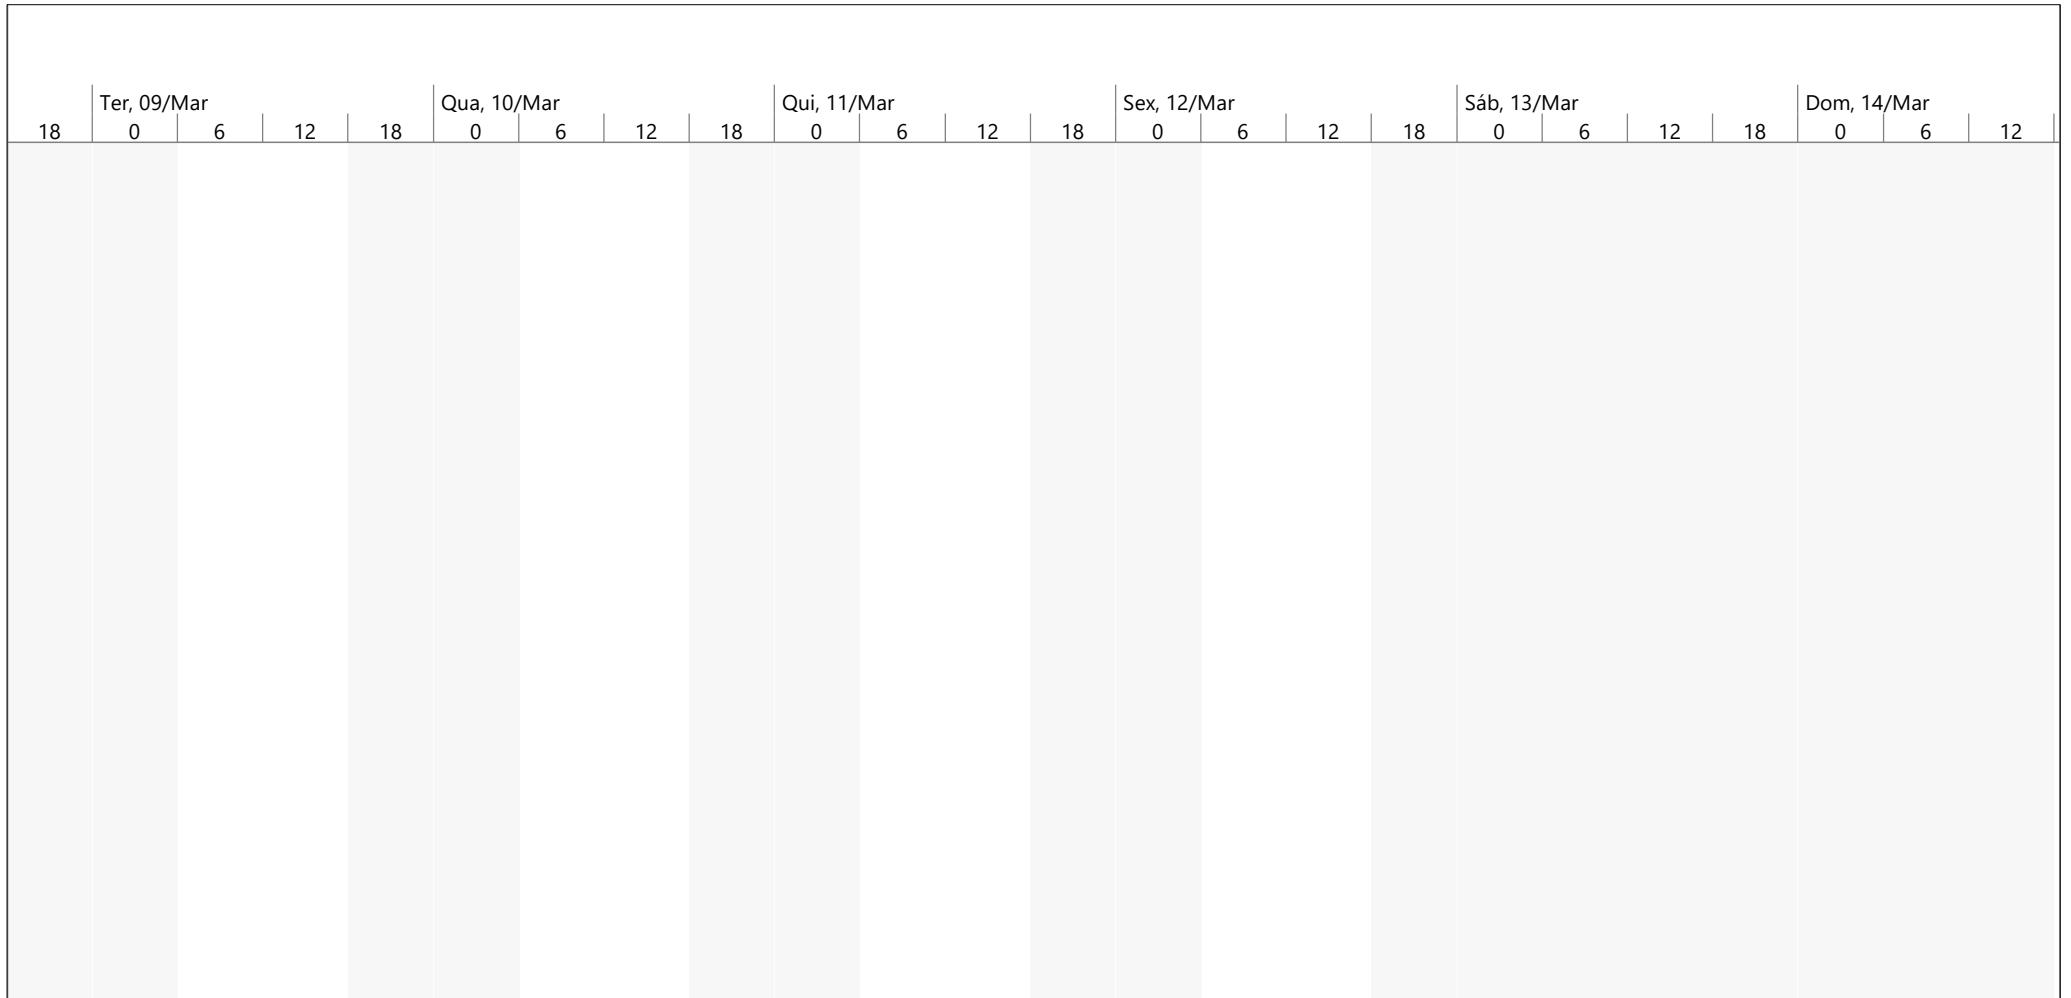


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

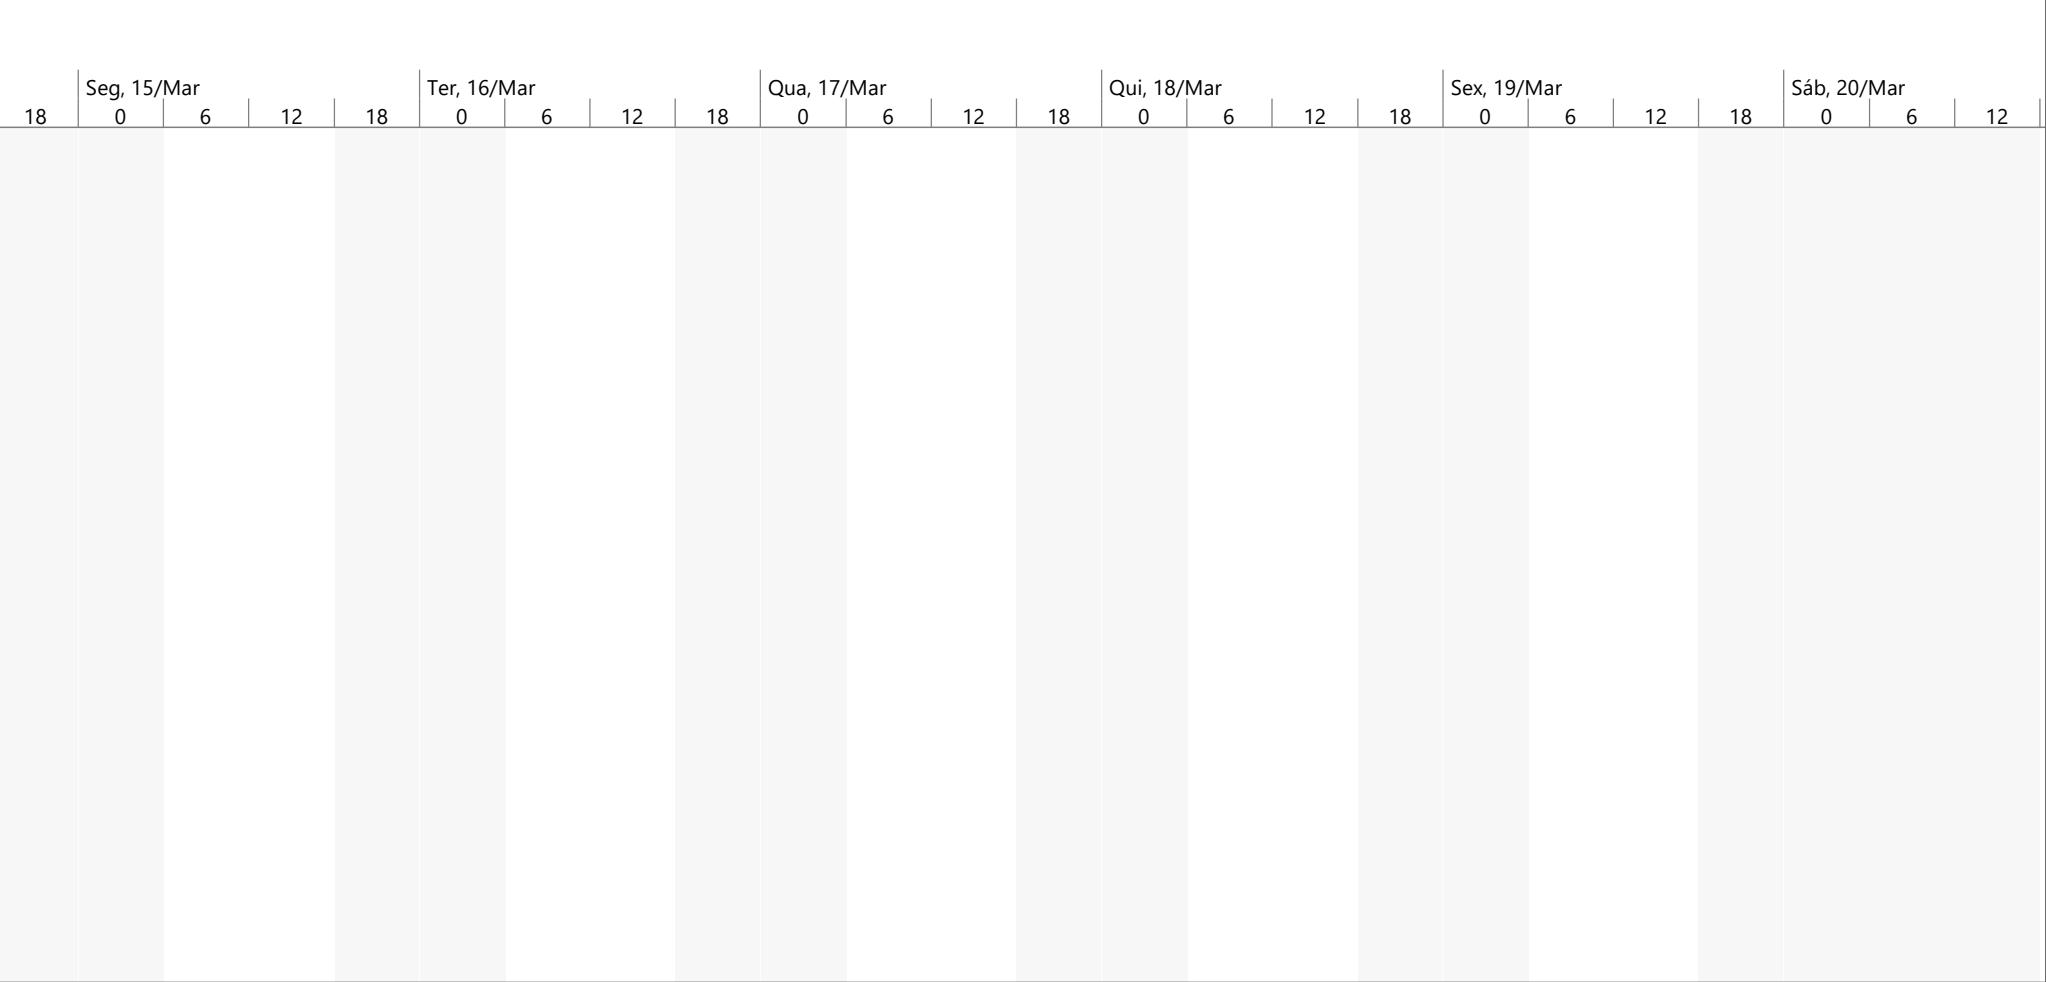


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

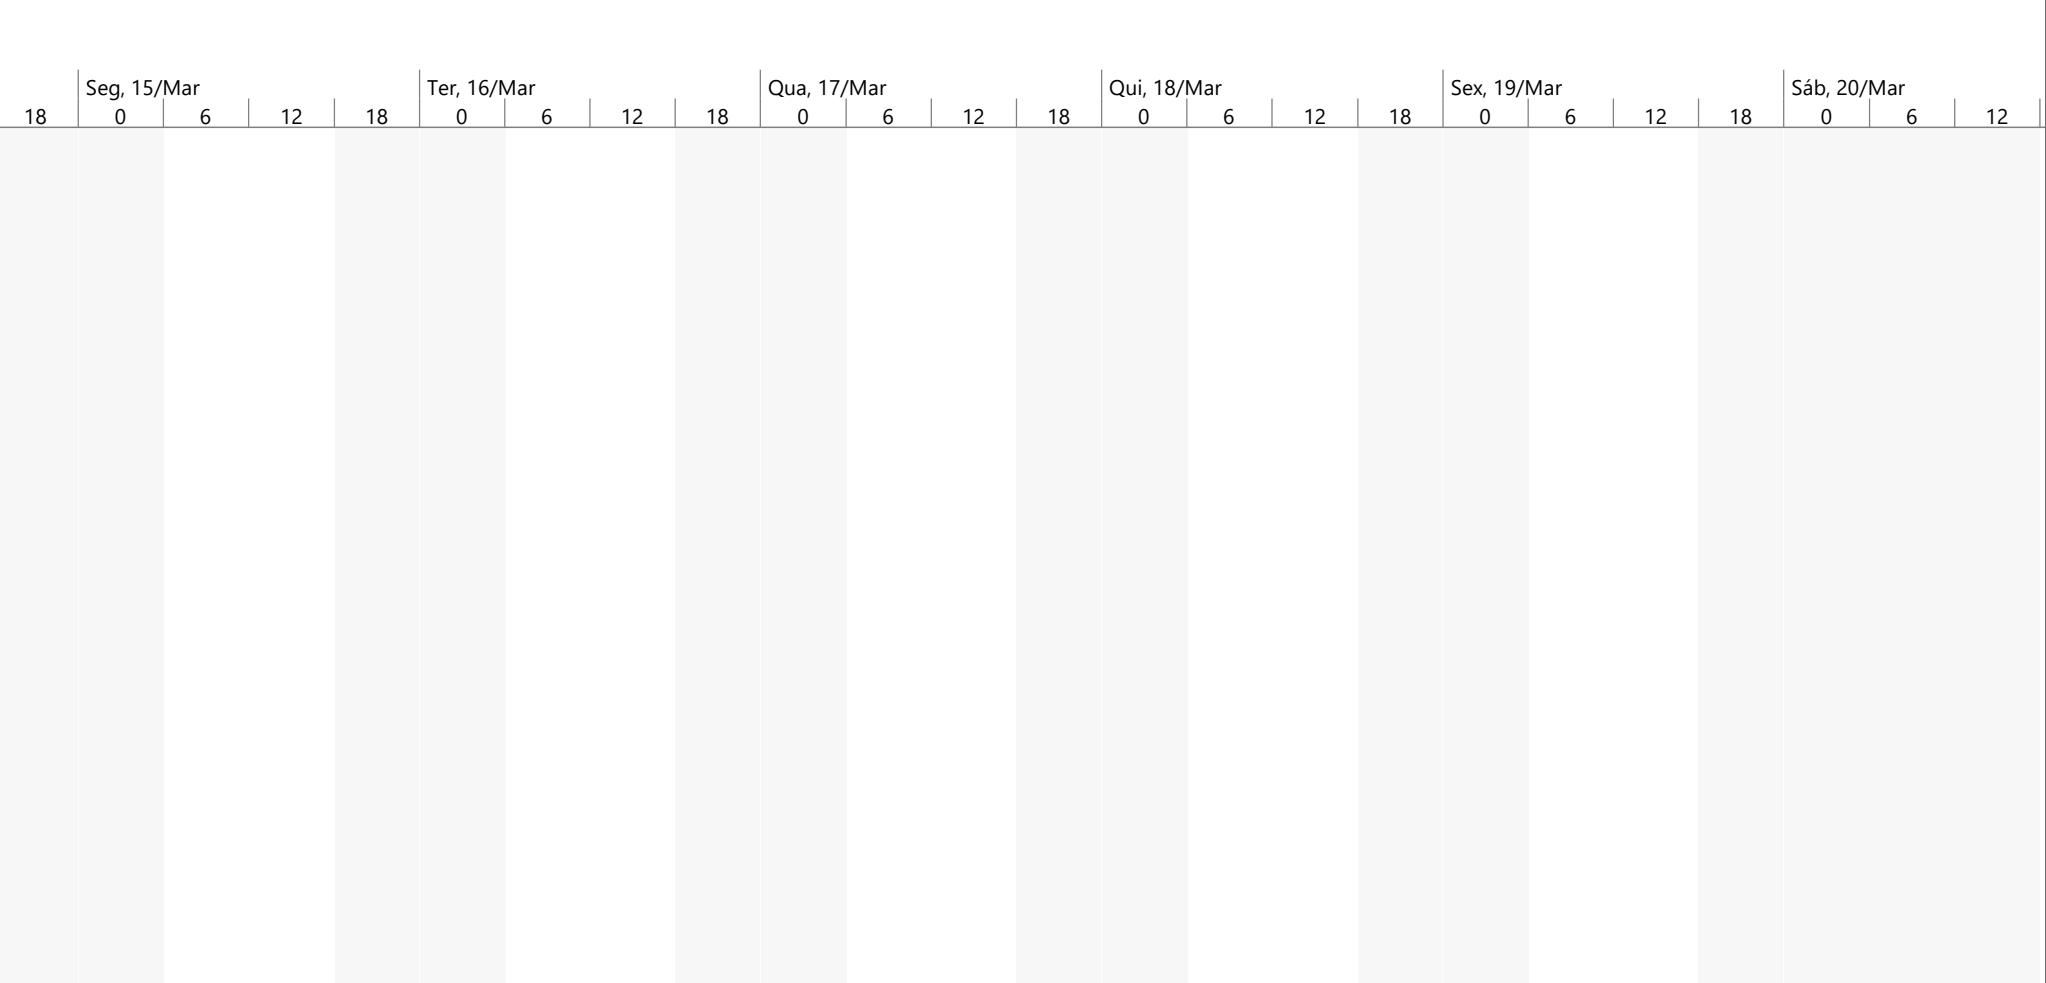


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

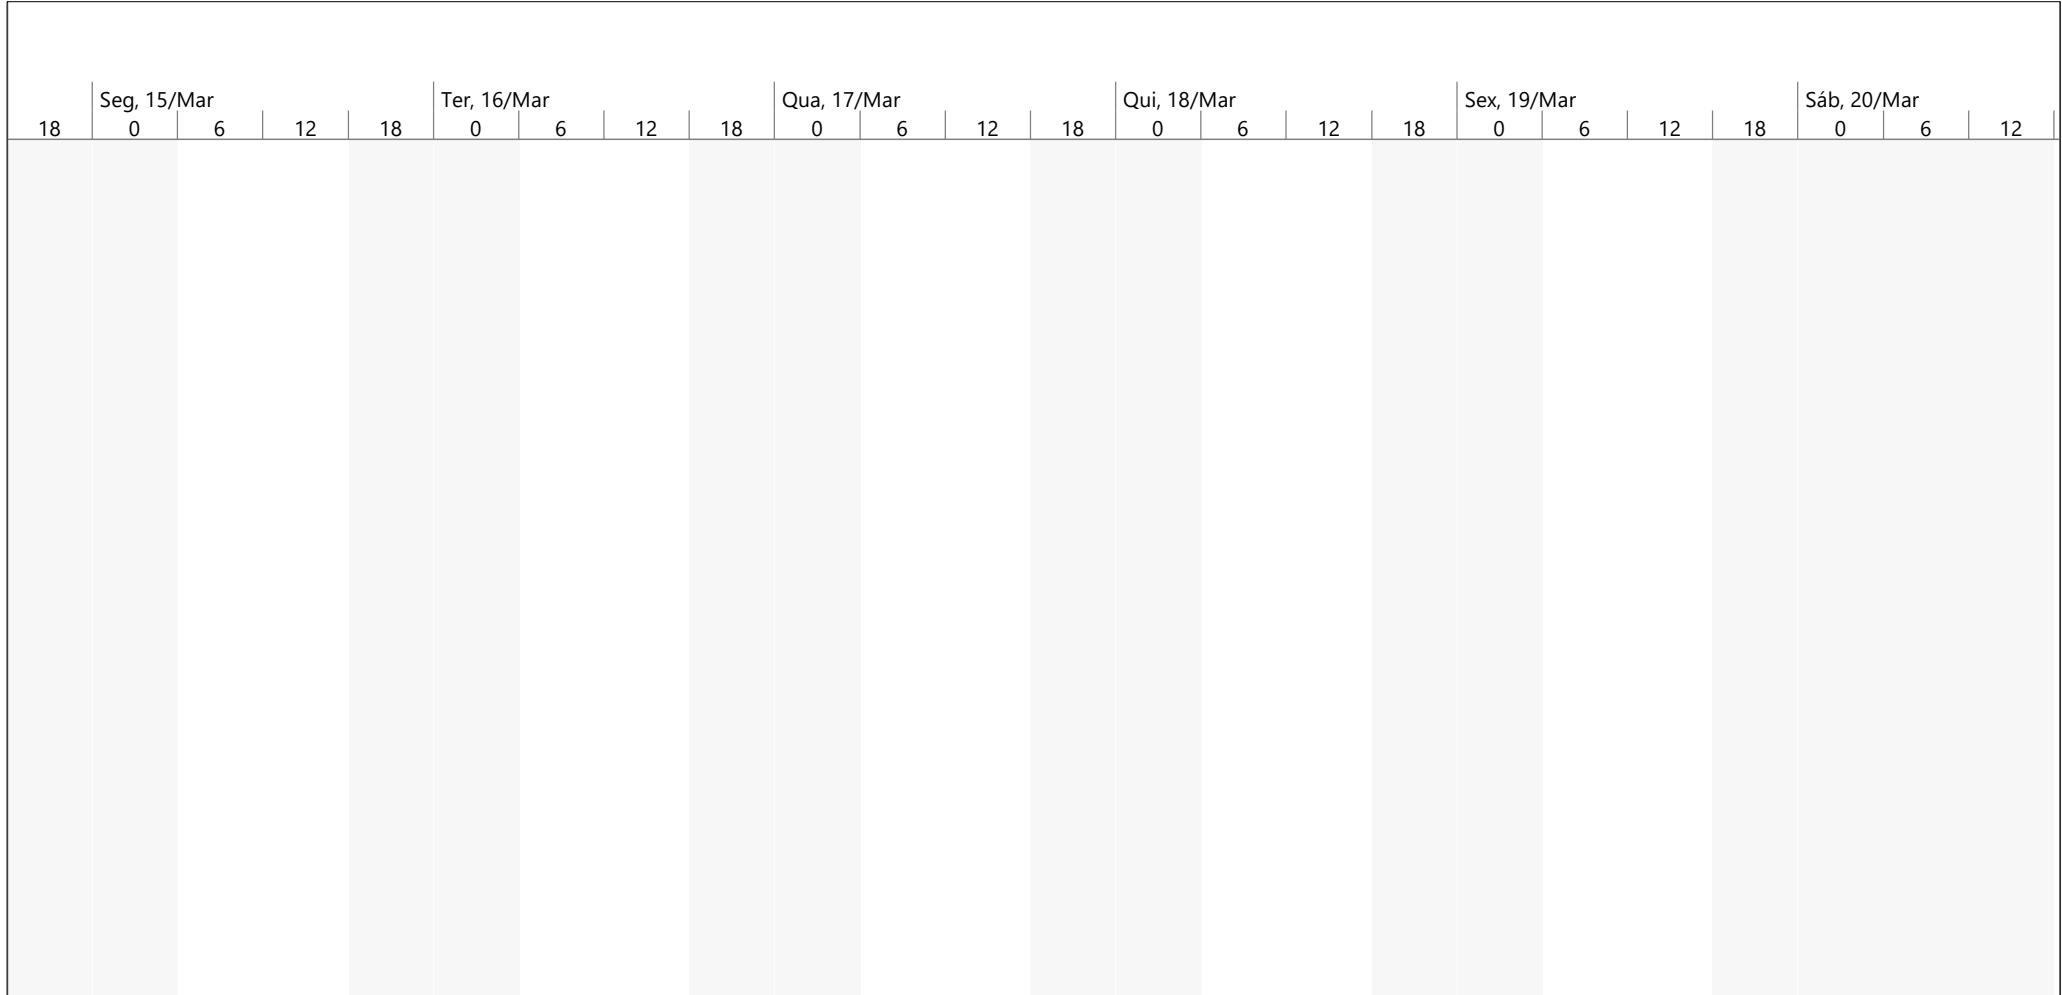


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

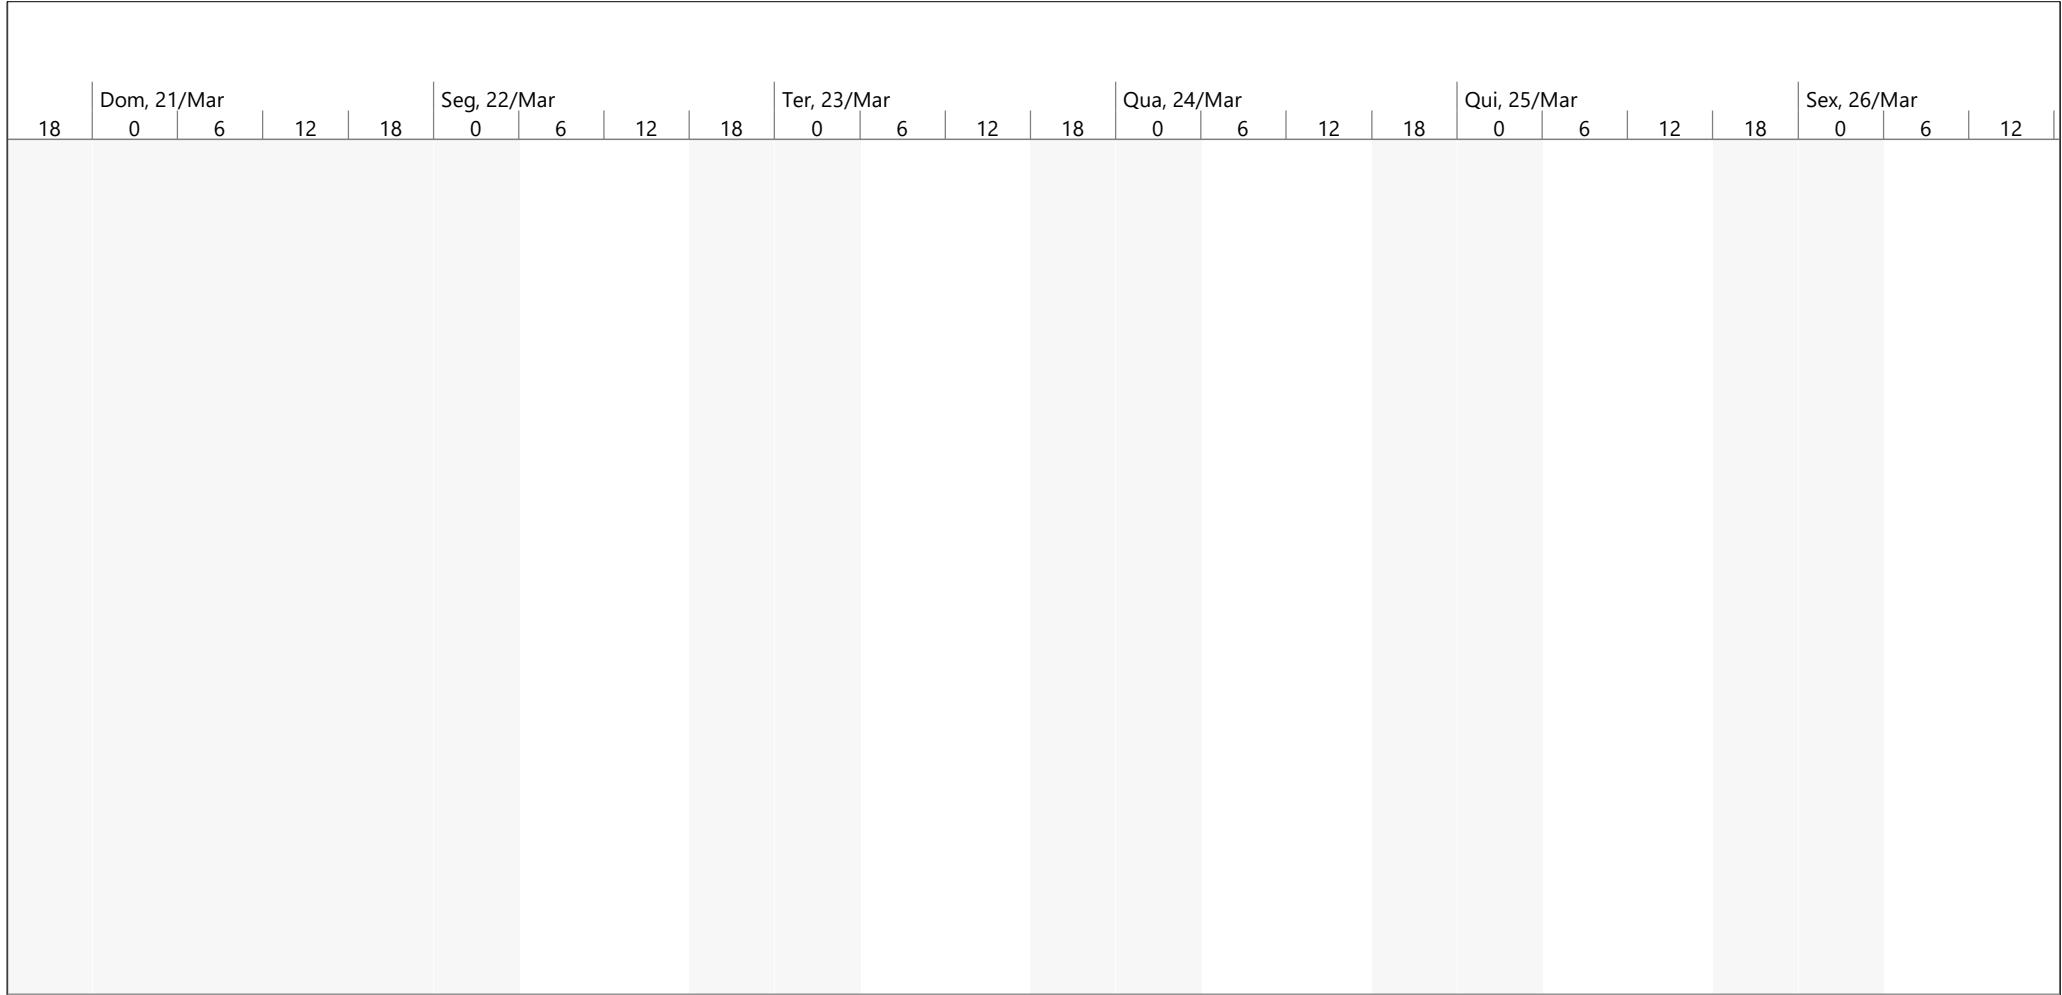


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

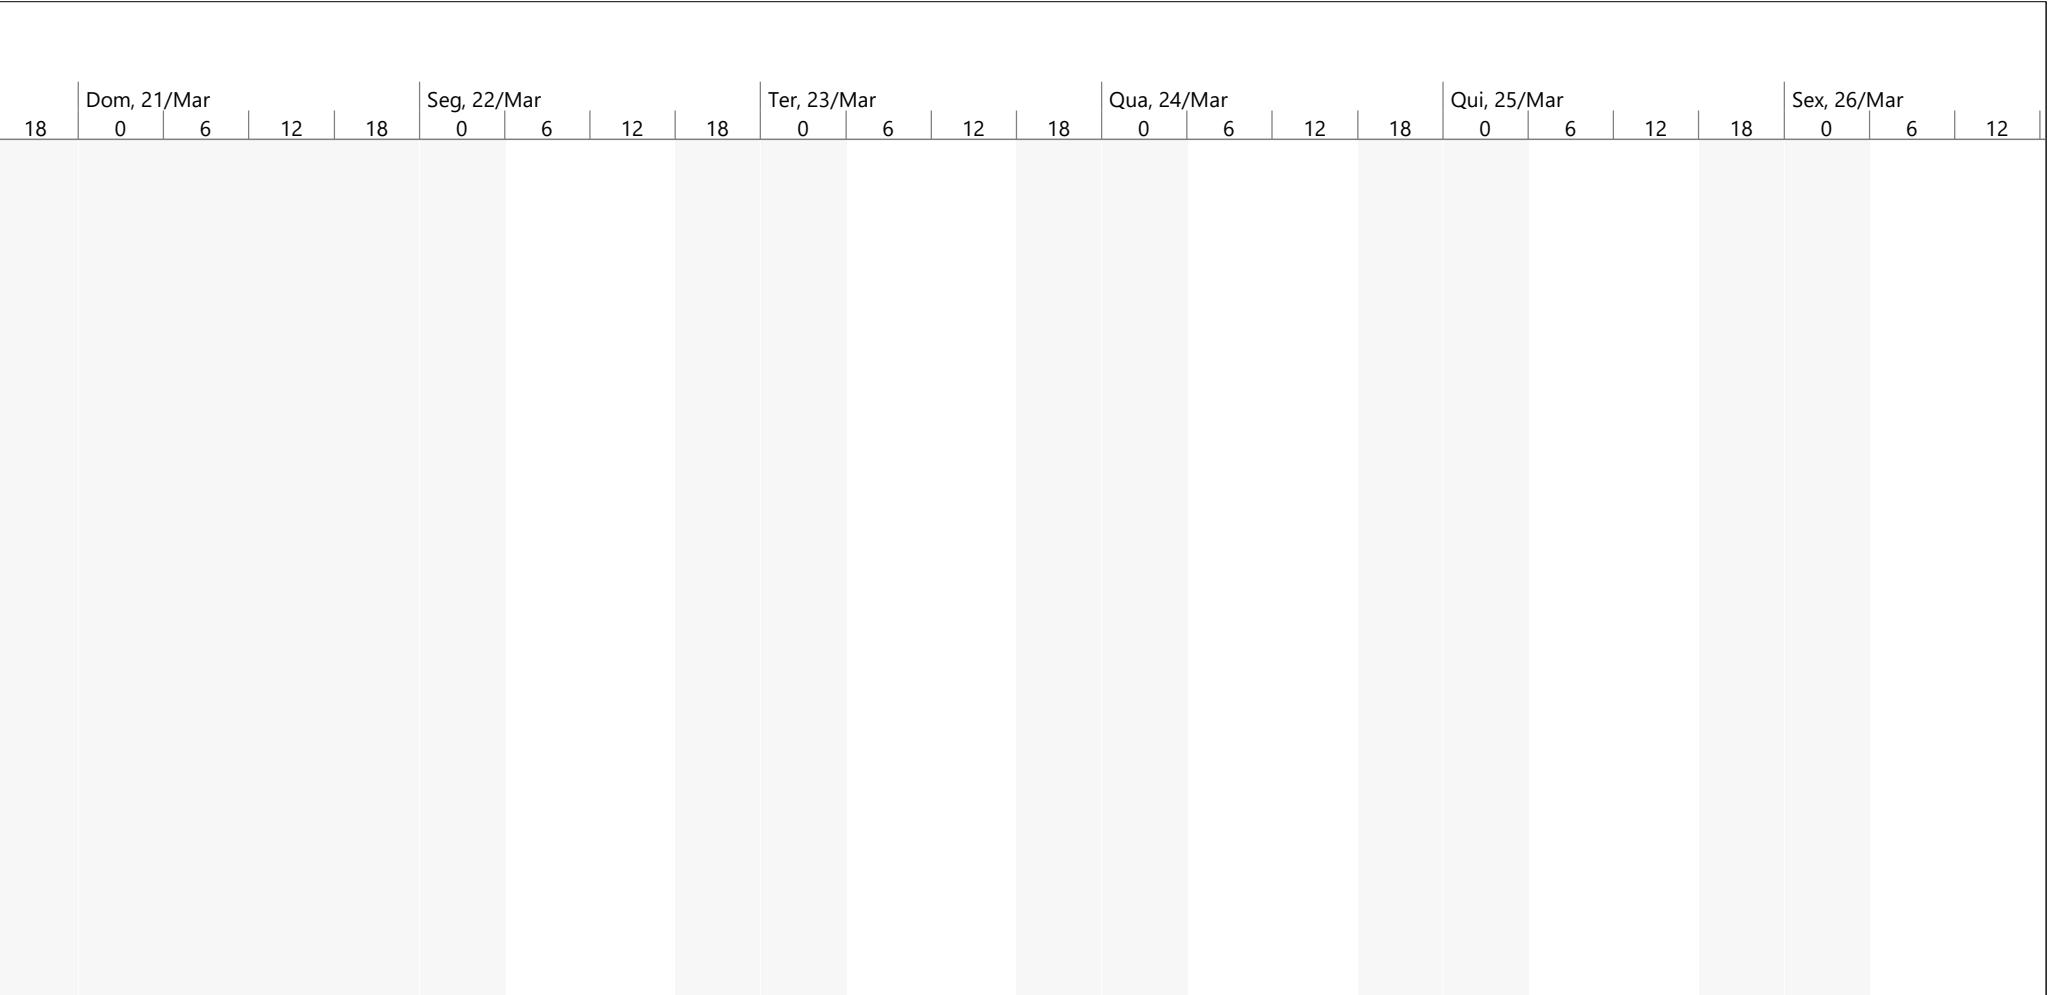

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

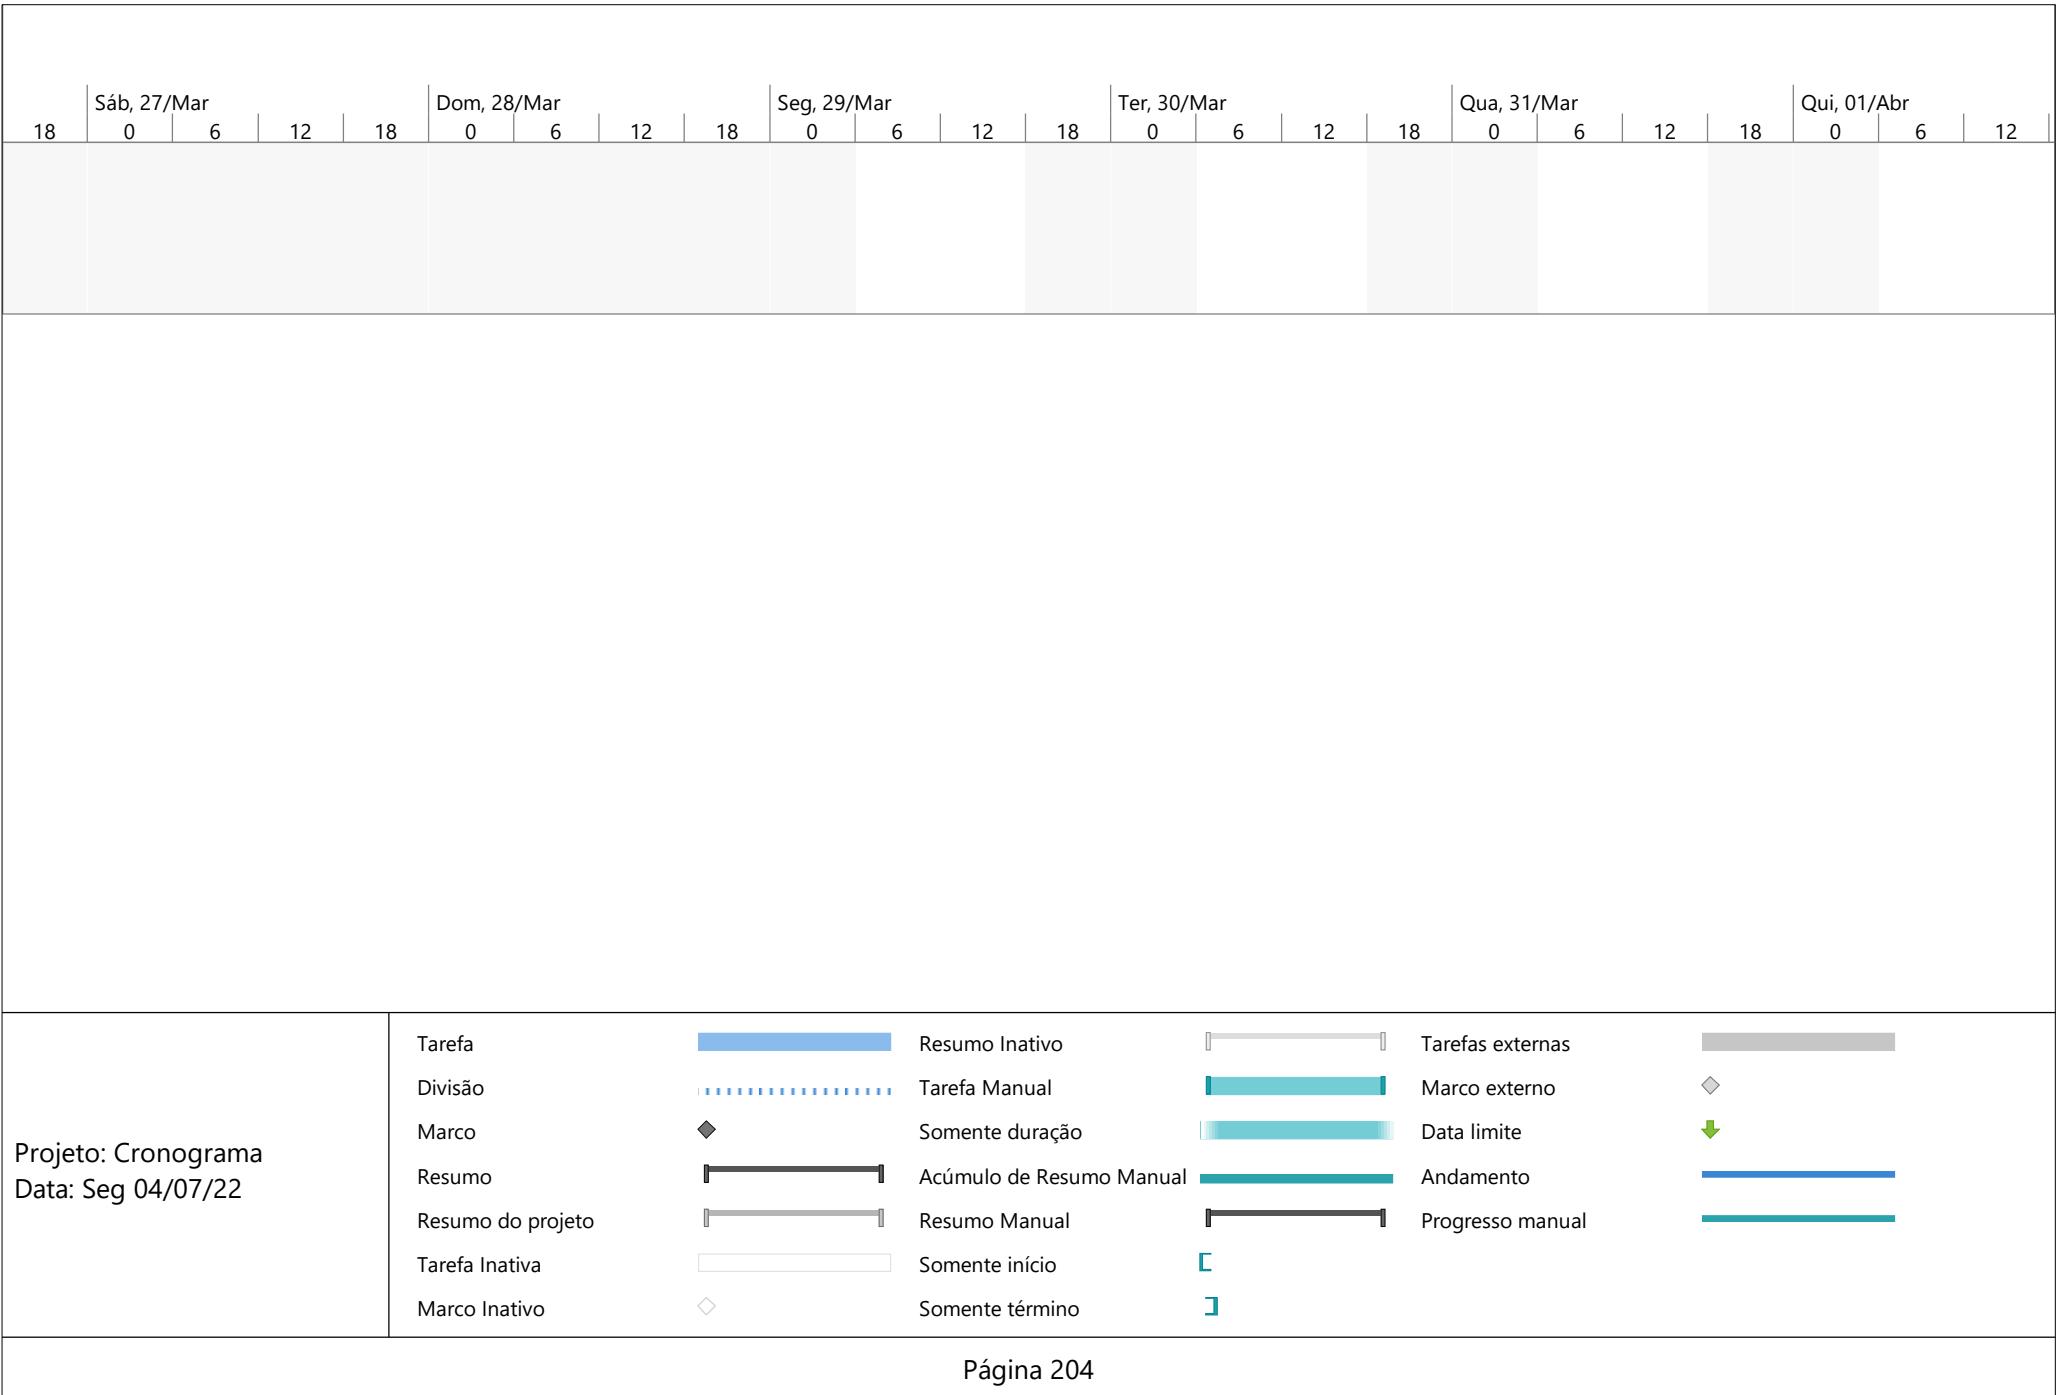

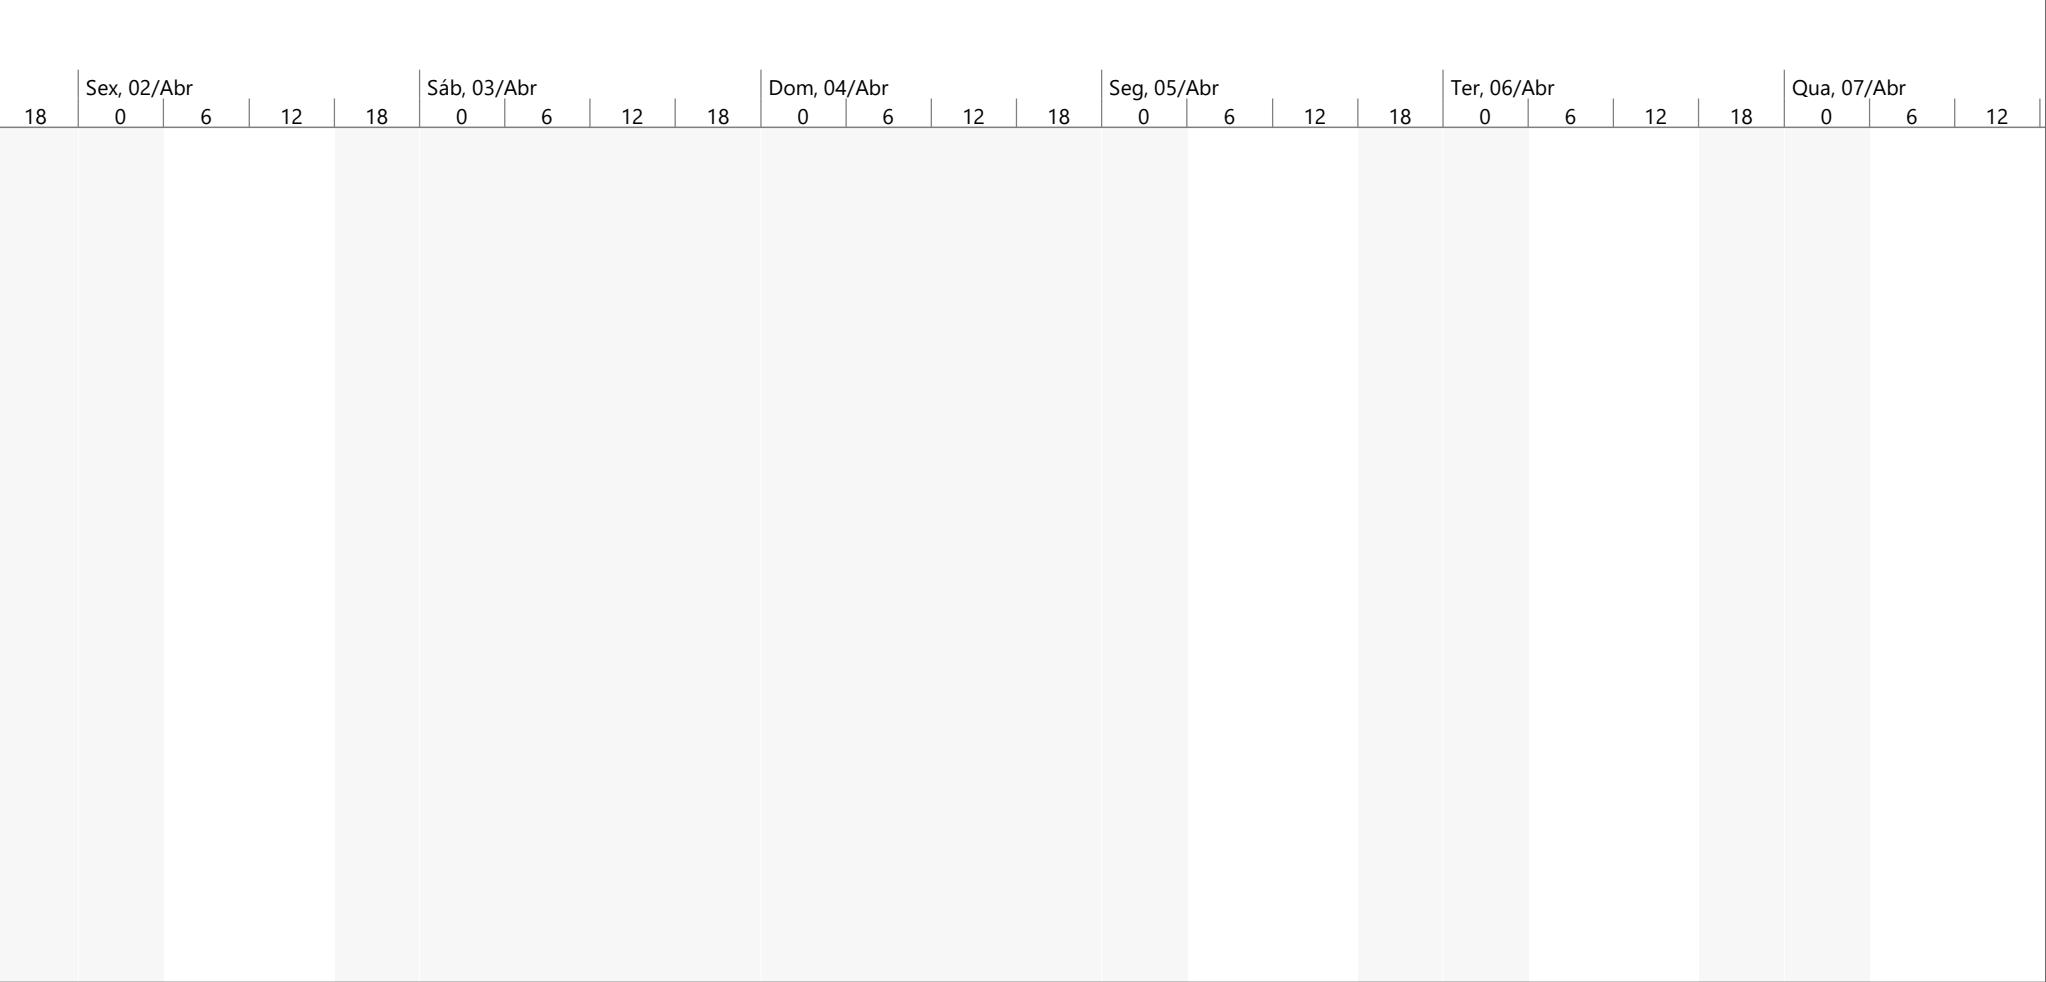


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

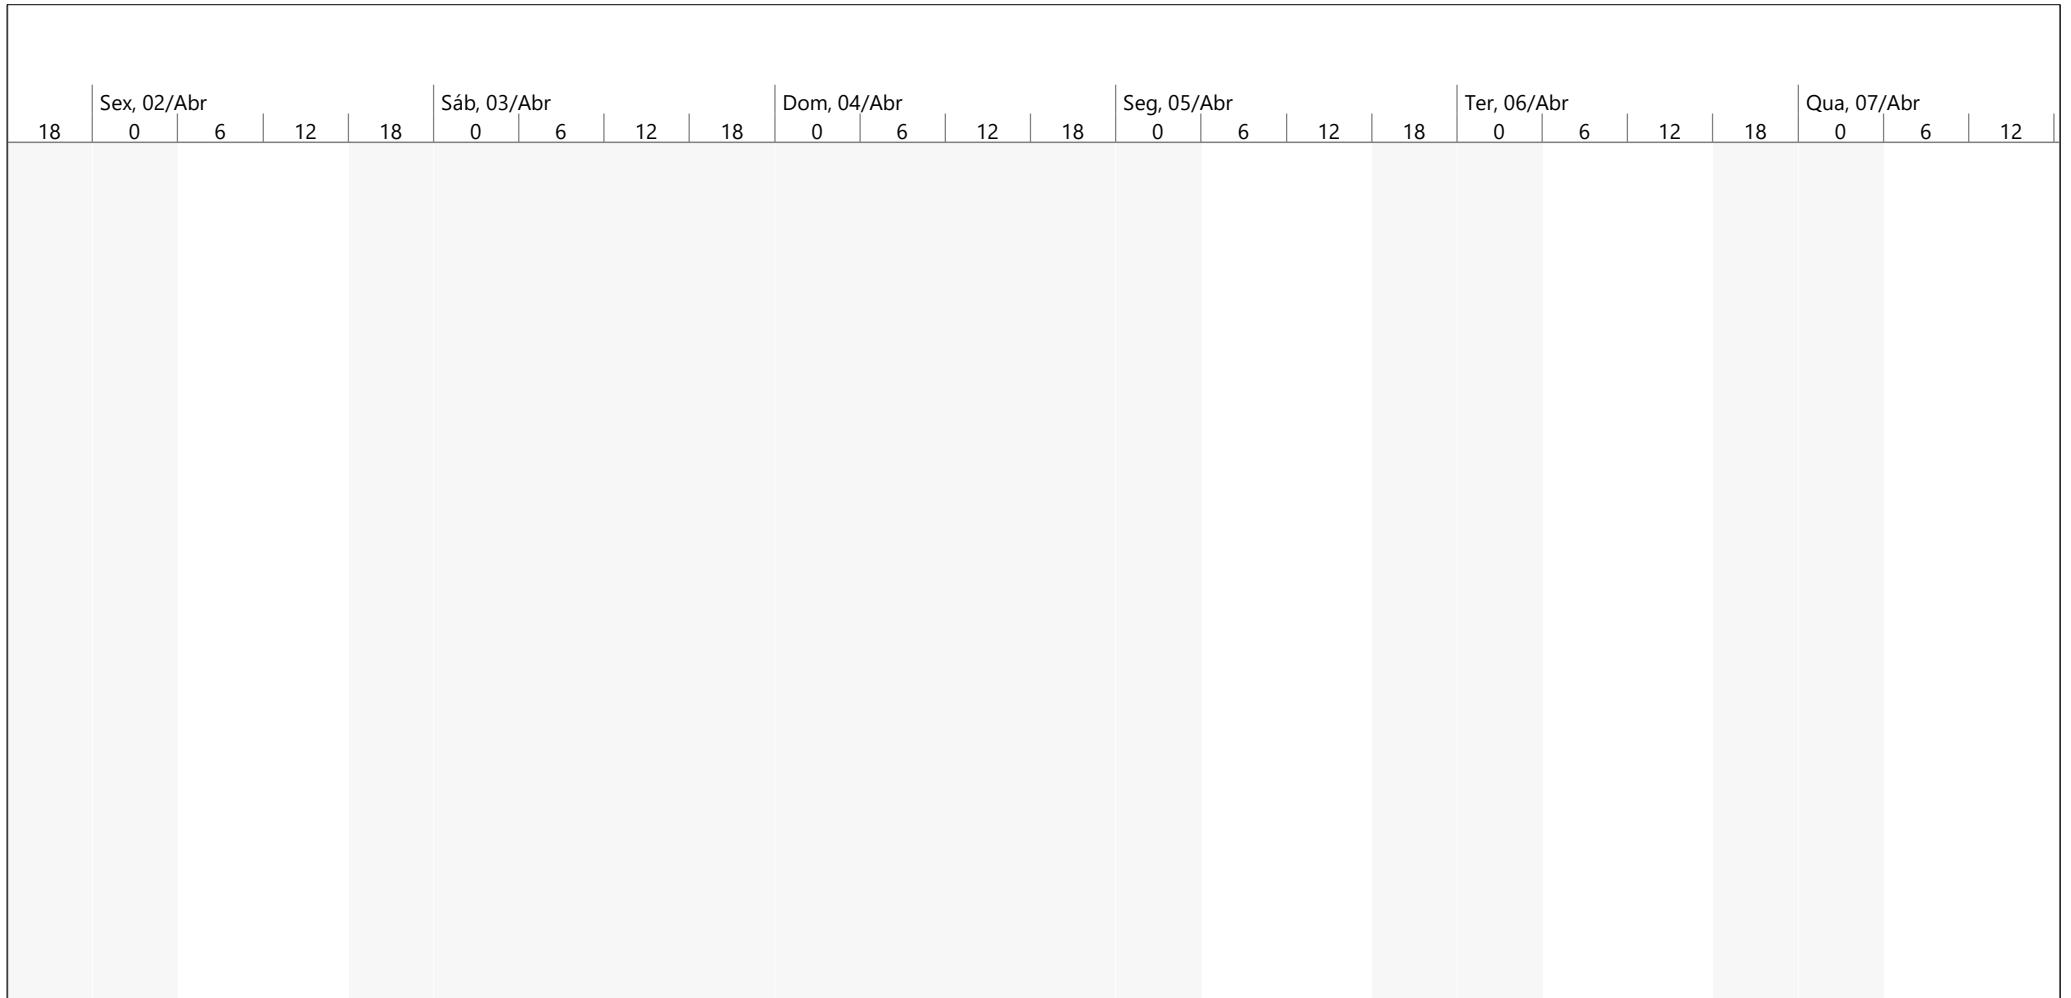


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

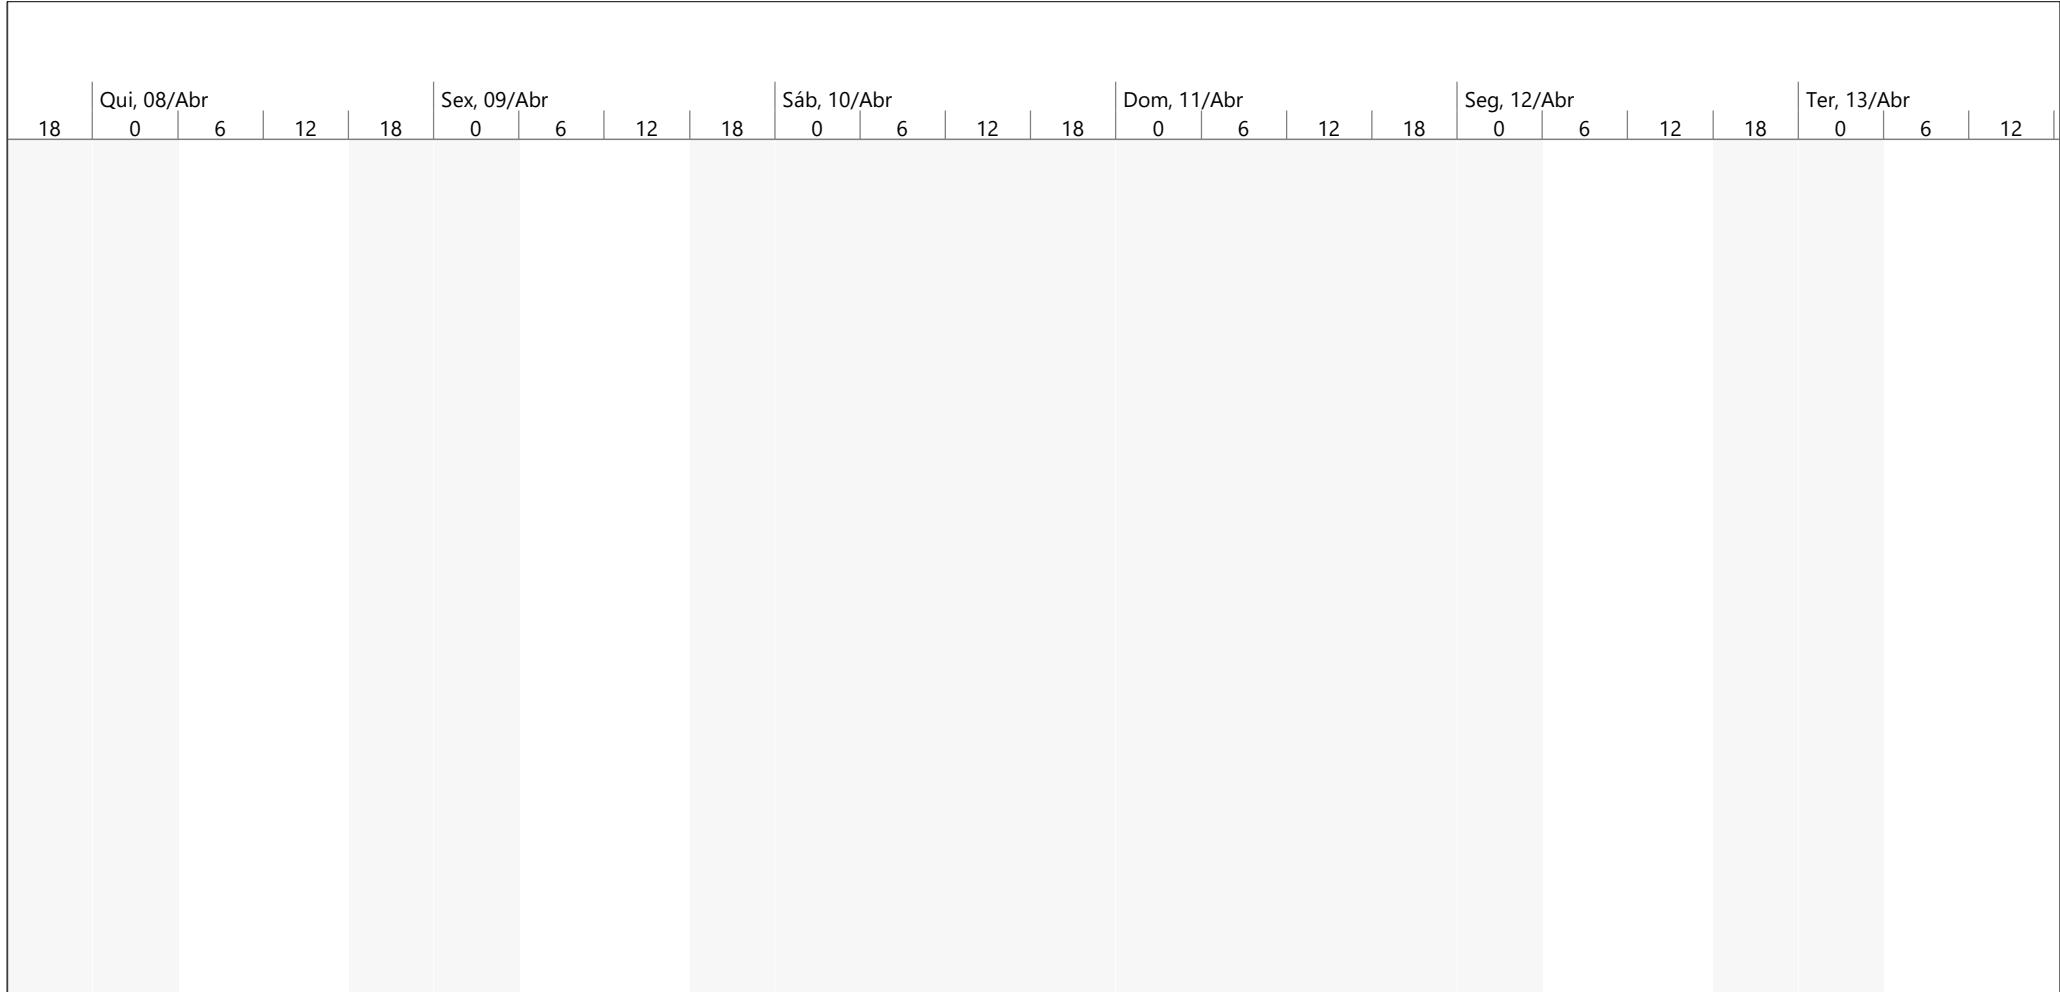

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

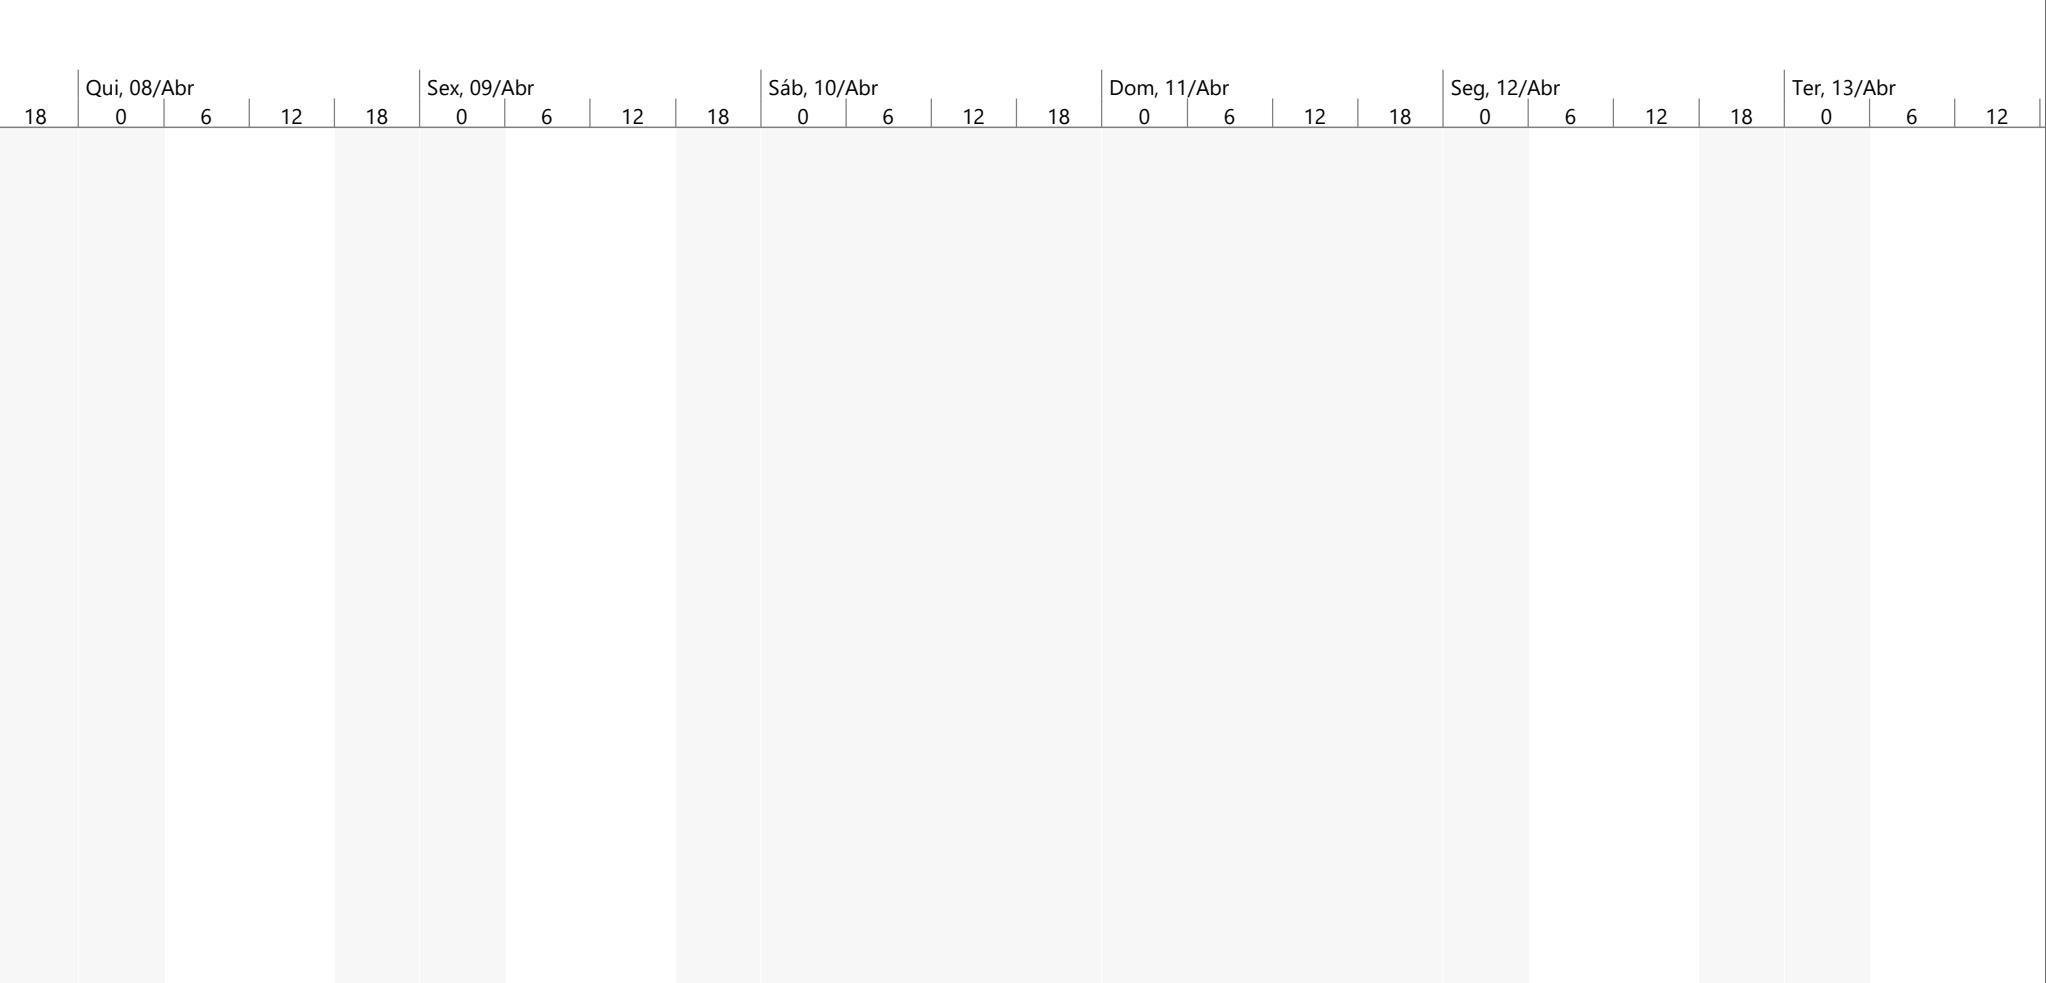


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

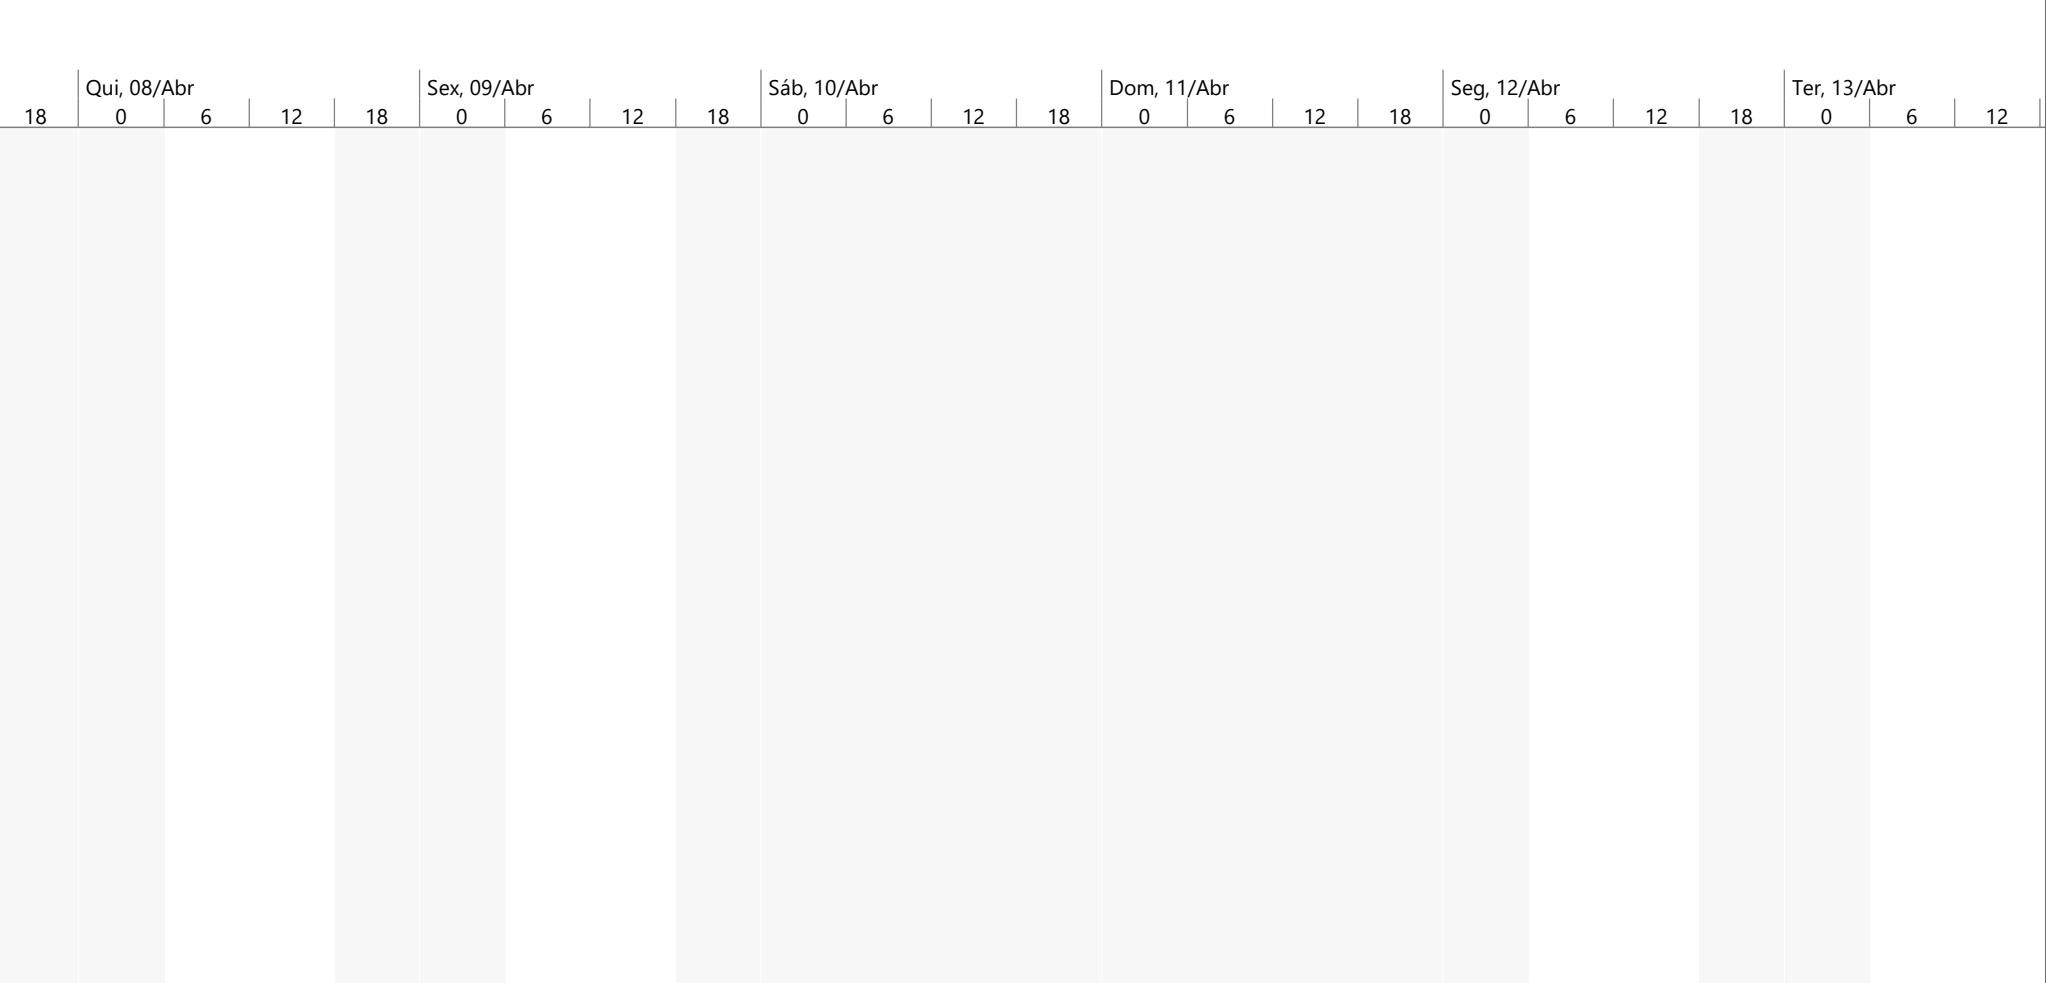


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

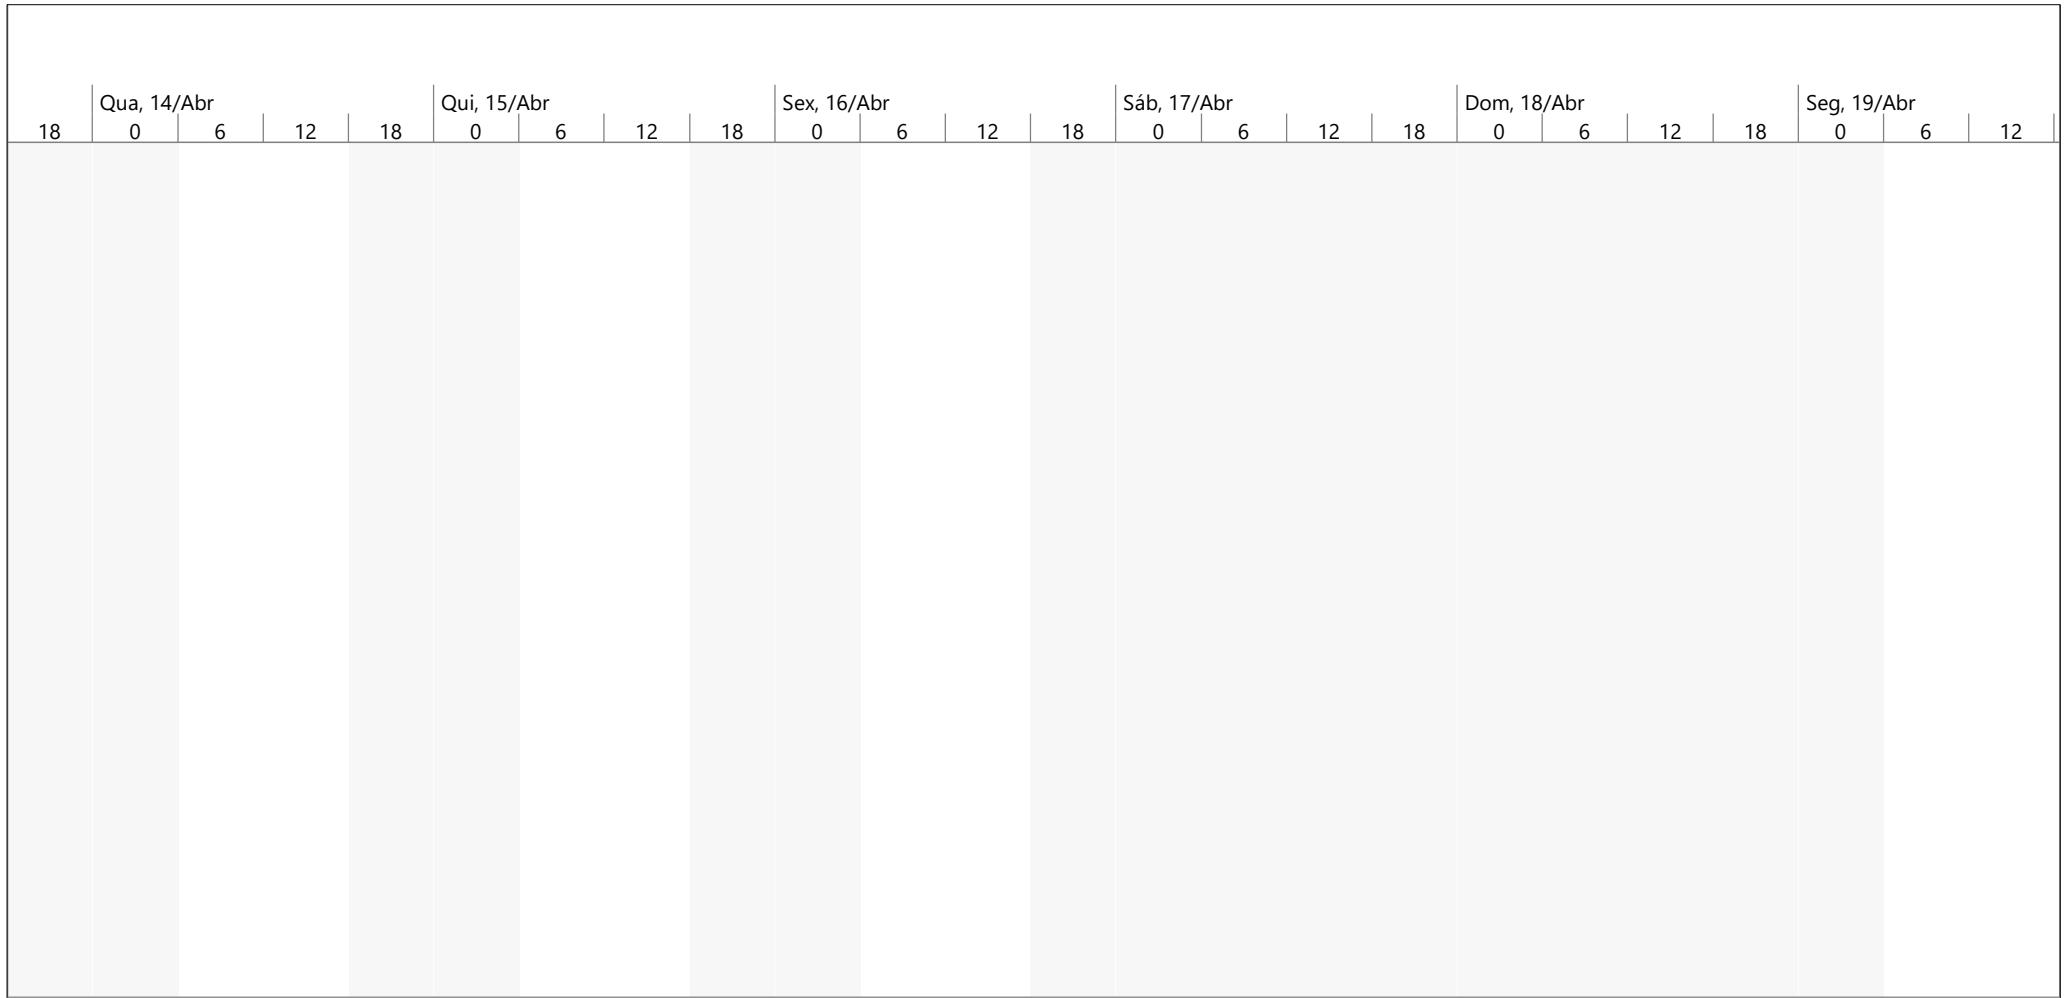


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

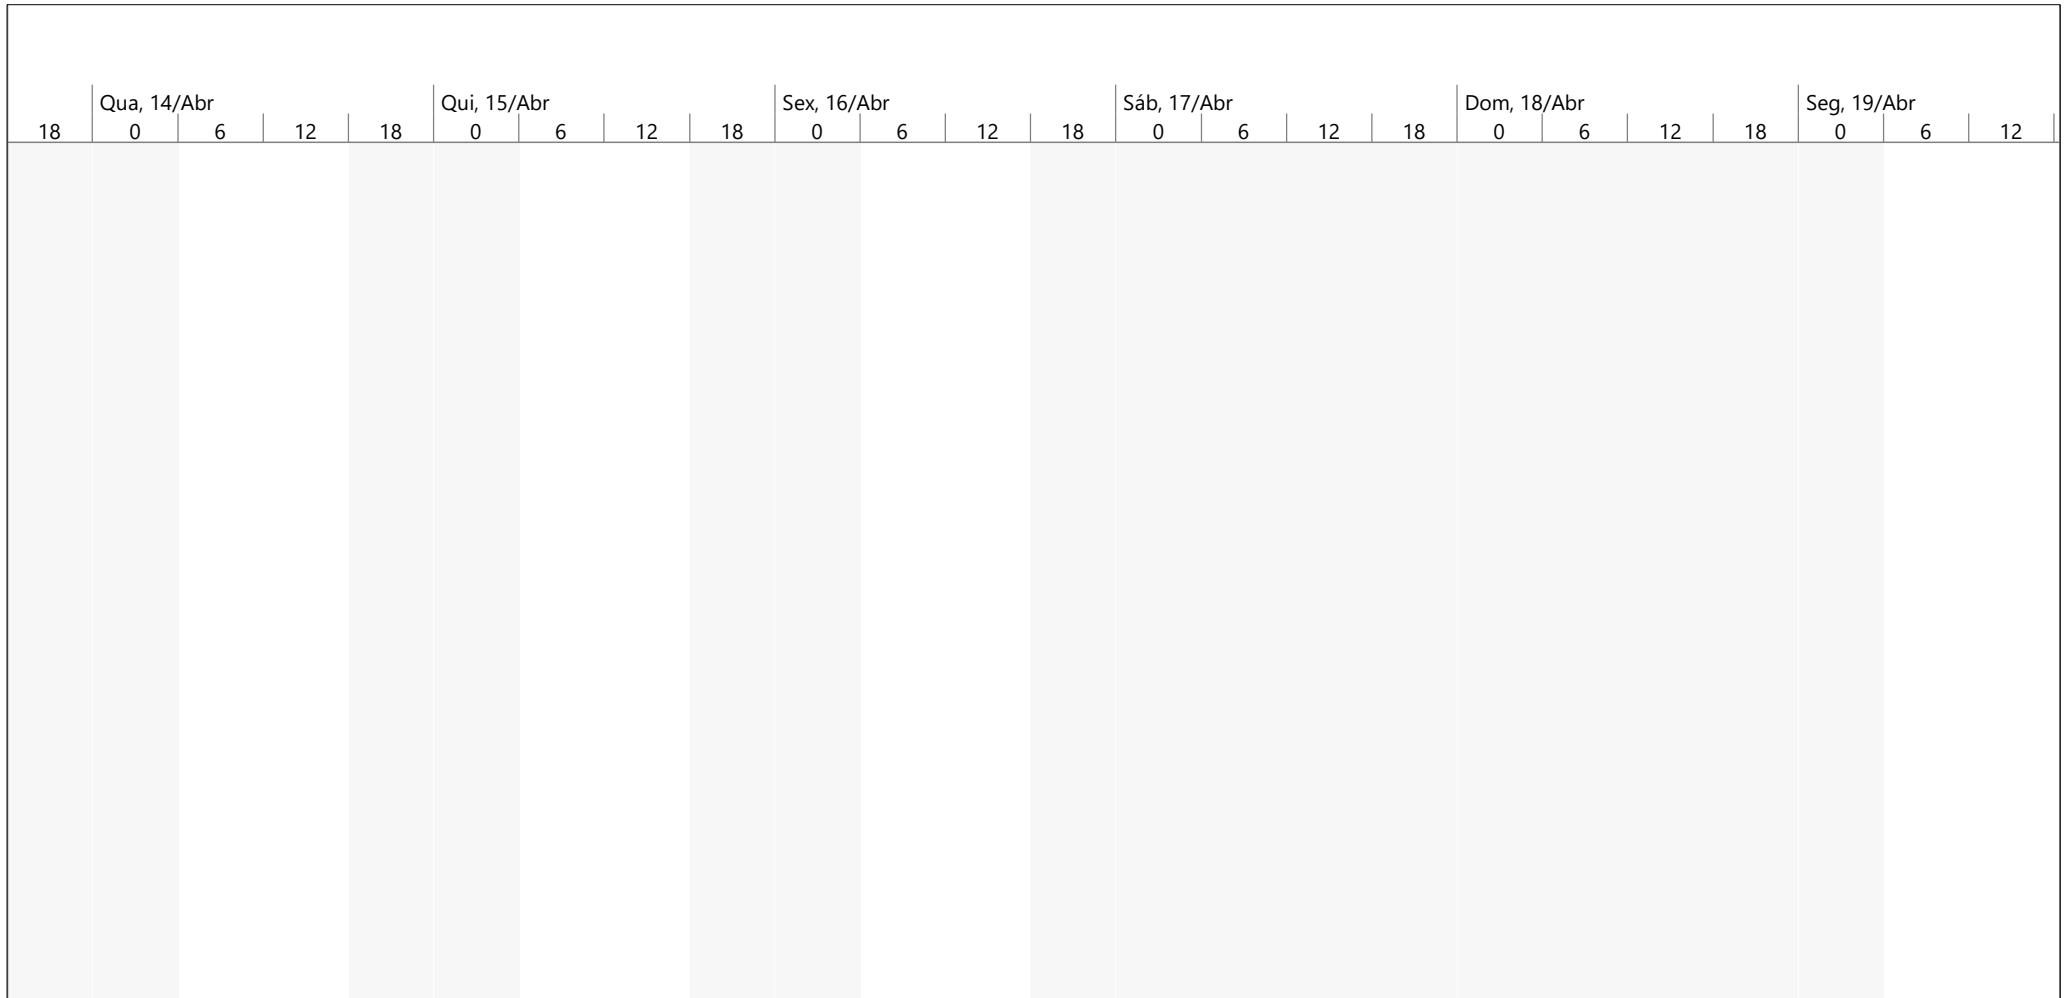


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

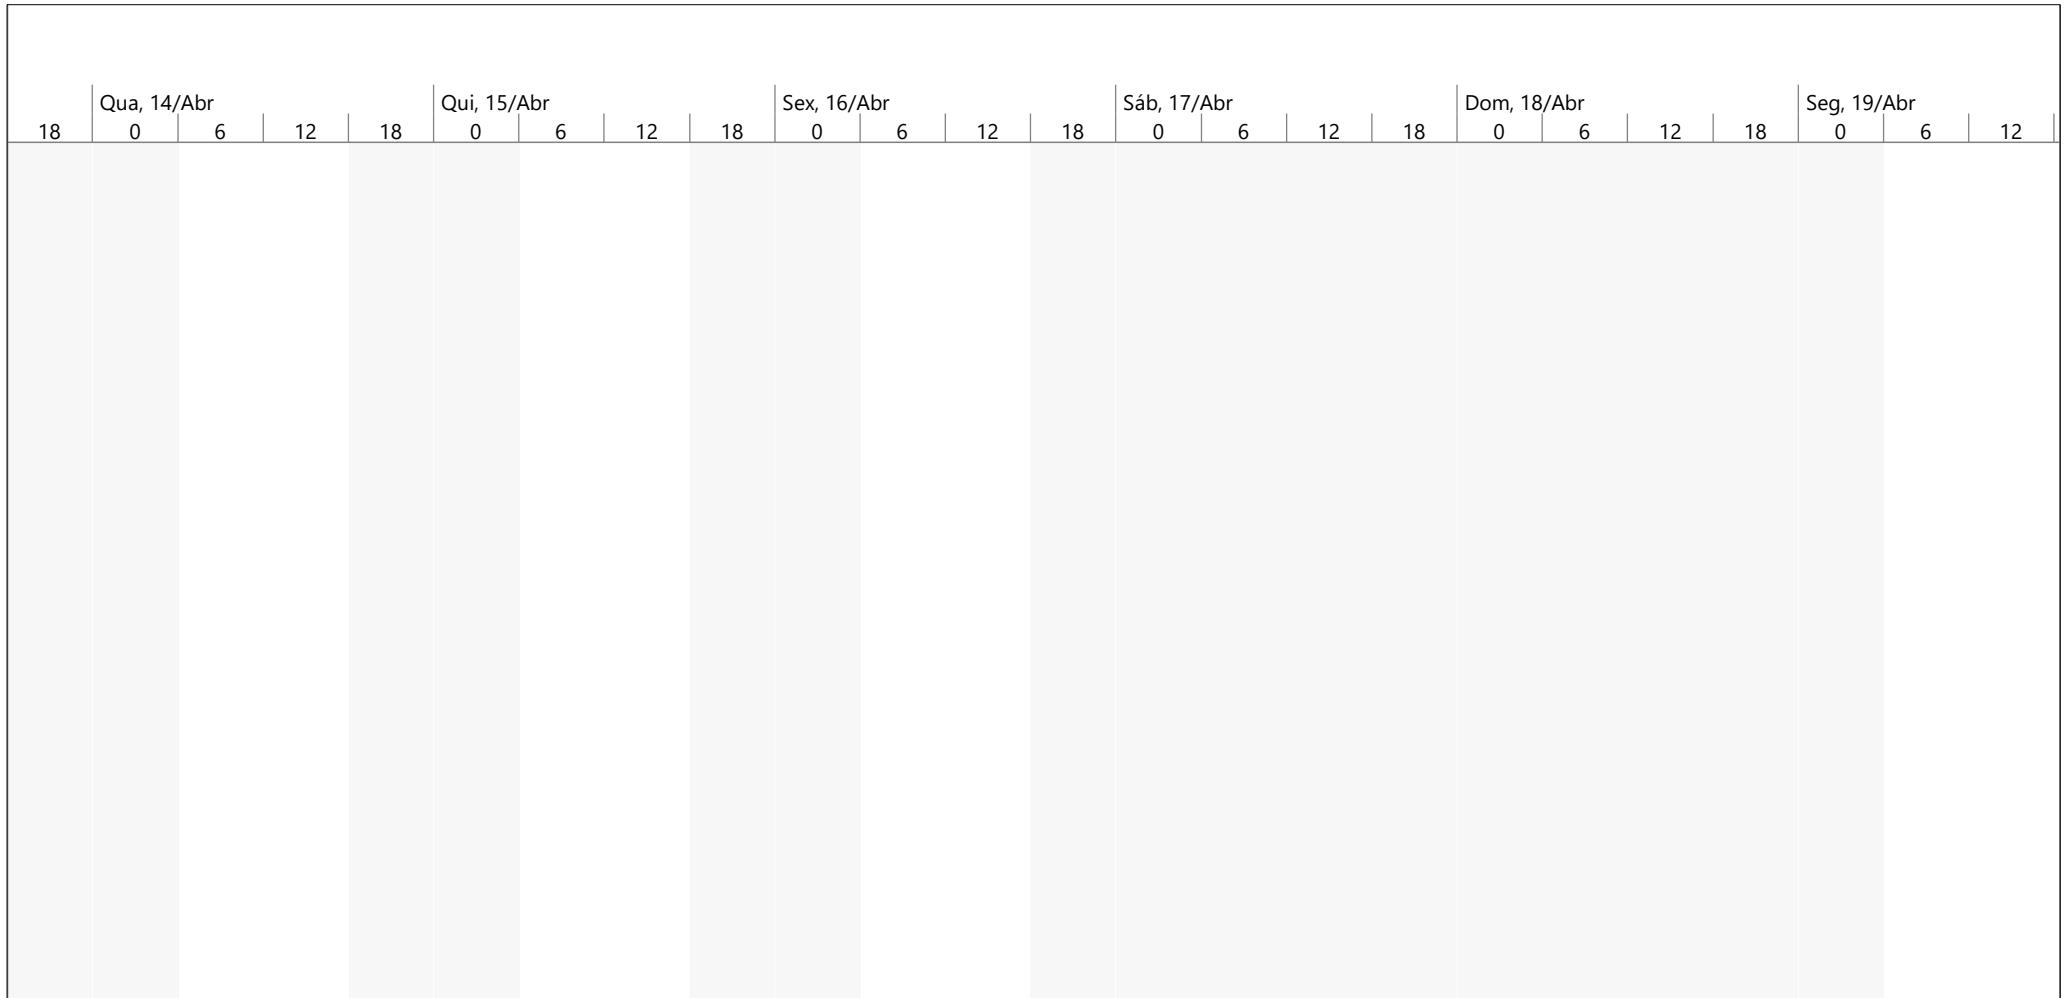


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

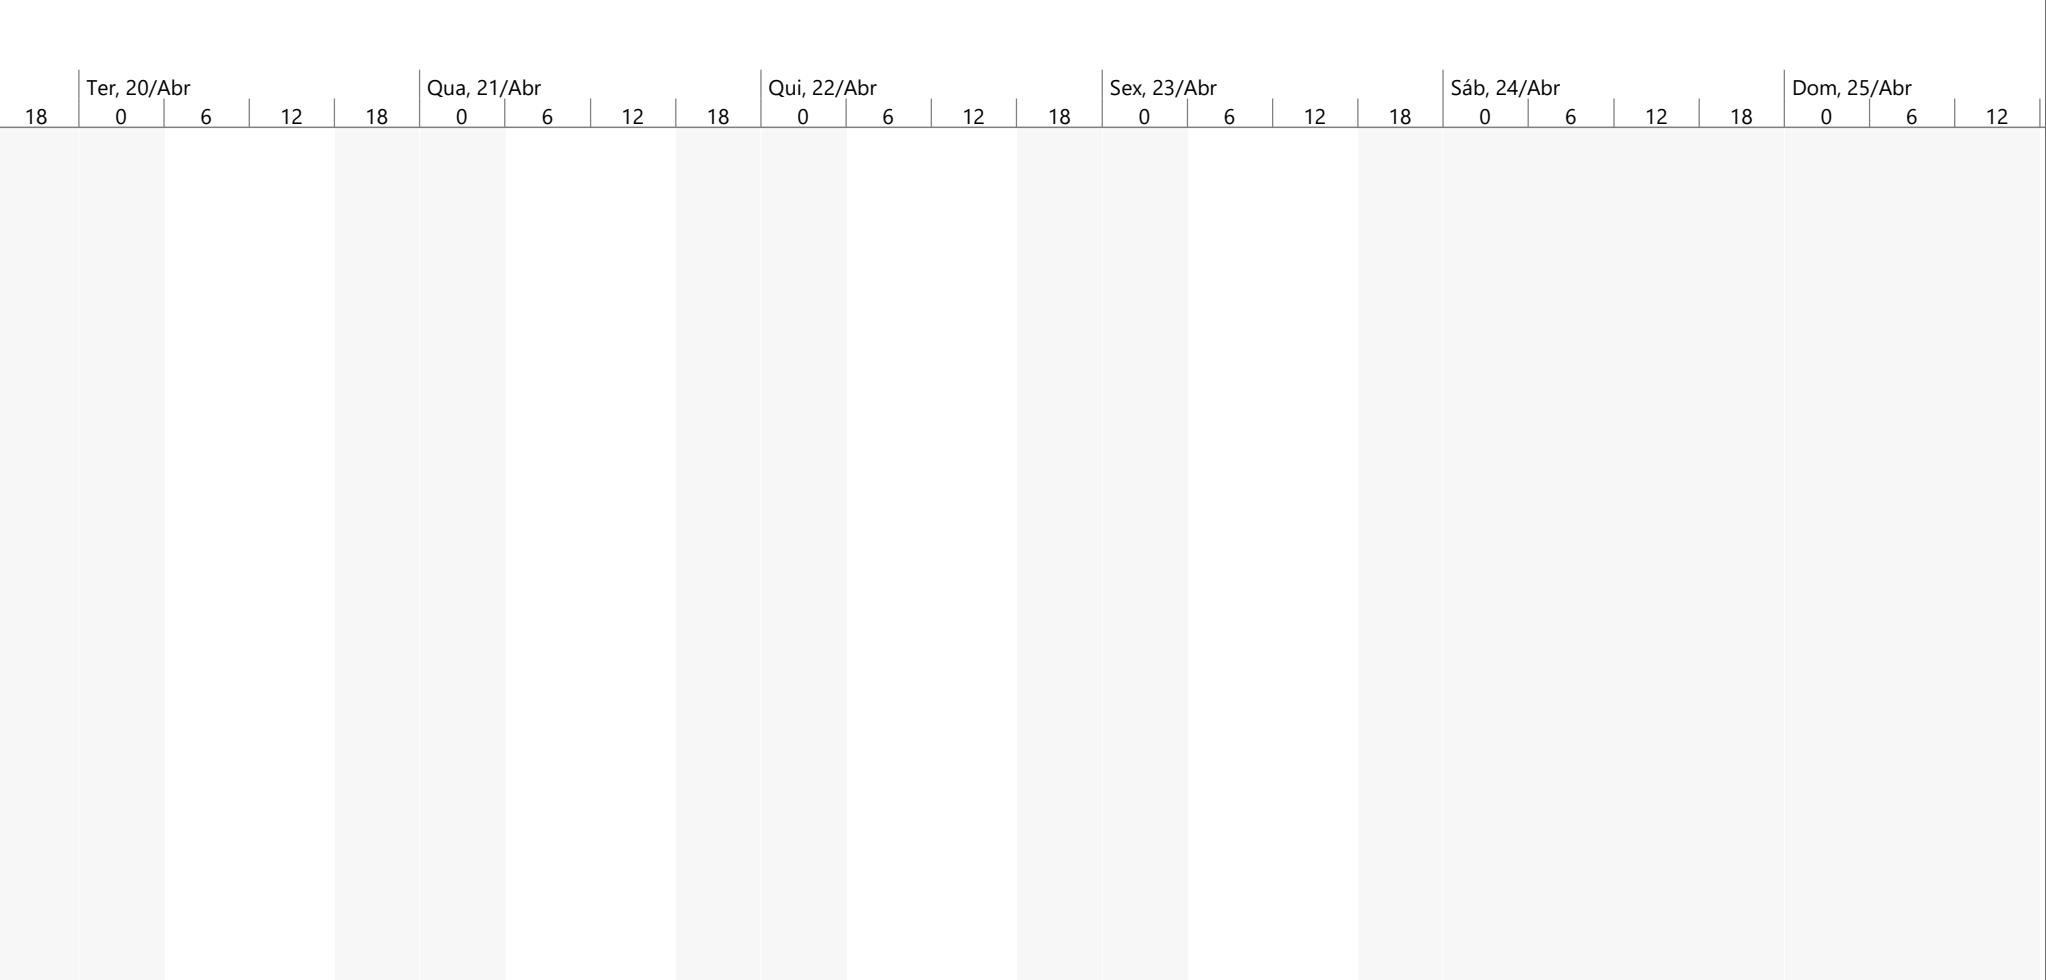


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

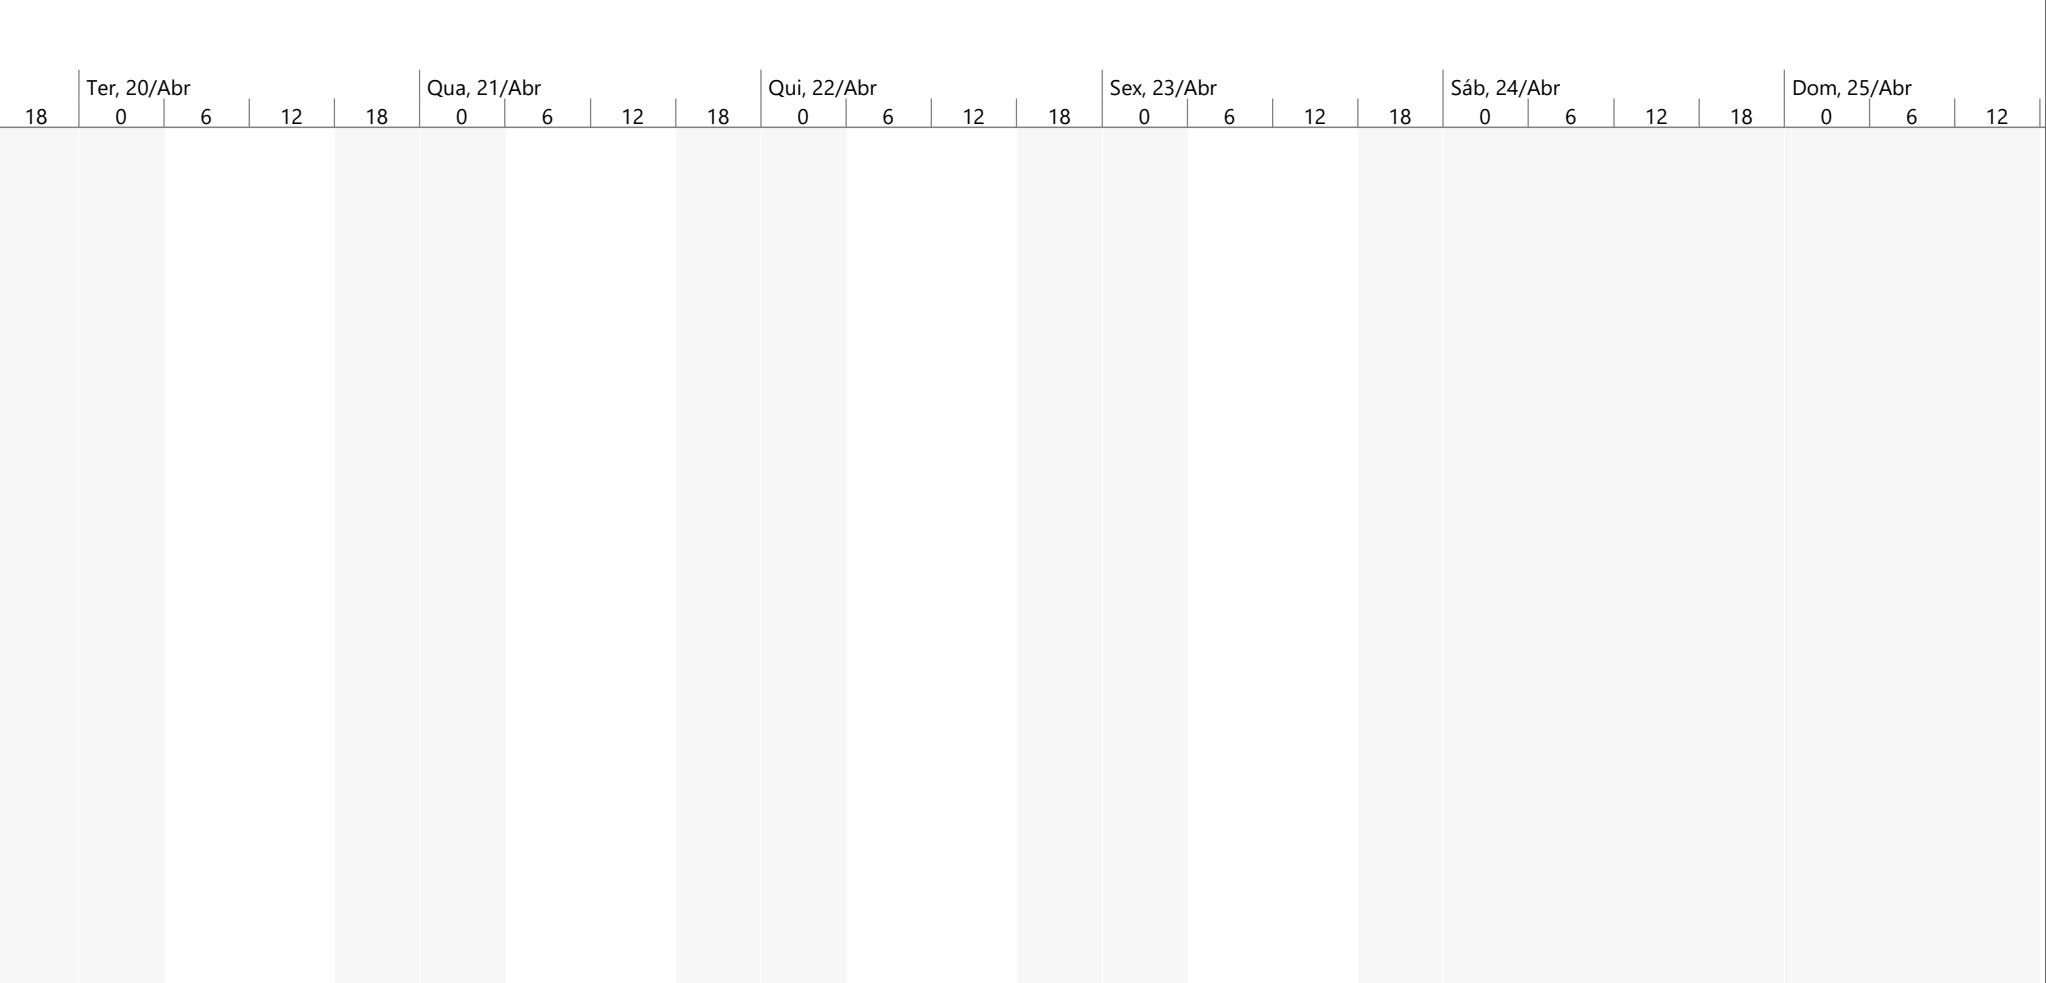

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

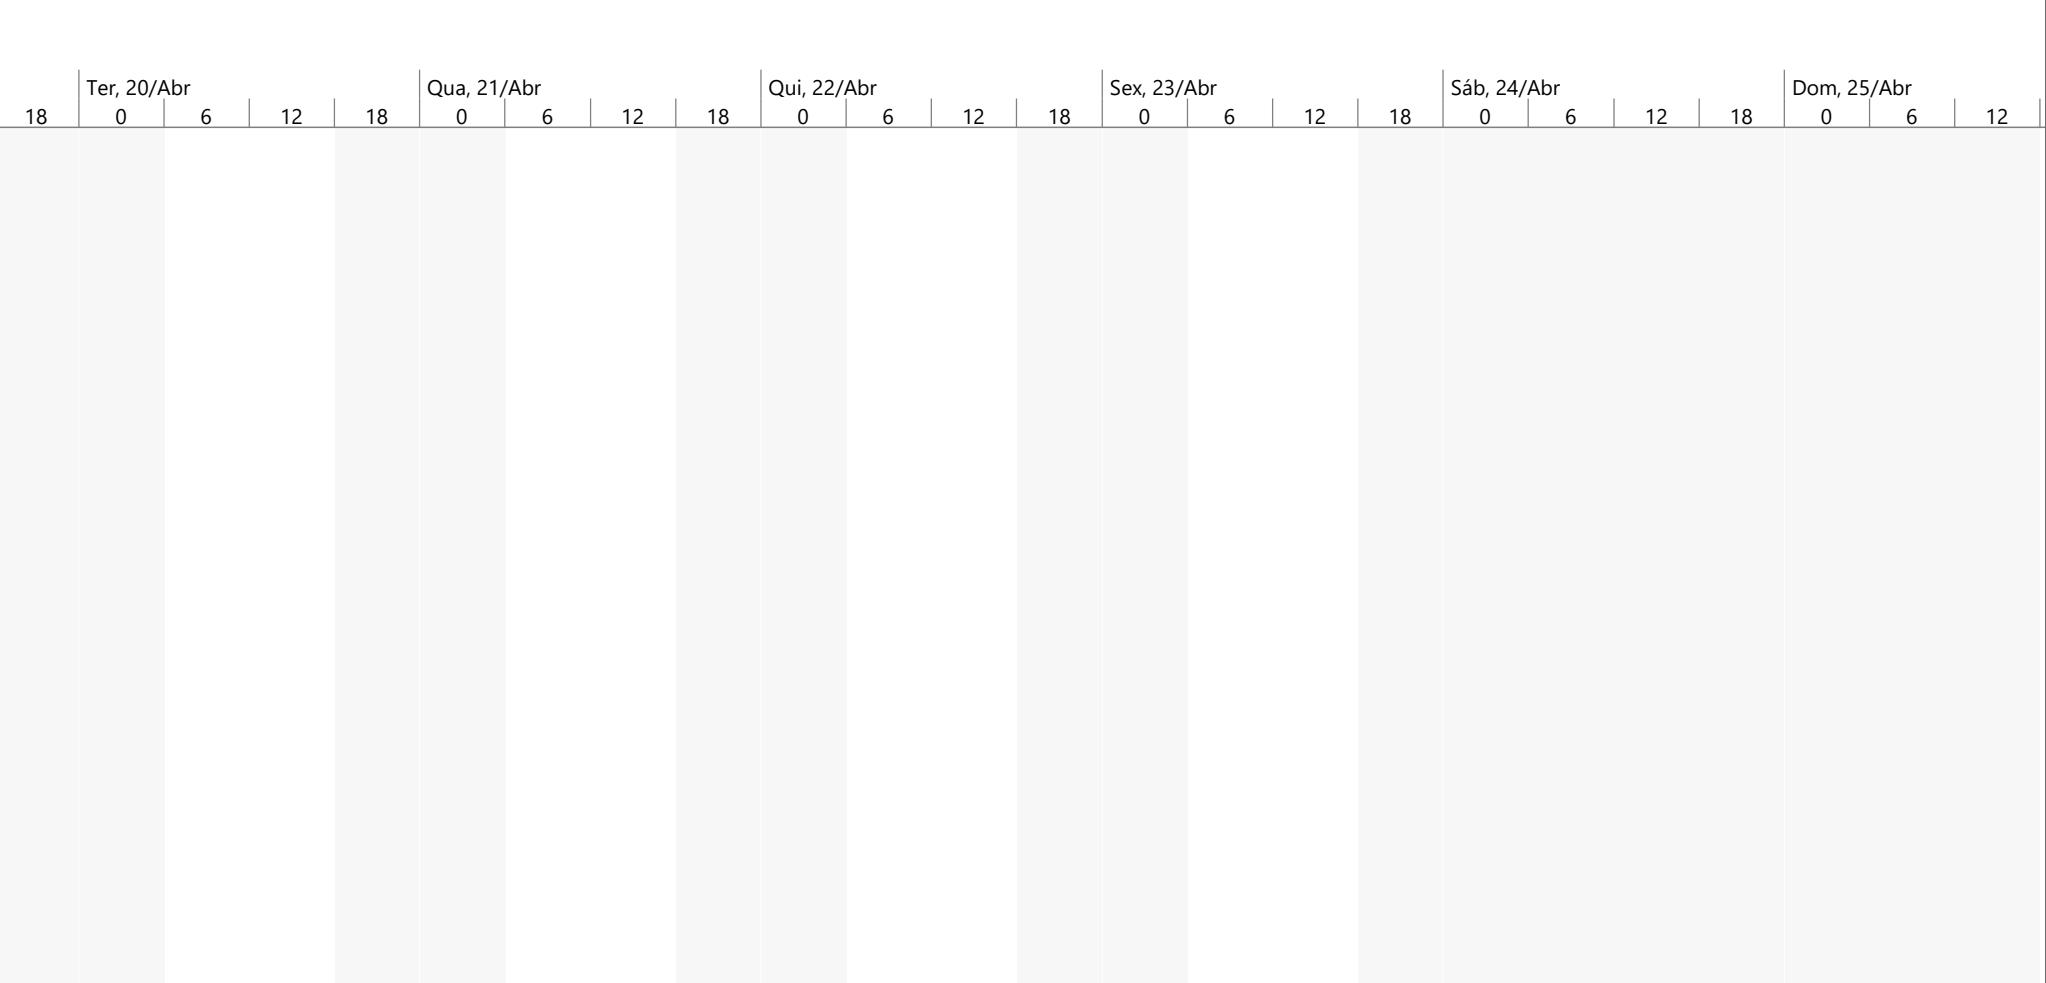


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	


18	Seg, 26/Abr	0	6	12	18	Ter, 27/Abr	0	6	12	18	Qua, 28/Abr	0	6	12	18	Qui, 29/Abr	0	6	12	18	Sex, 30/Abr	0	6	12	18	Sáb, 01/Maio	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	--------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

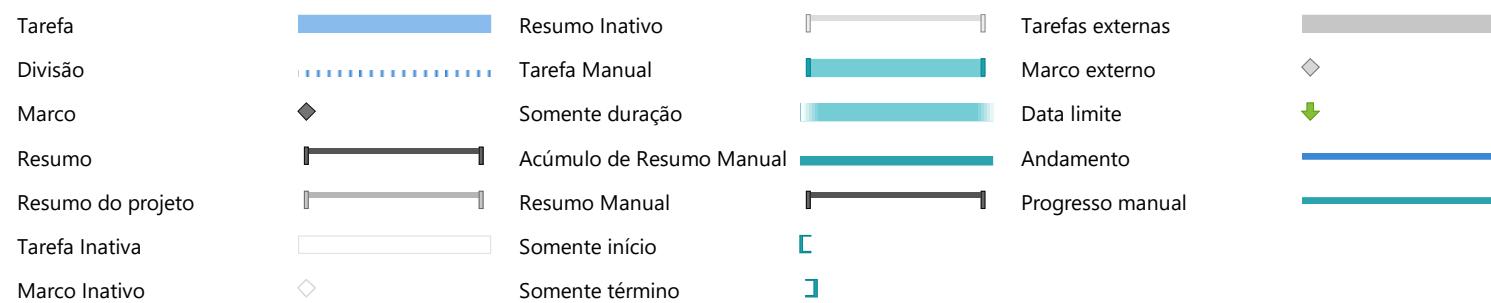





Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

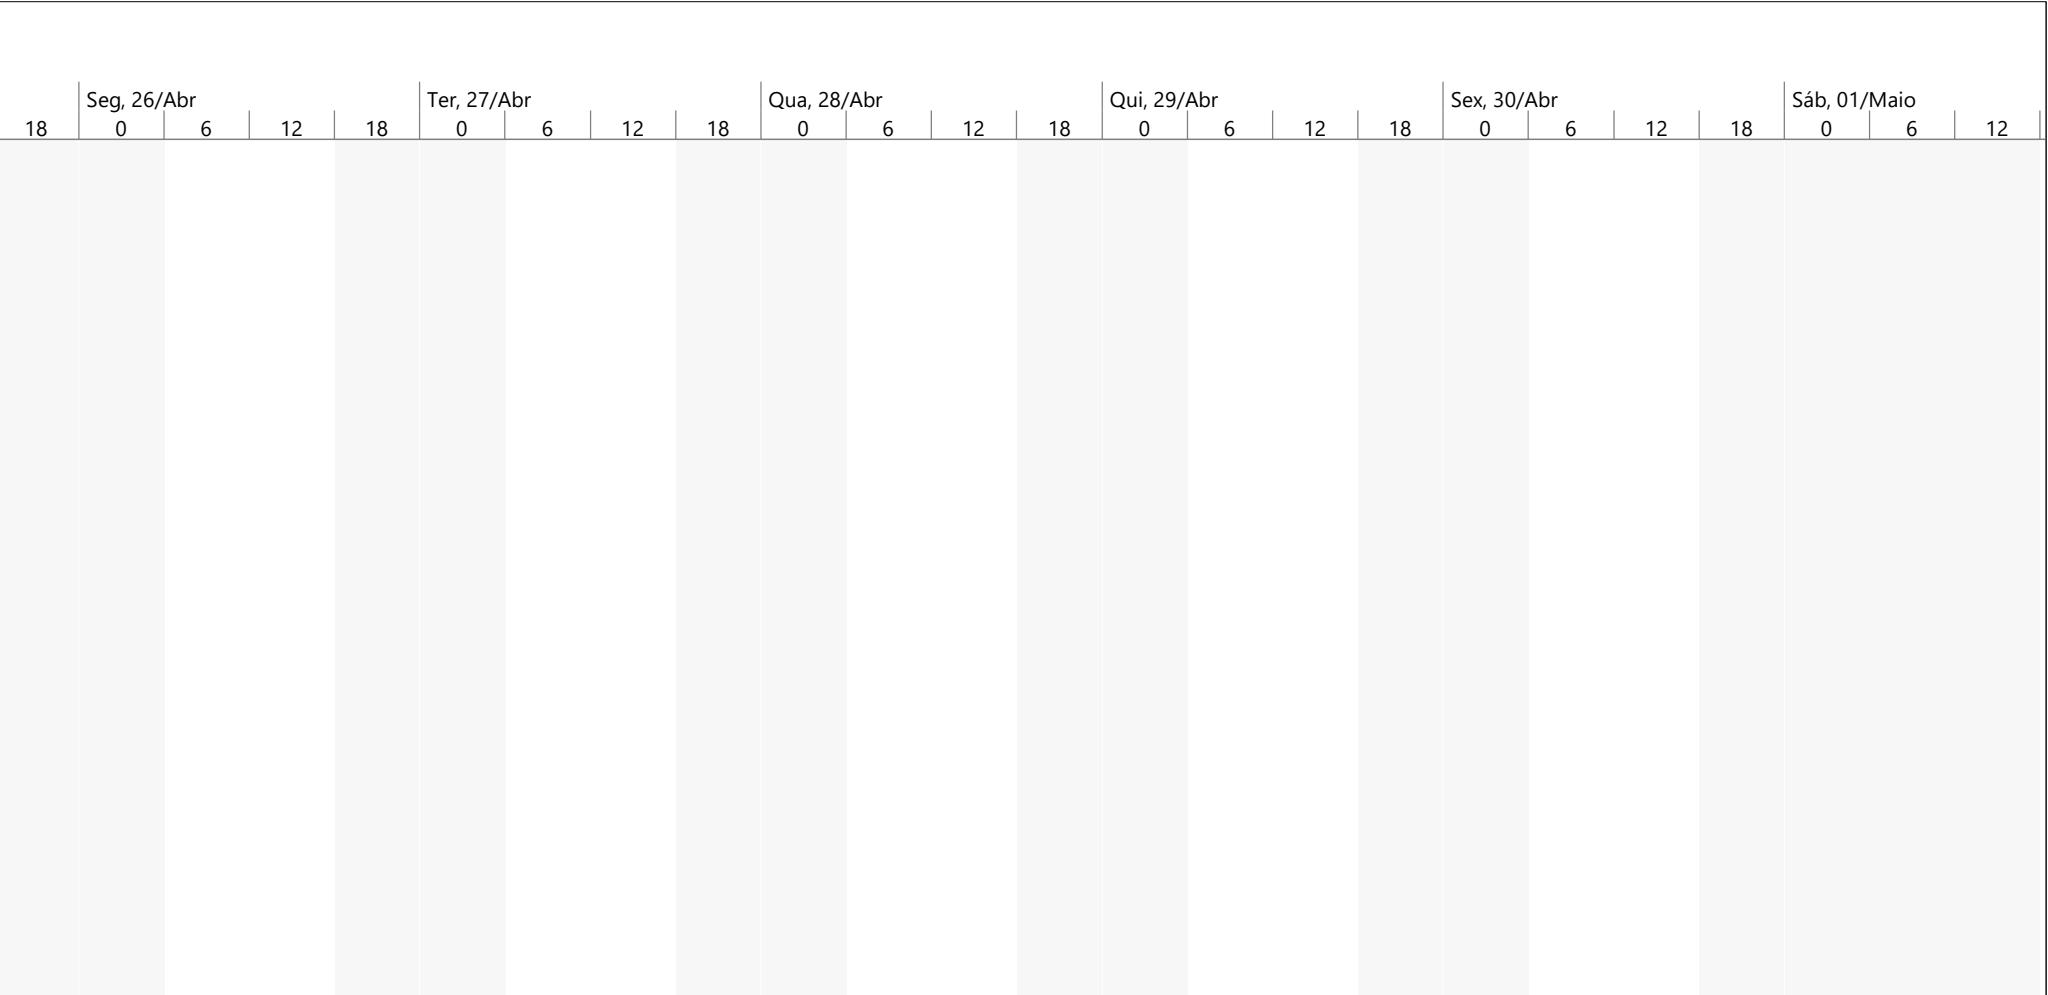

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

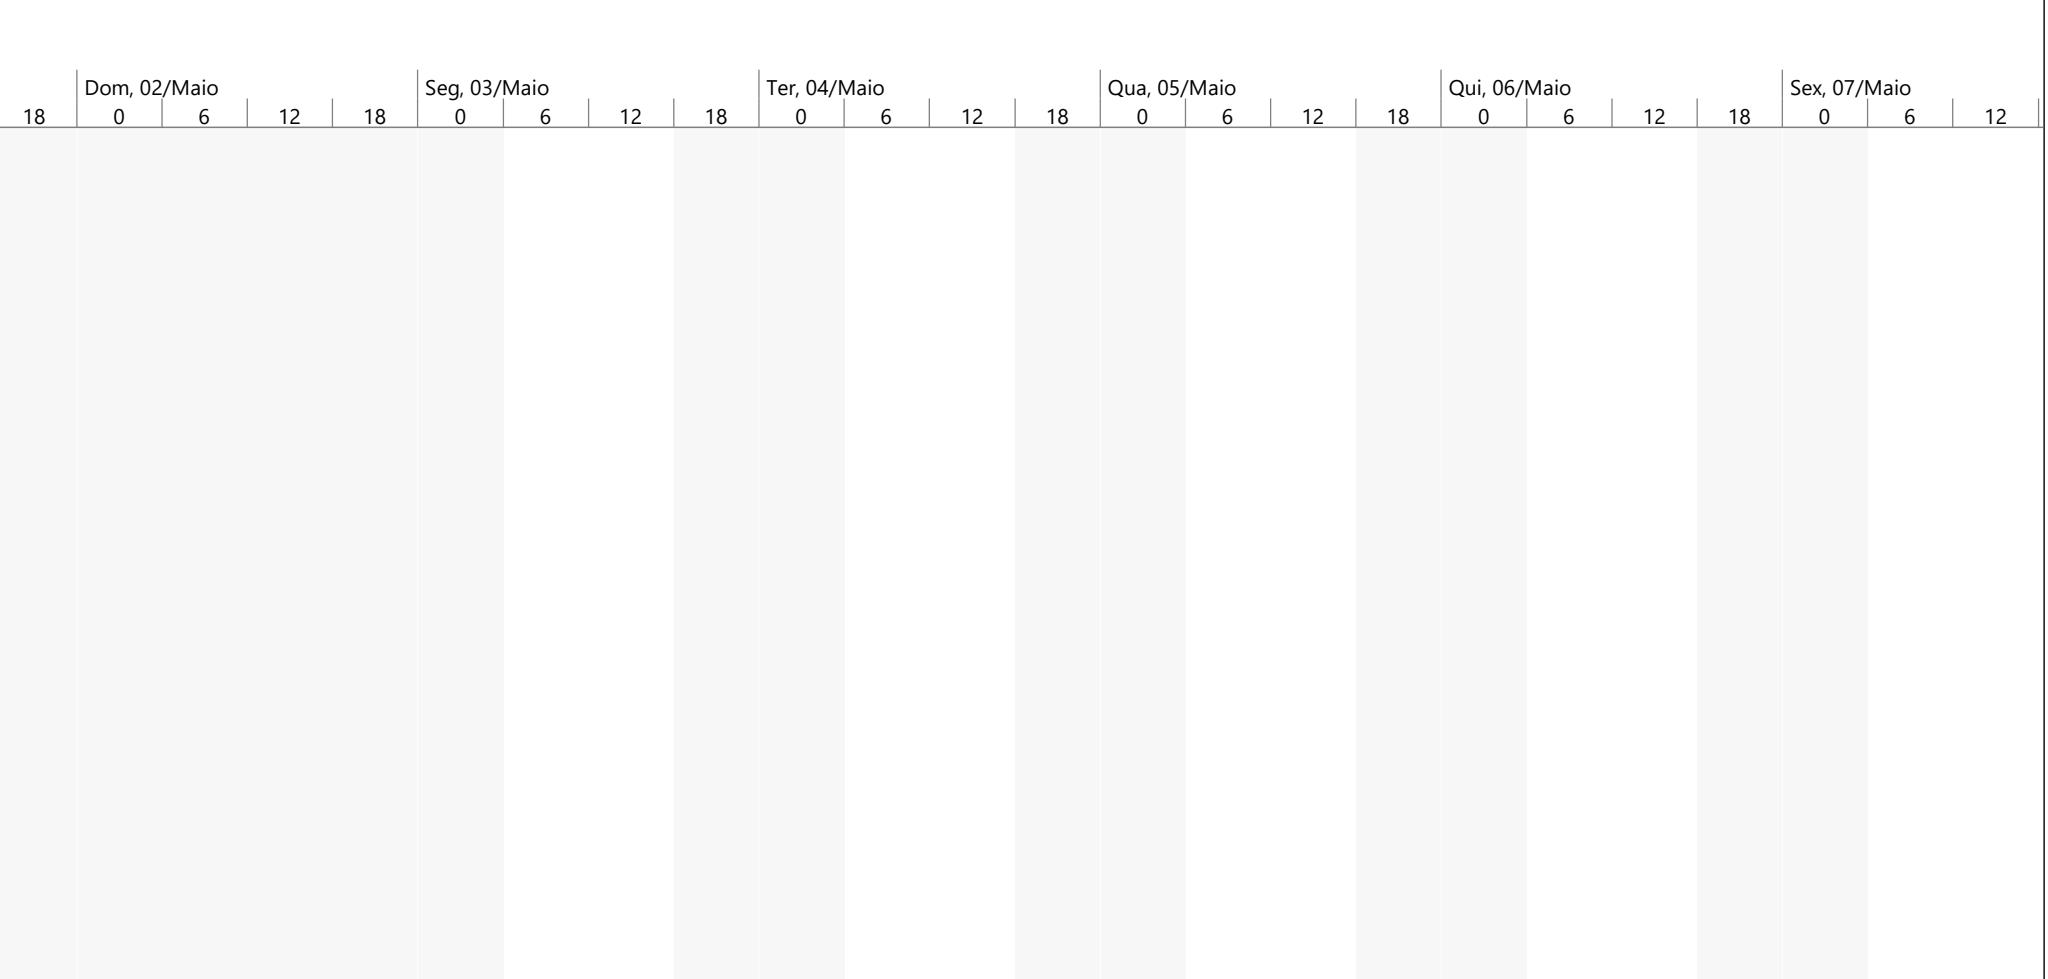



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

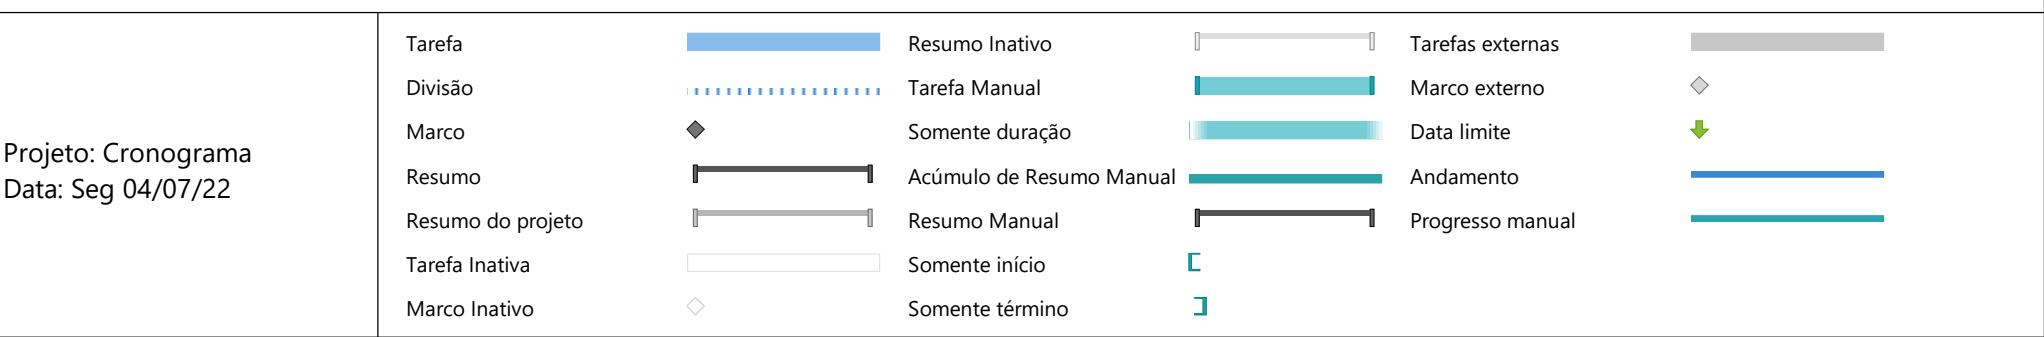


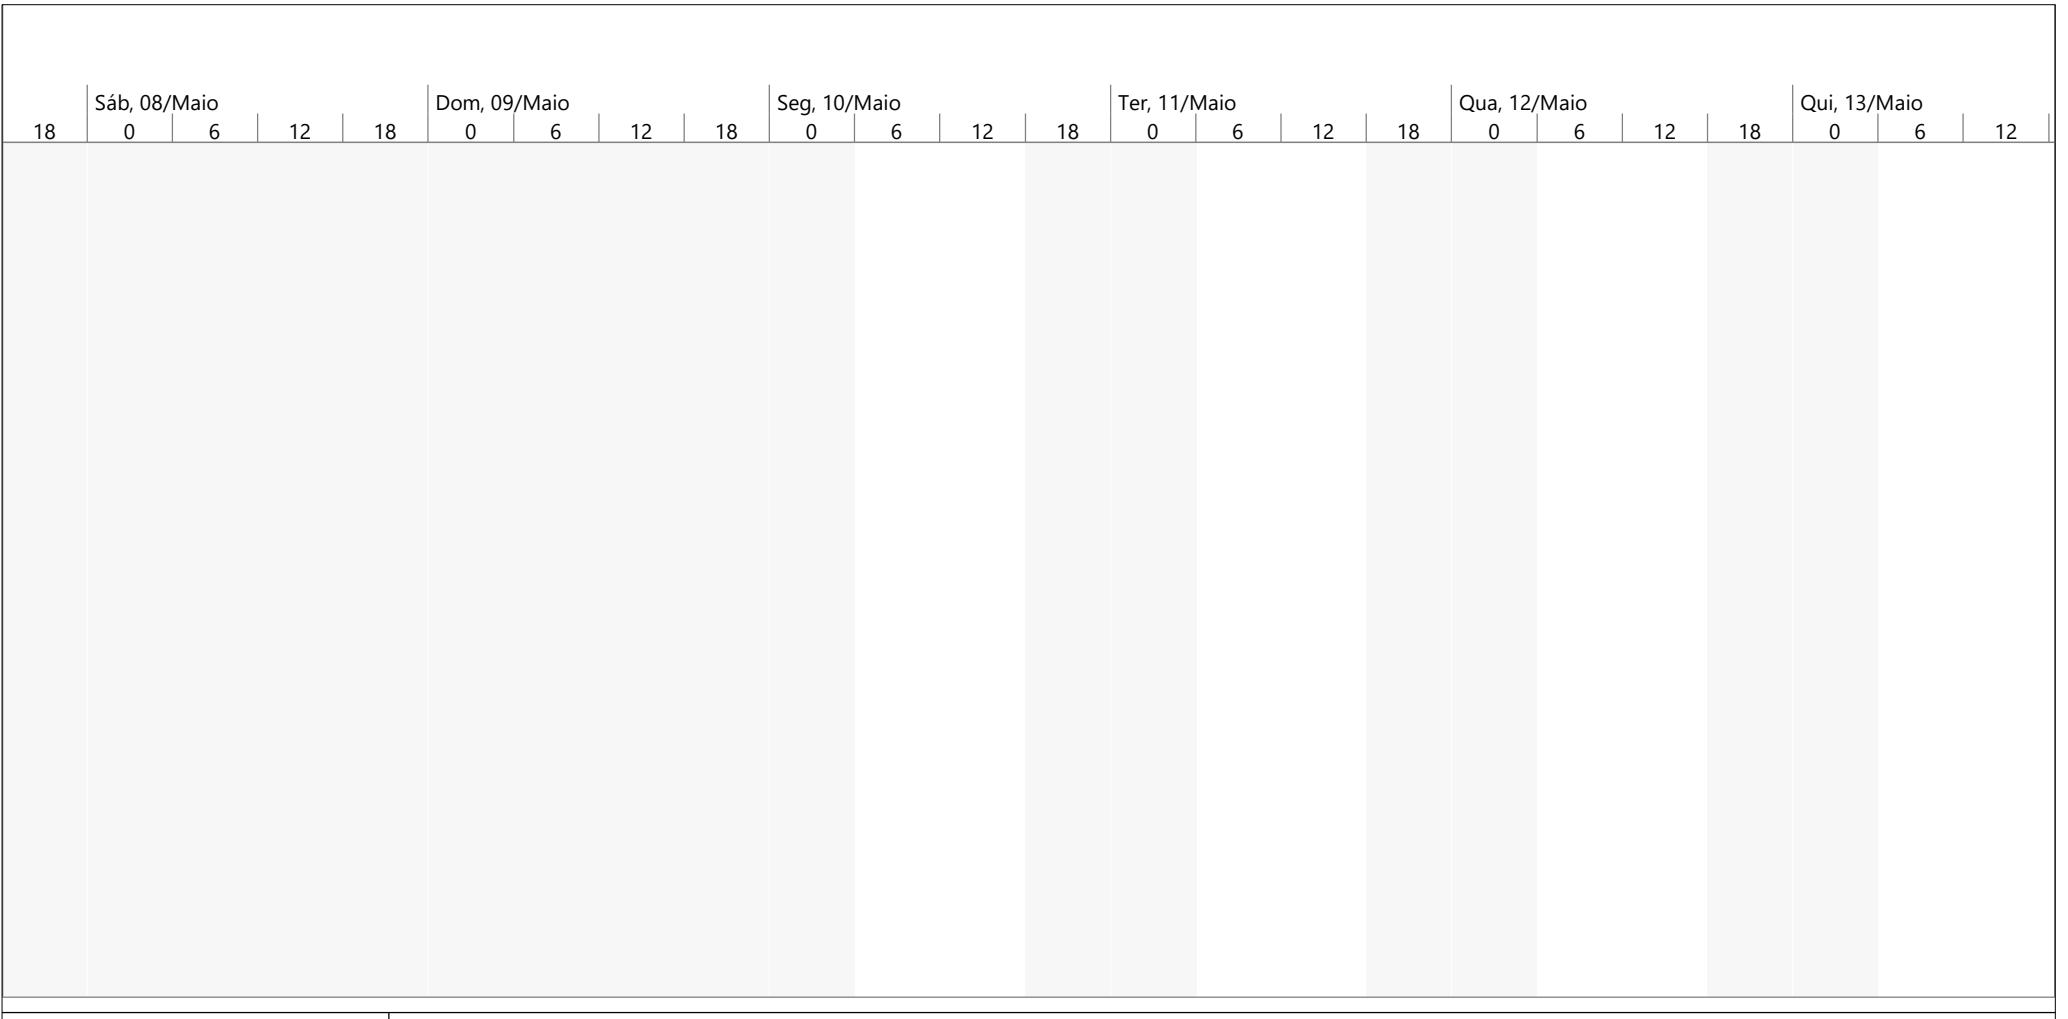


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

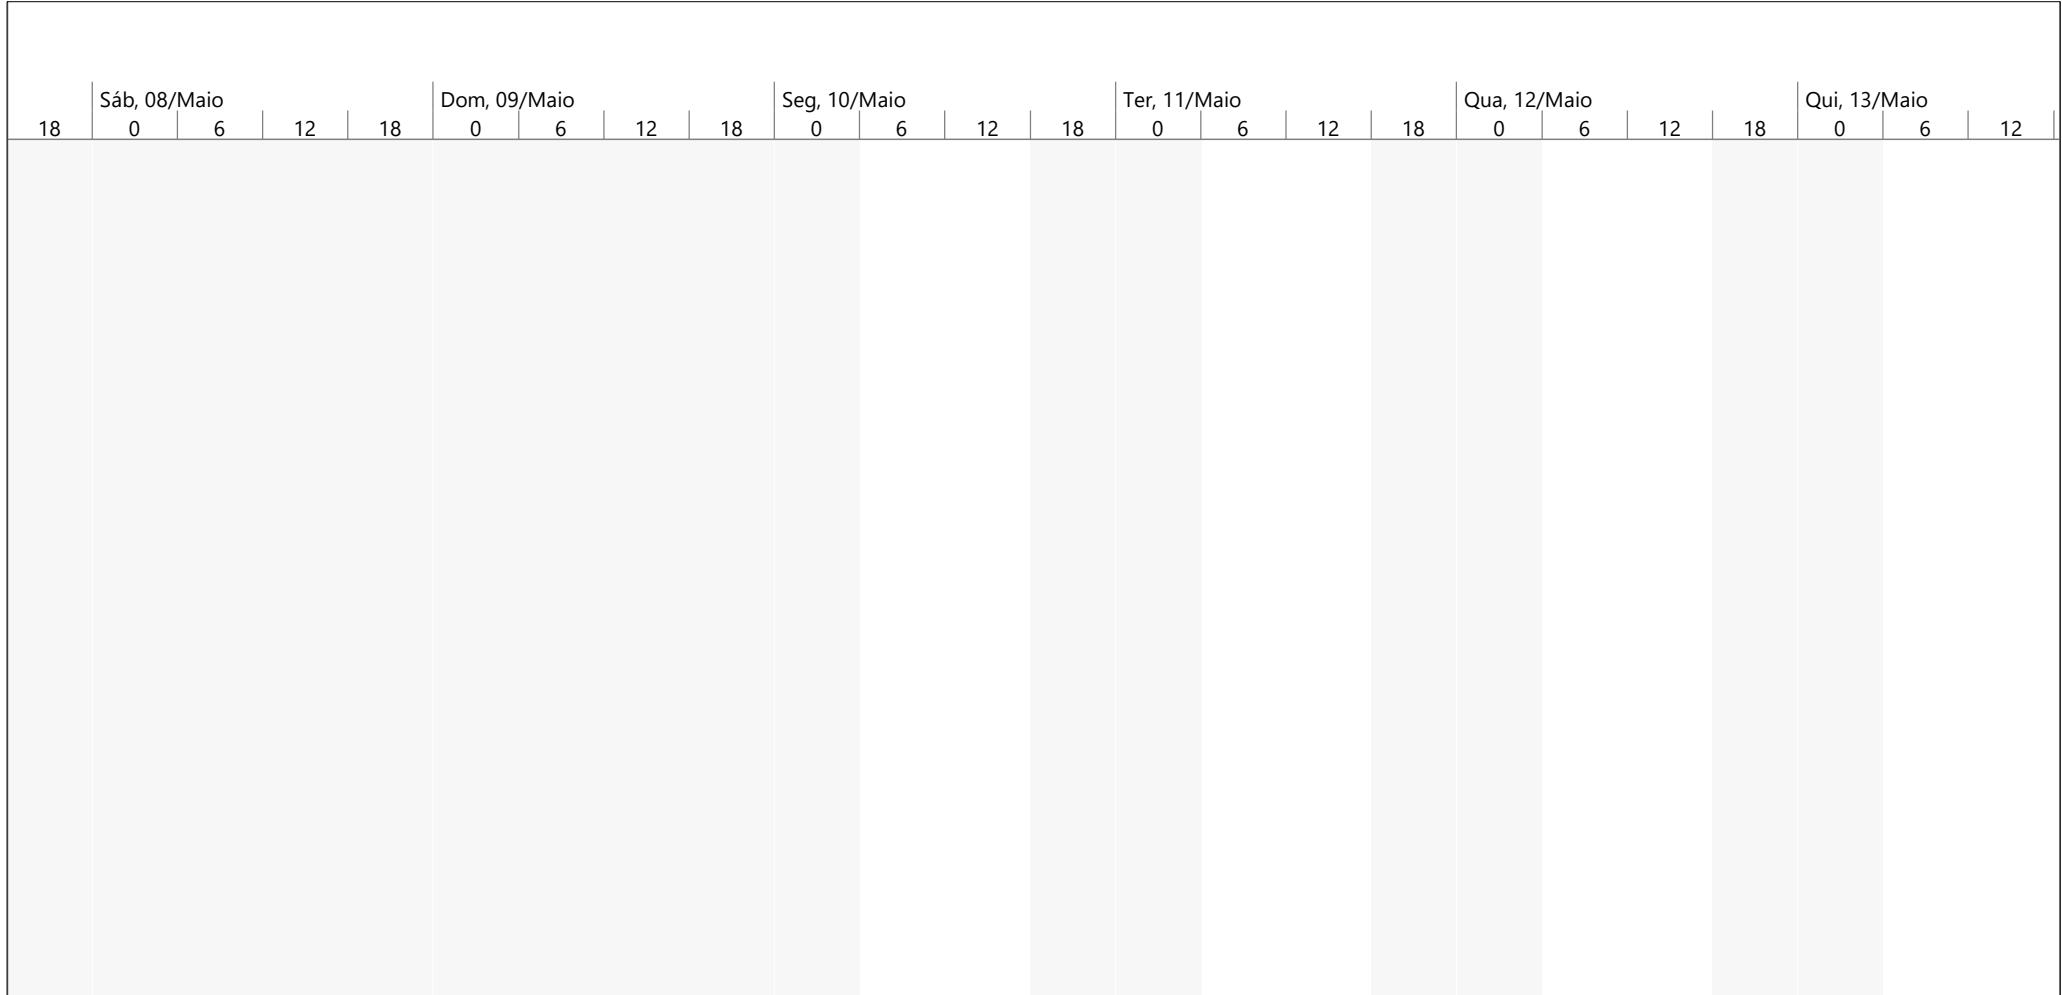


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

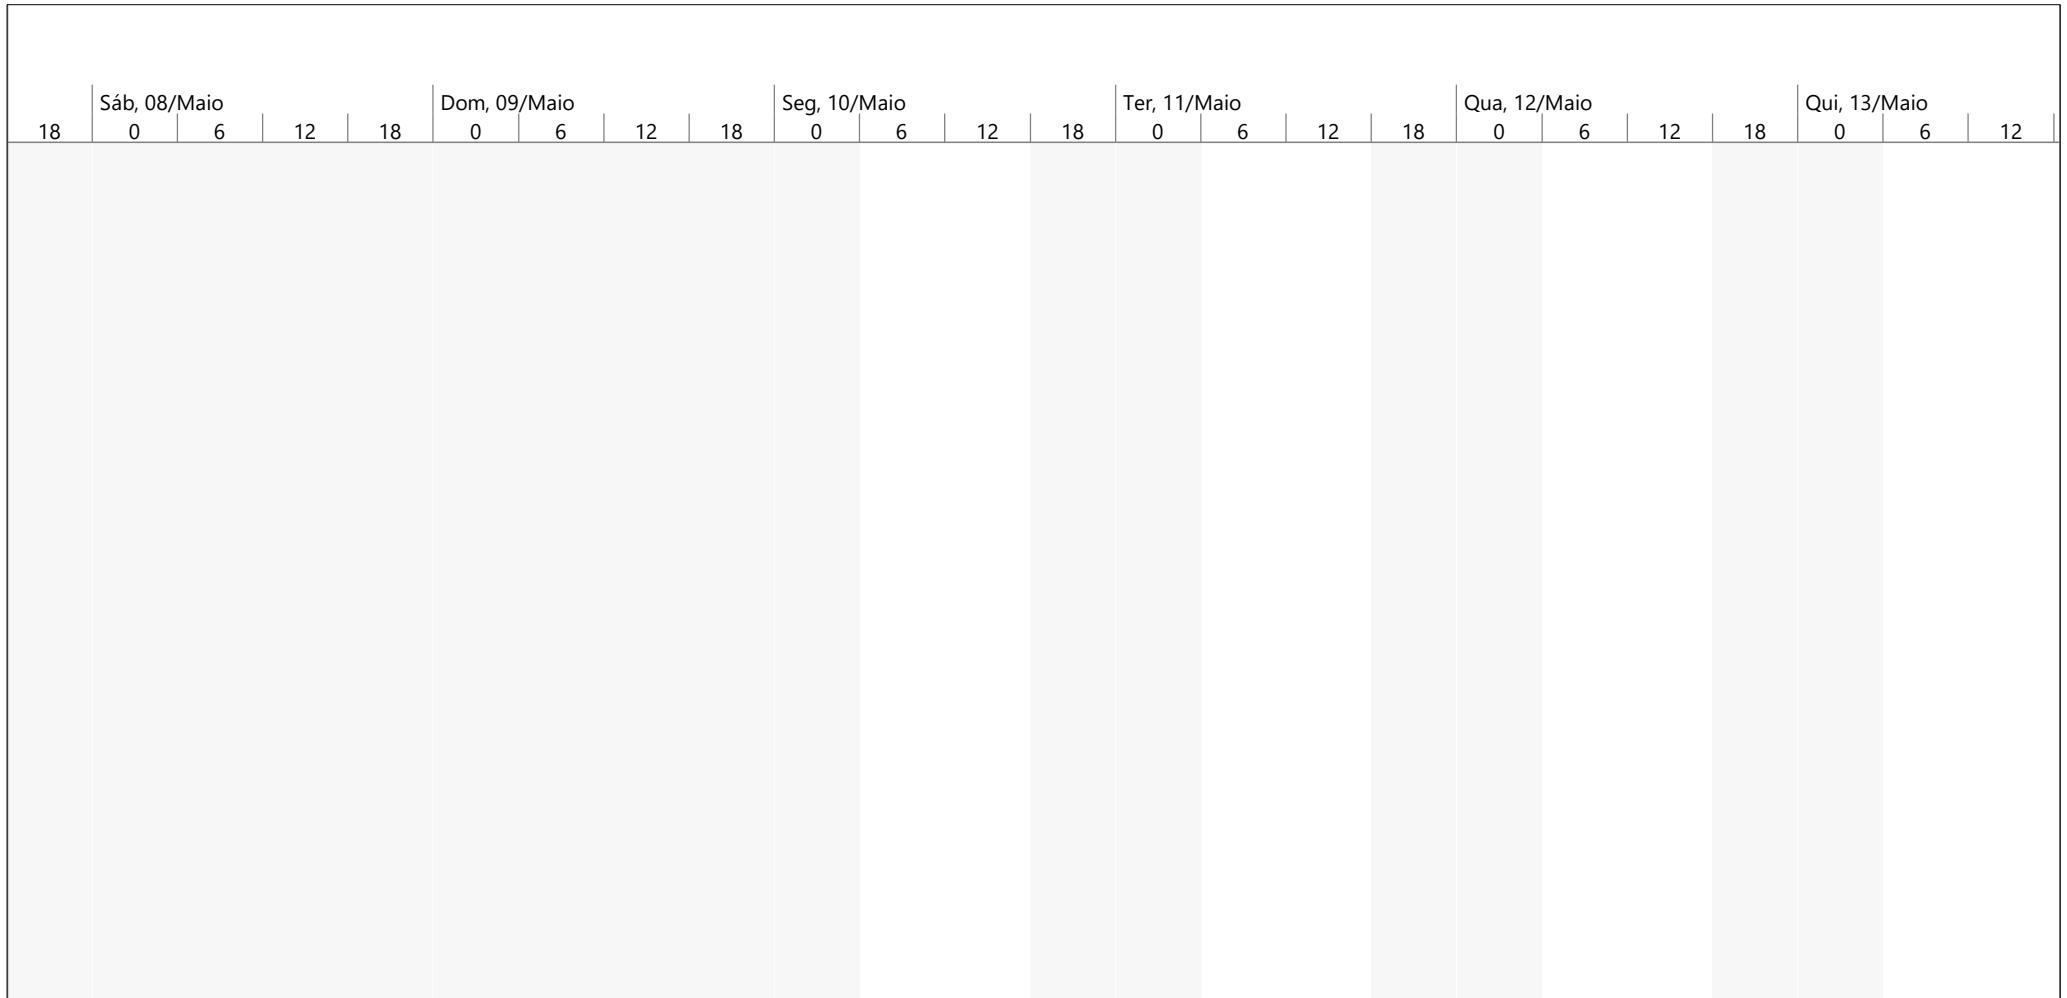


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

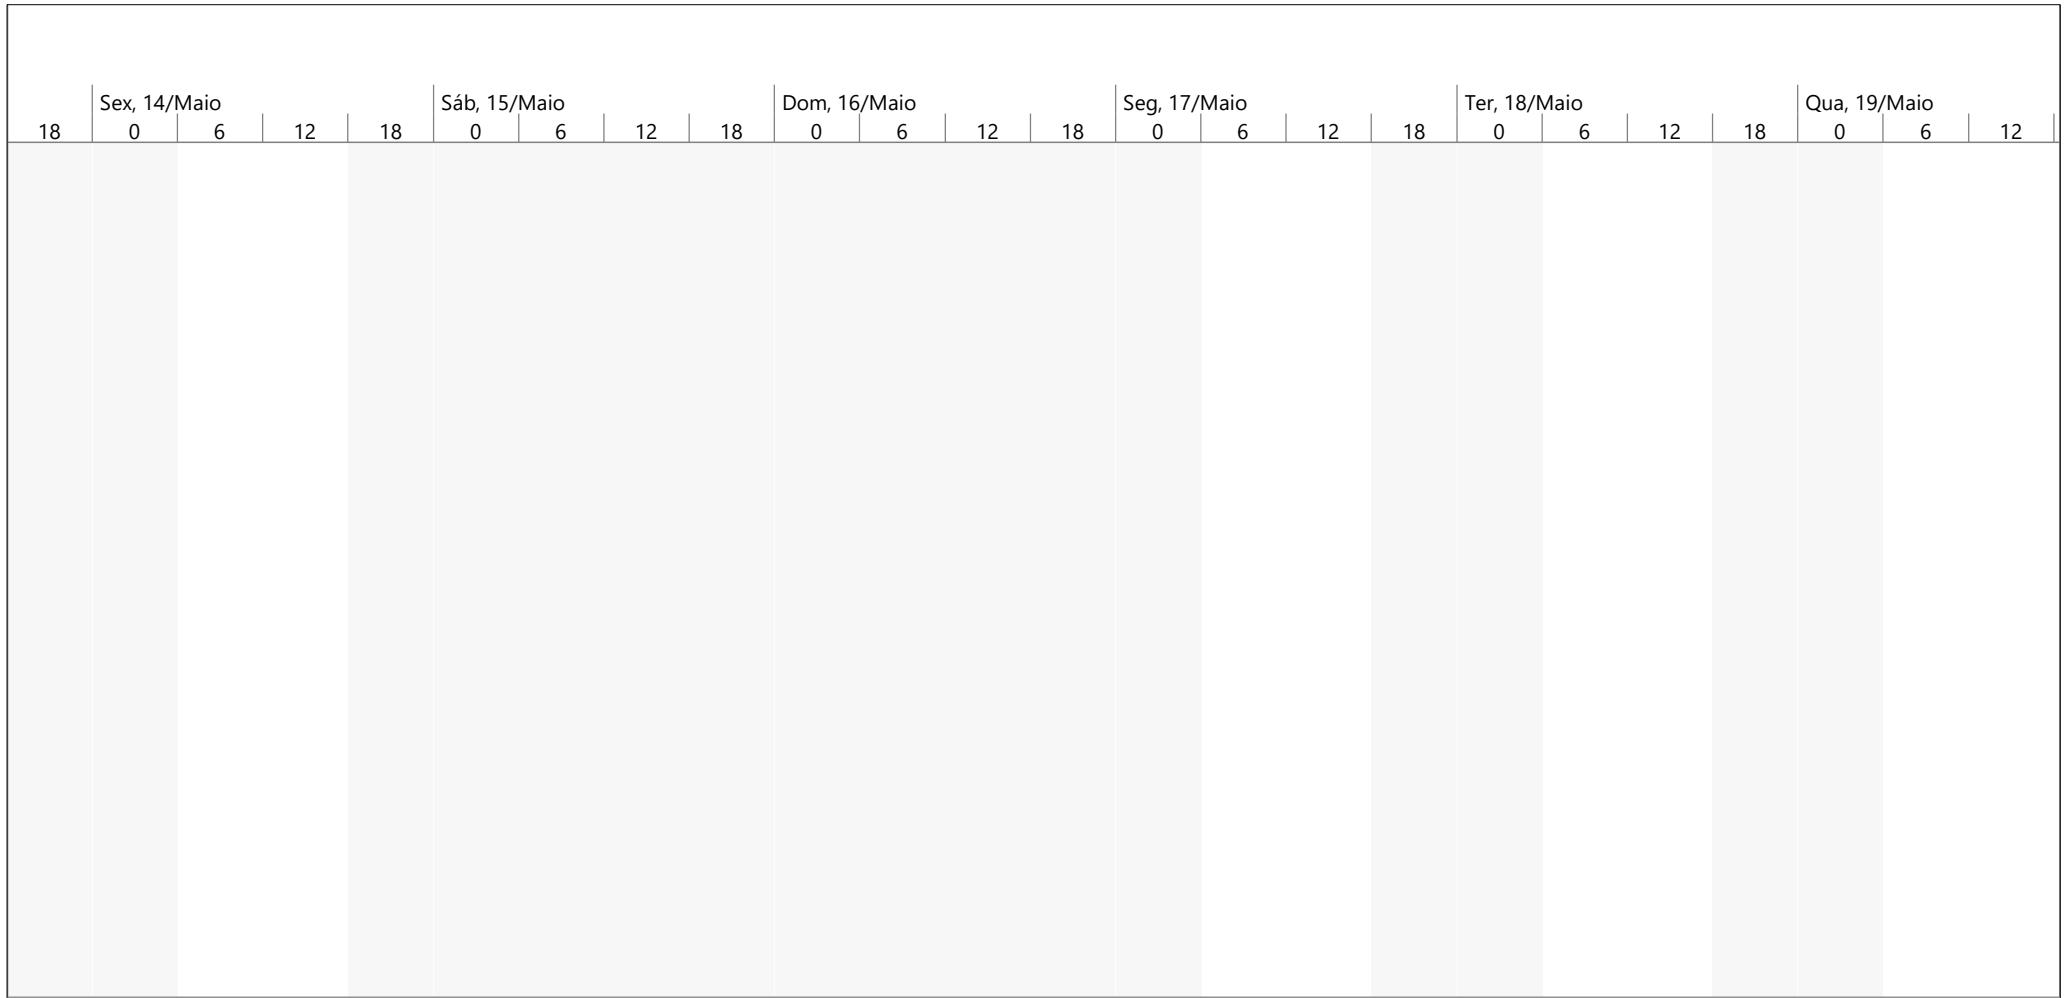


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

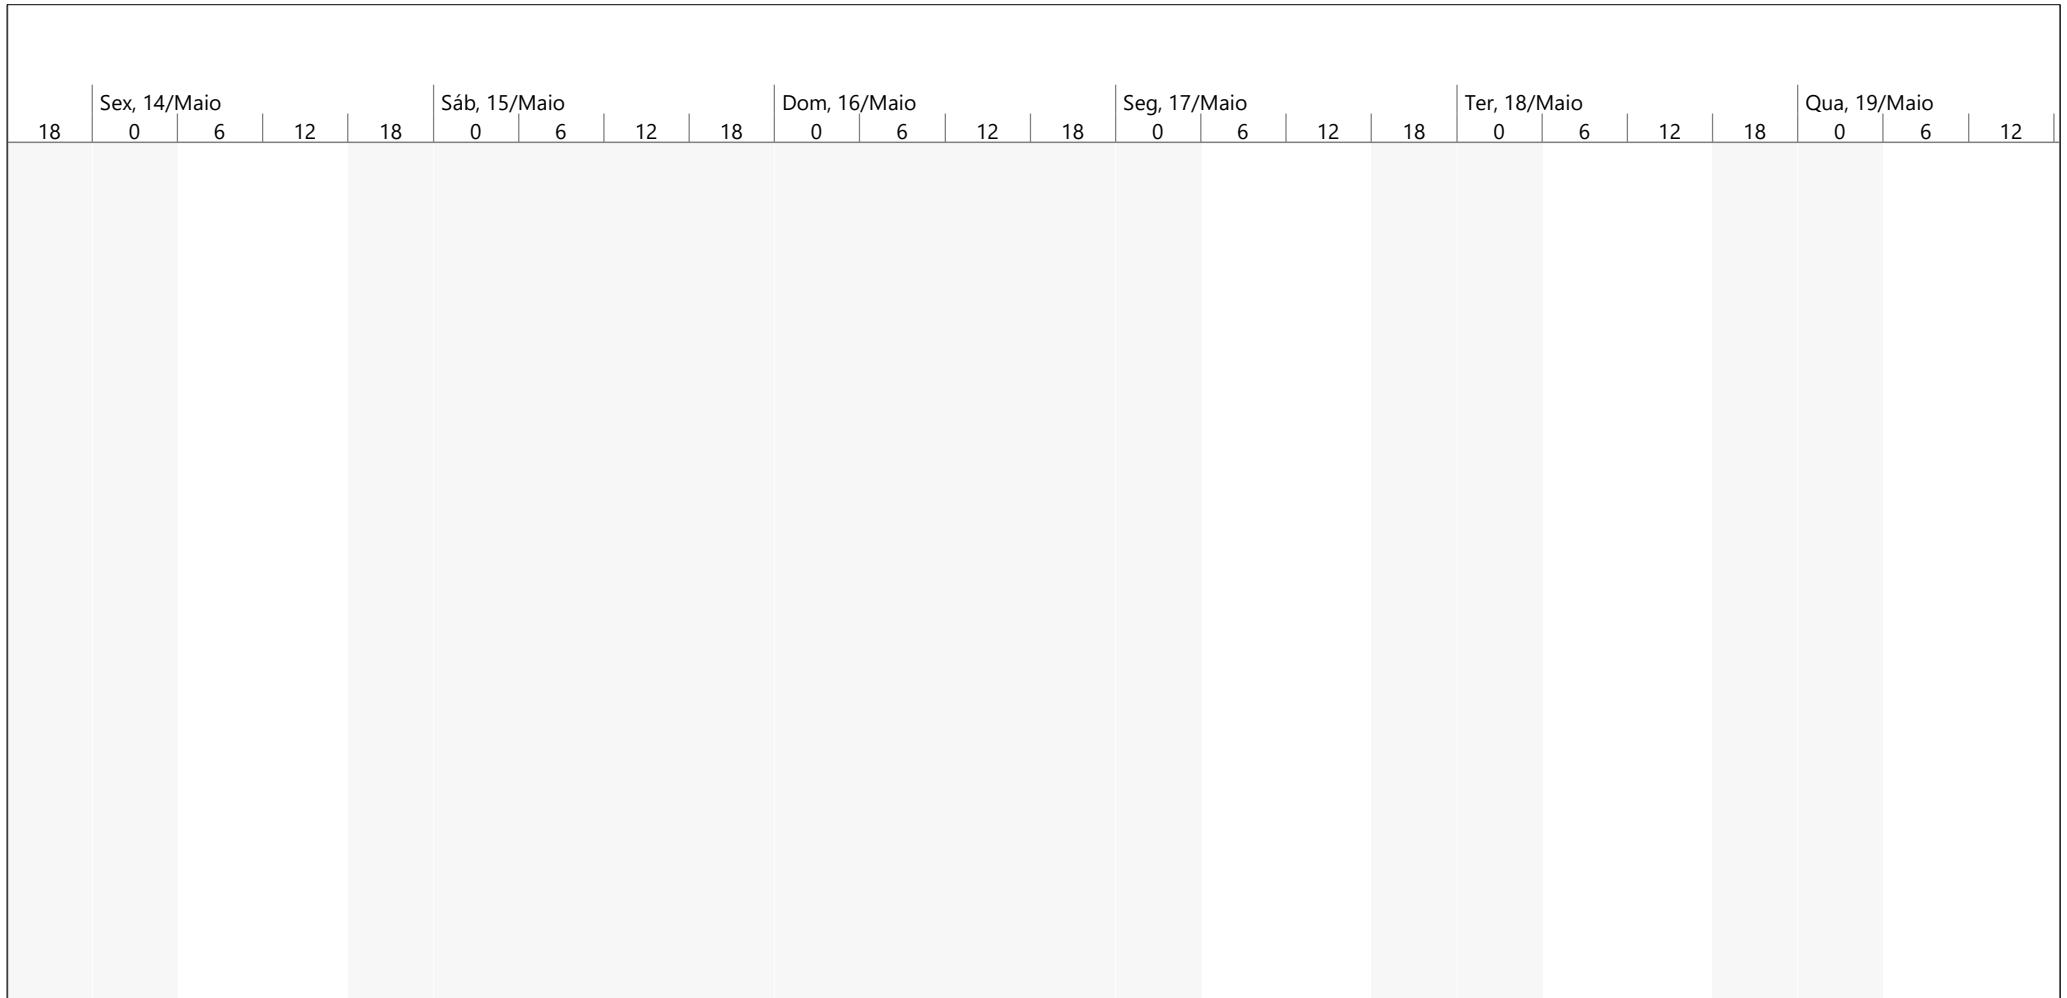


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

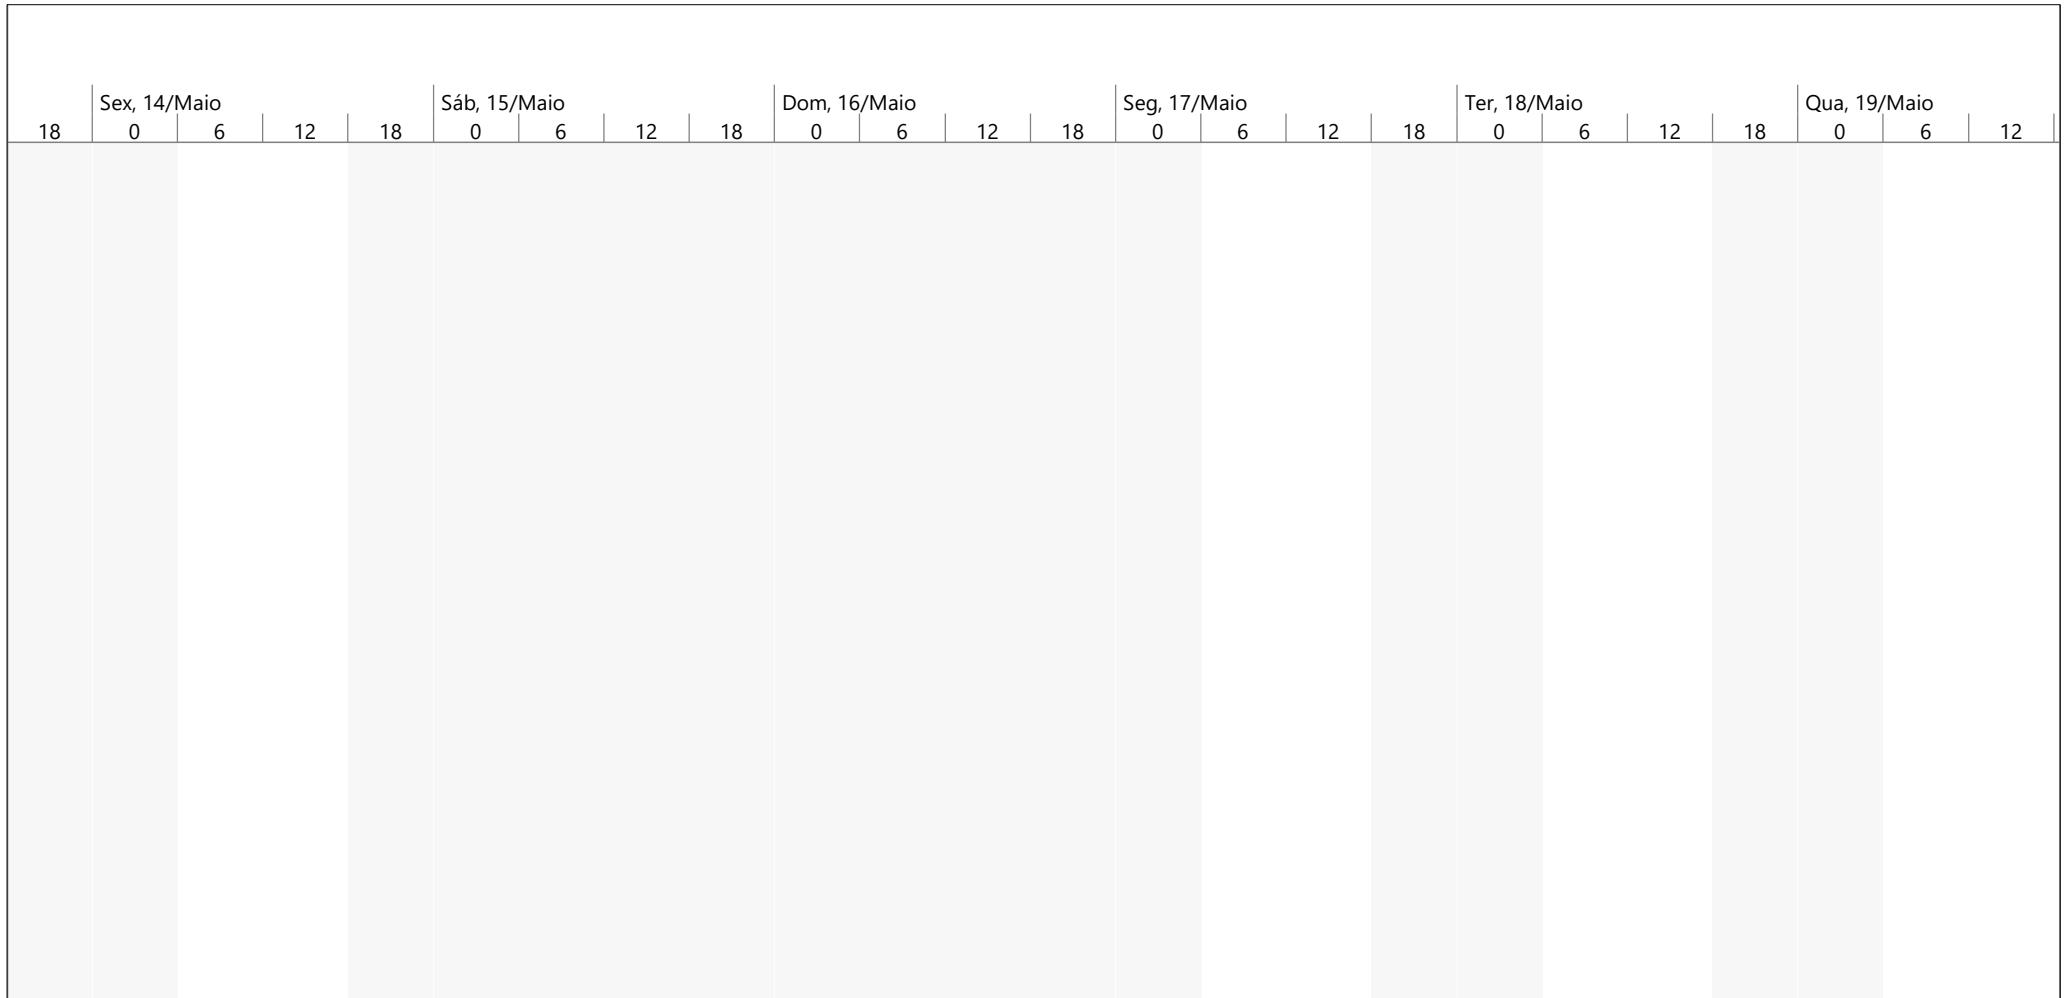


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

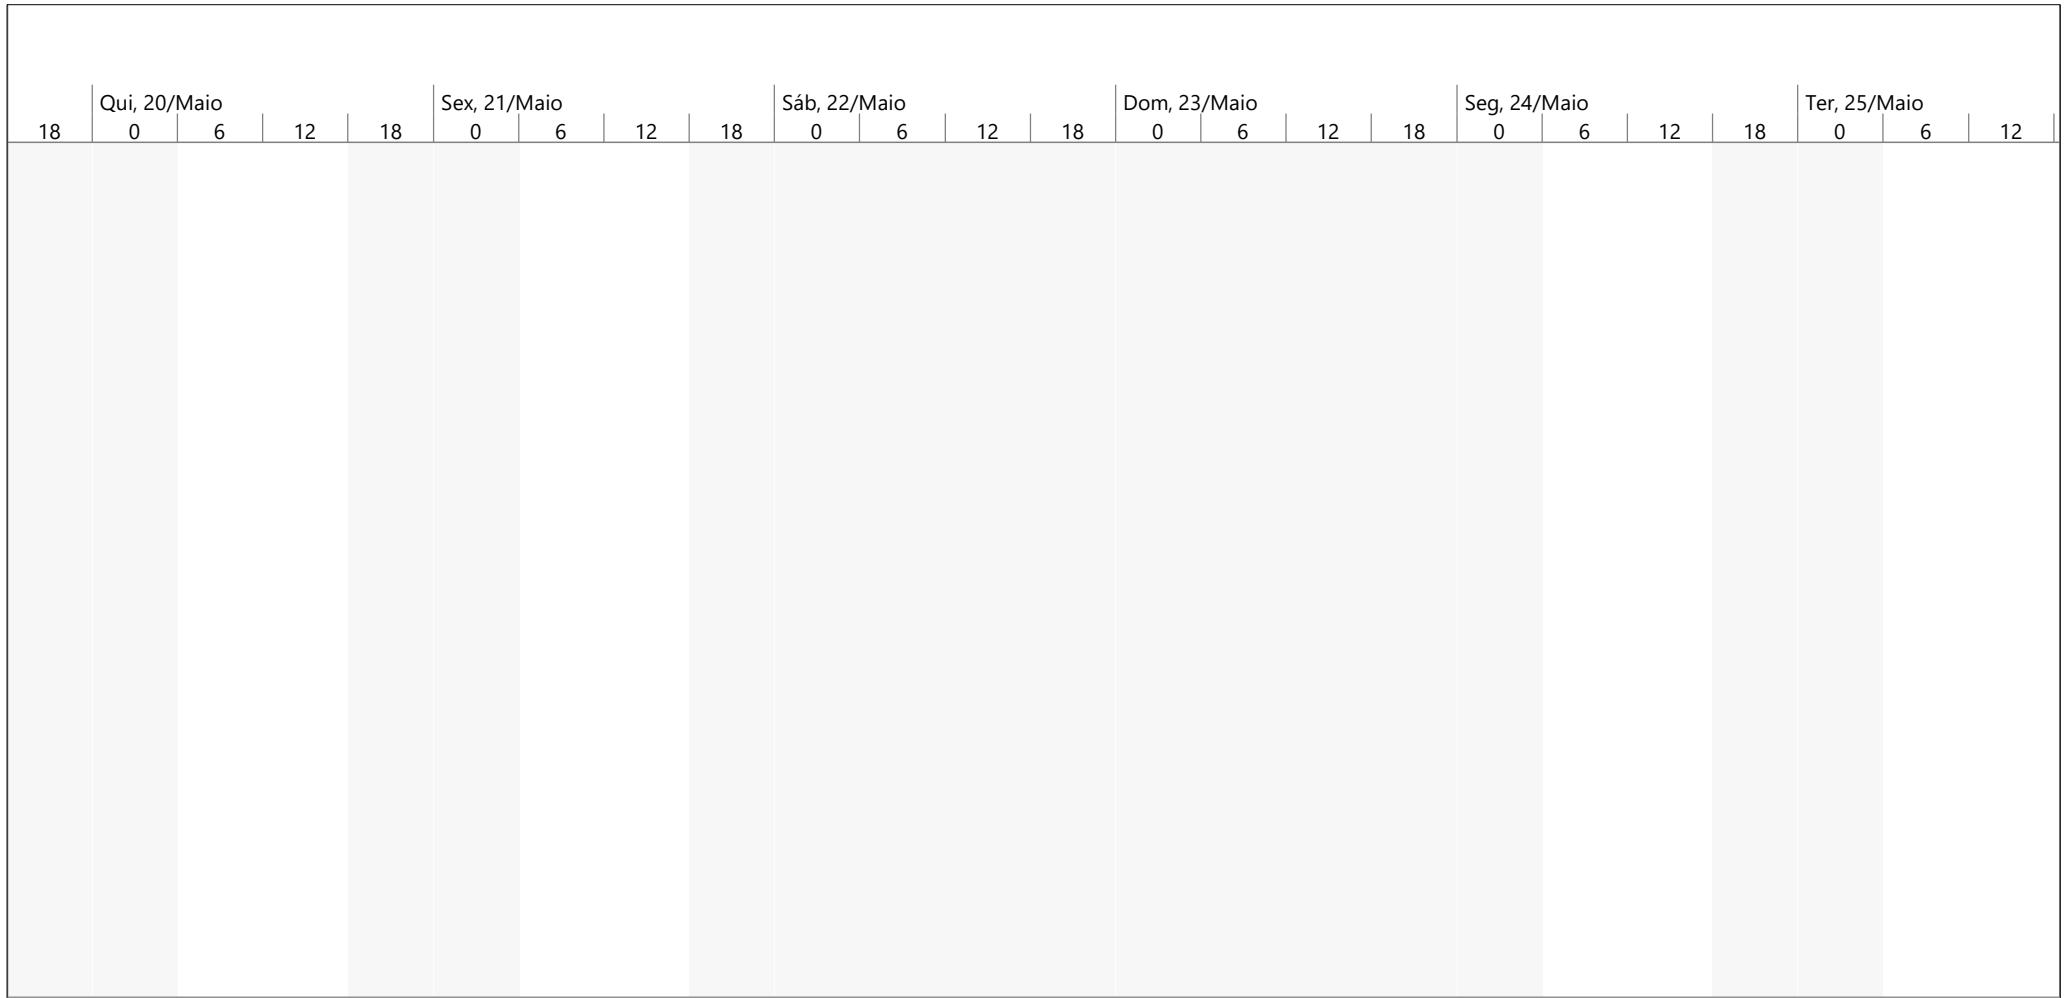


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

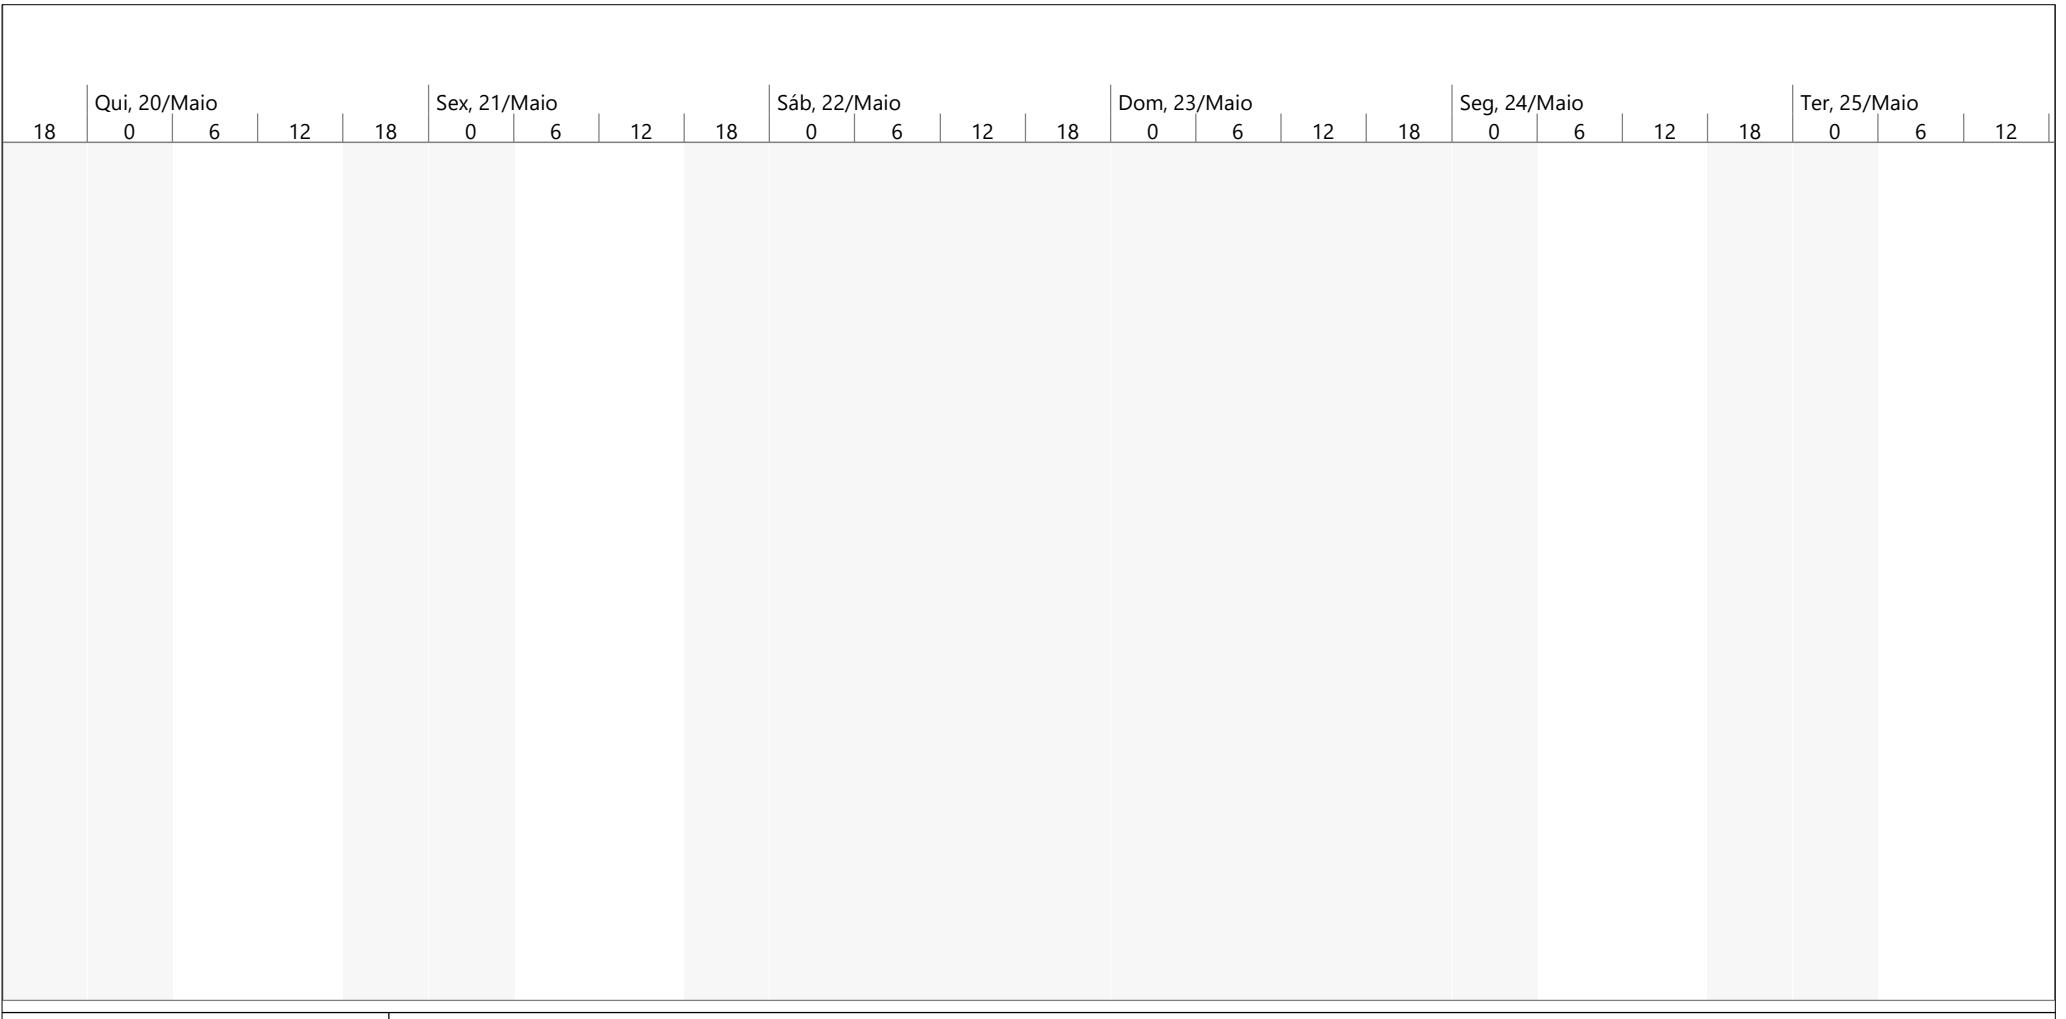


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

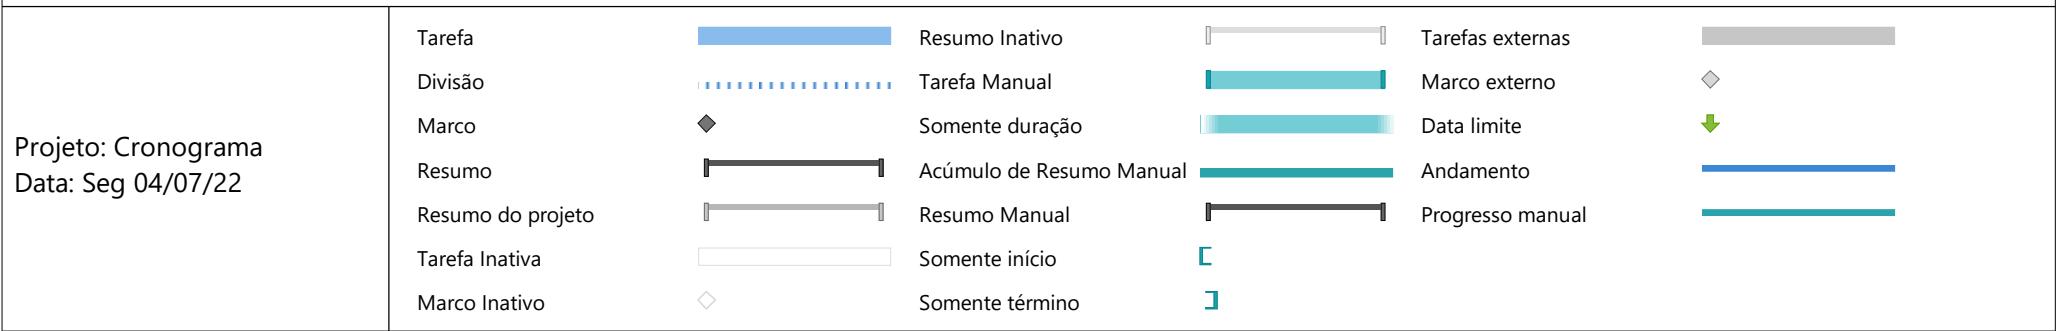

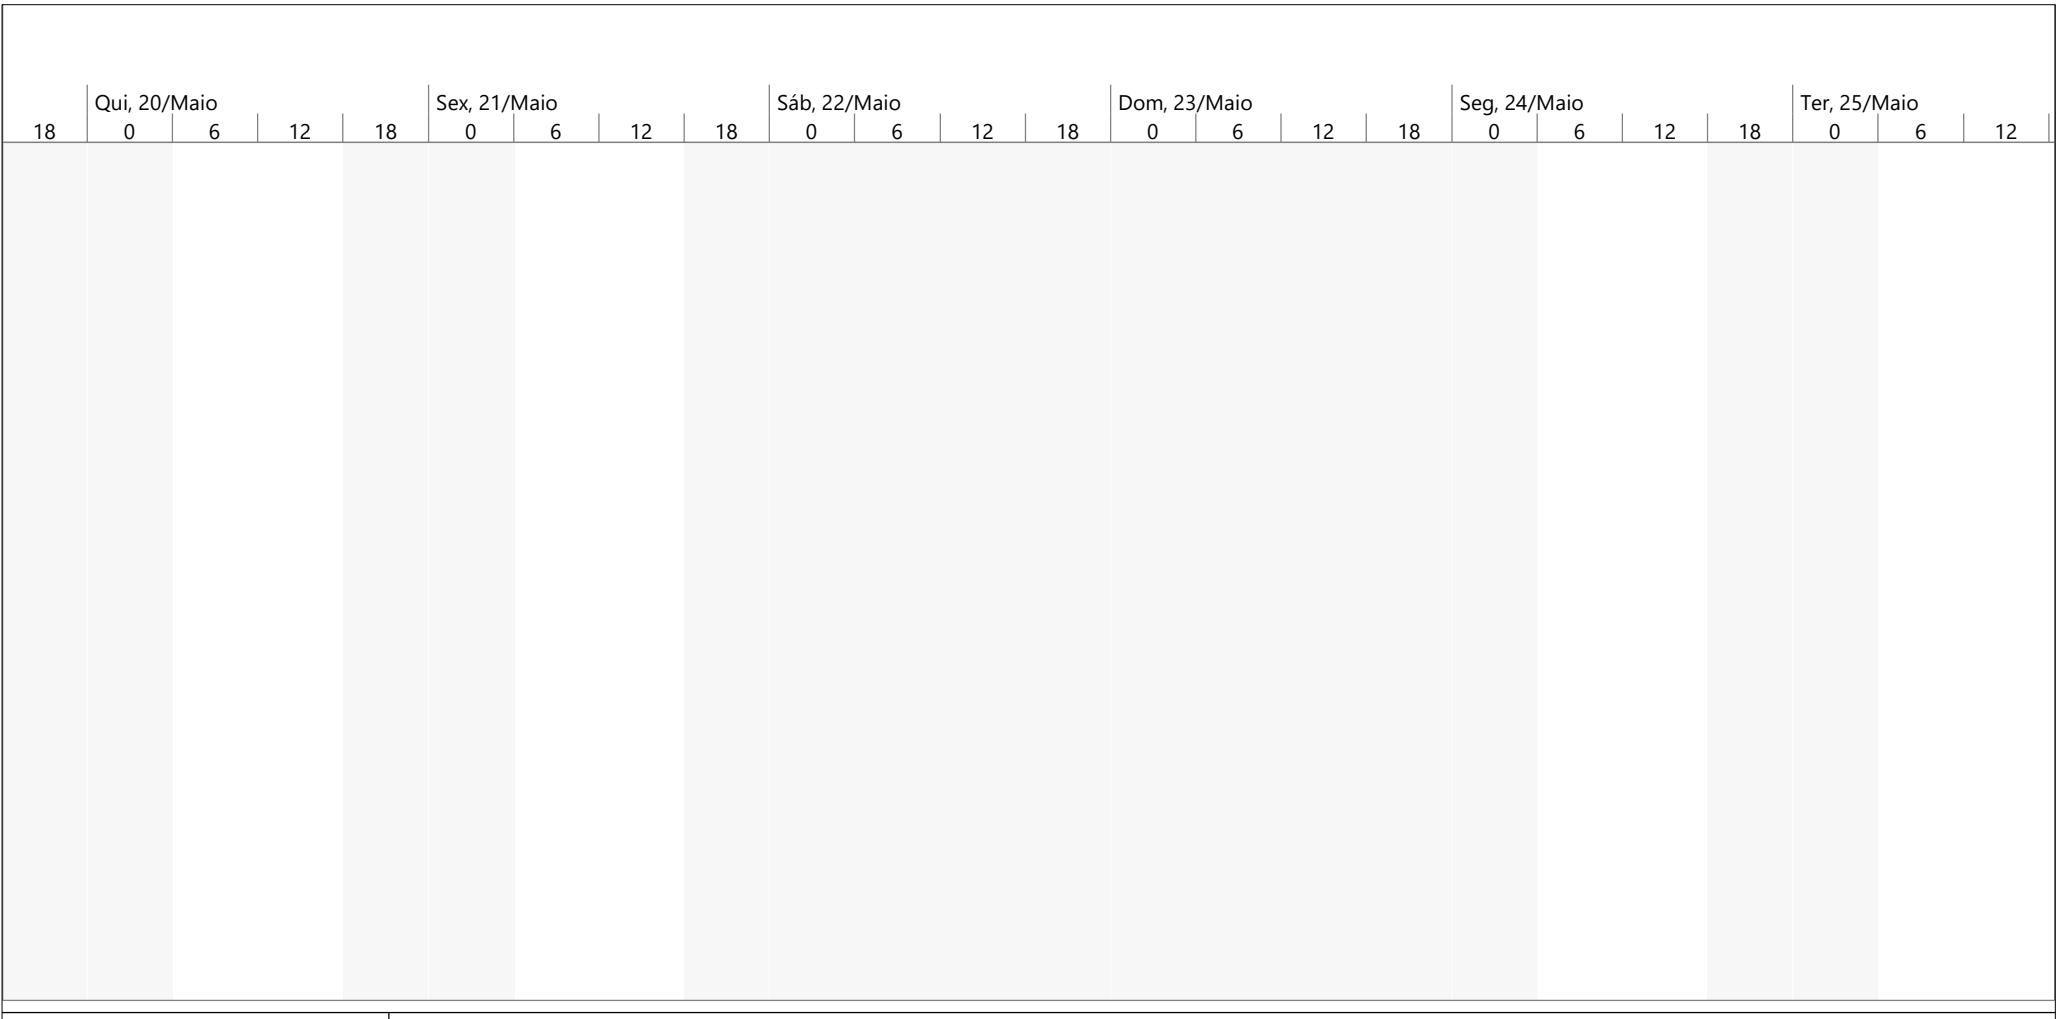


Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	◆ Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	◇ Somente término	

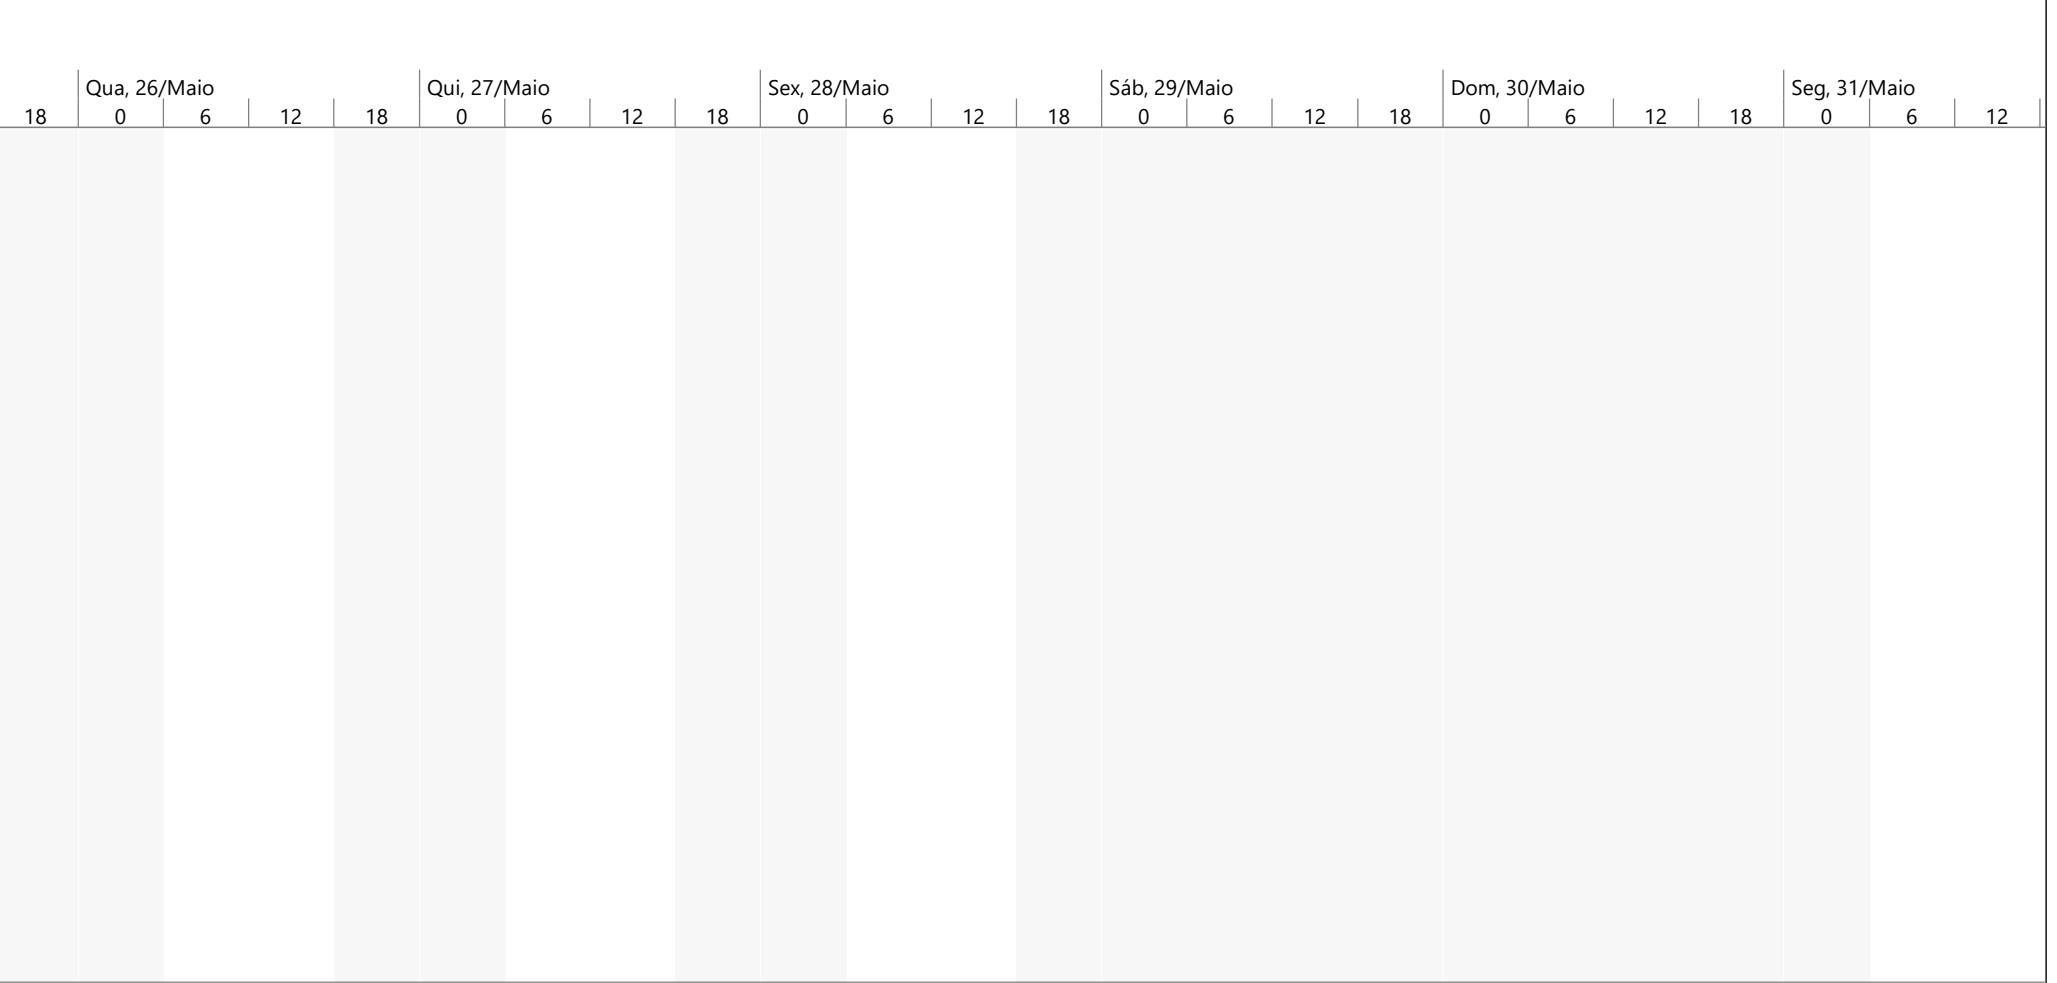


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

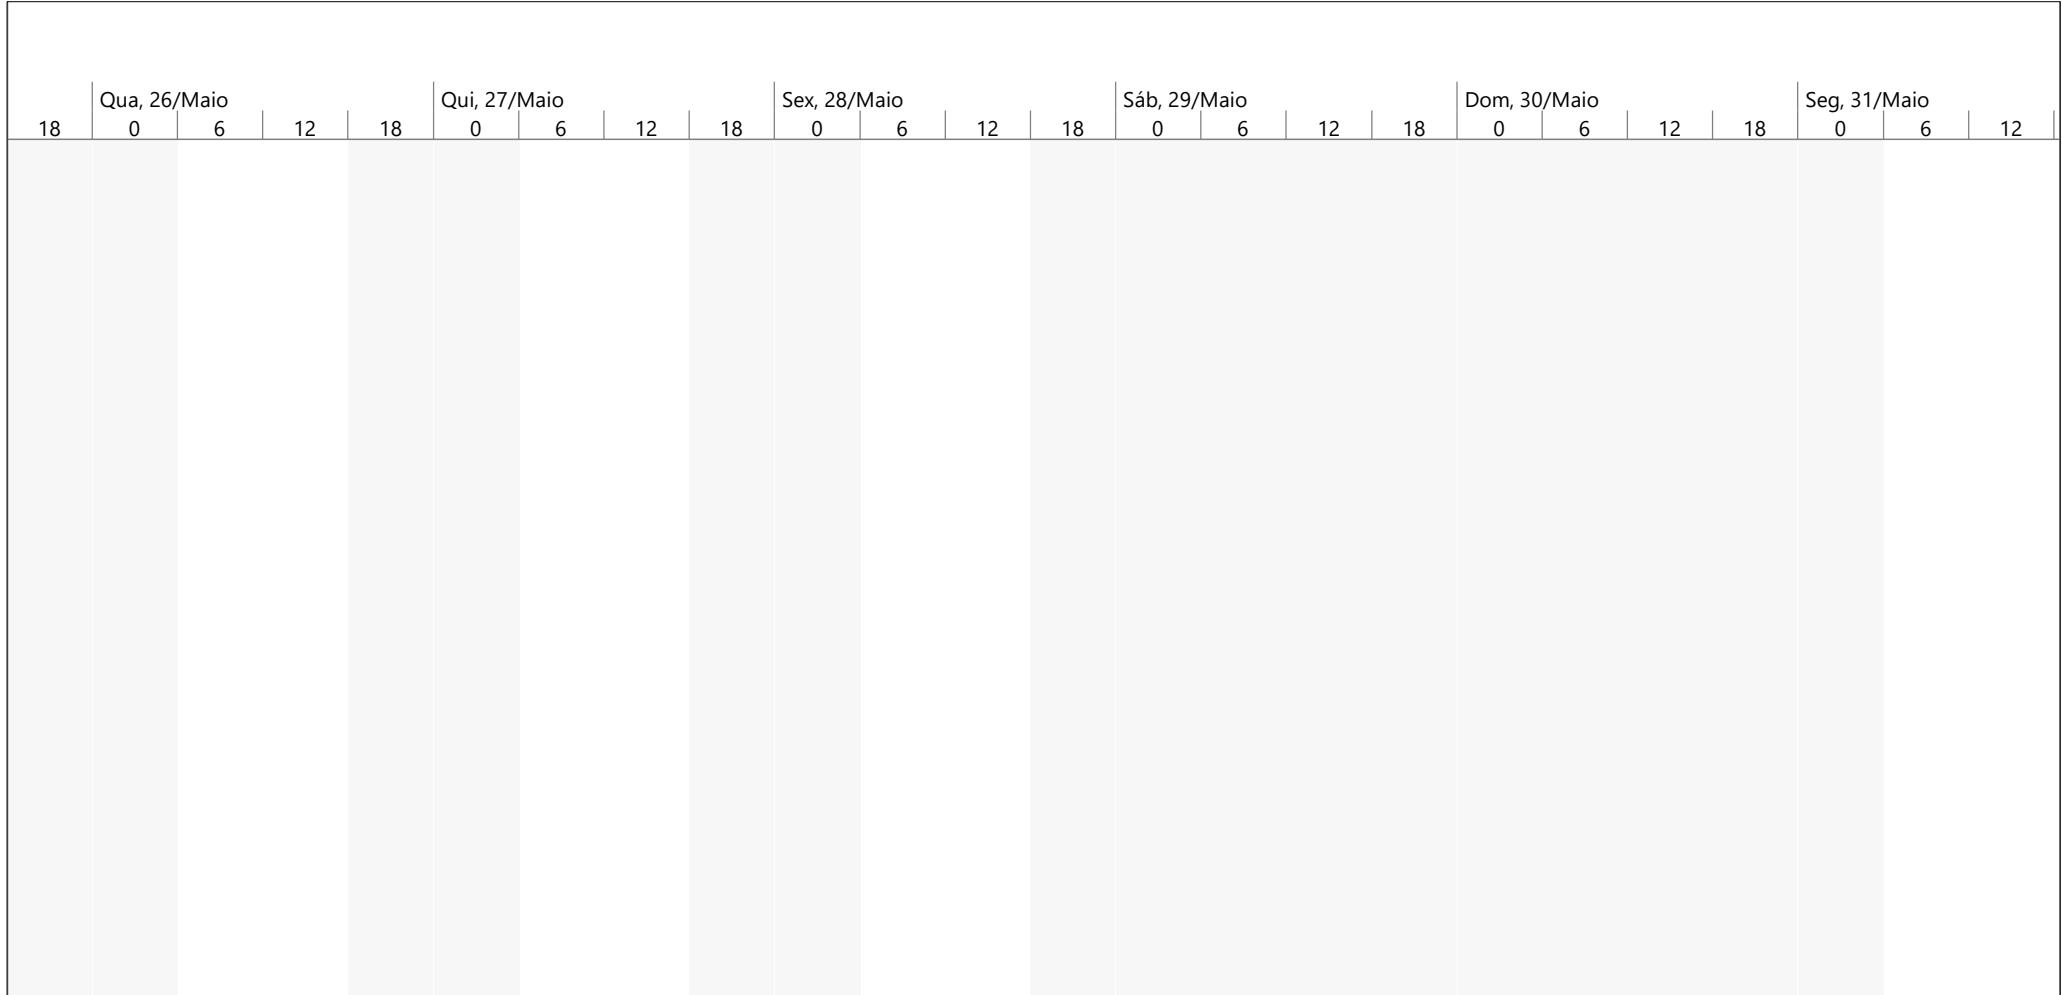

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

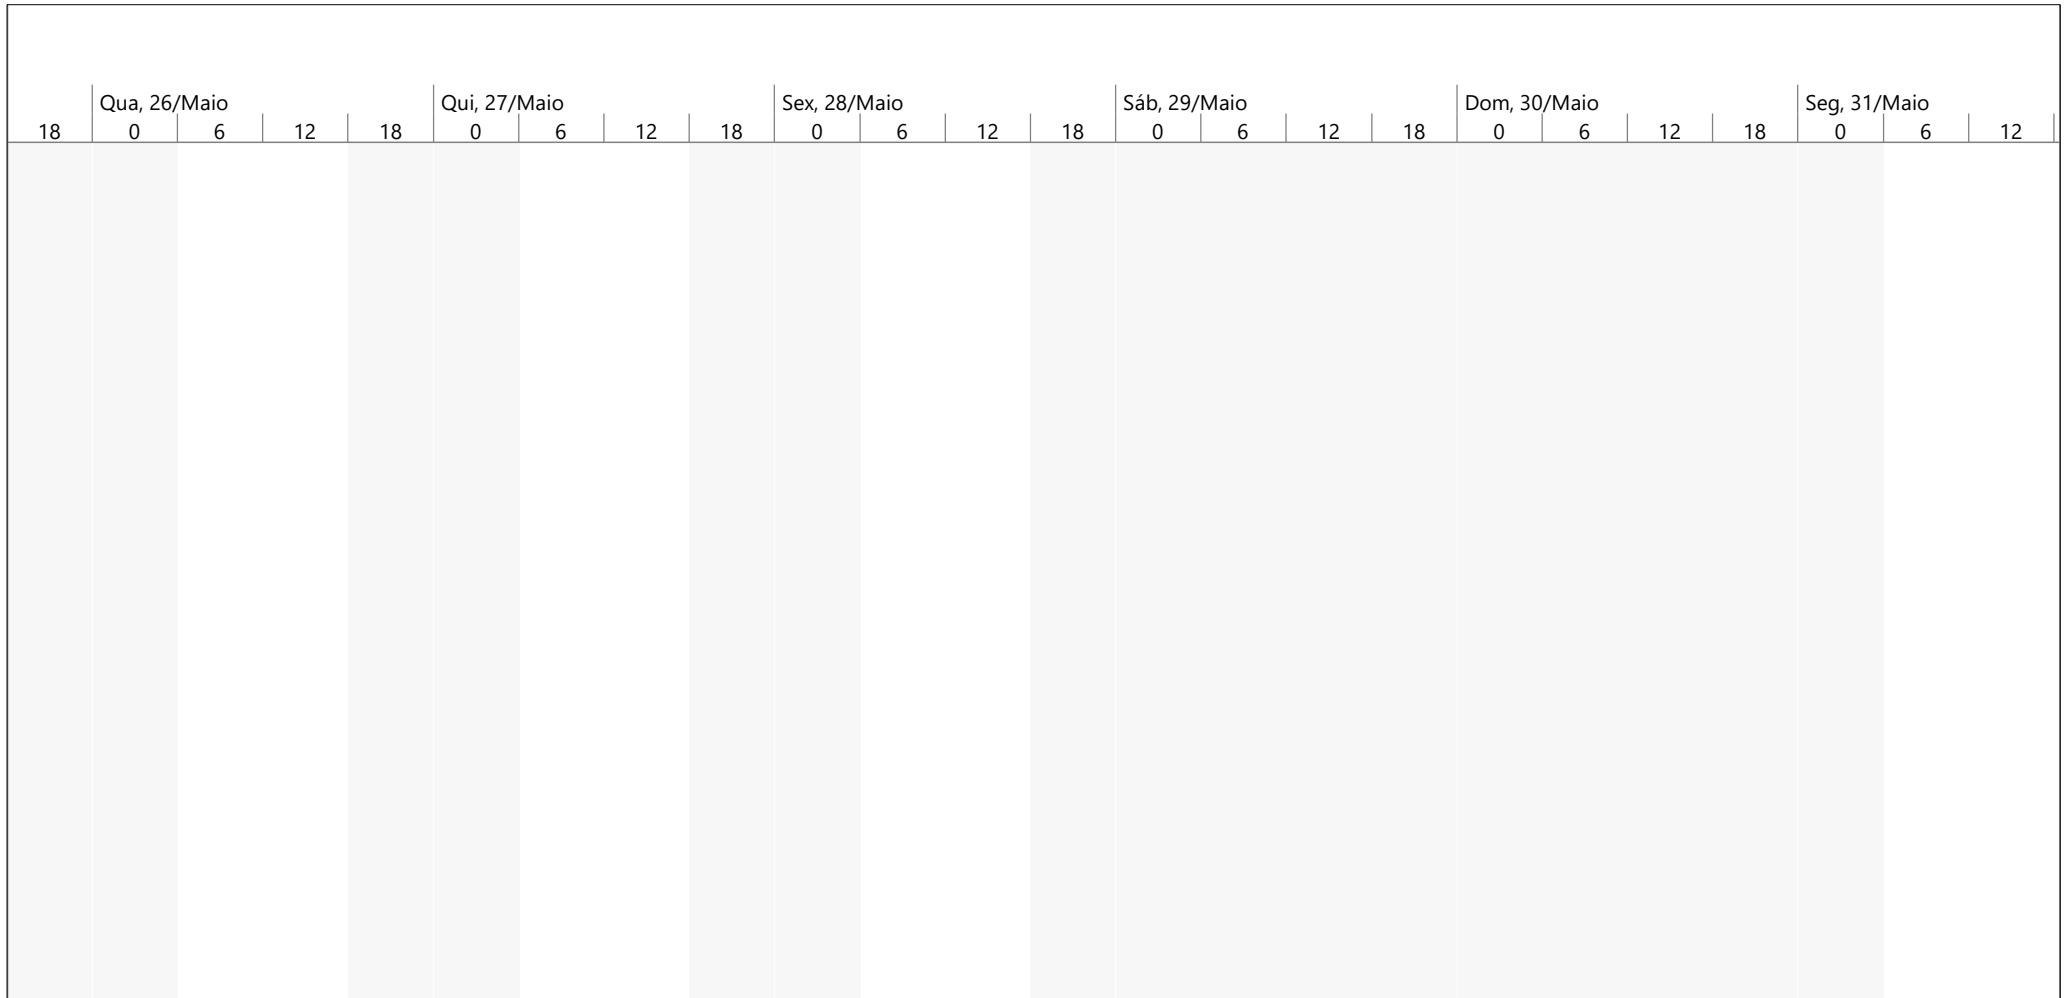

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	


18	Ter, 01/Jun	0	6	12	18	Qua, 02/Jun	0	6	12	18	Qui, 03/Jun	0	6	12	18	Sex, 04/Jun	0	6	12	18	Sáb, 05/Jun	0	6	12	18	Dom, 06/Jun	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

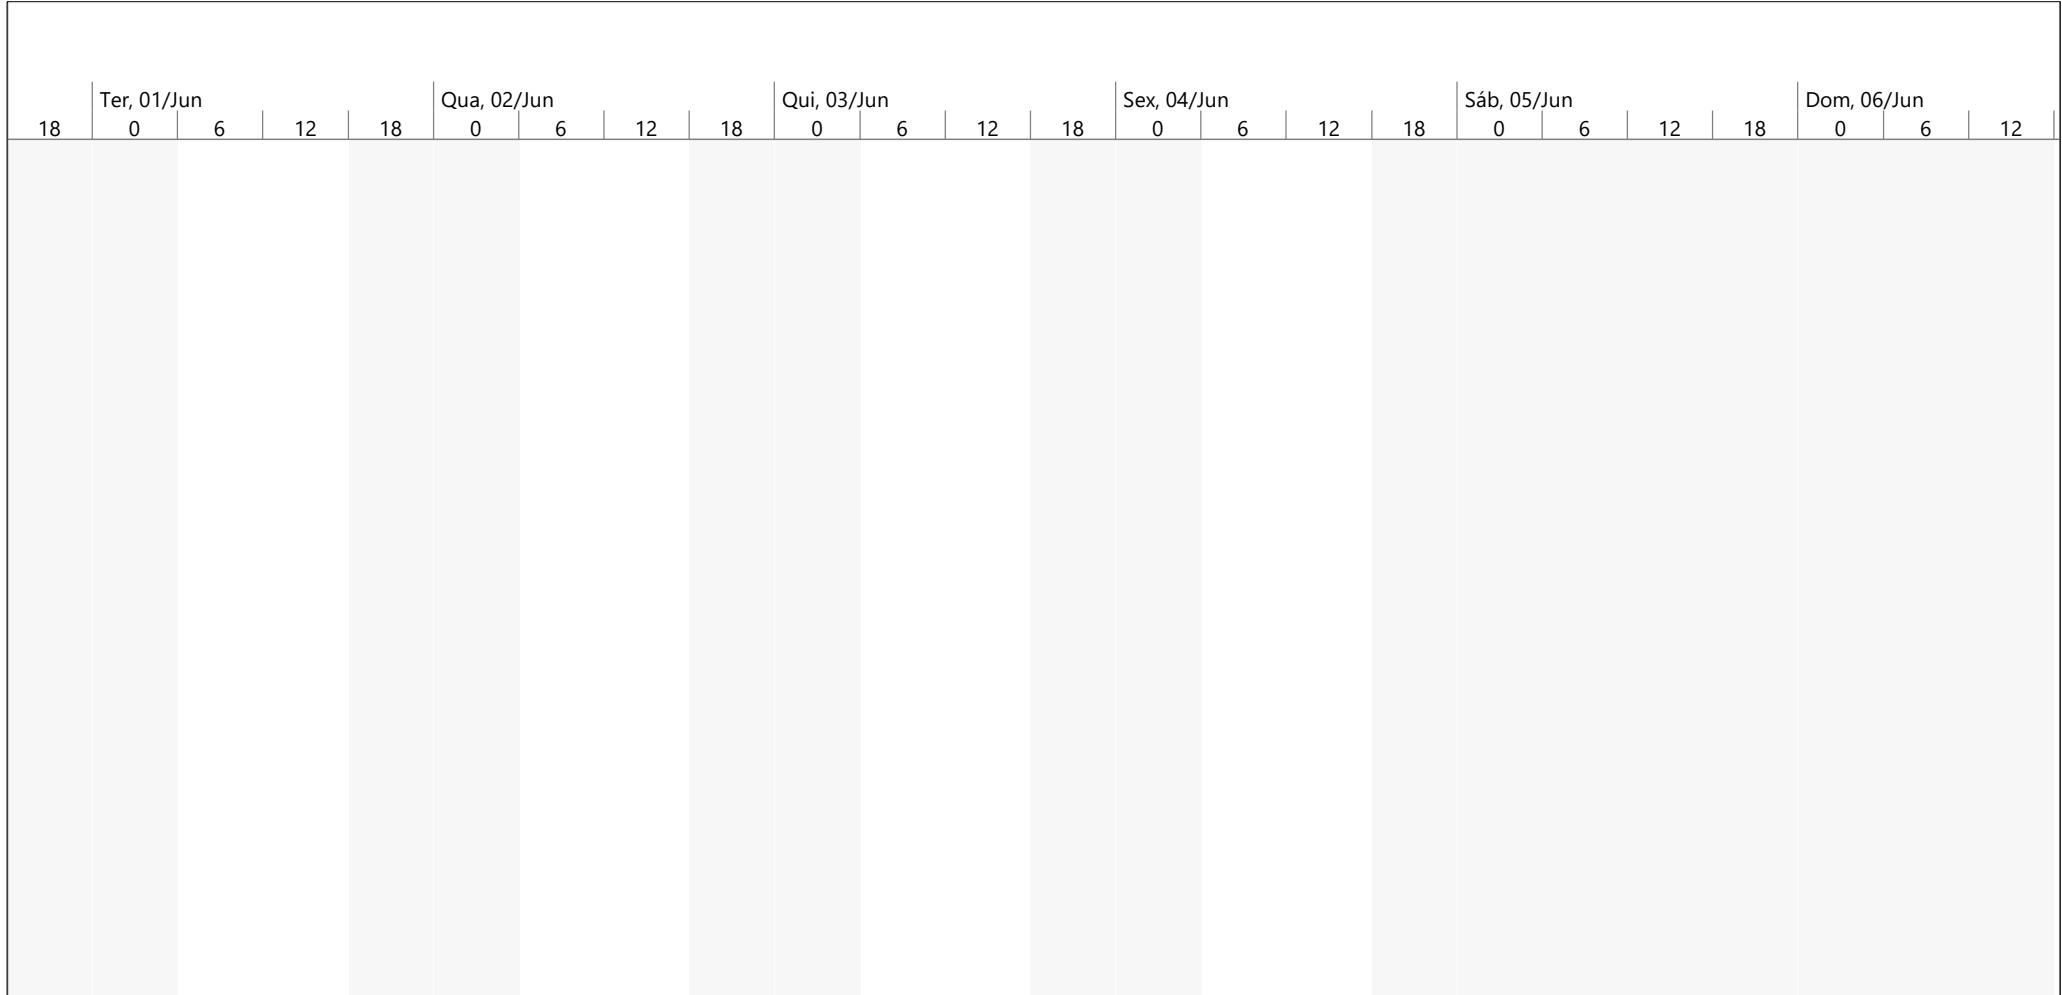


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

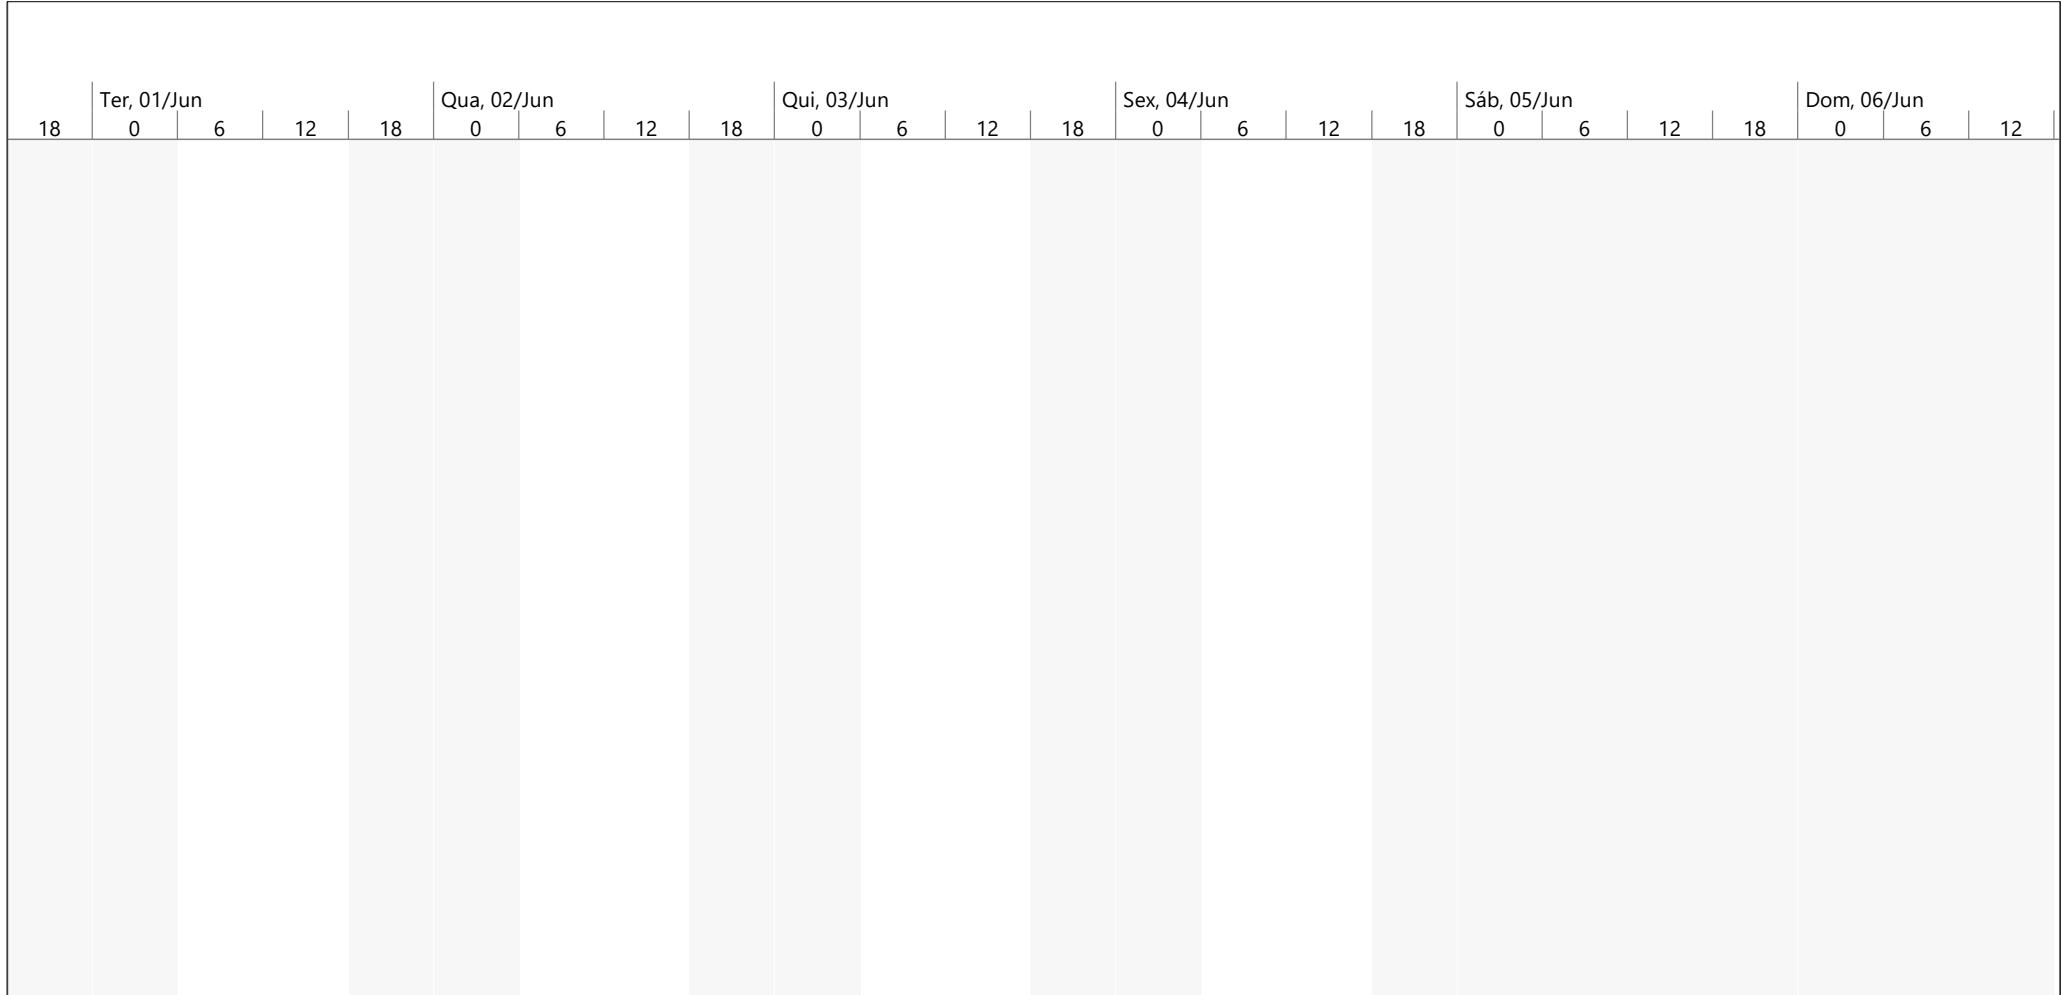


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

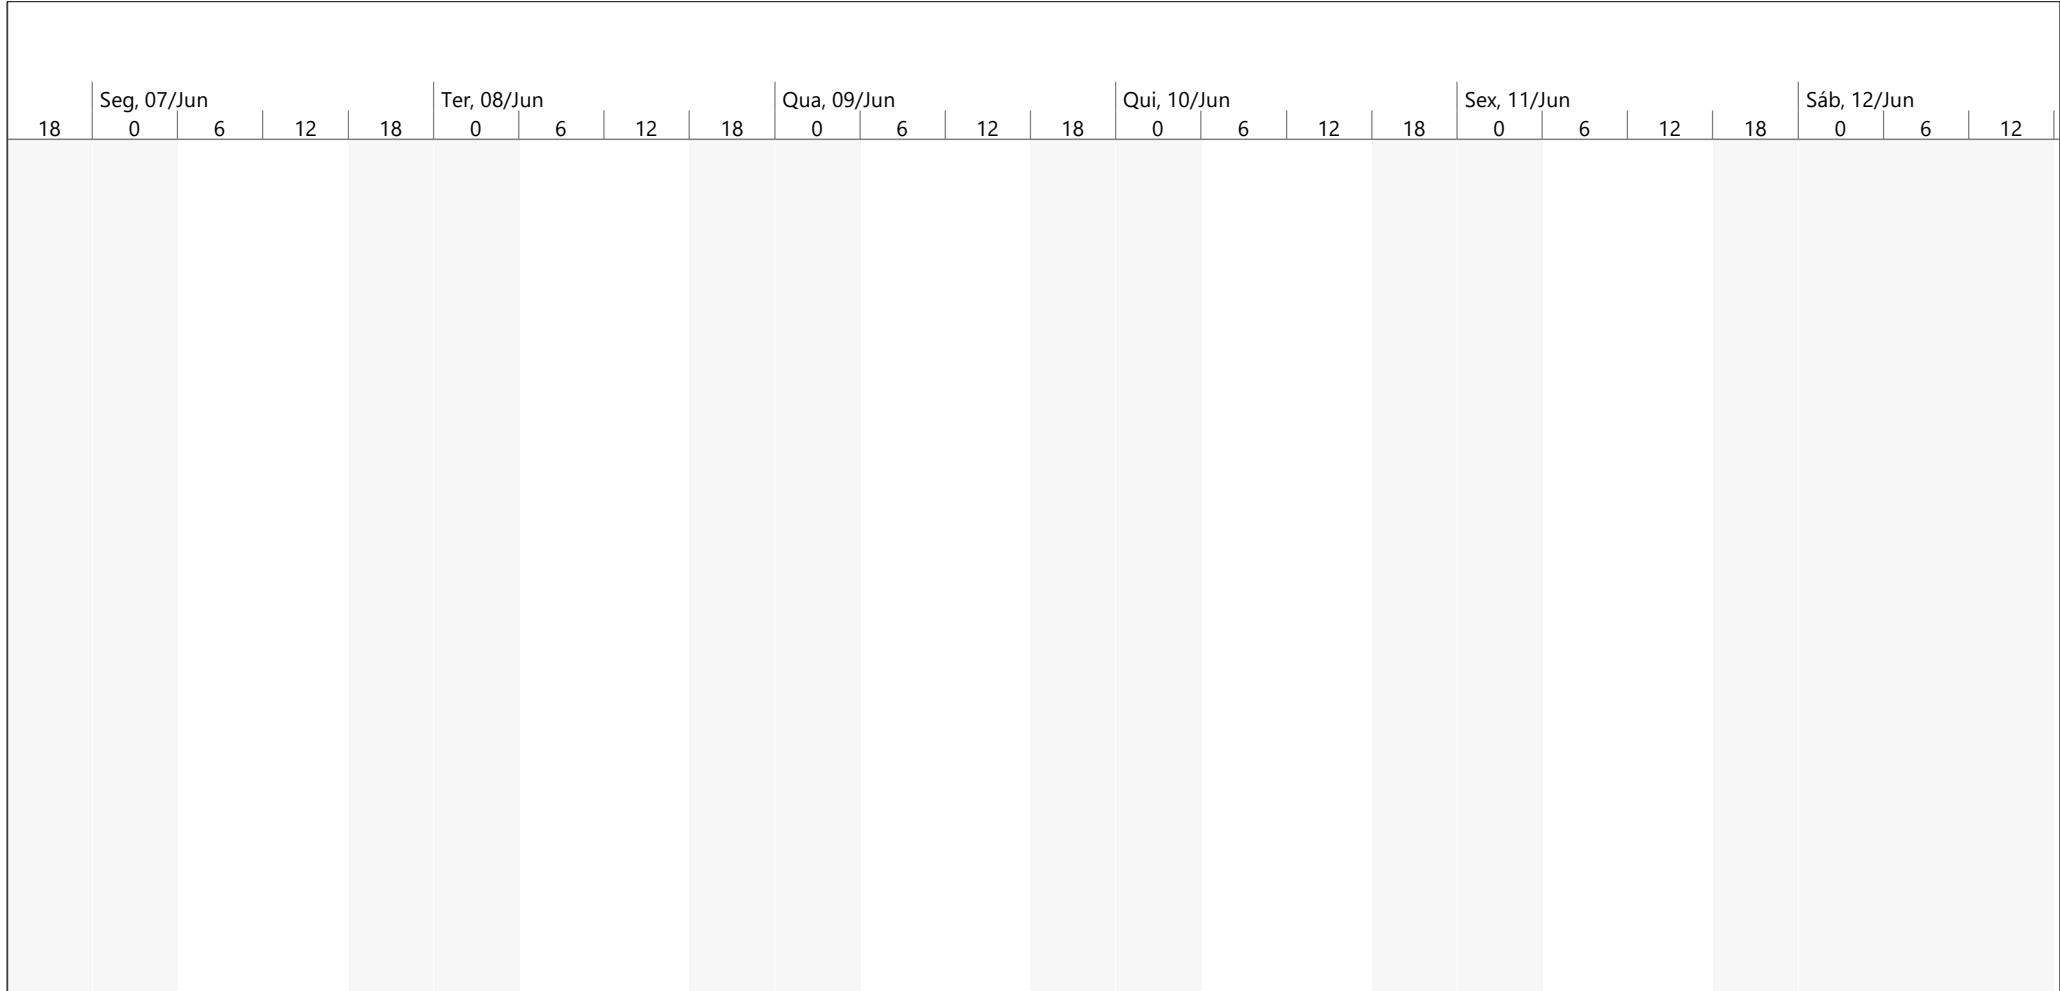


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

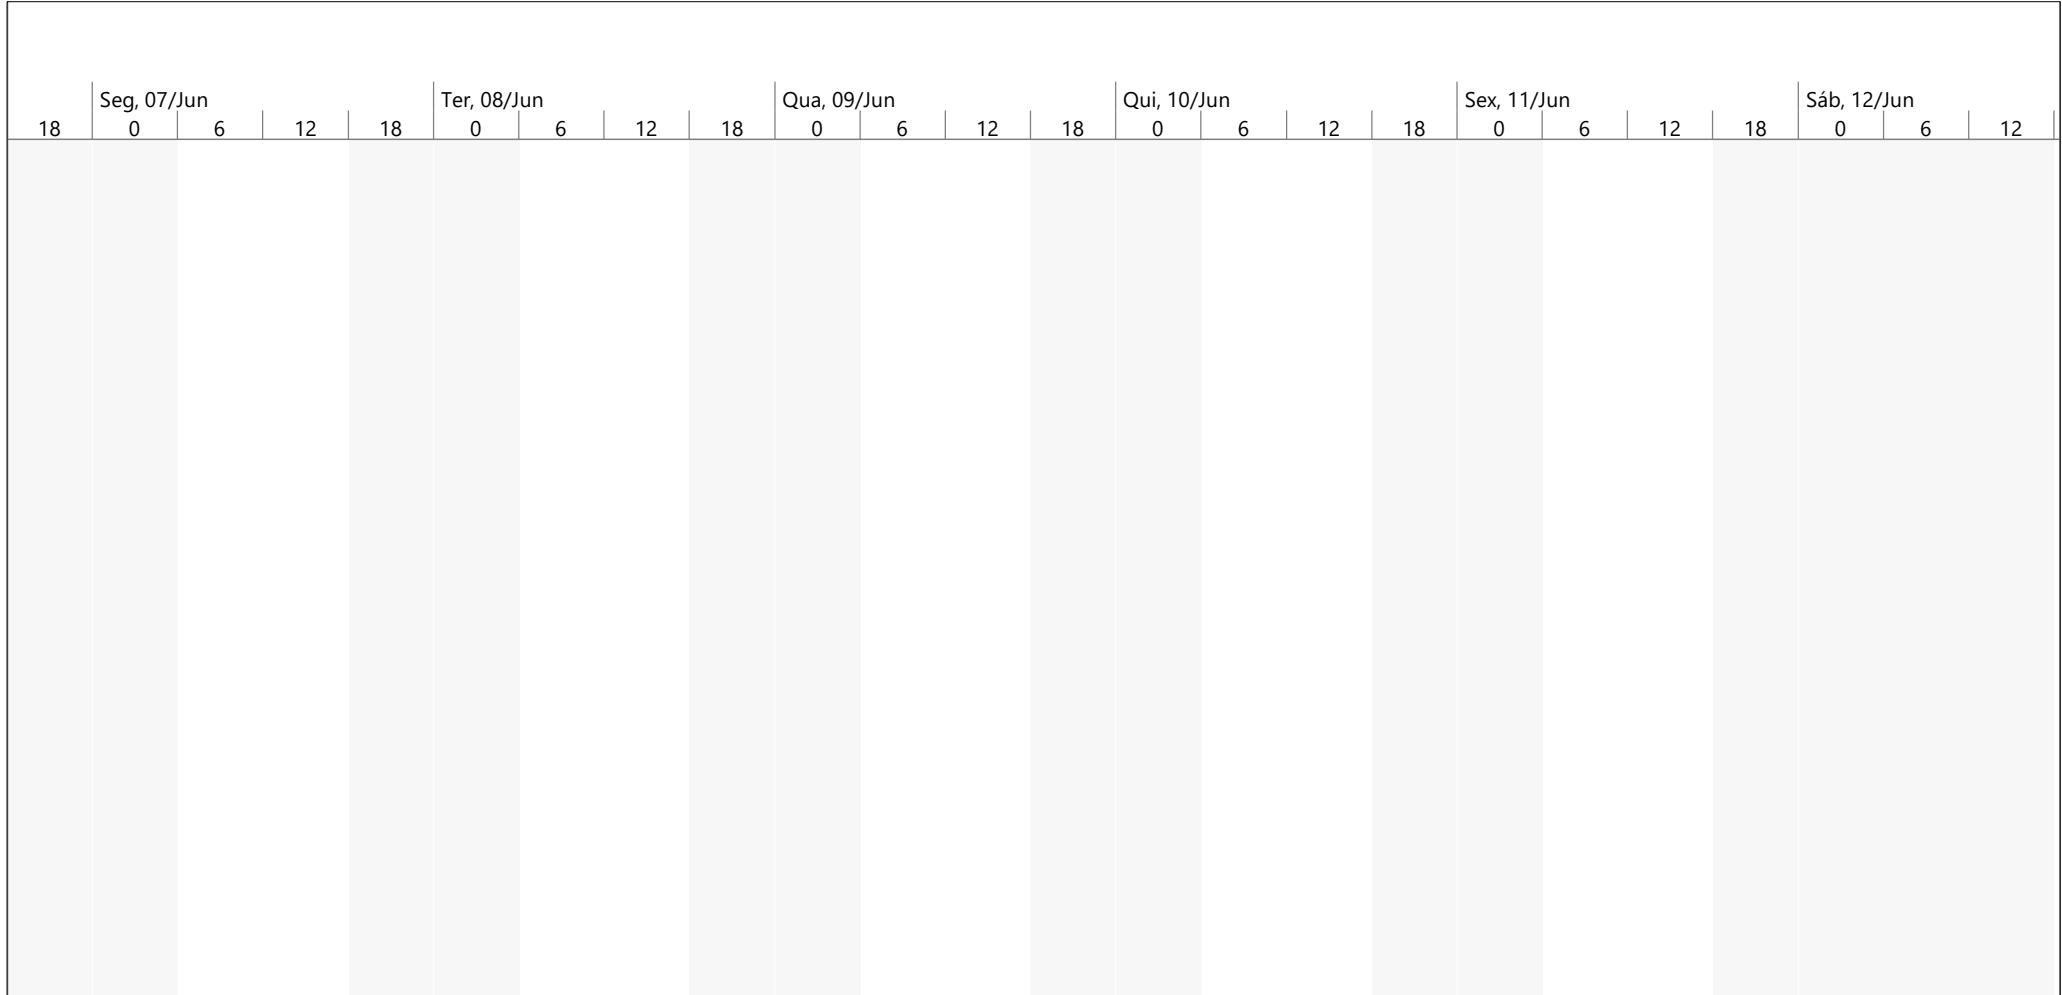


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

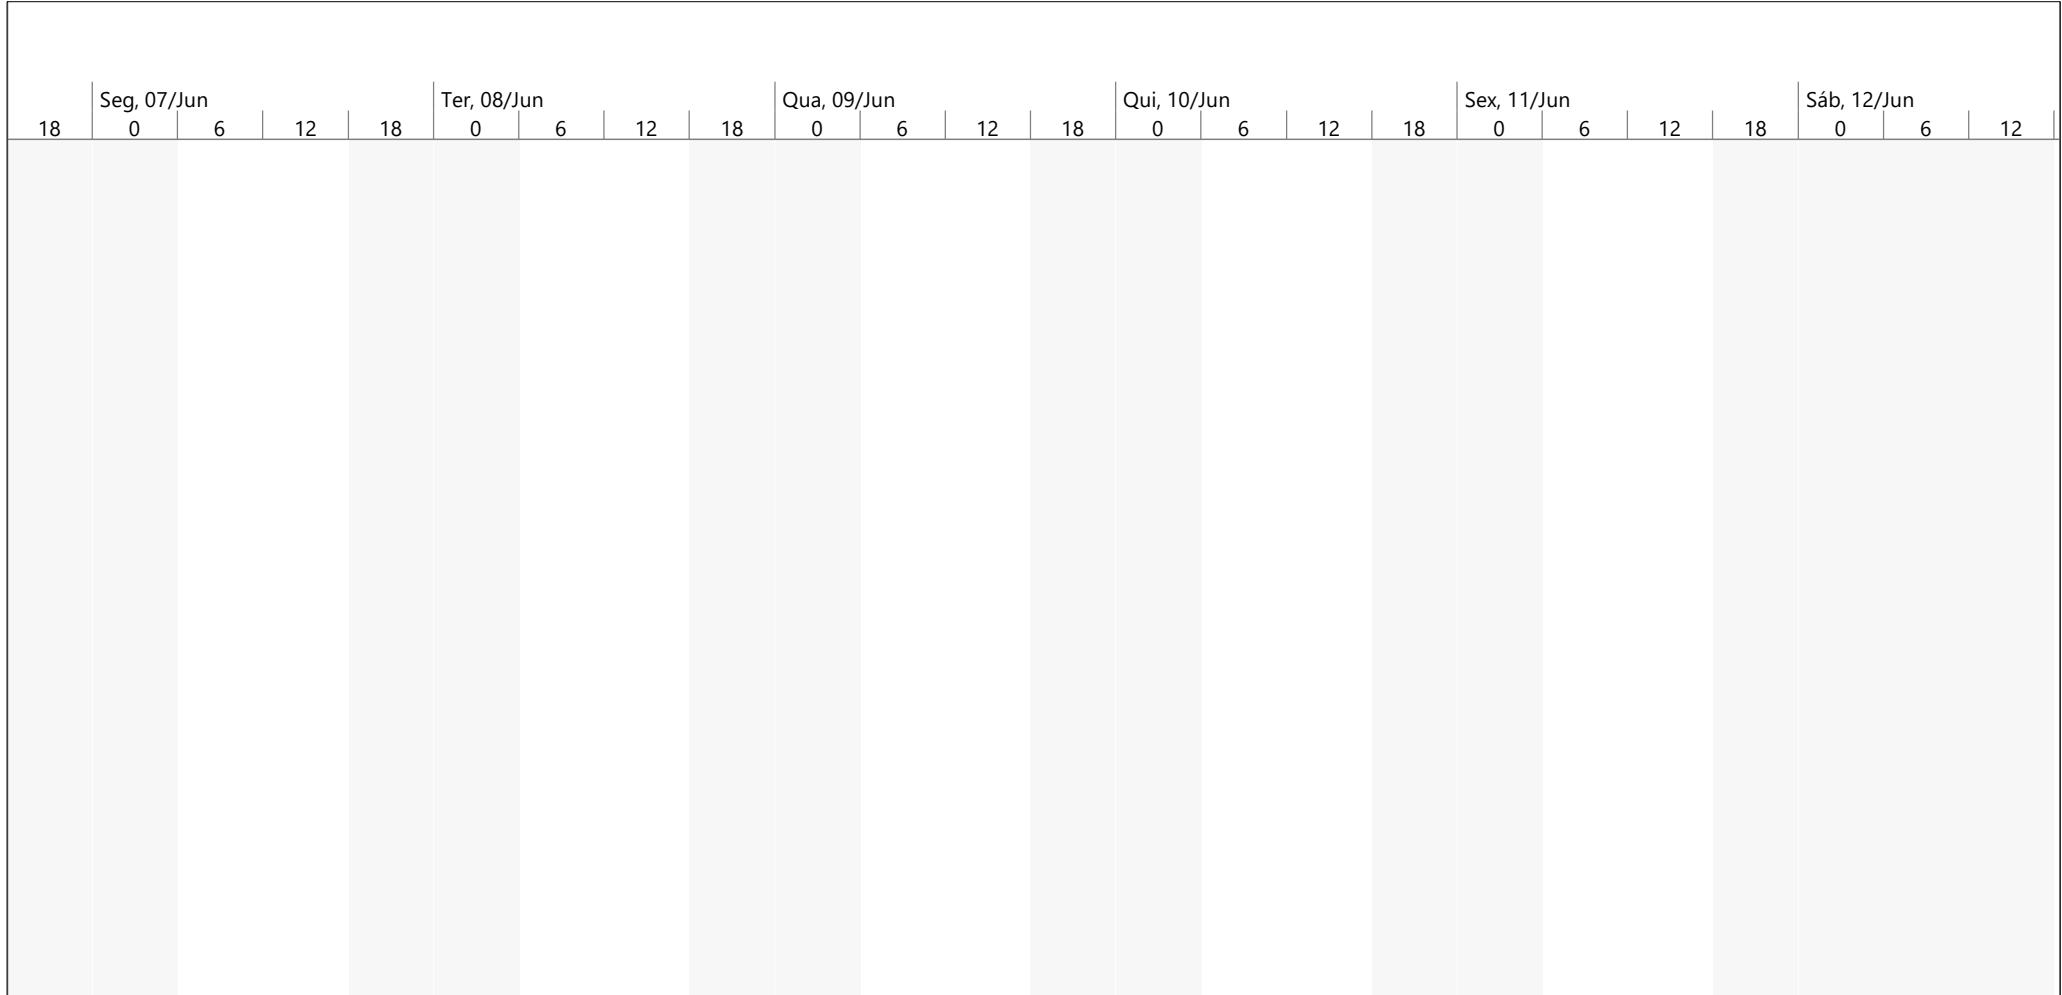


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

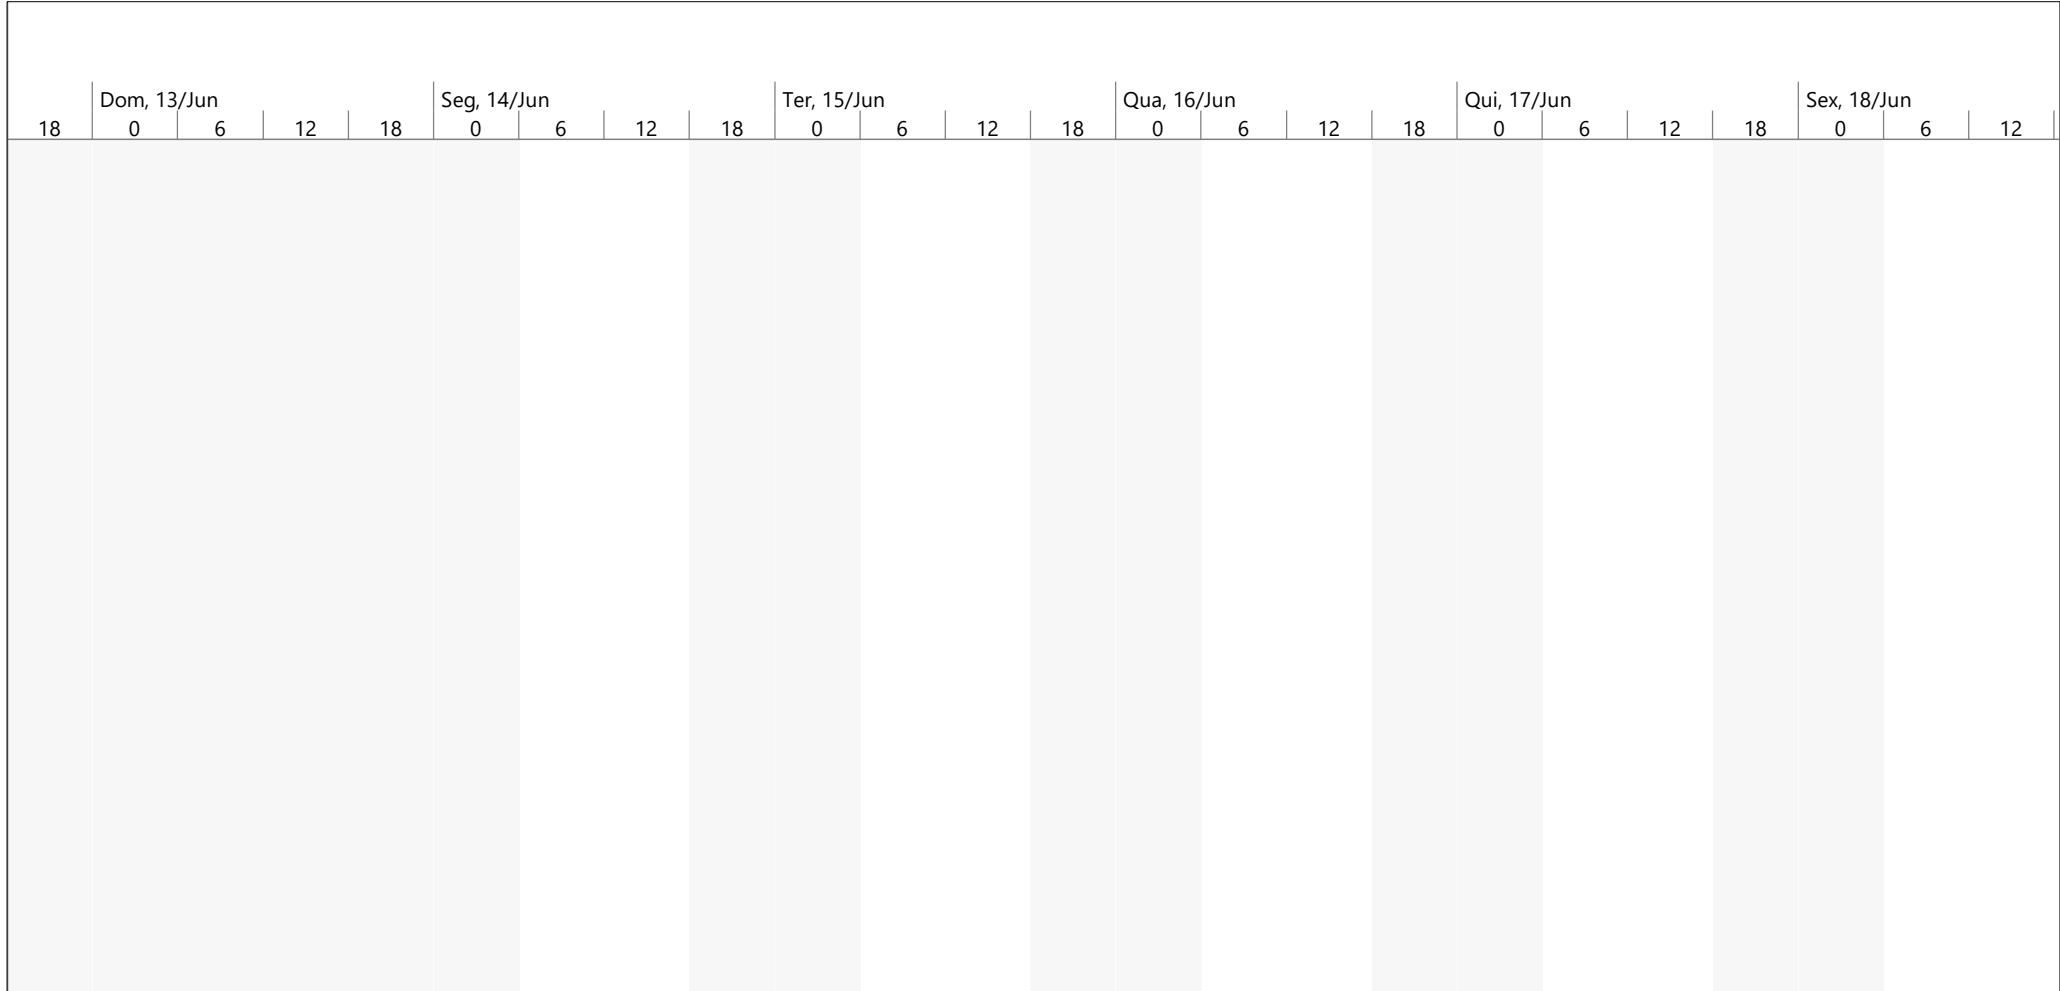


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

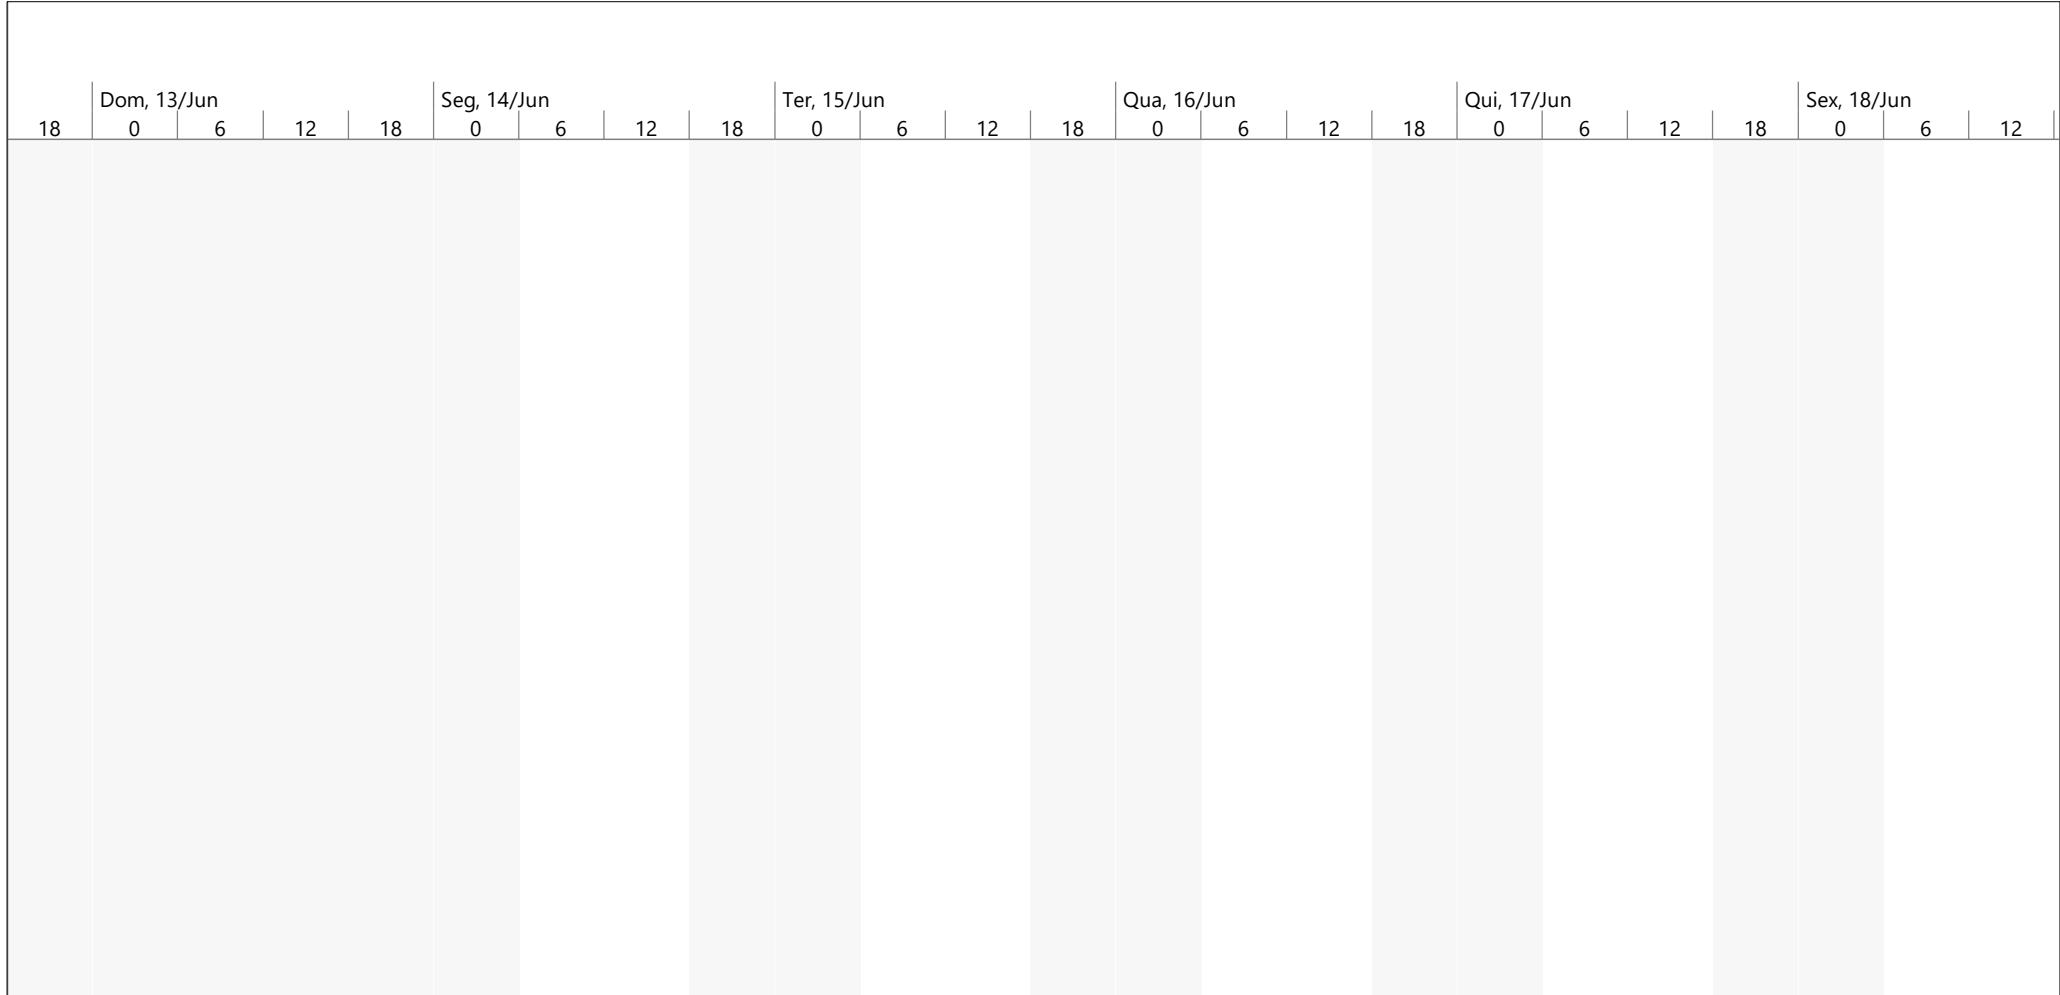


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

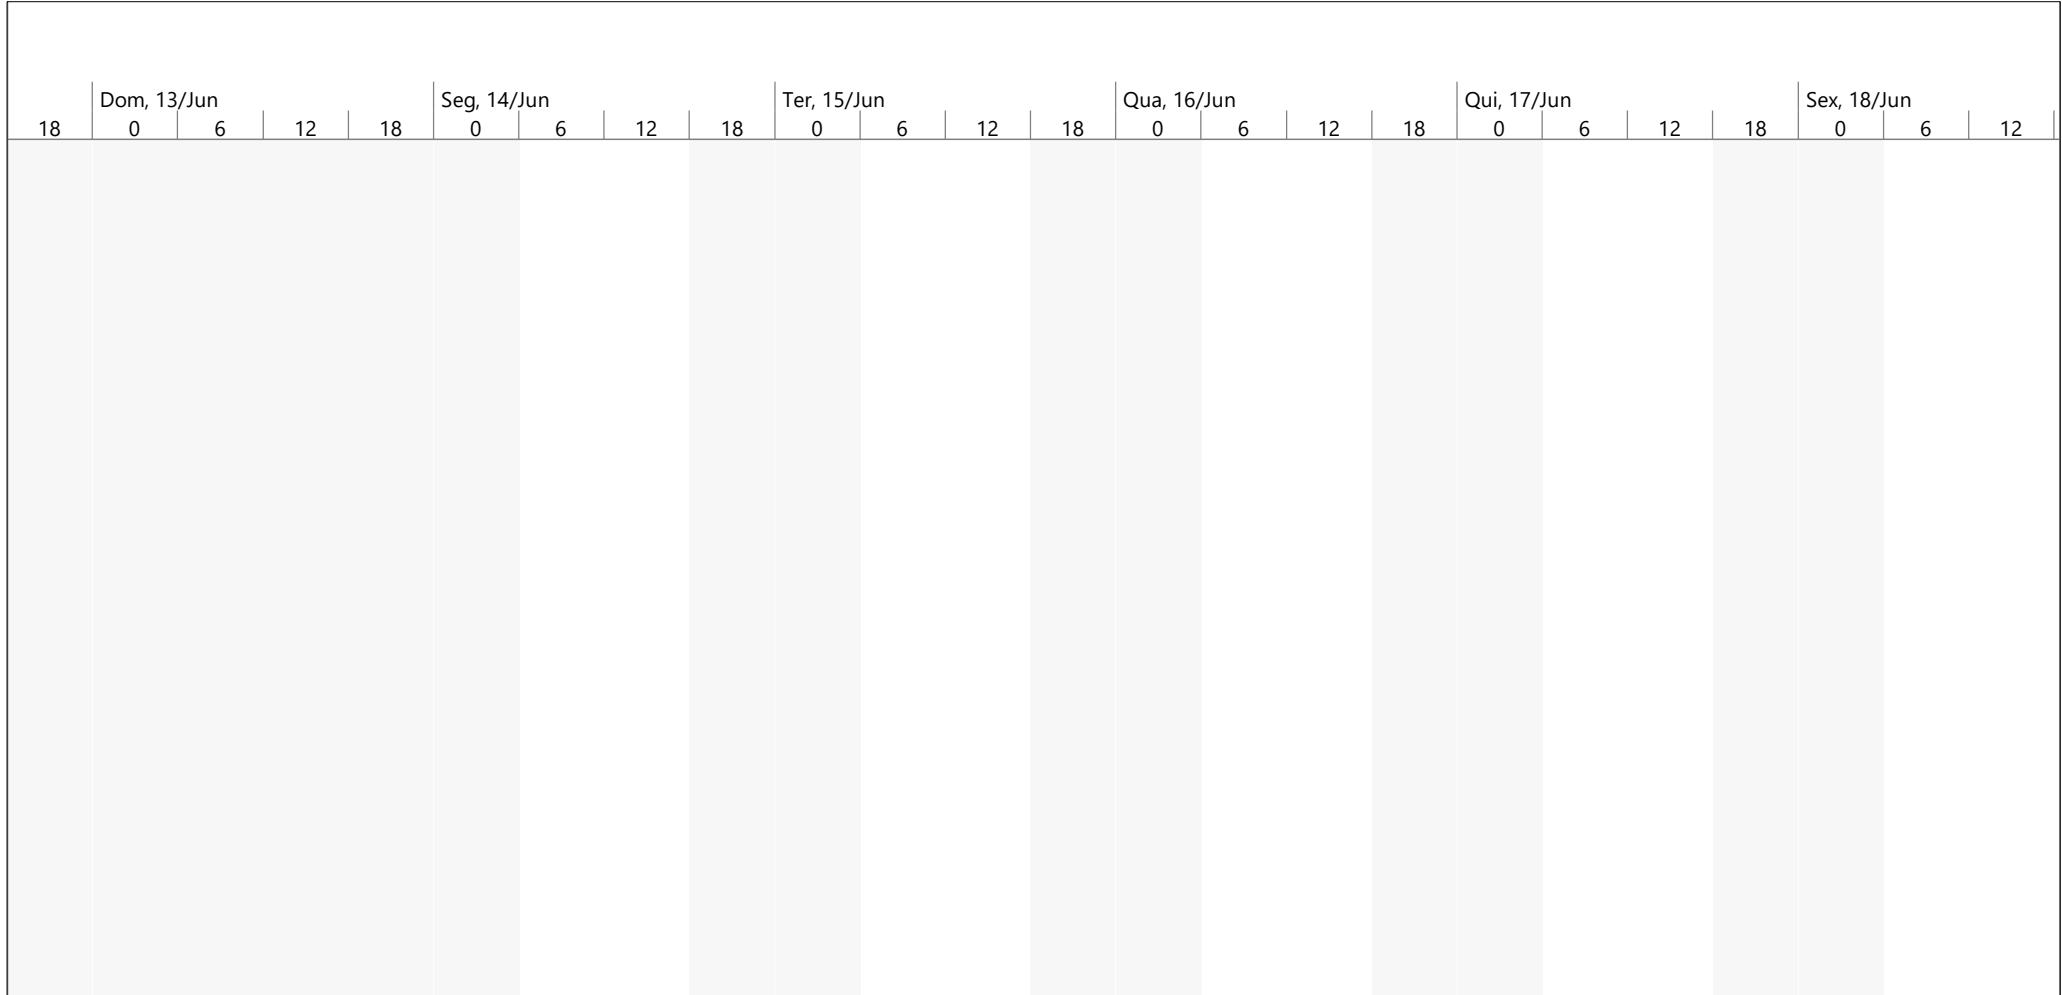


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

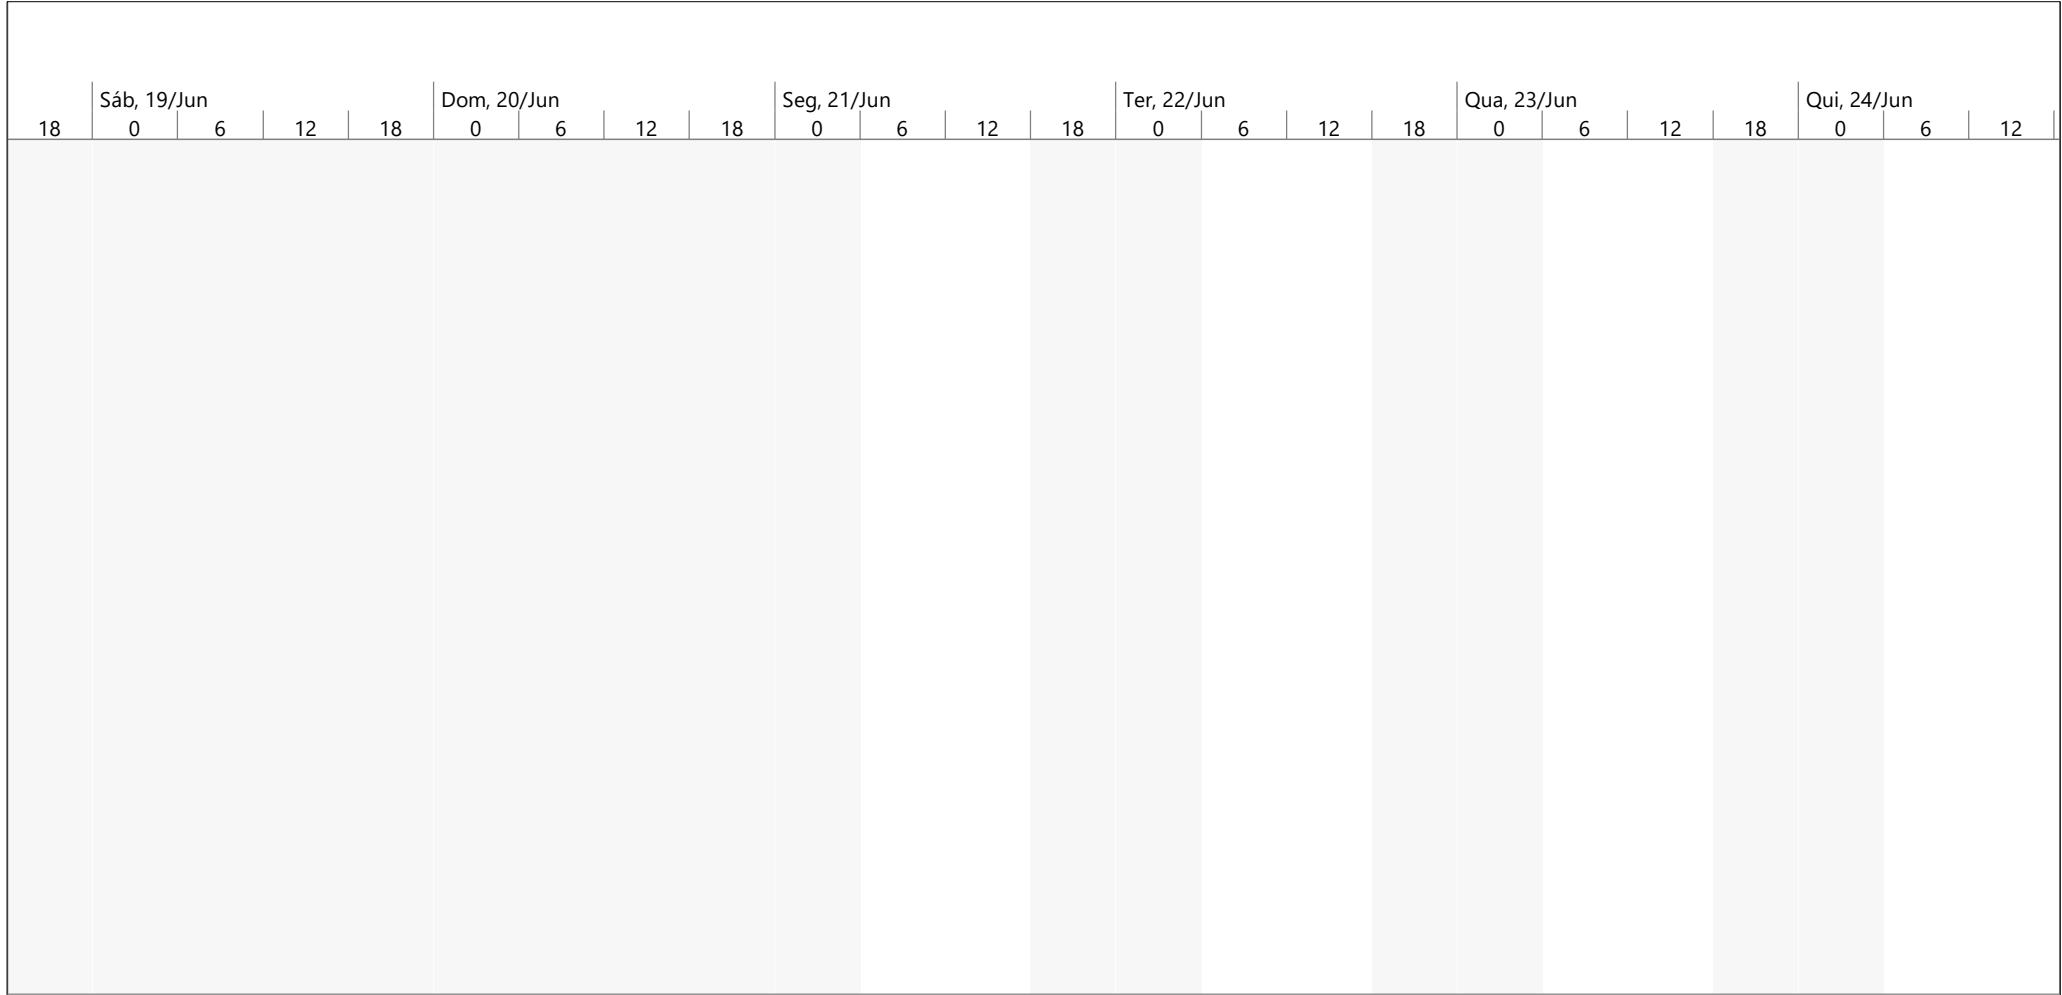

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

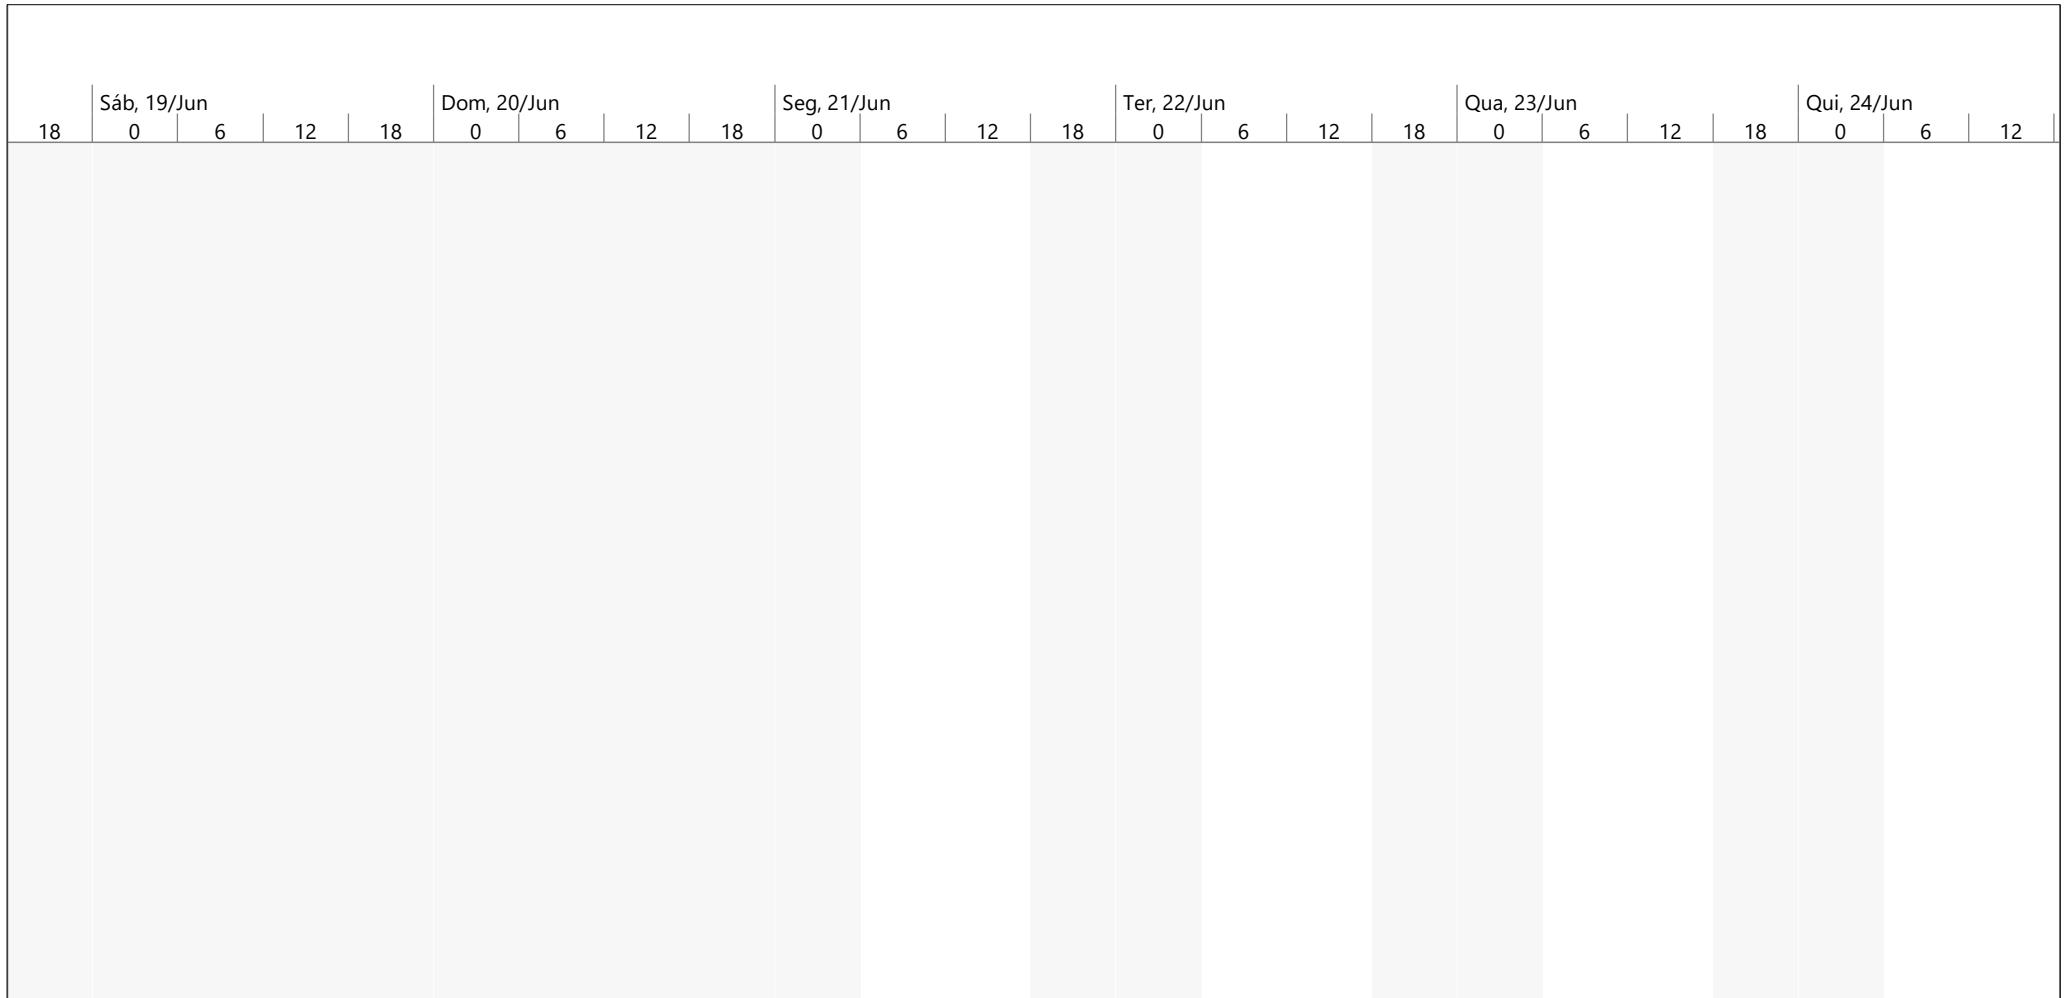



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

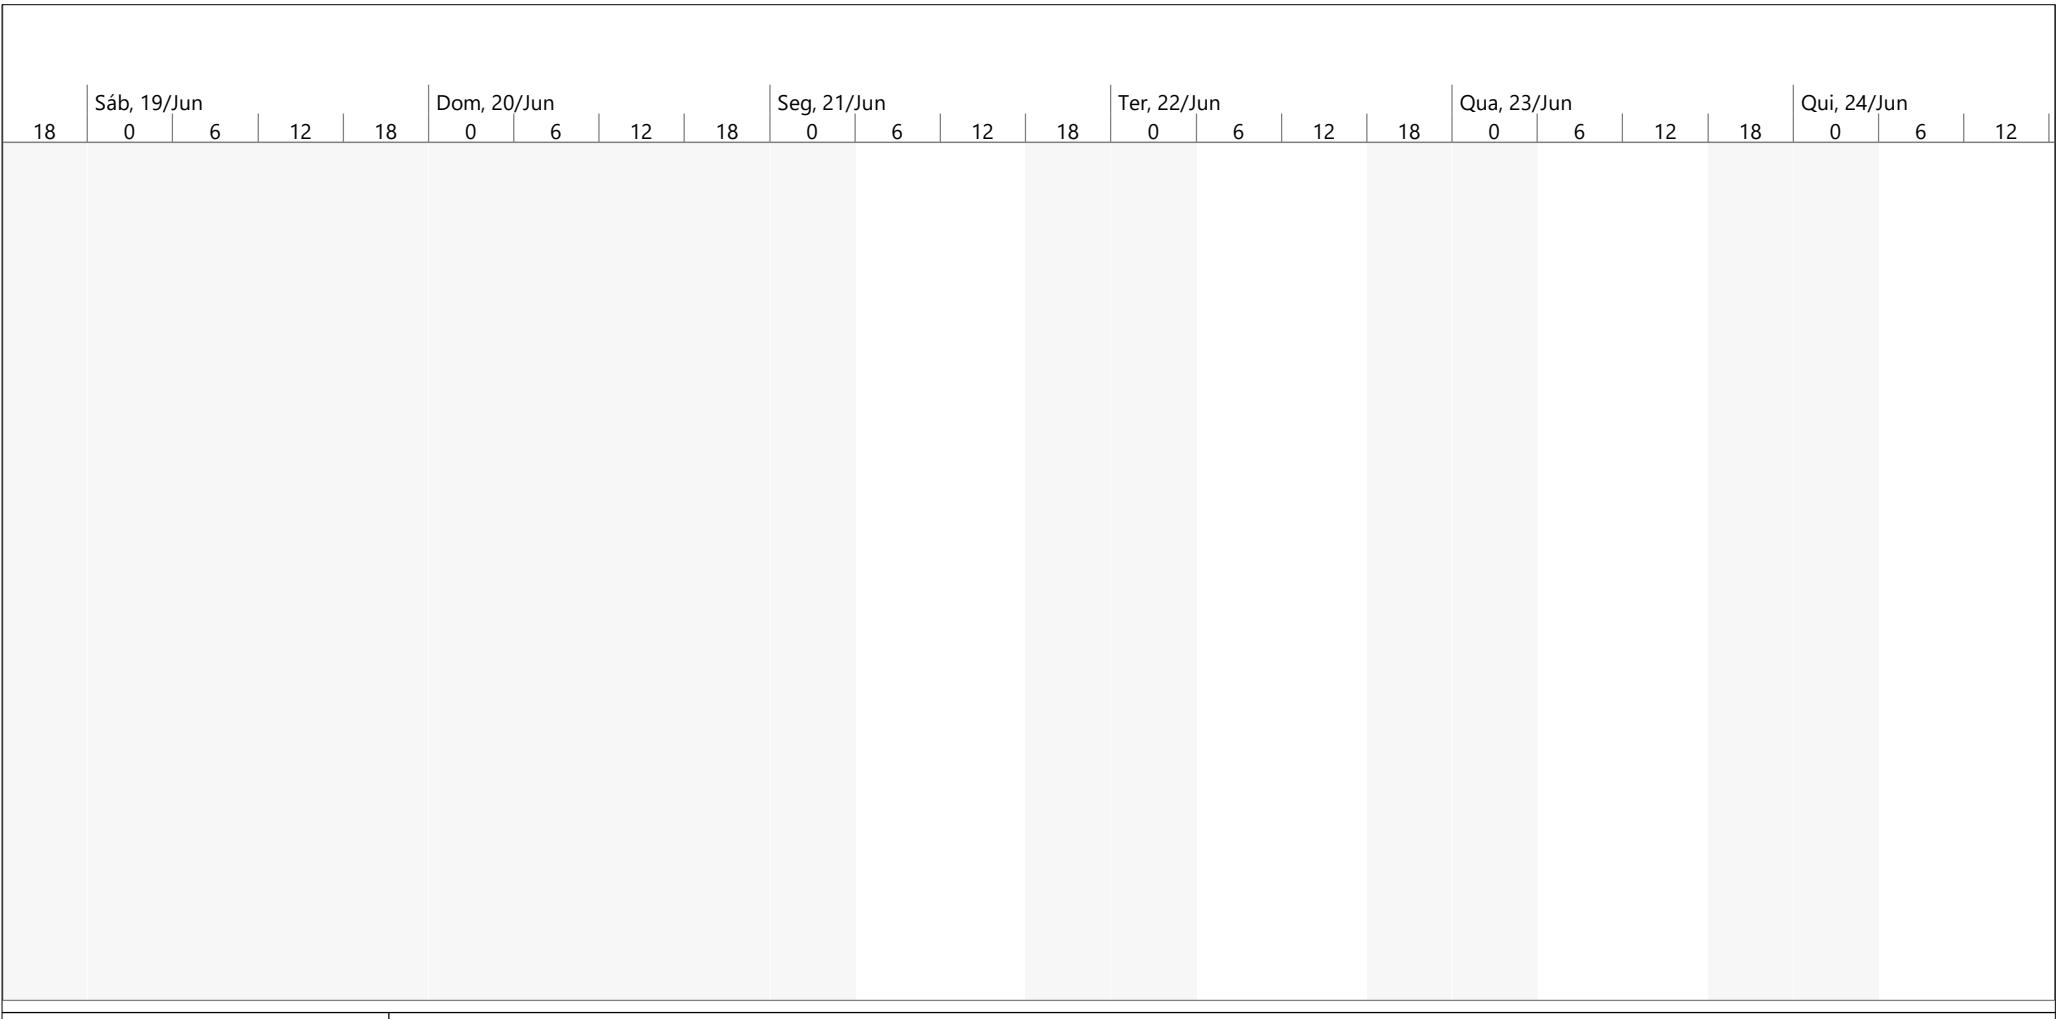


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		

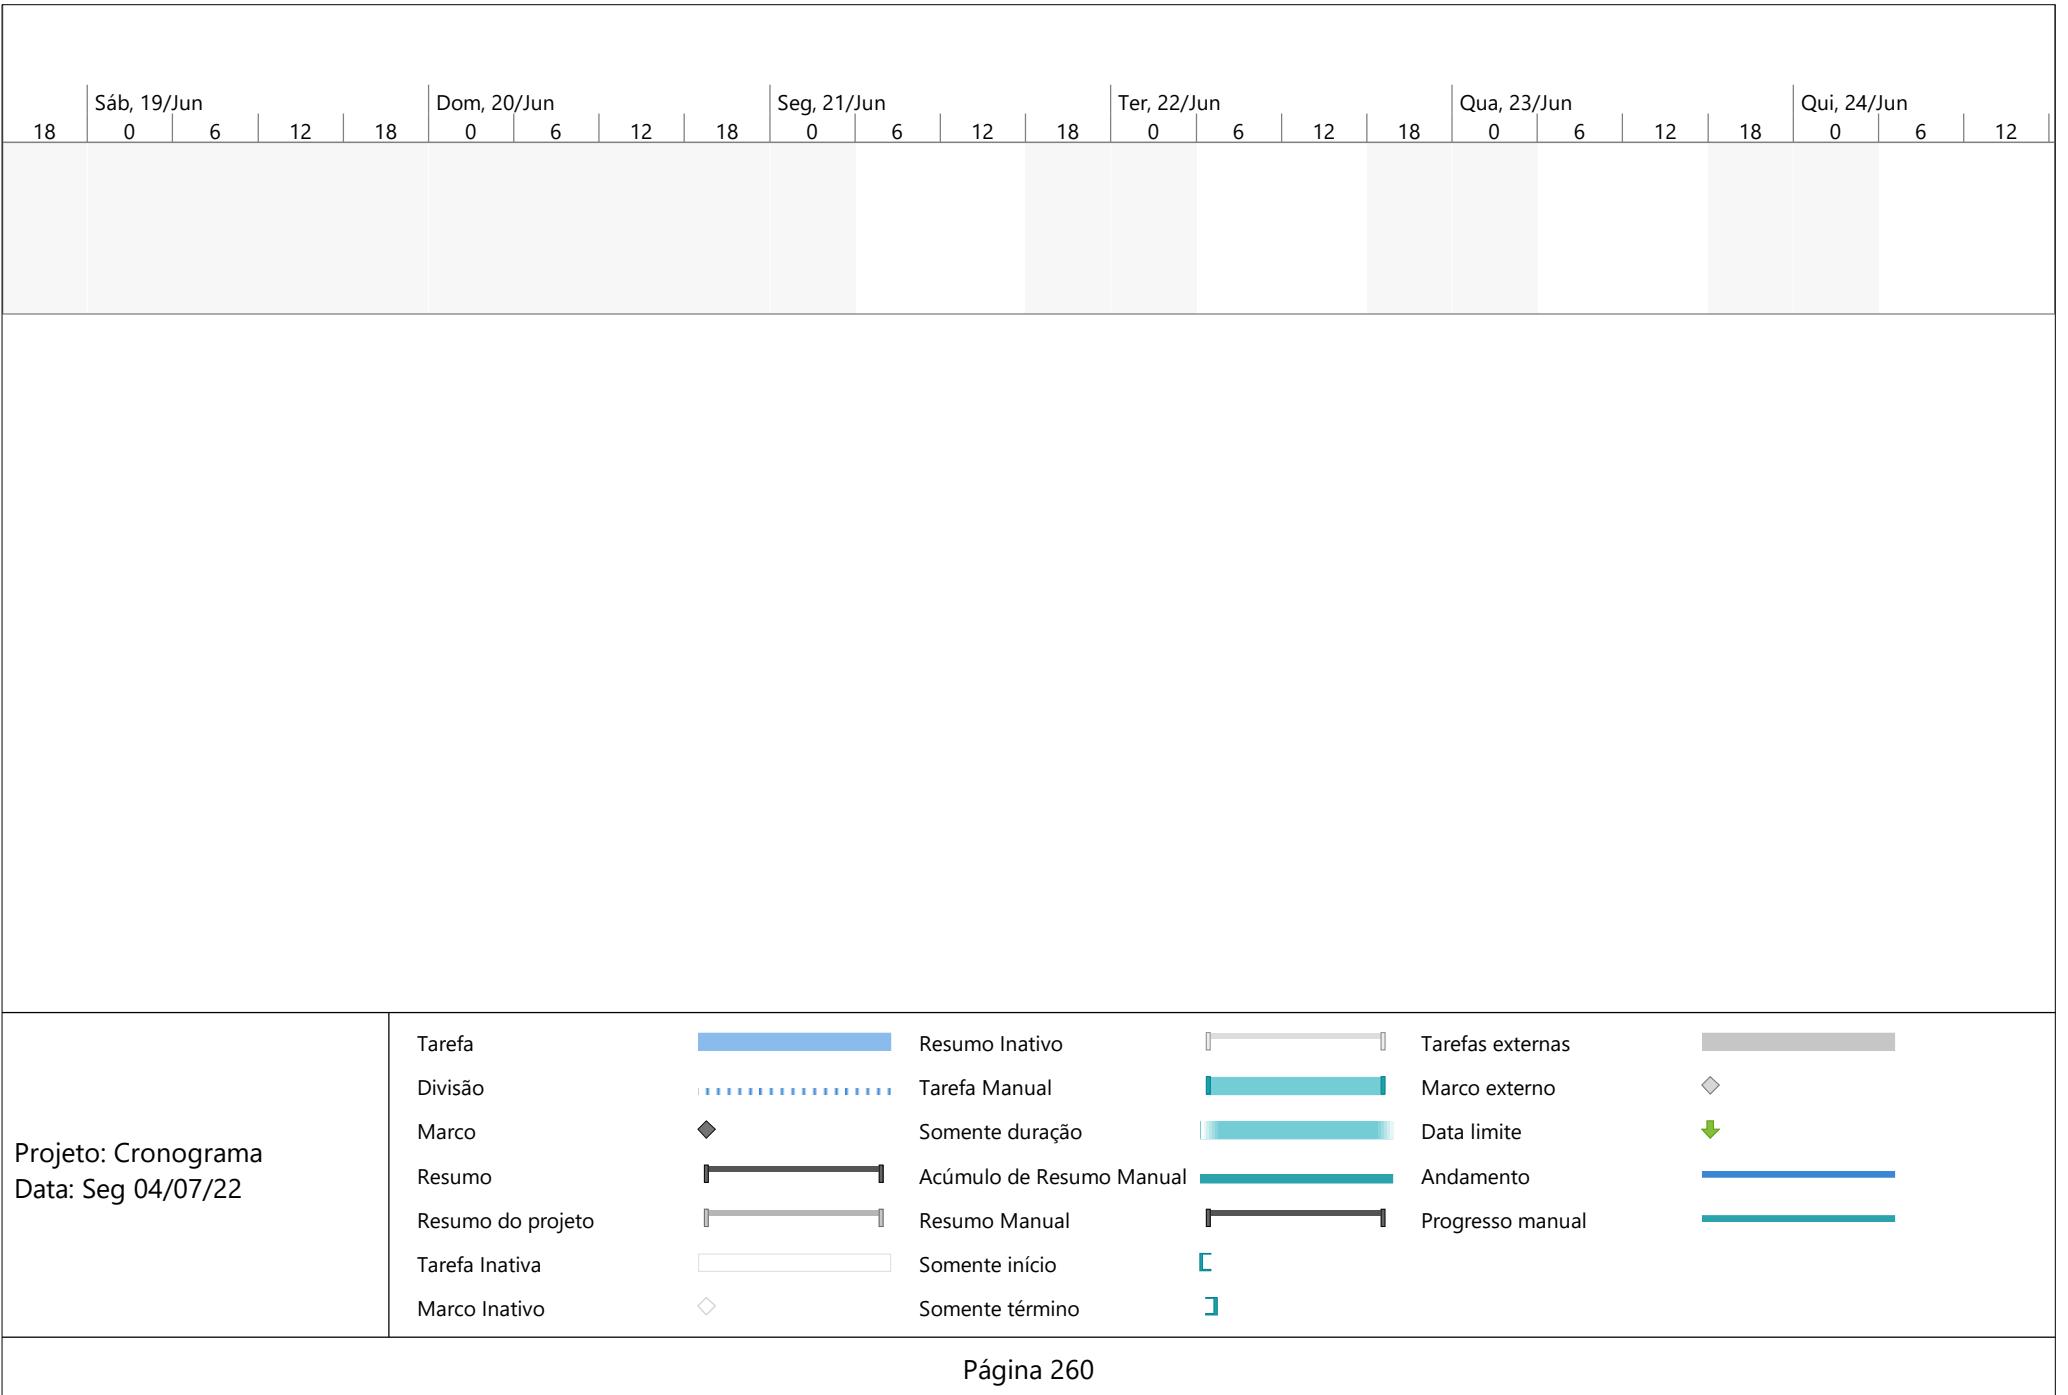


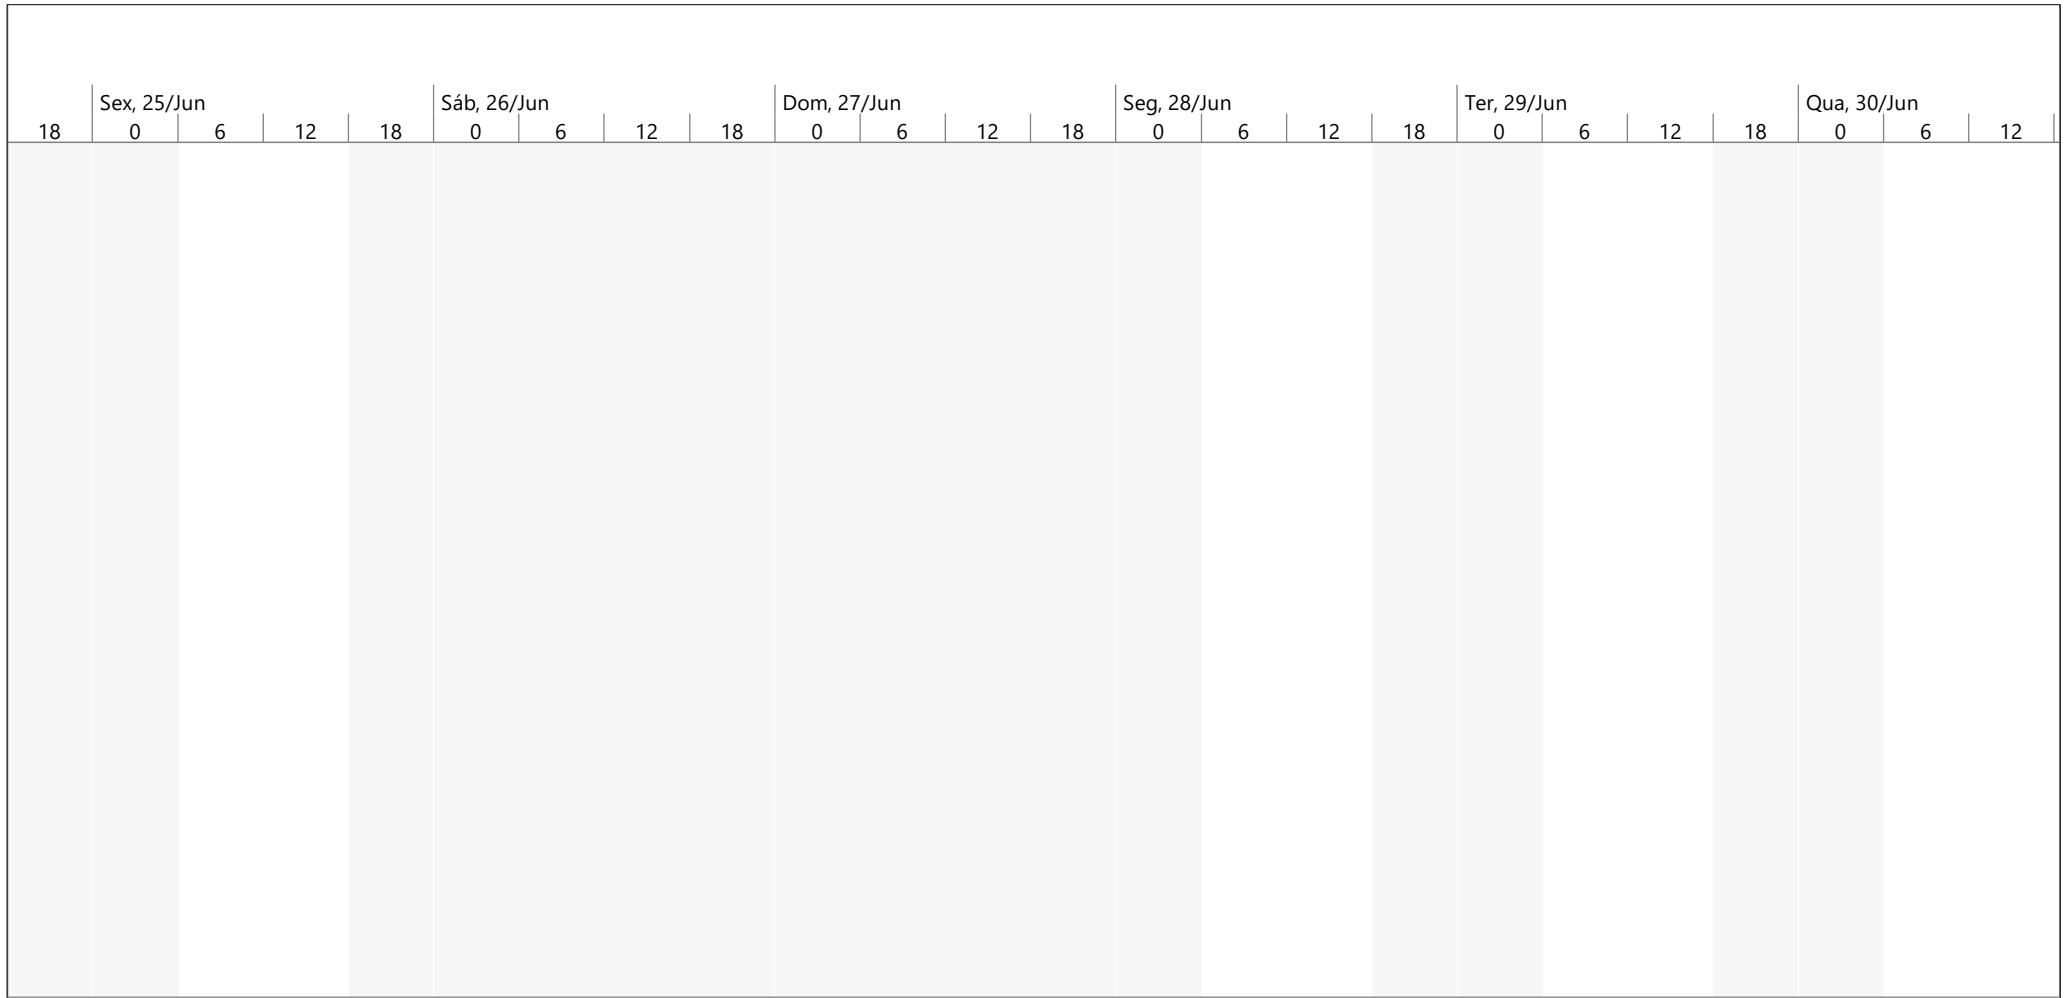


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

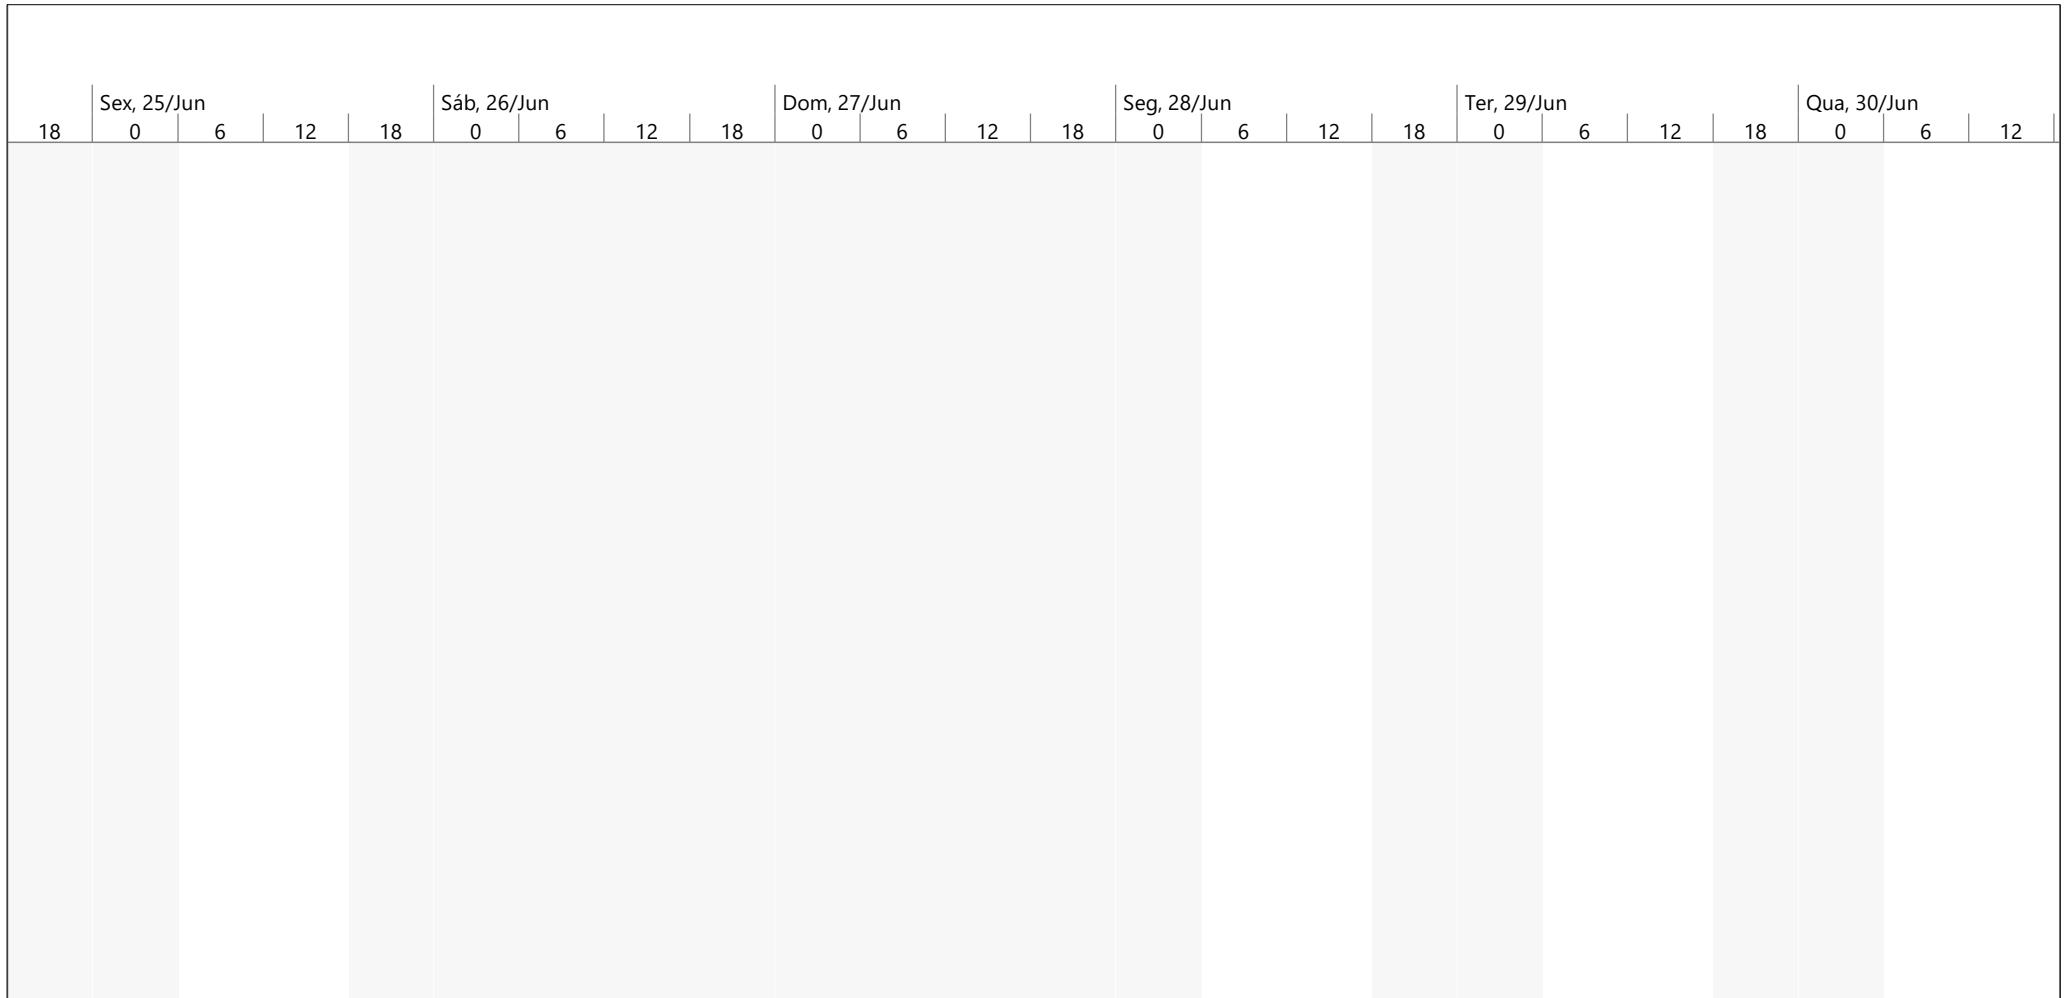


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

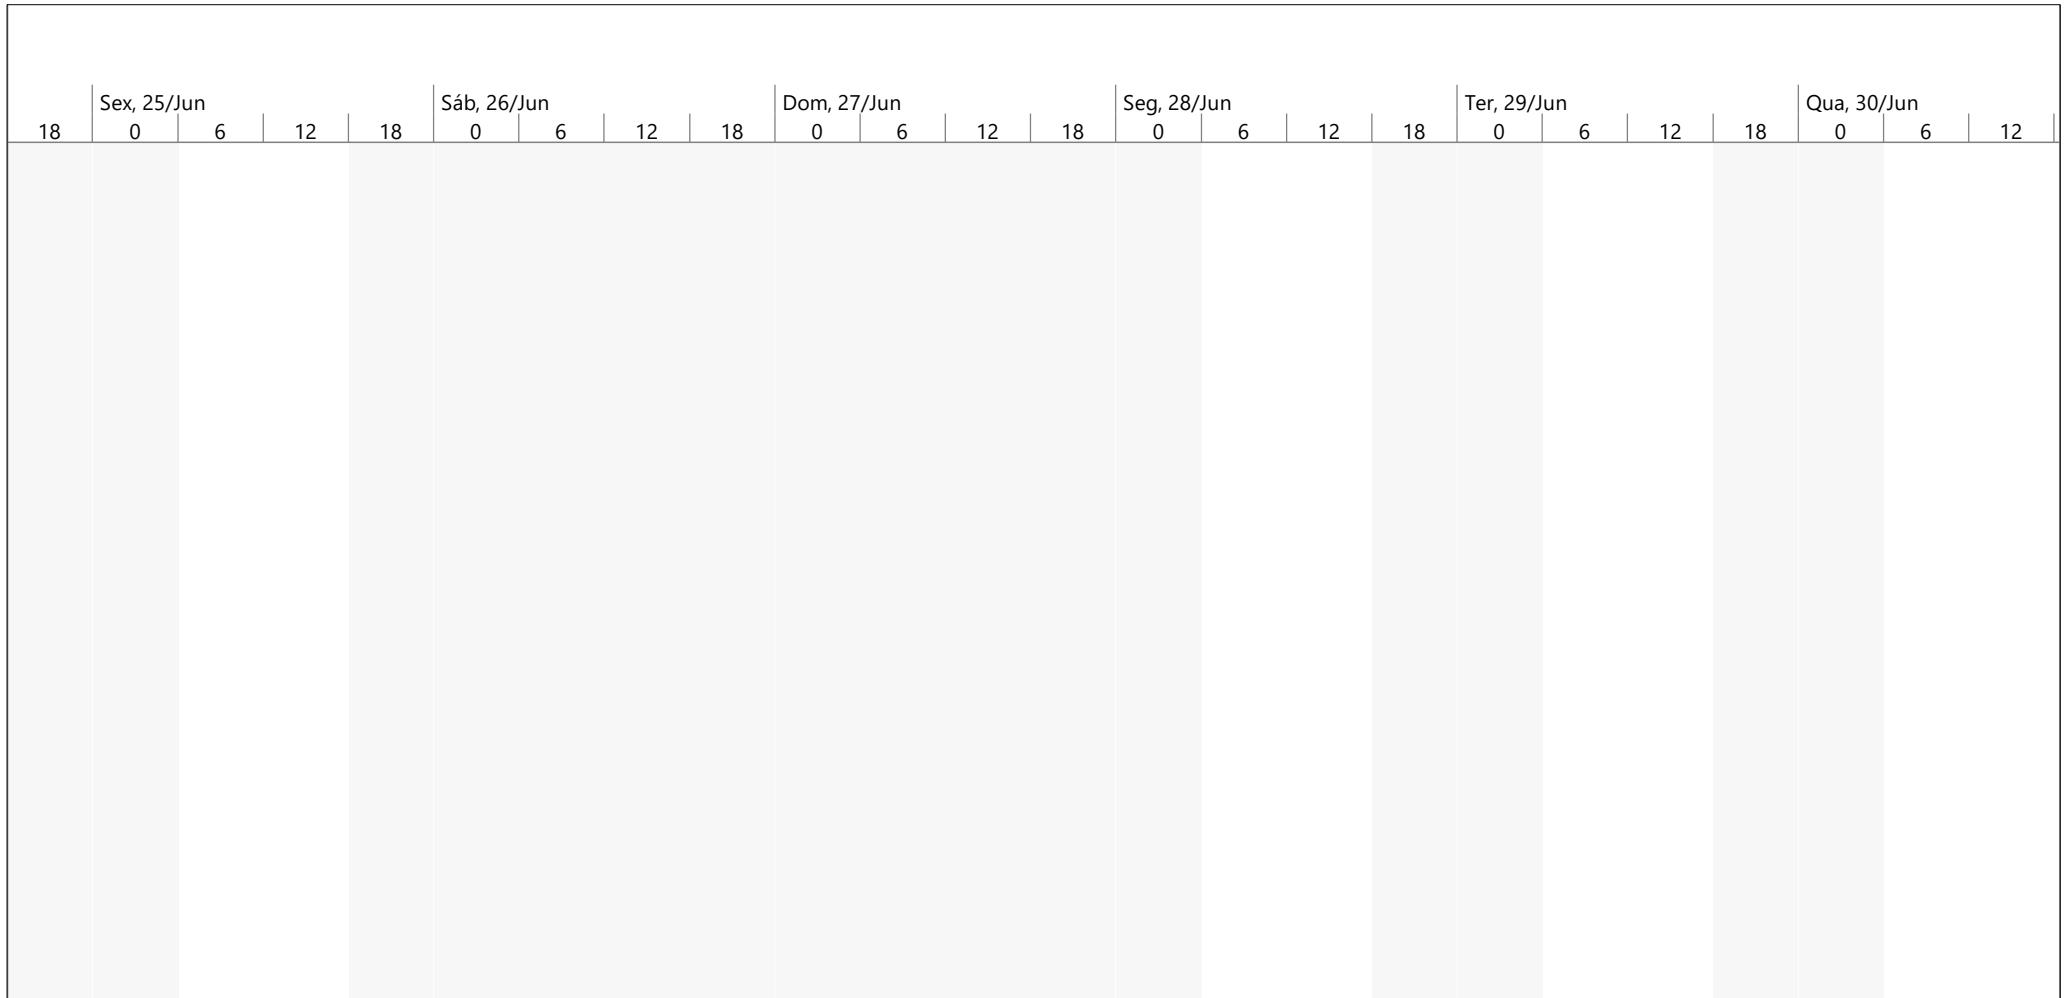


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

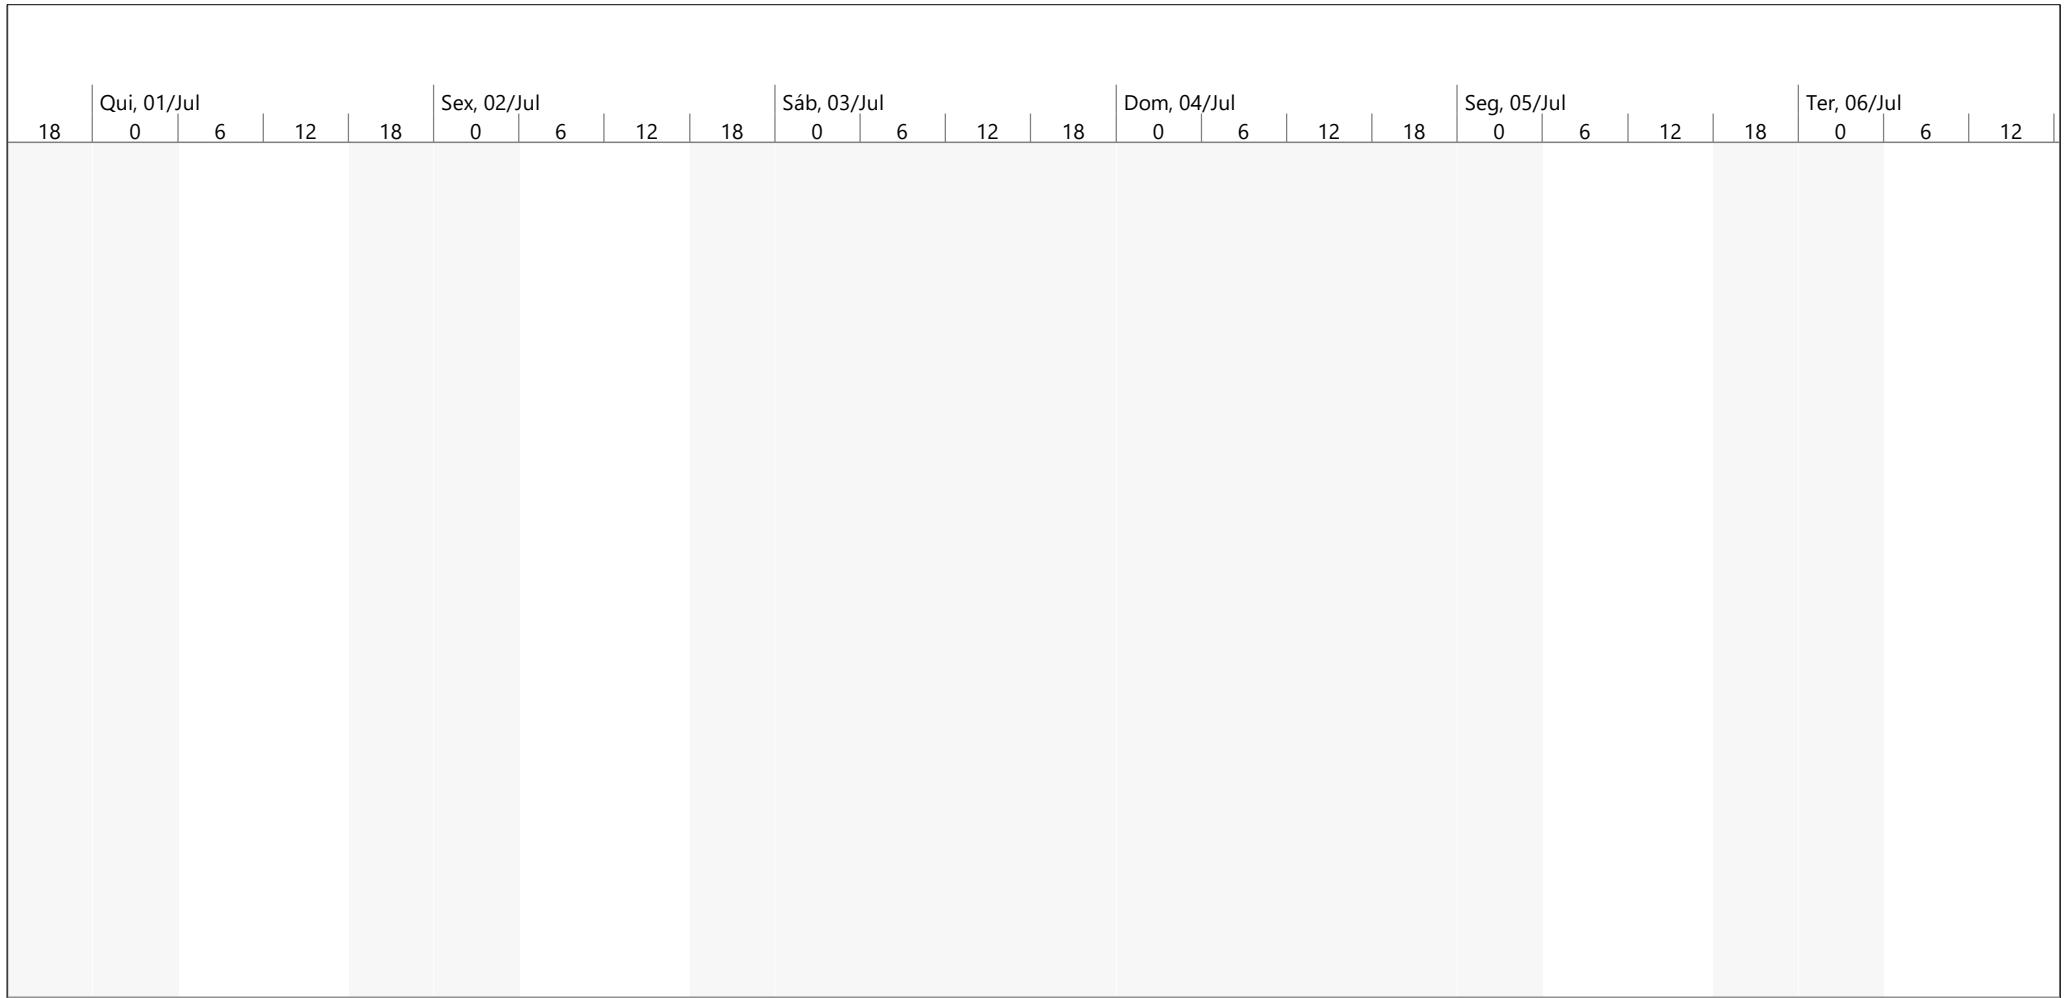


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

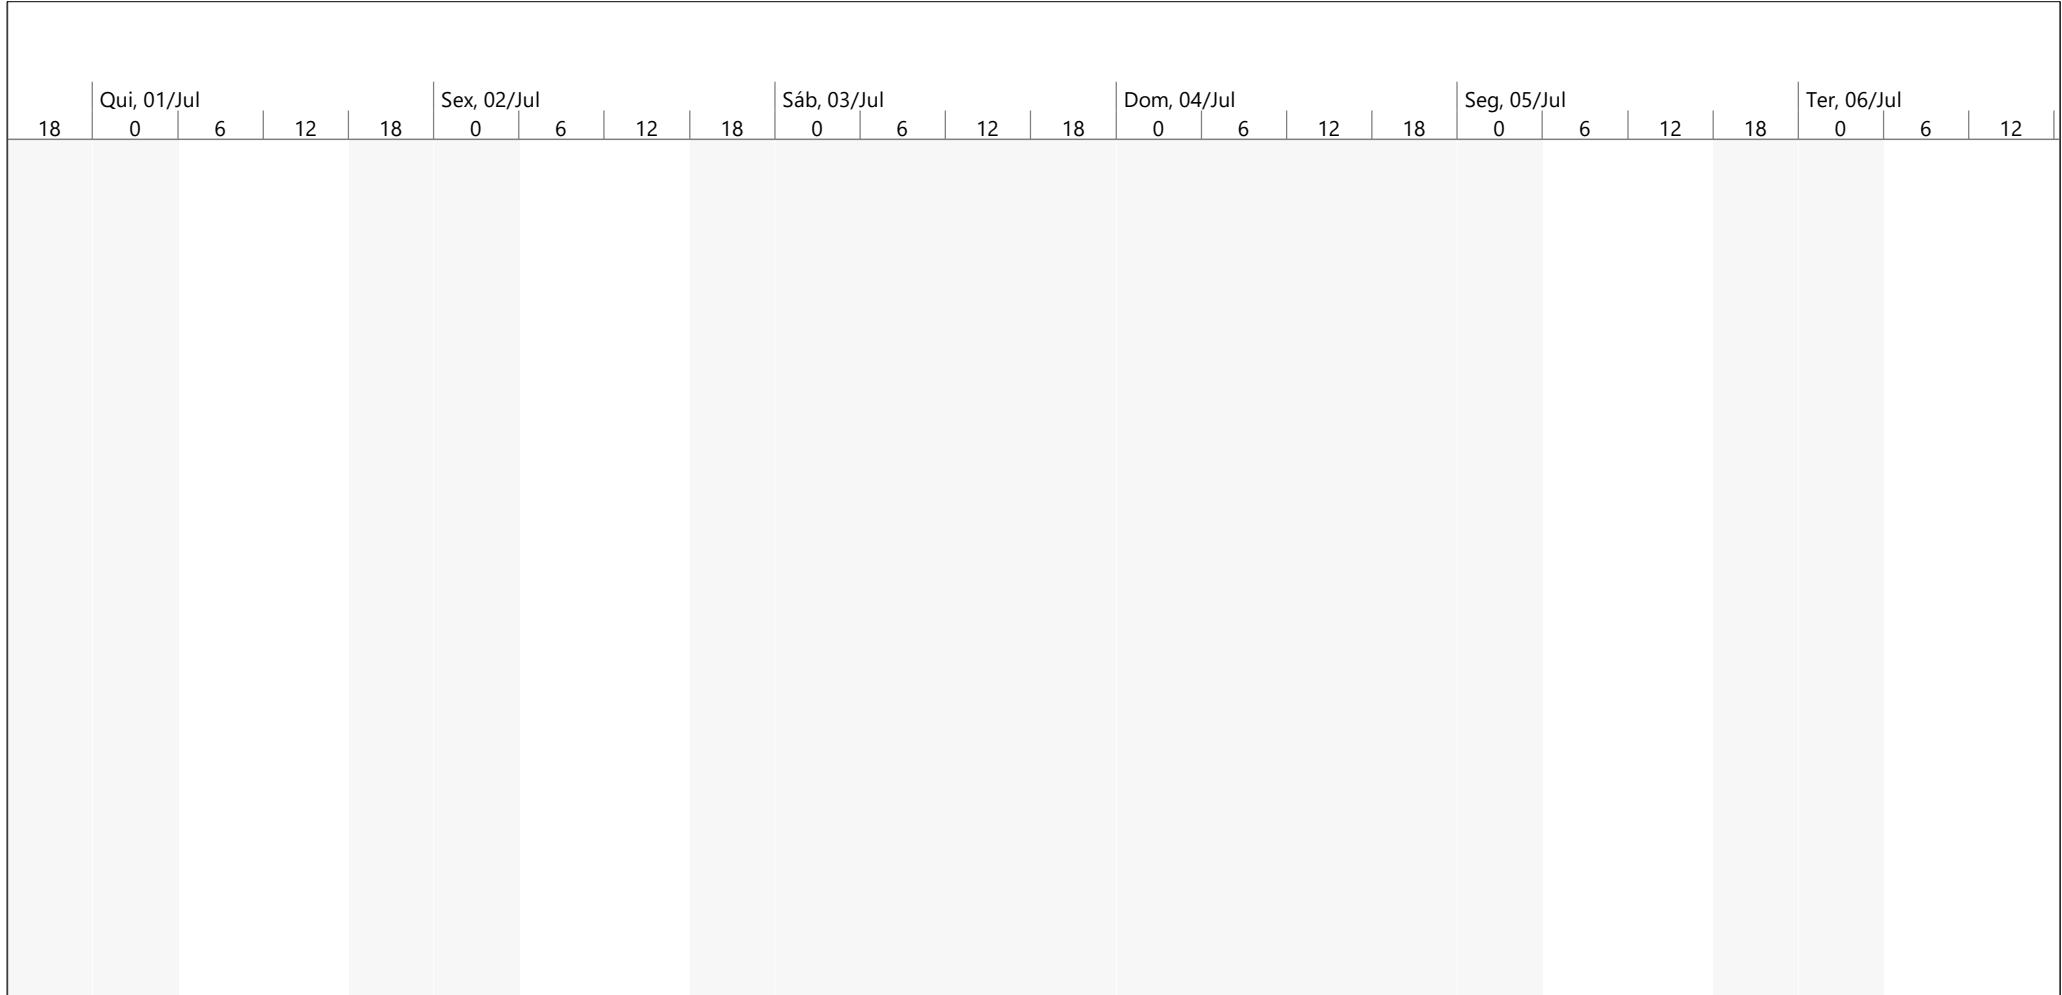


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

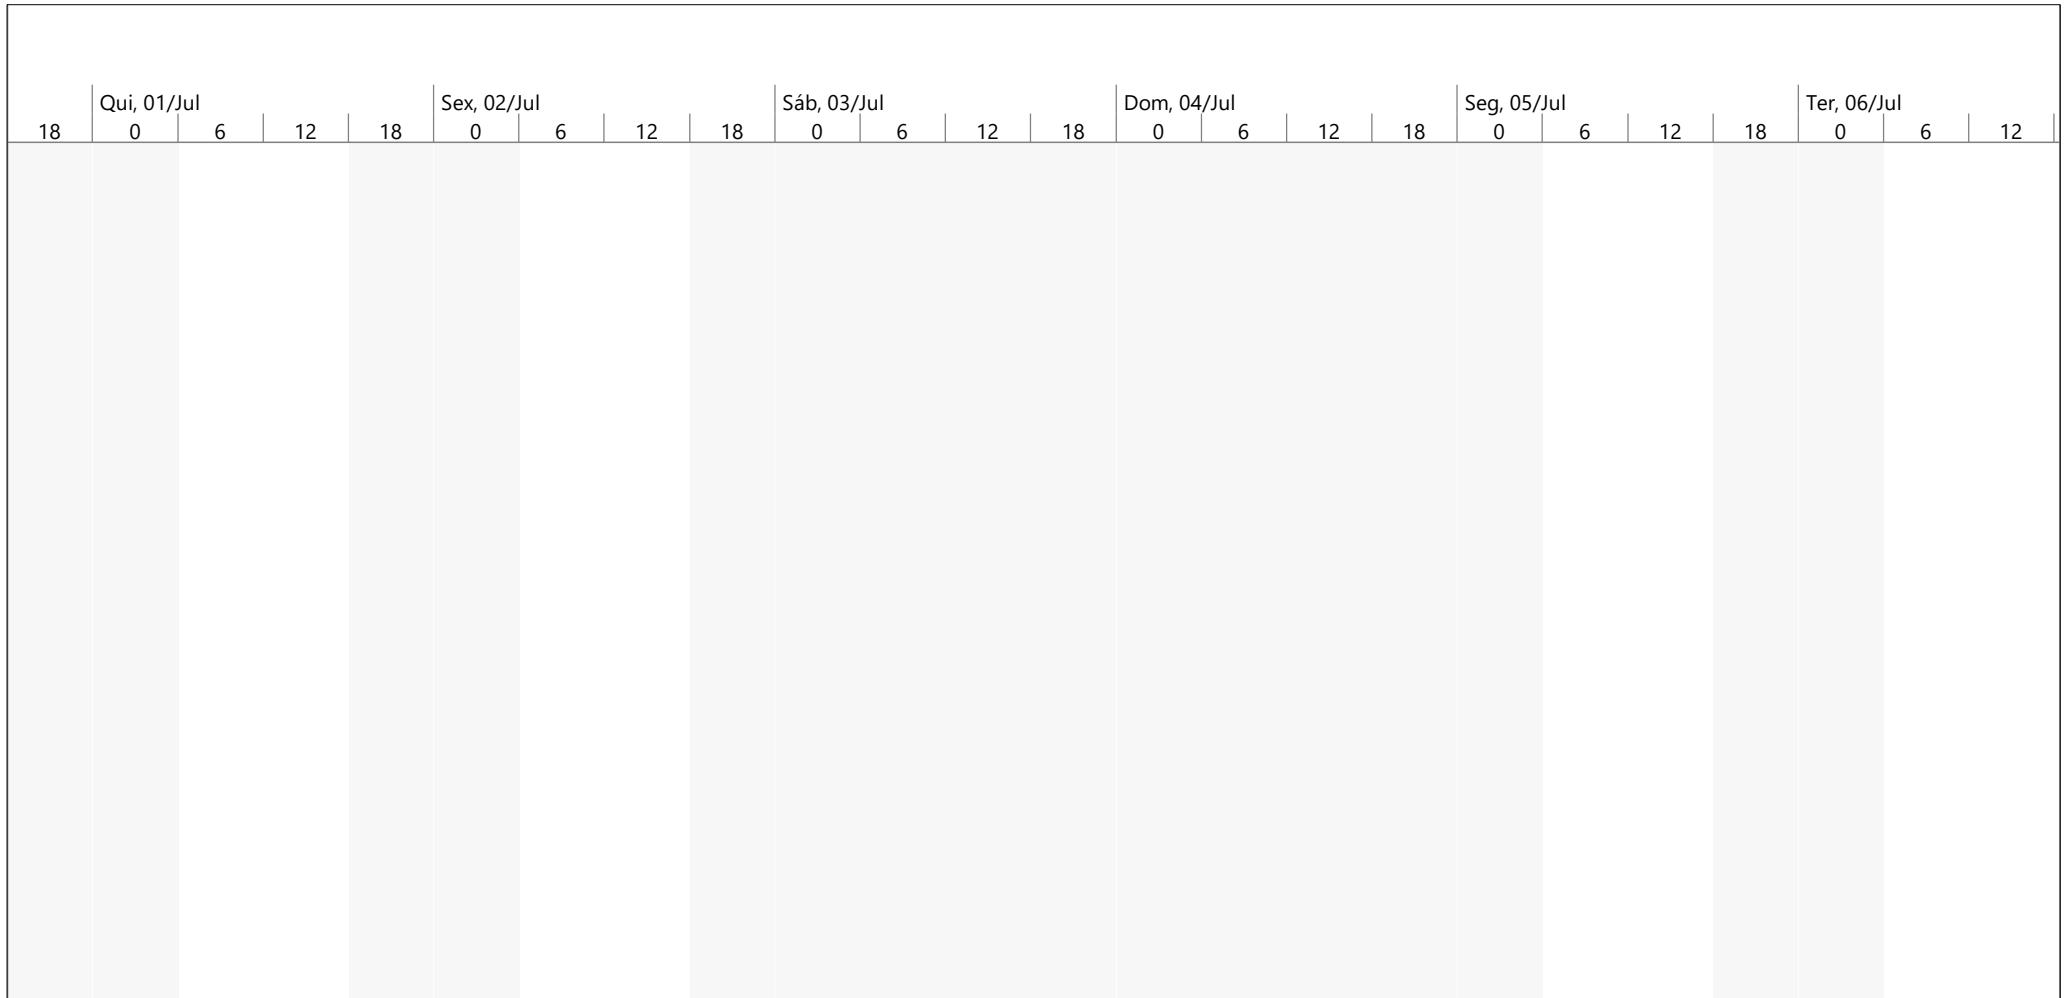

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

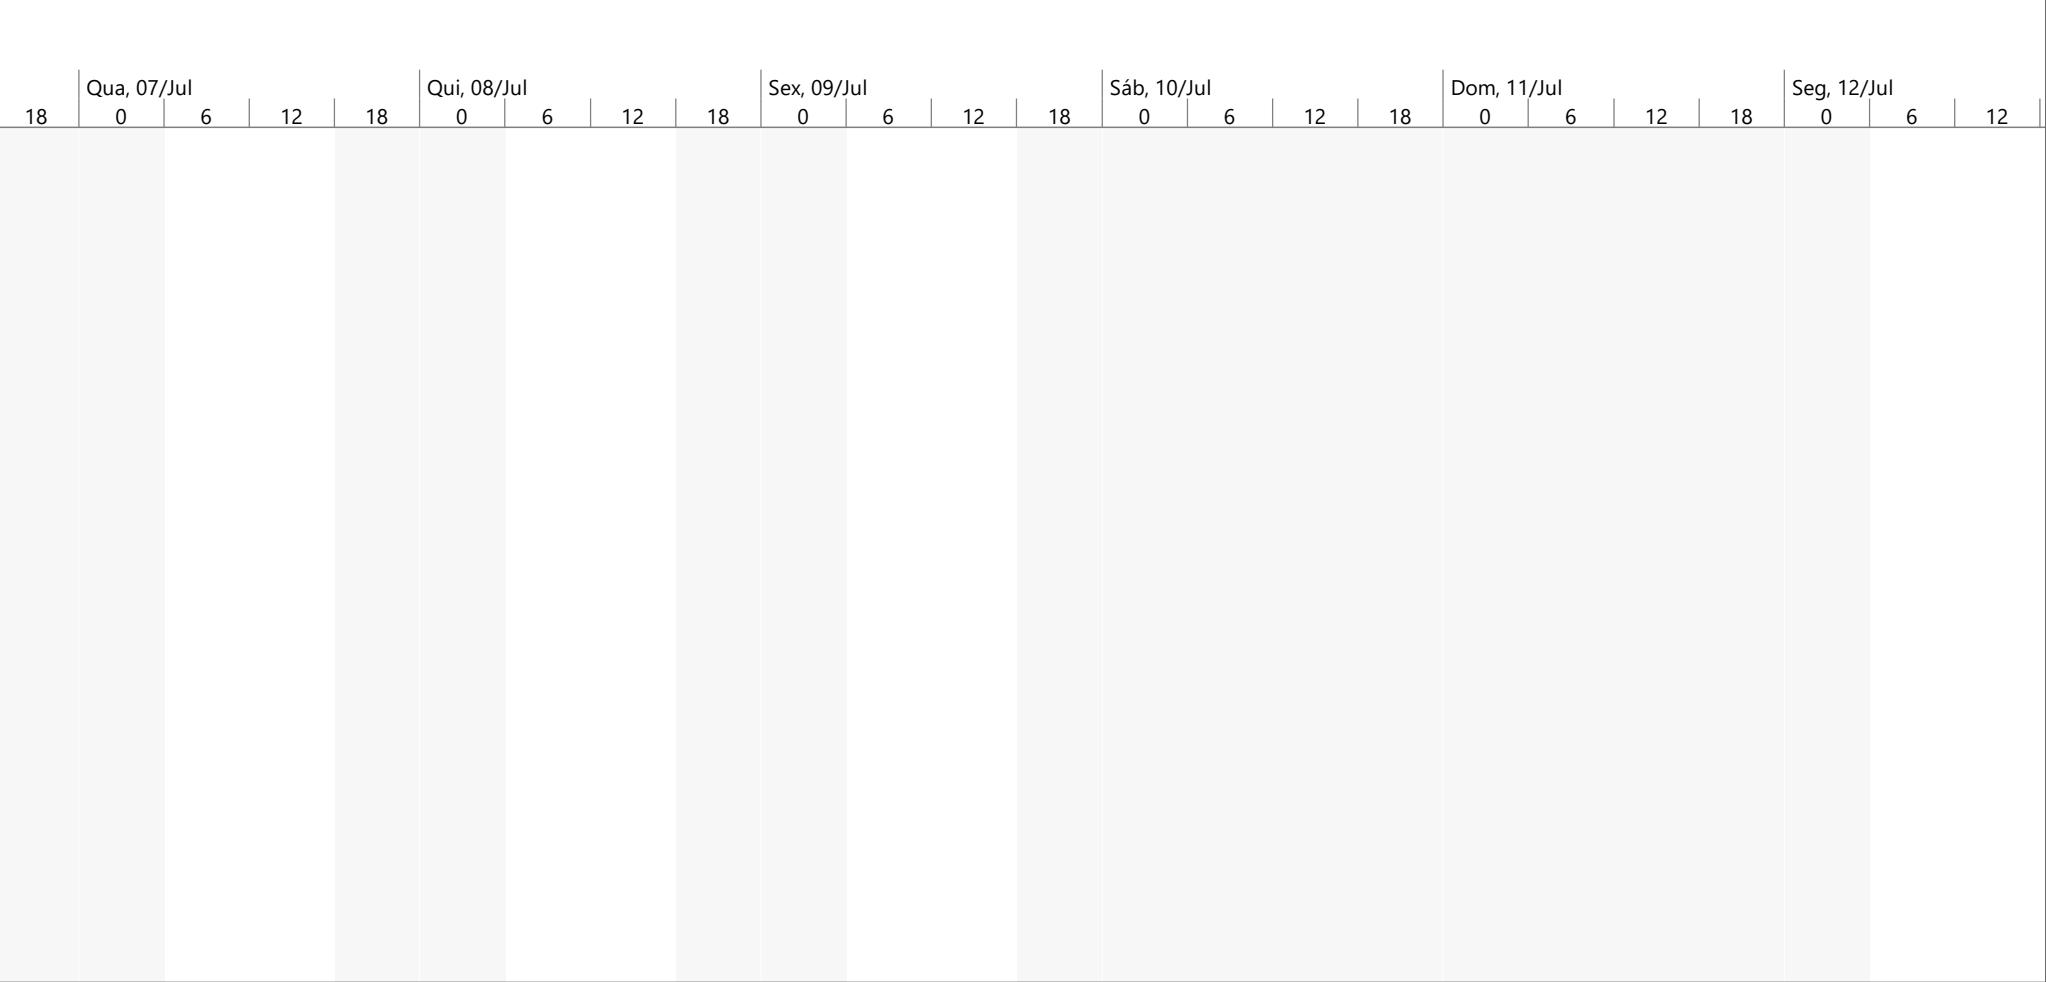


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

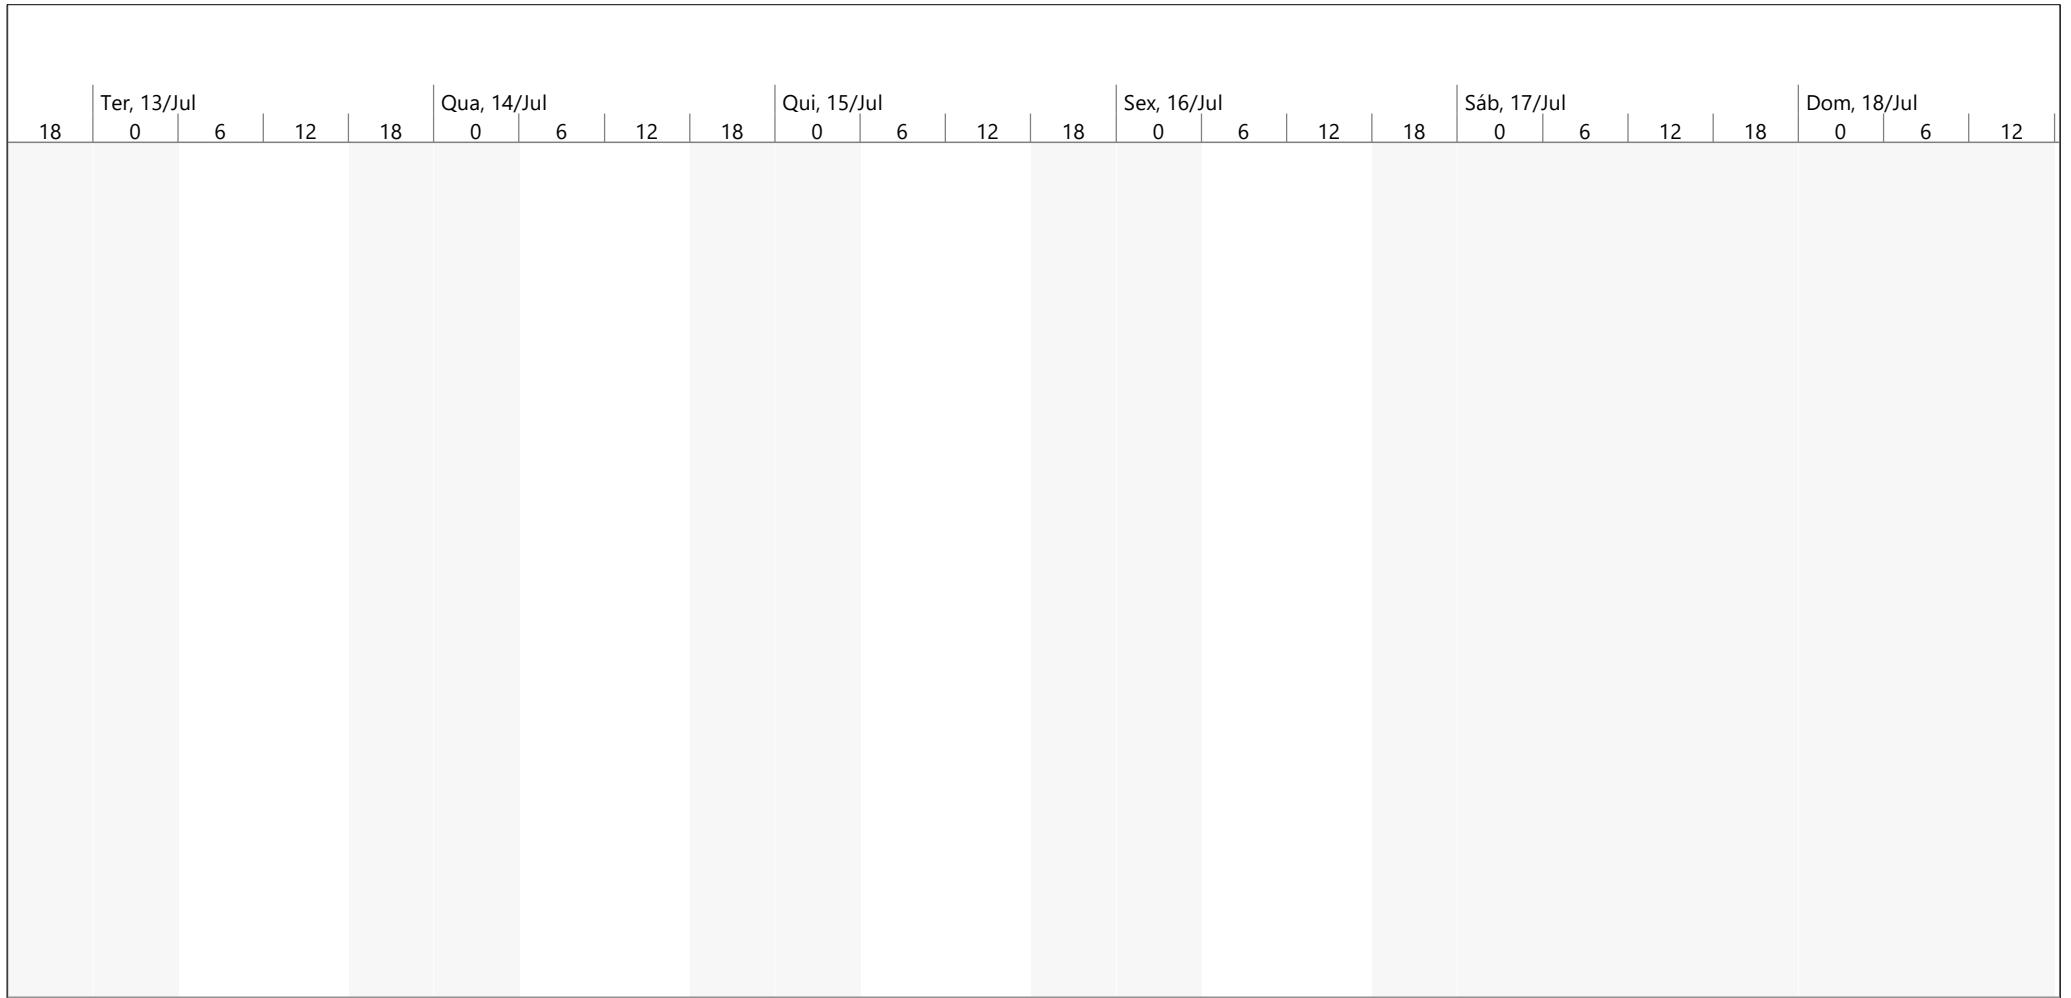


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

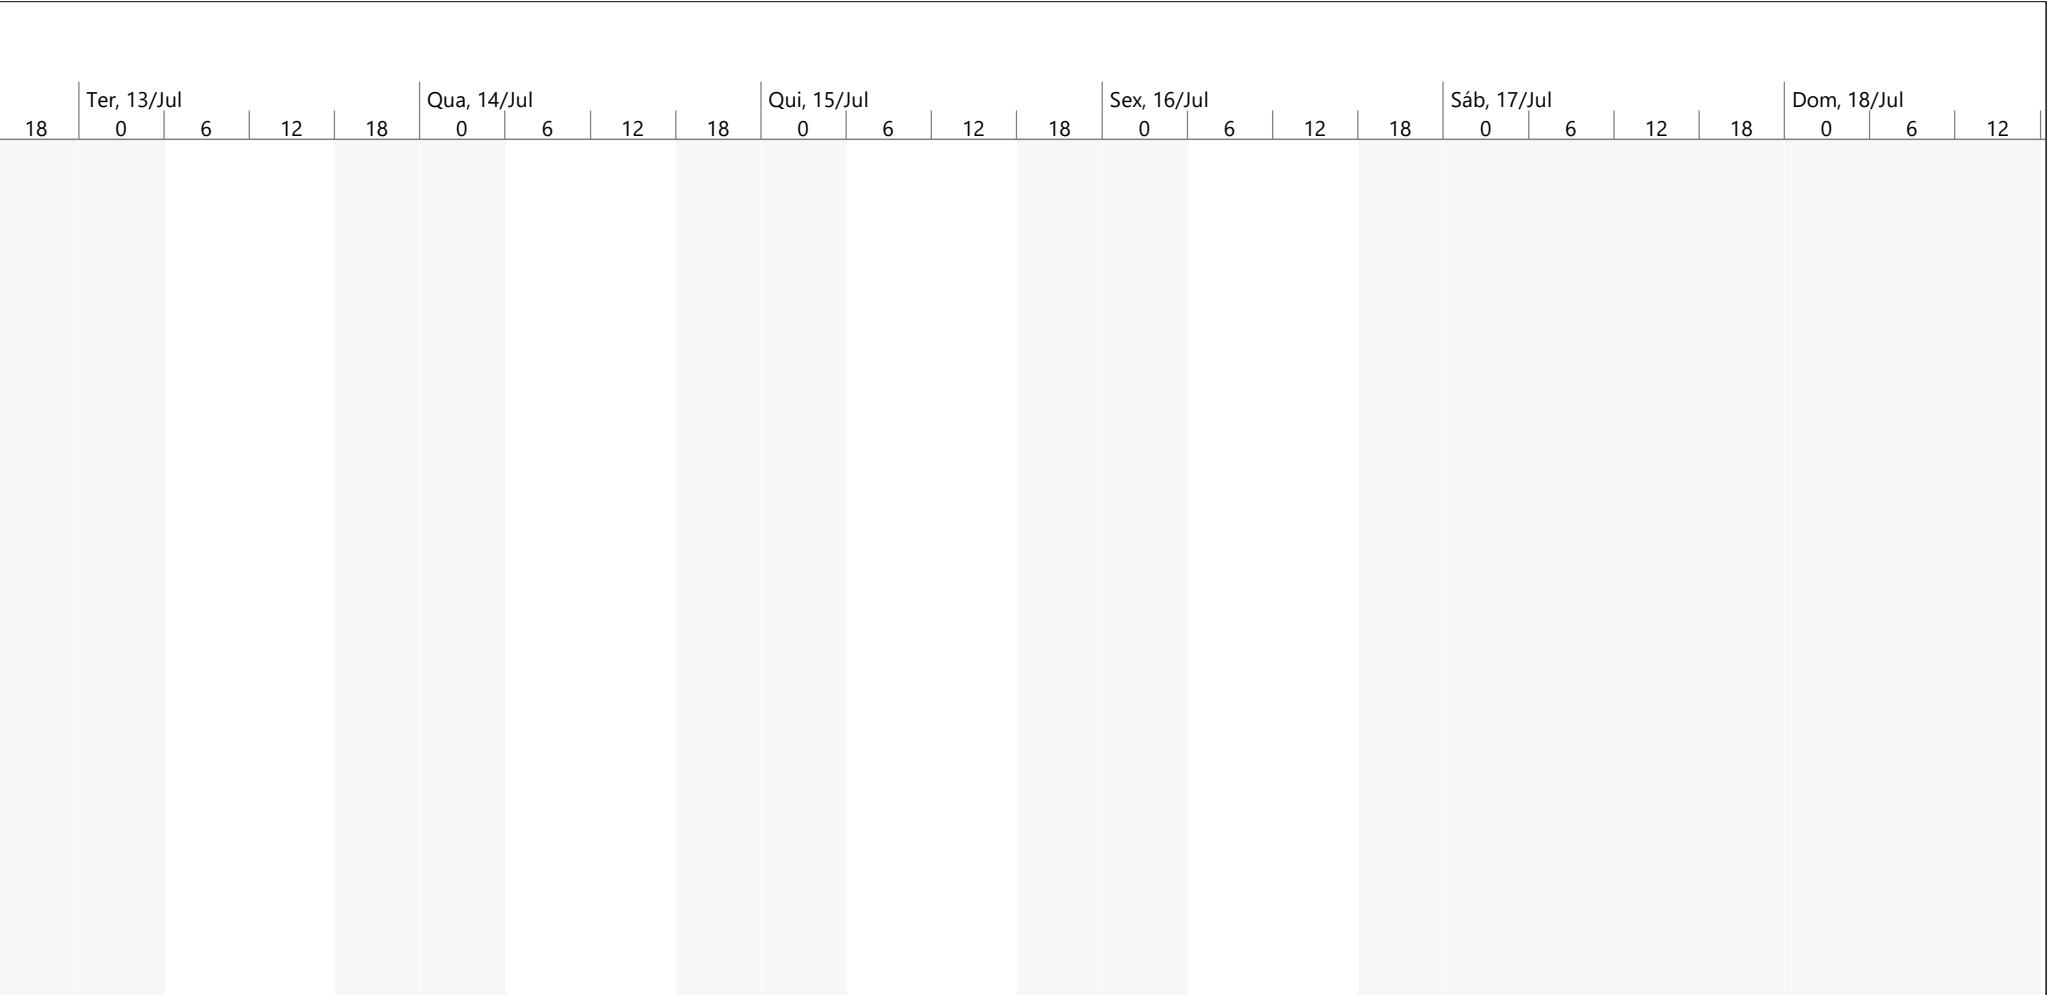

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

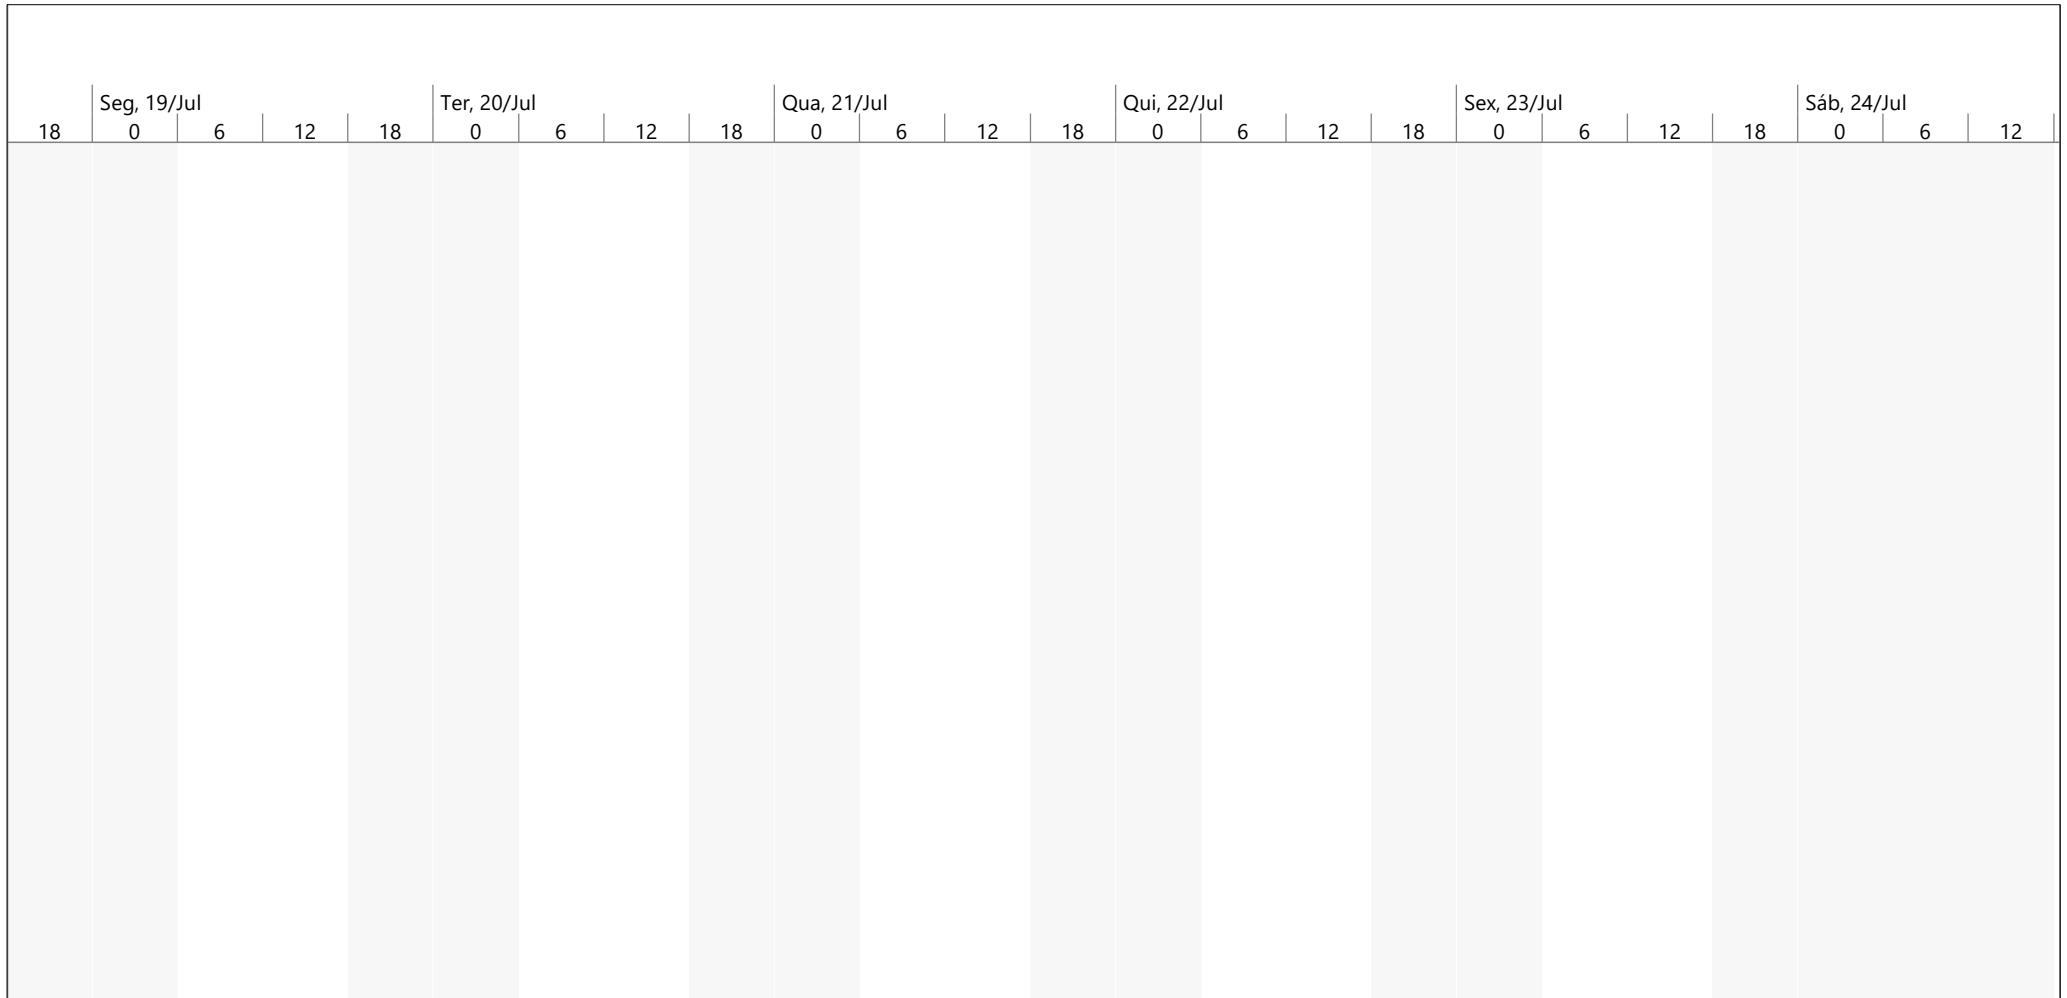


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

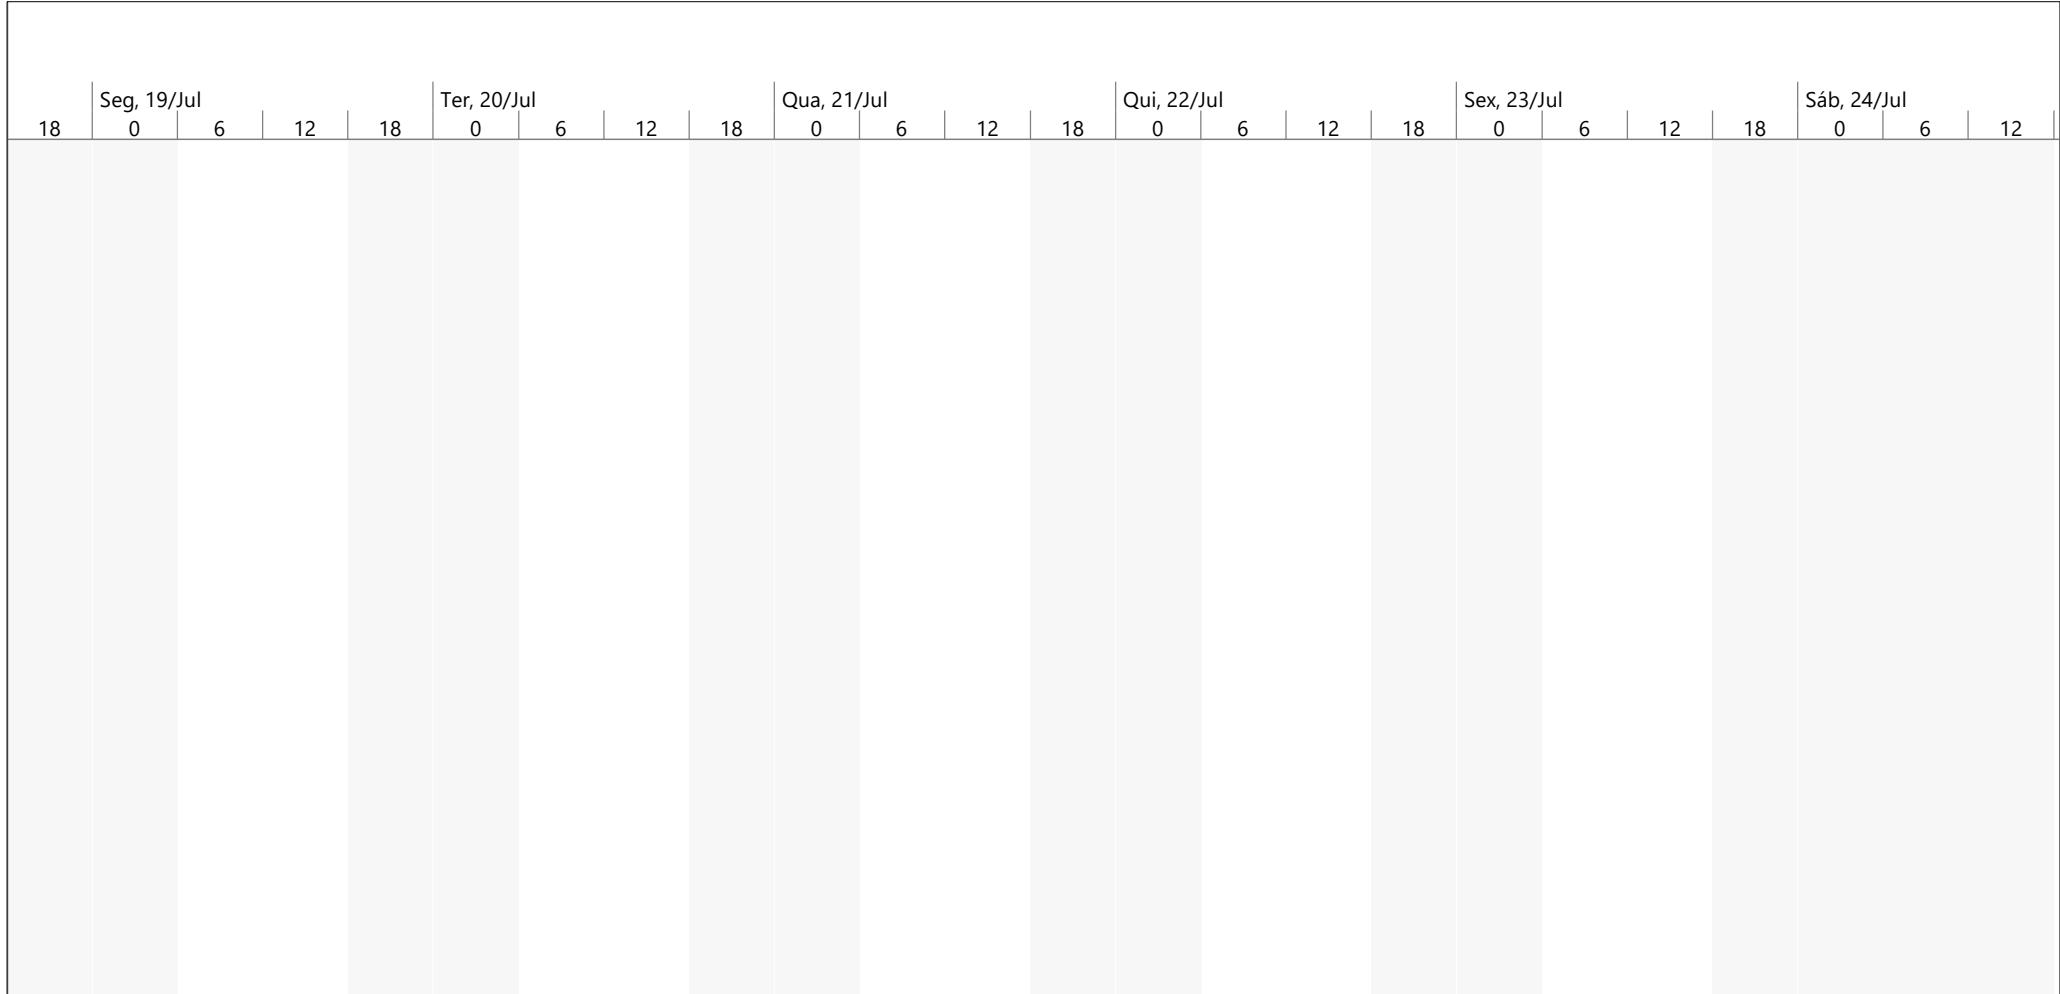


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

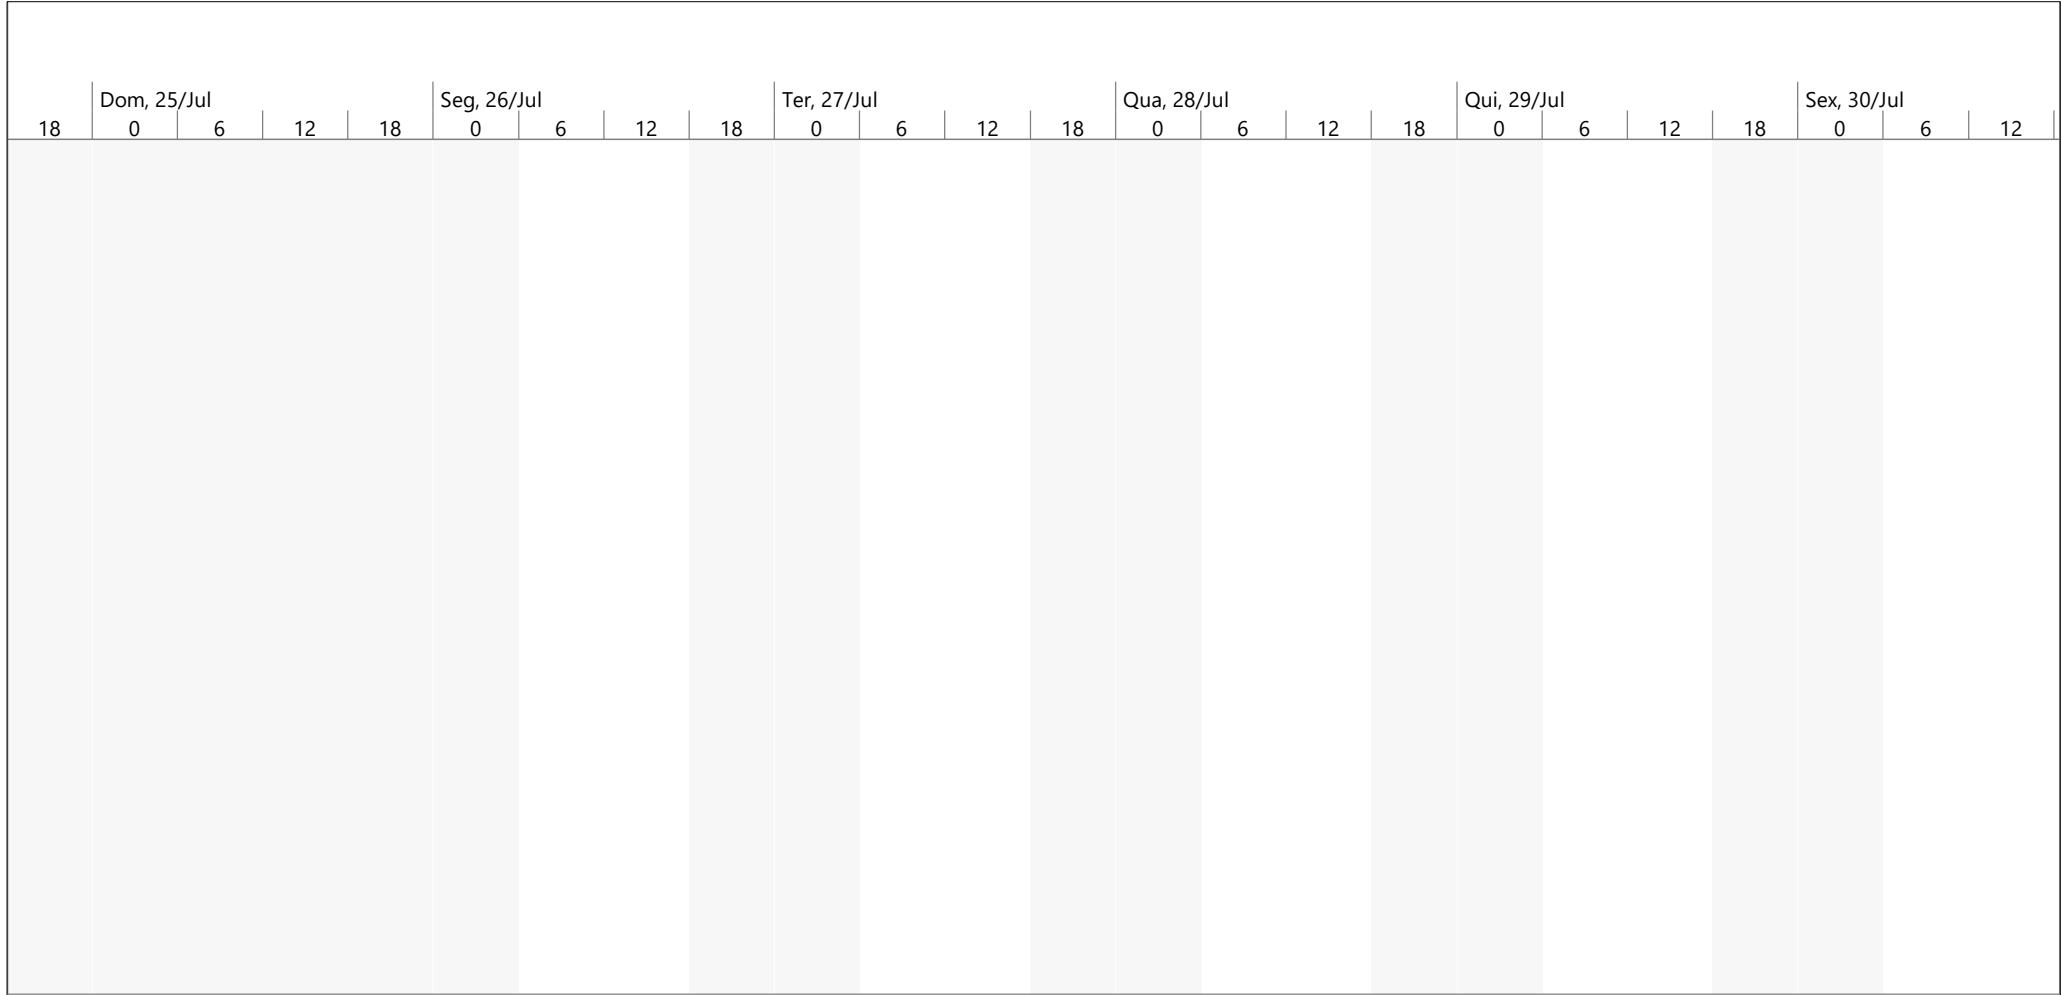


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

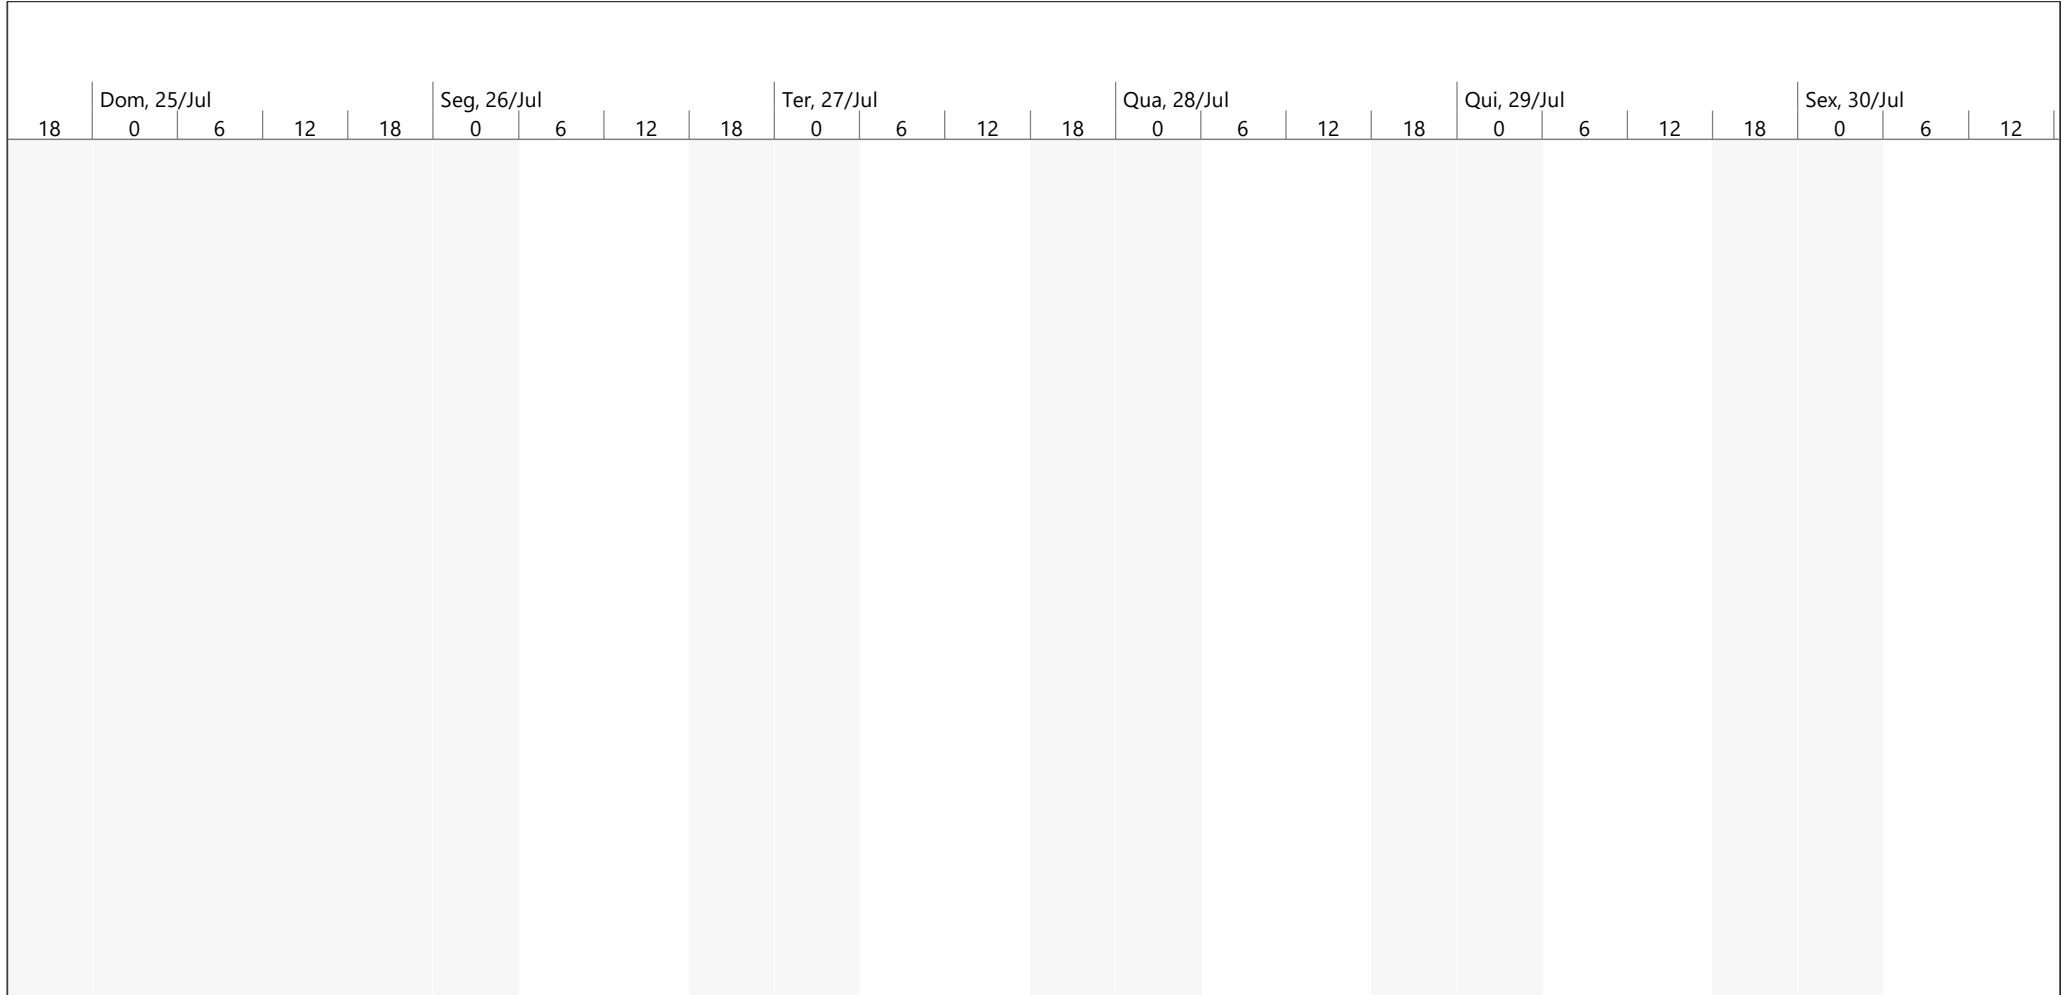


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

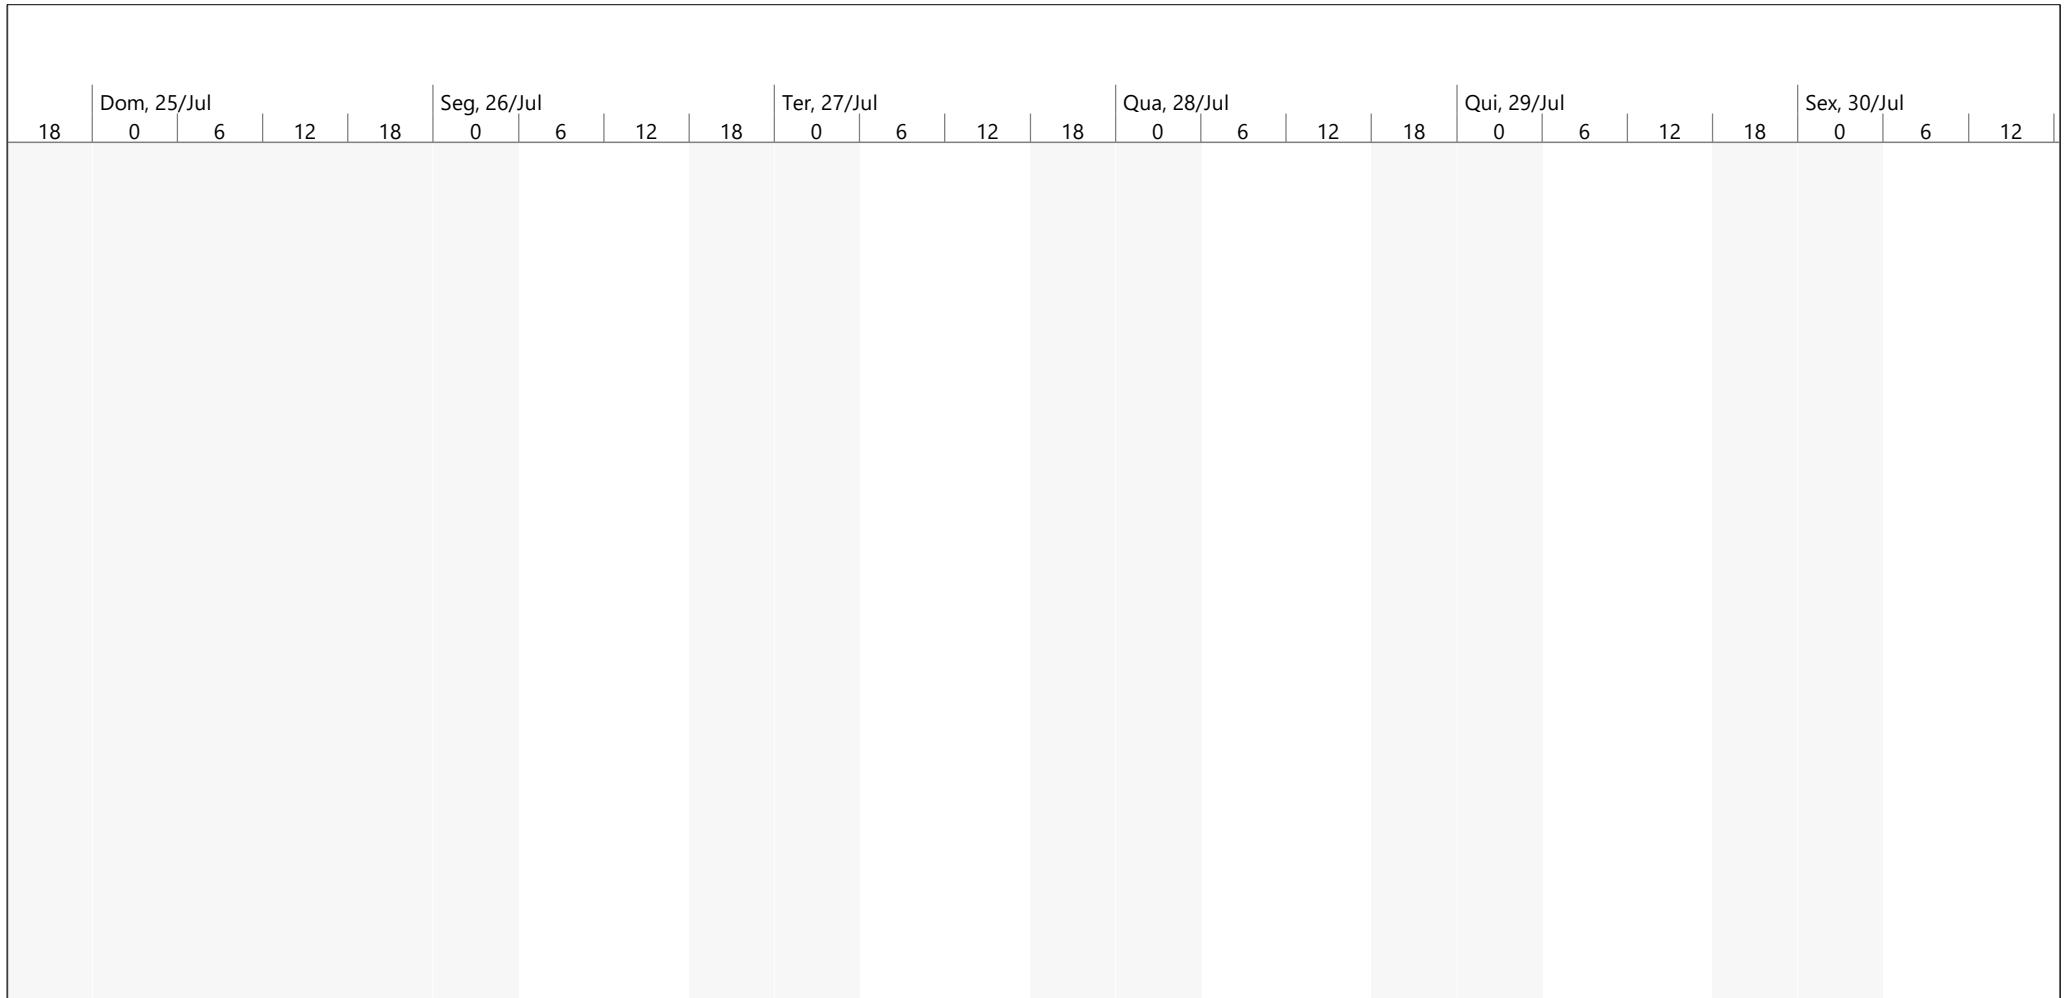


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

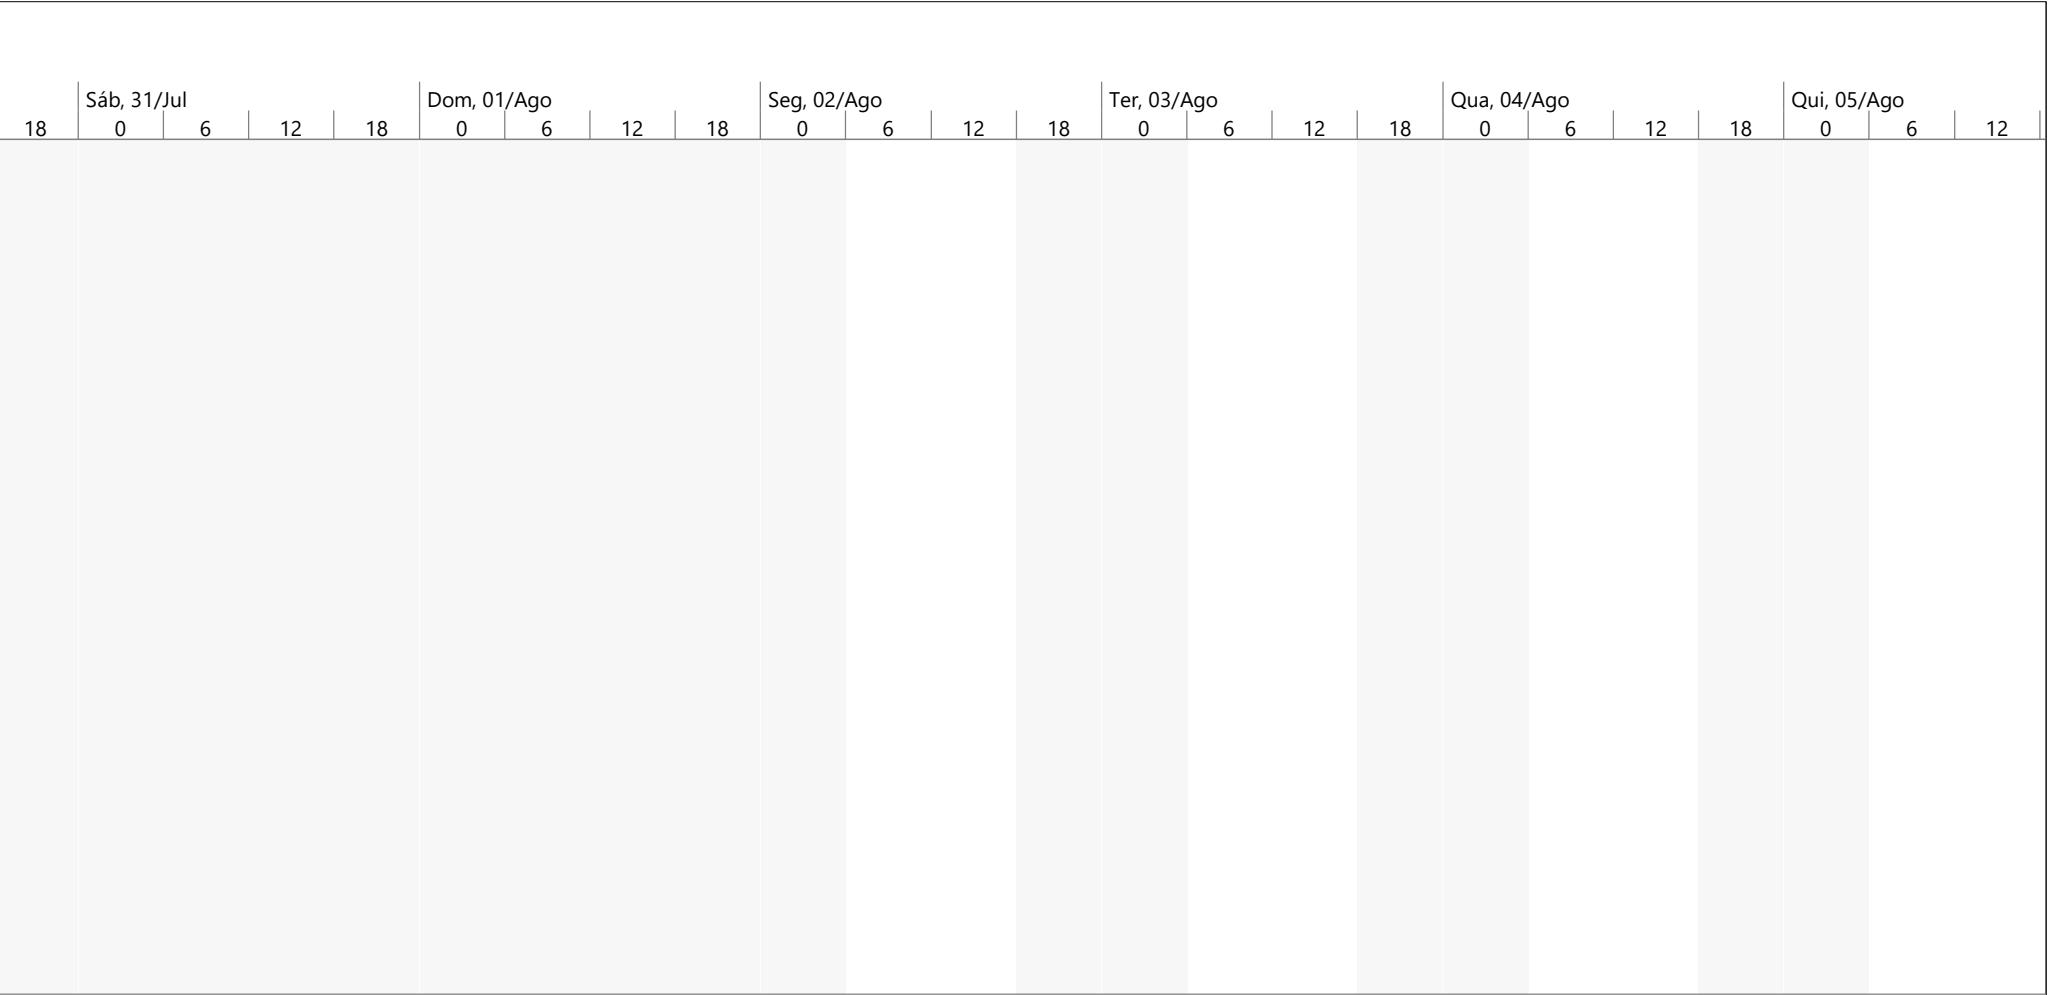


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

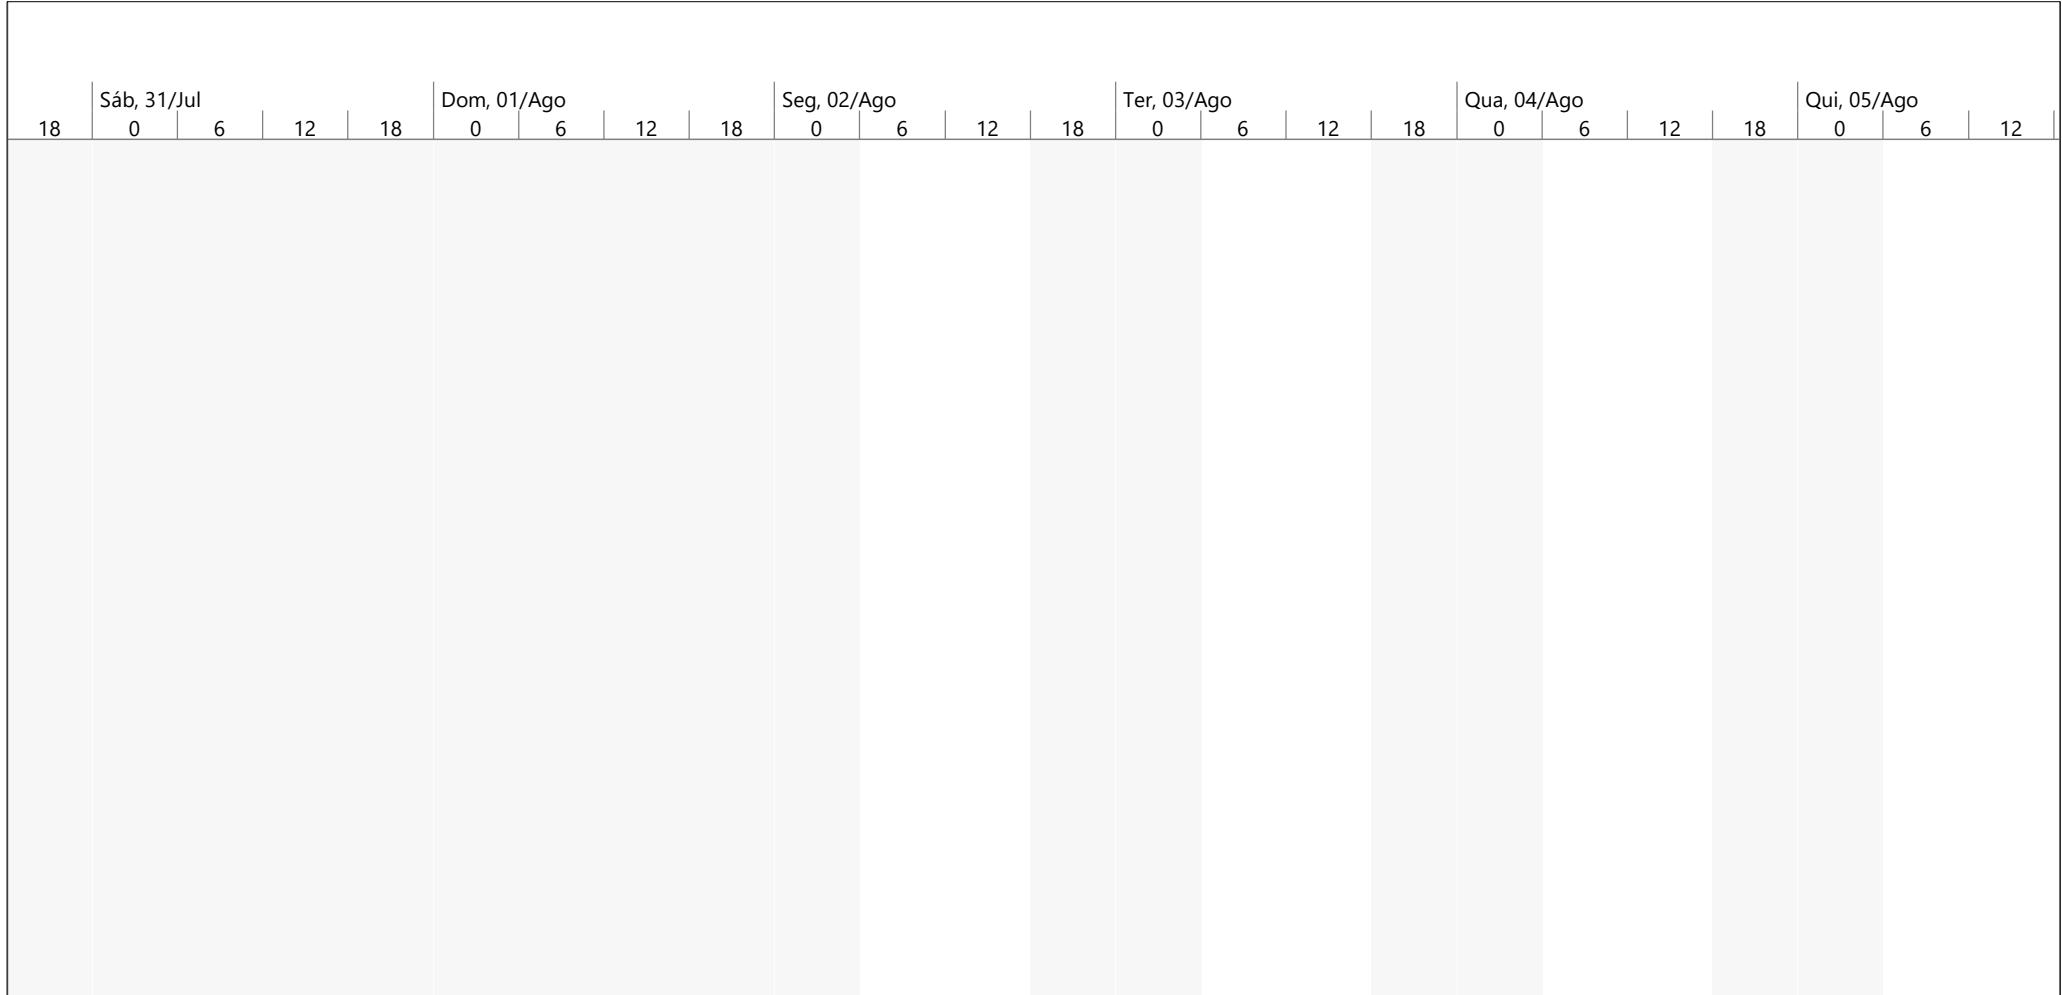

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

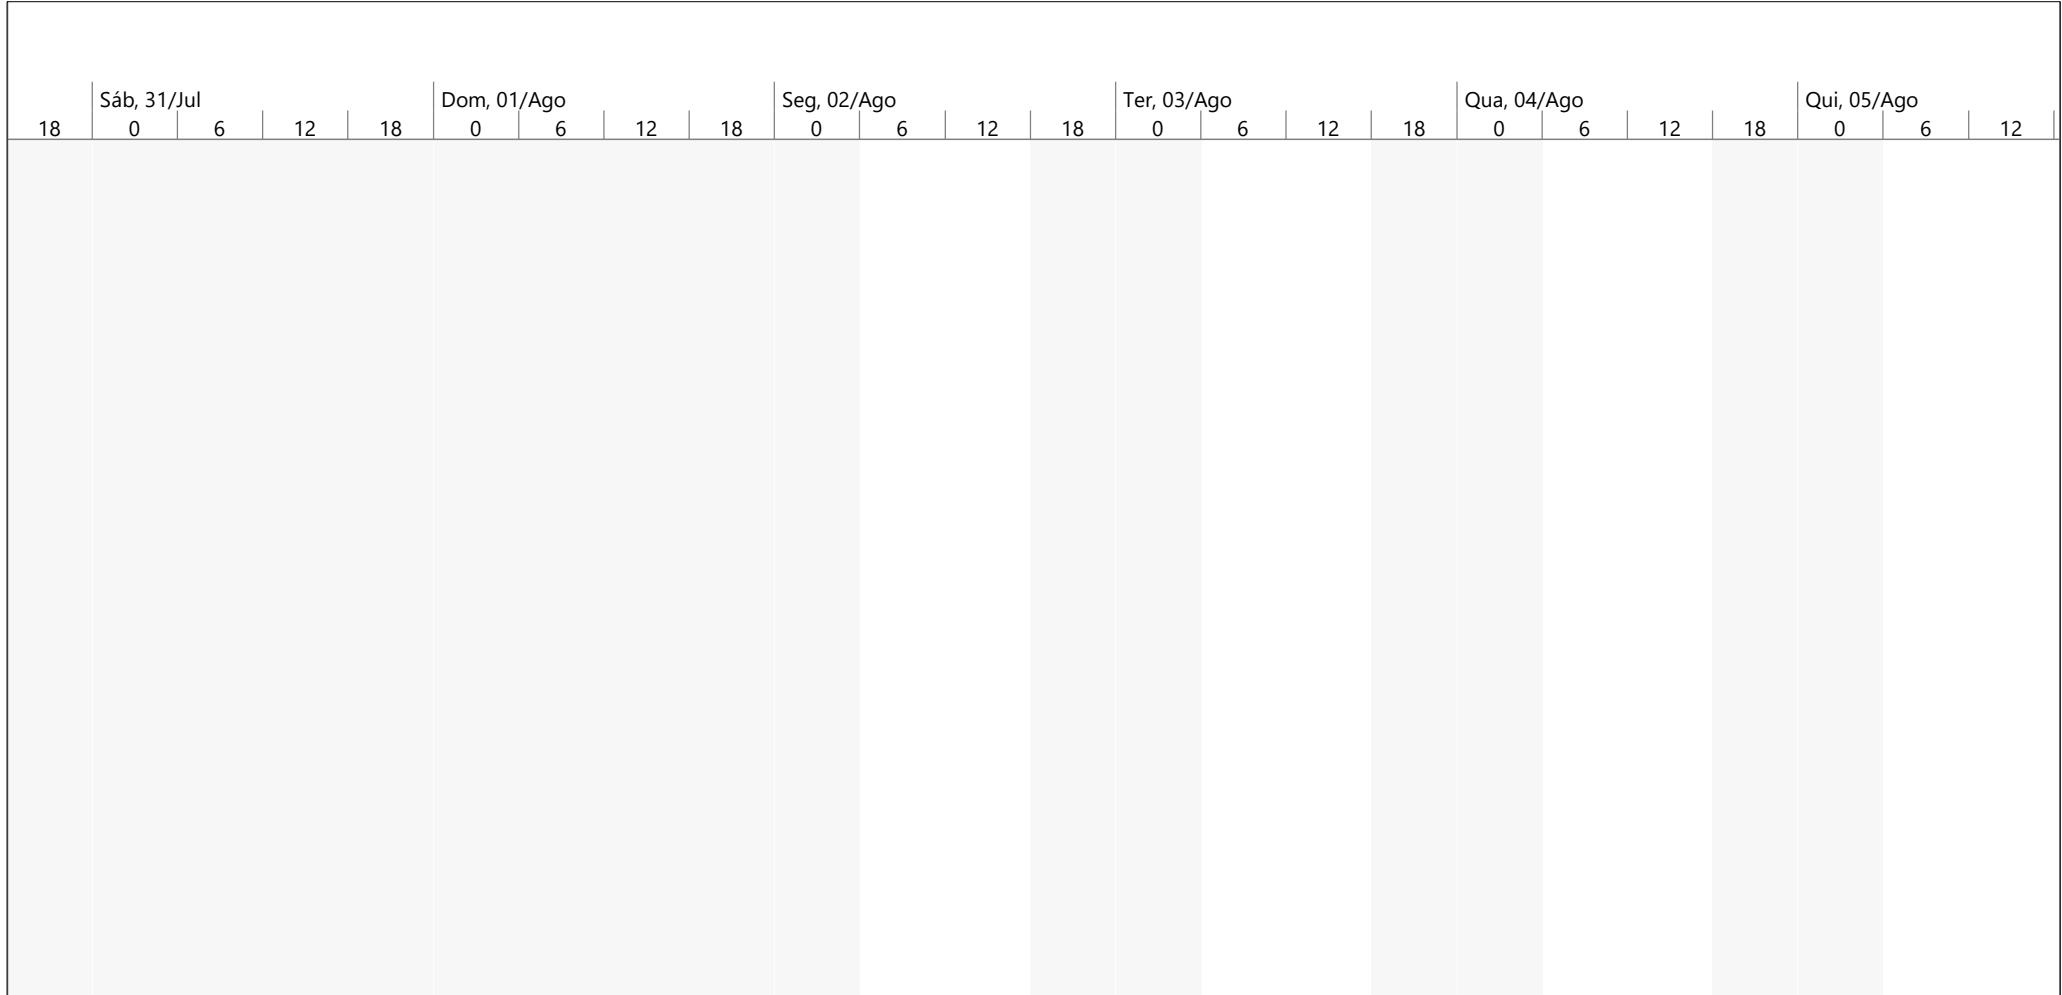


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	


Página 287



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

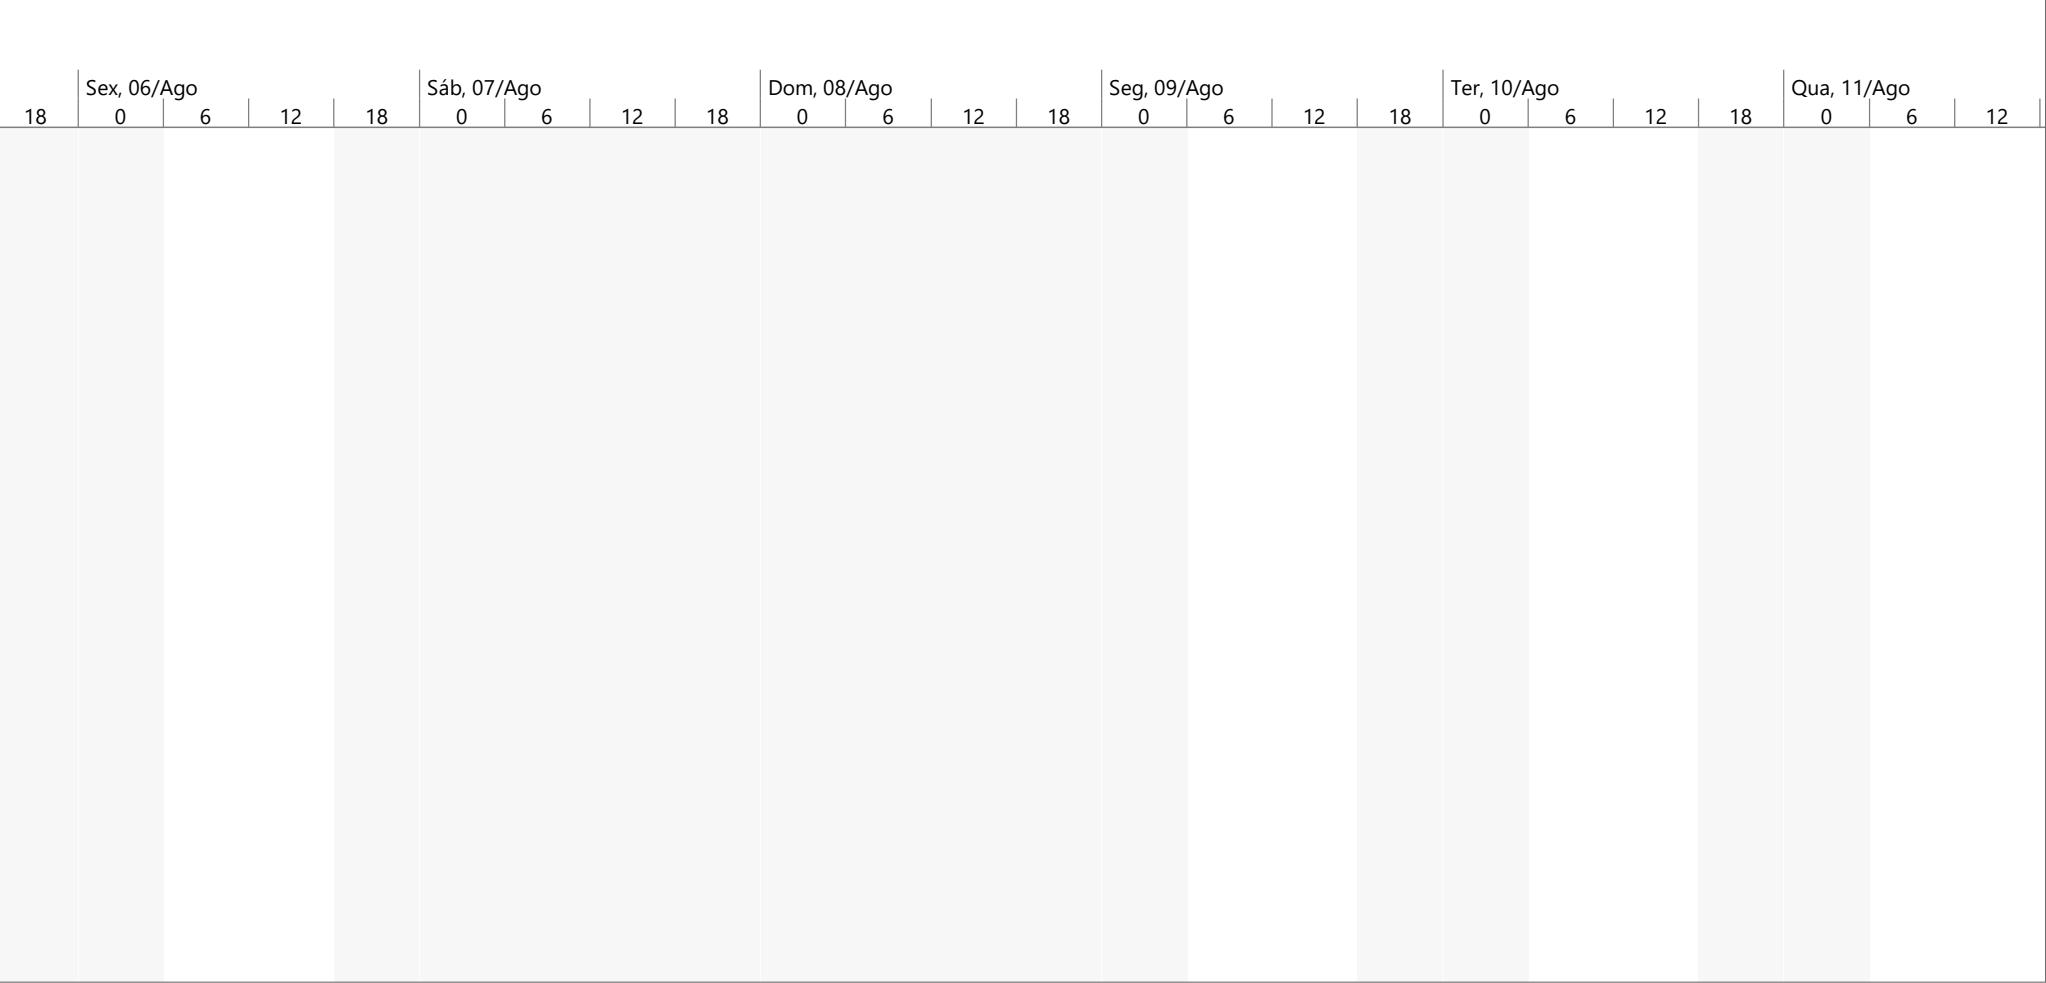

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

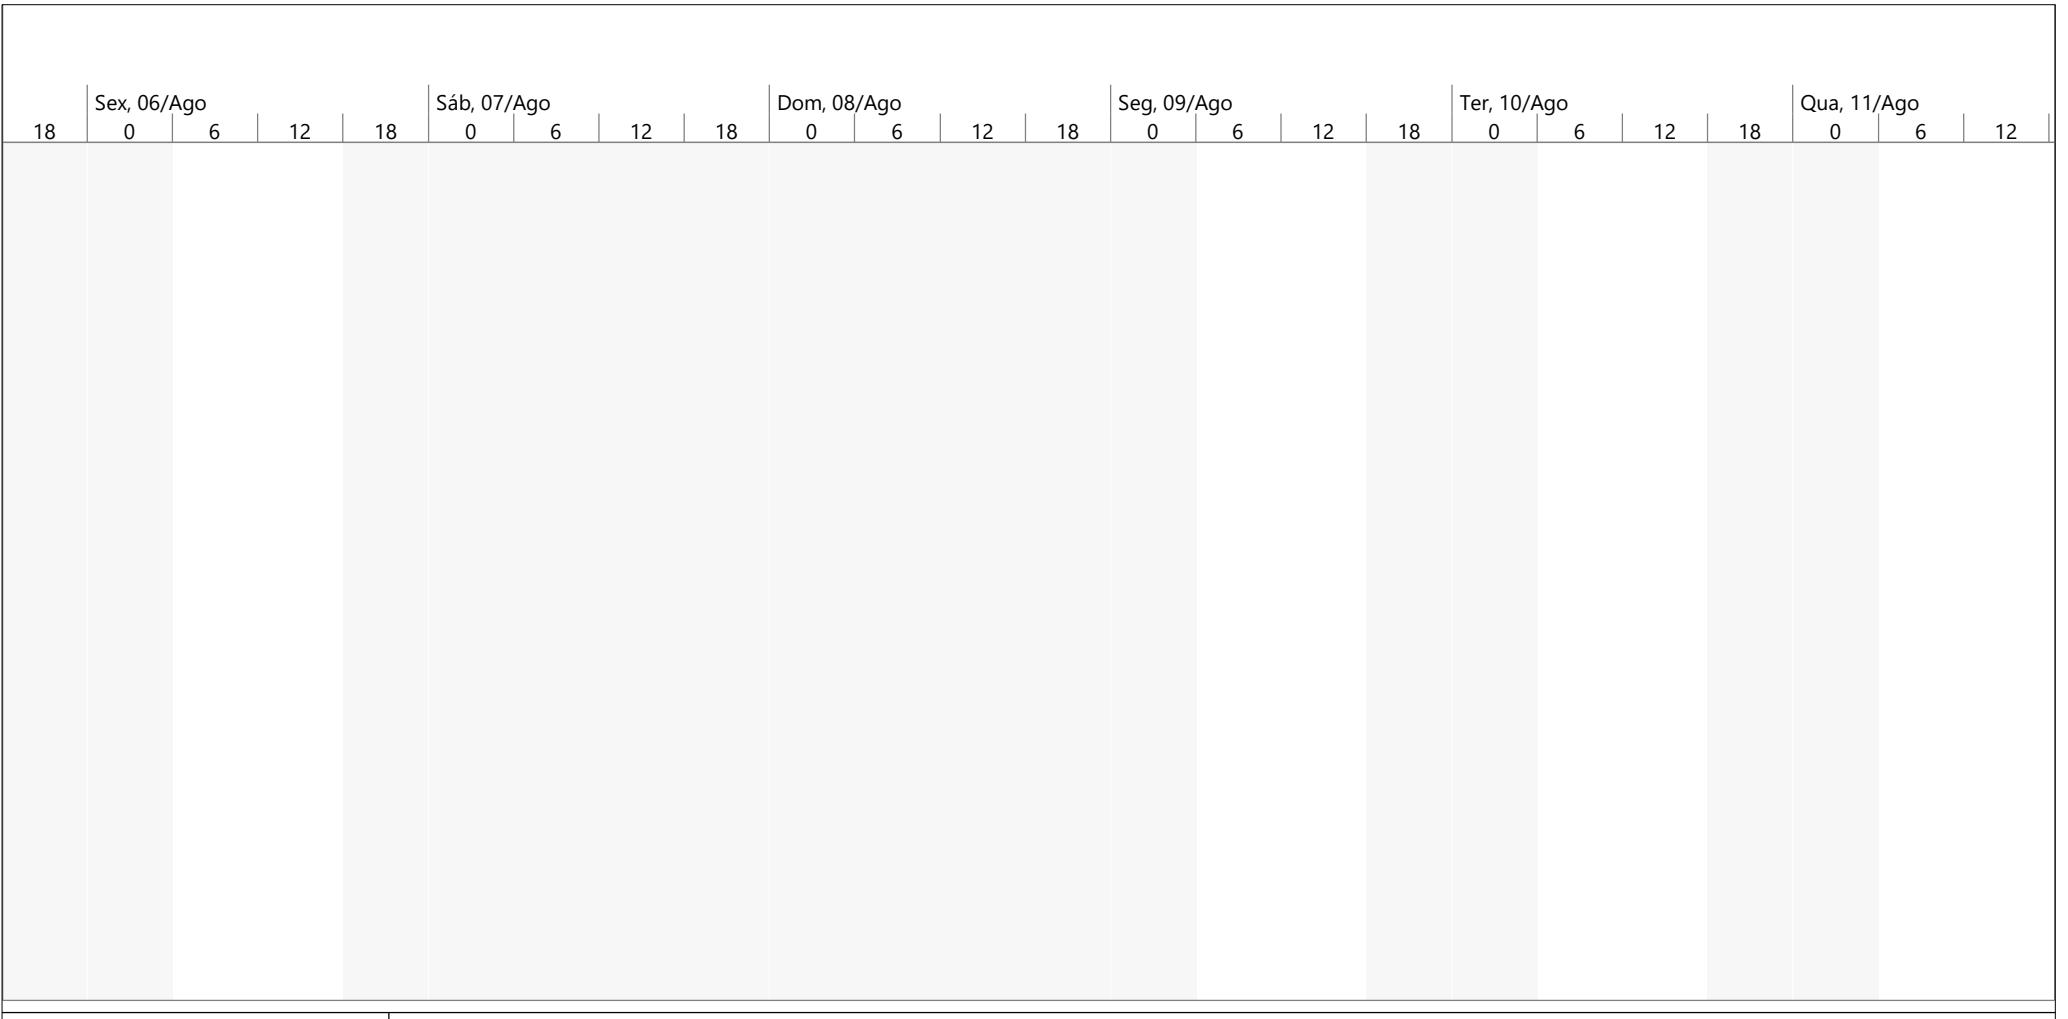


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		




Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

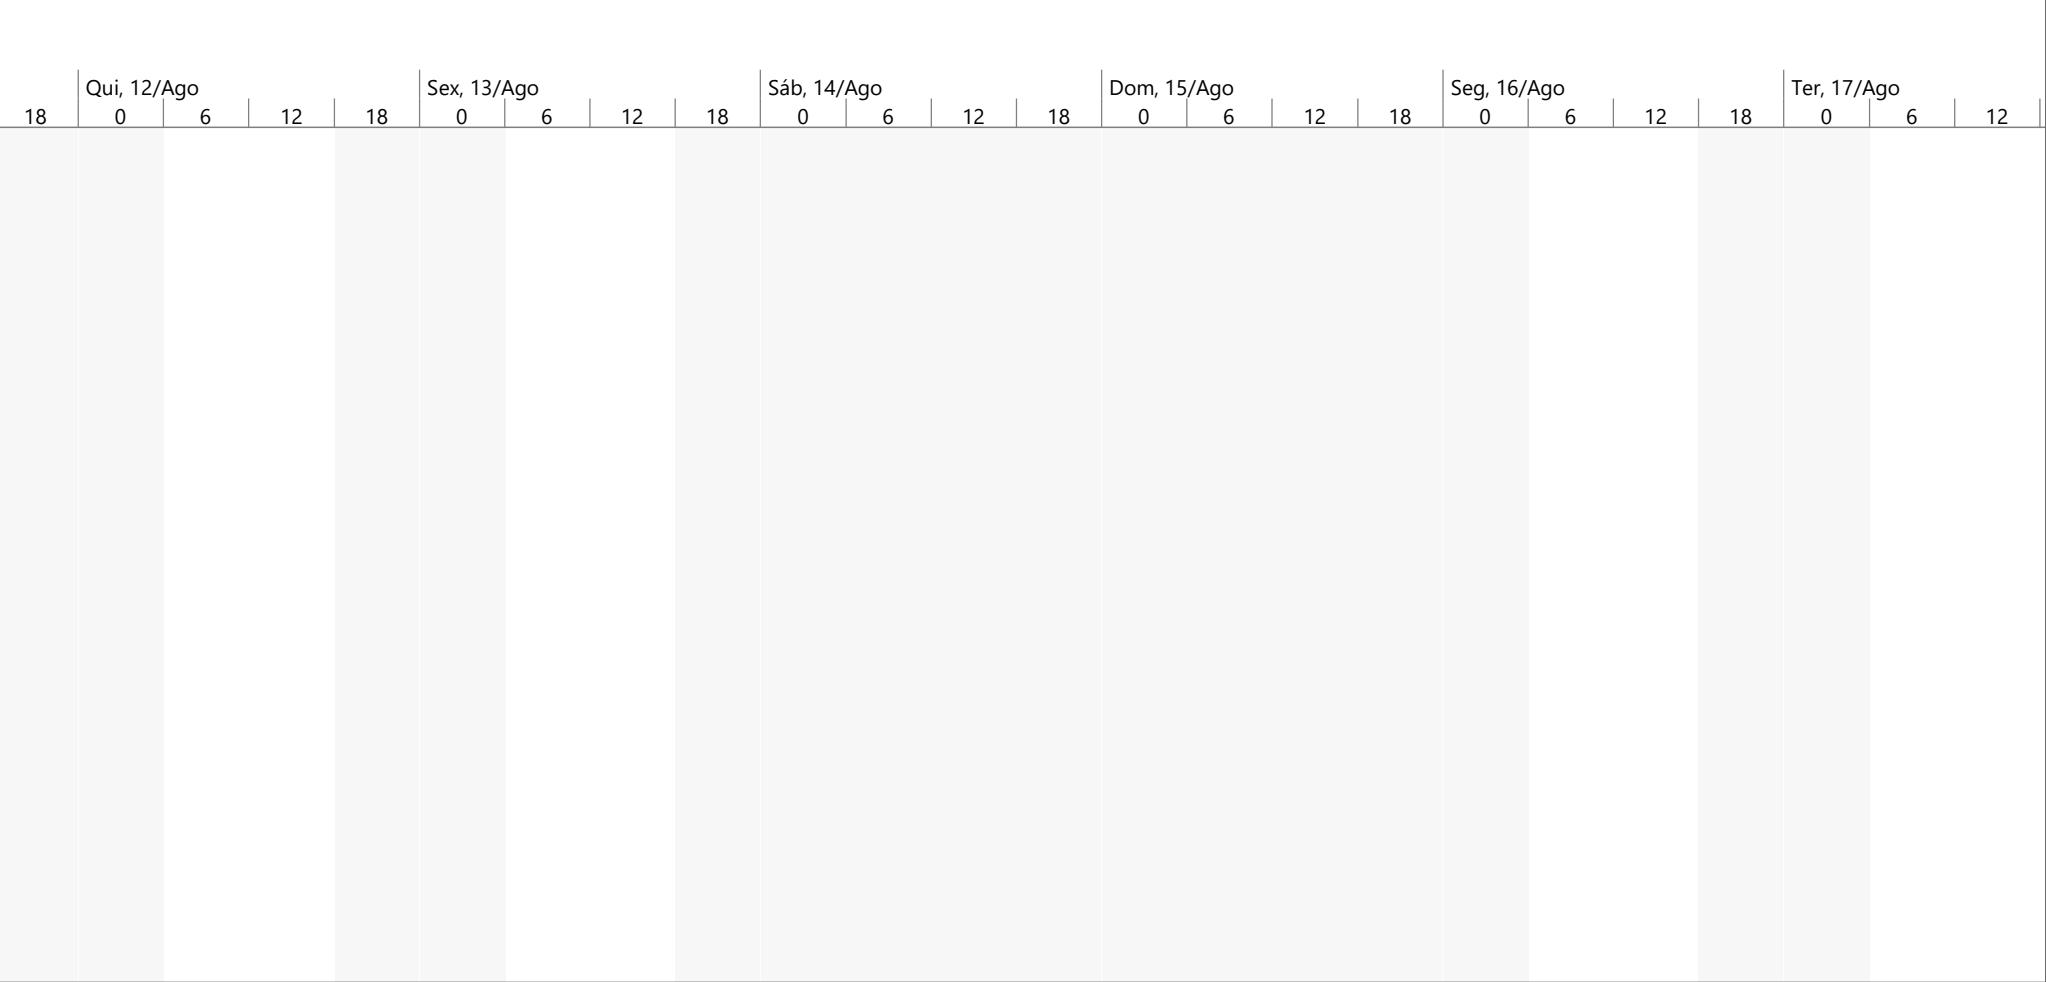


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

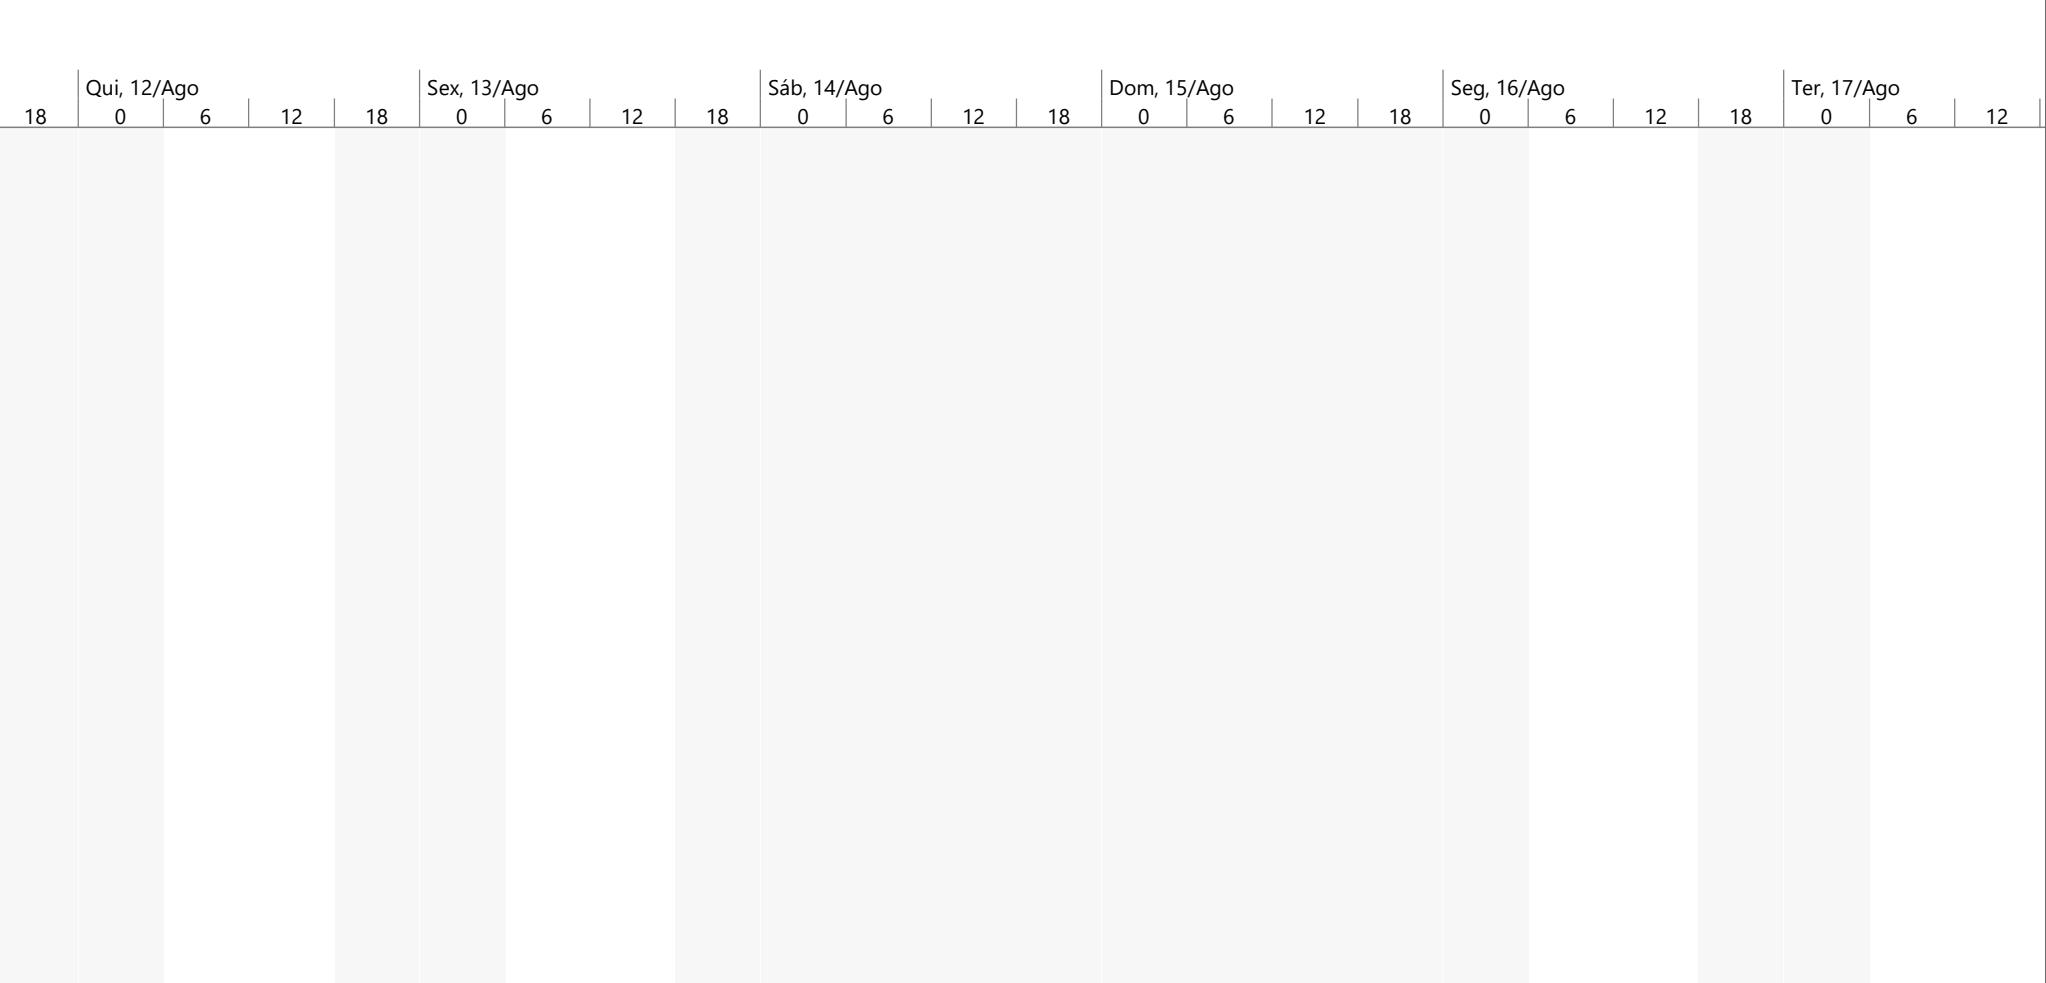


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

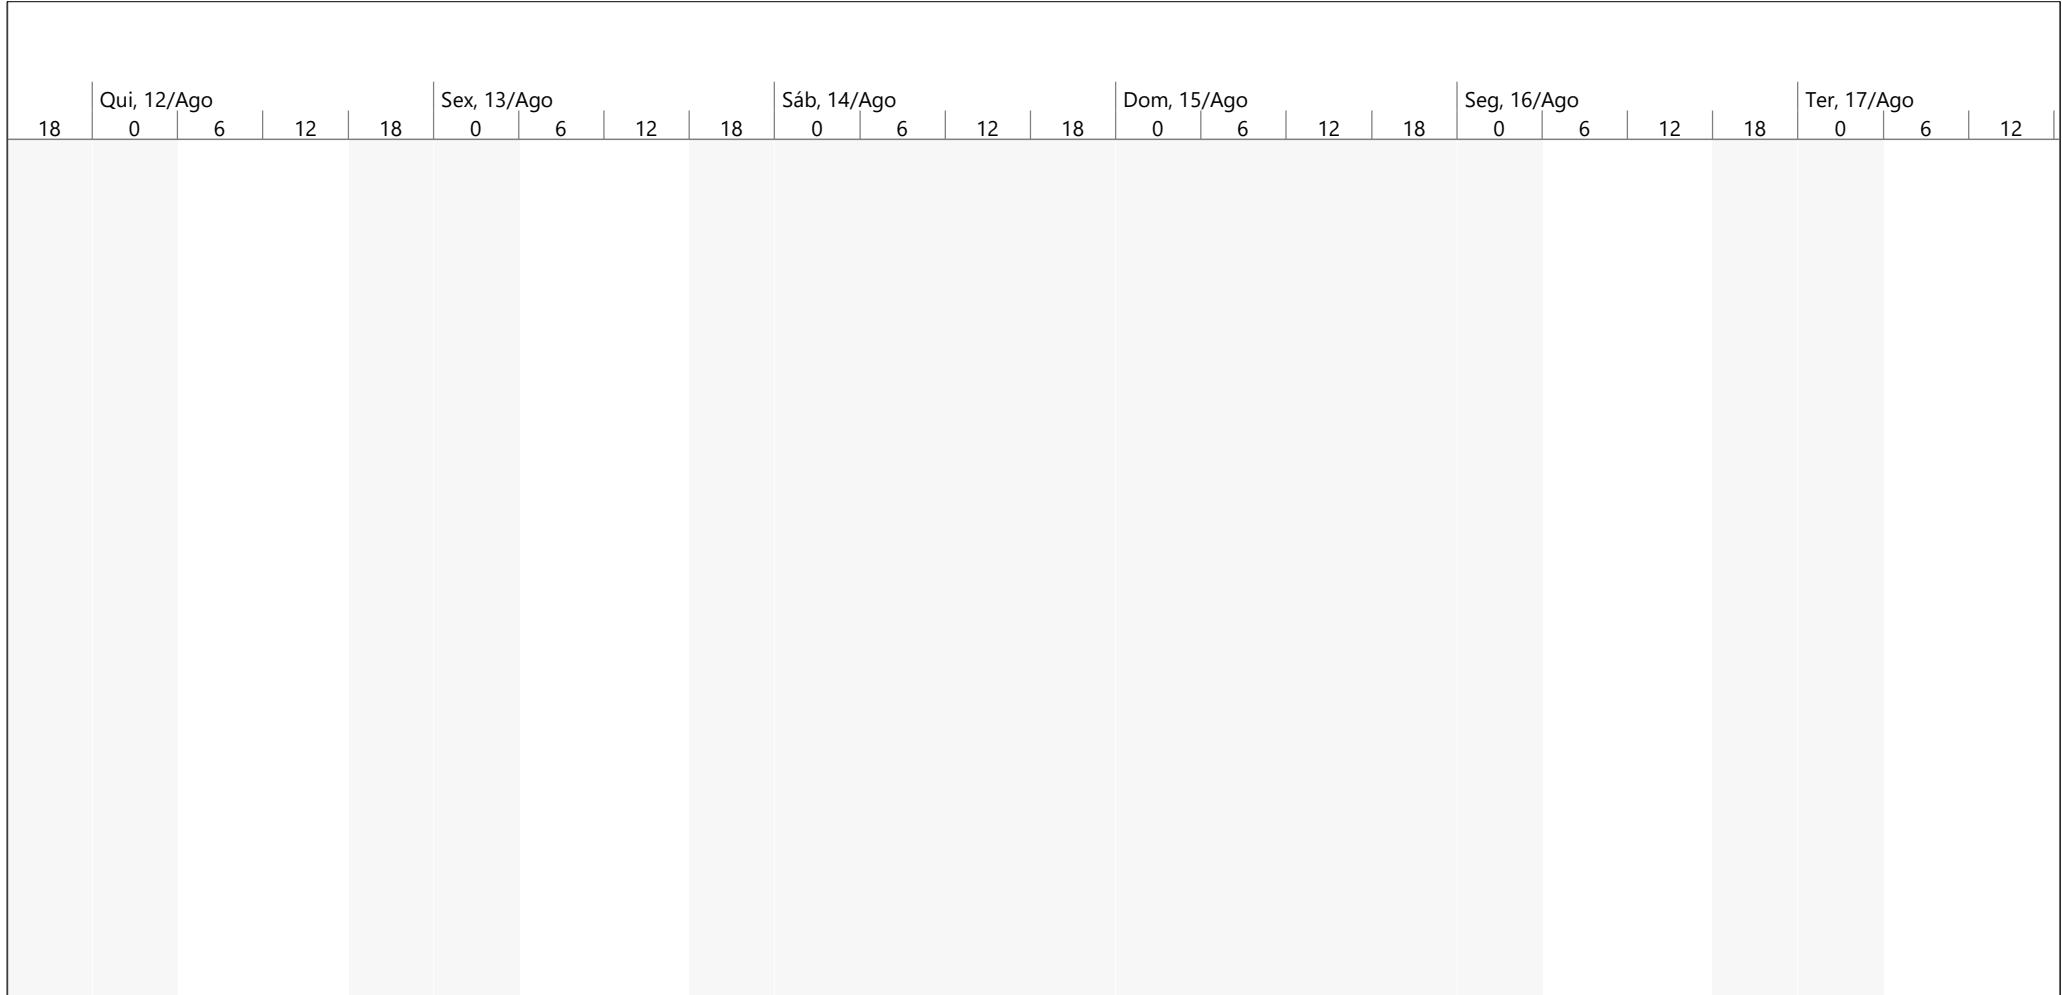

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

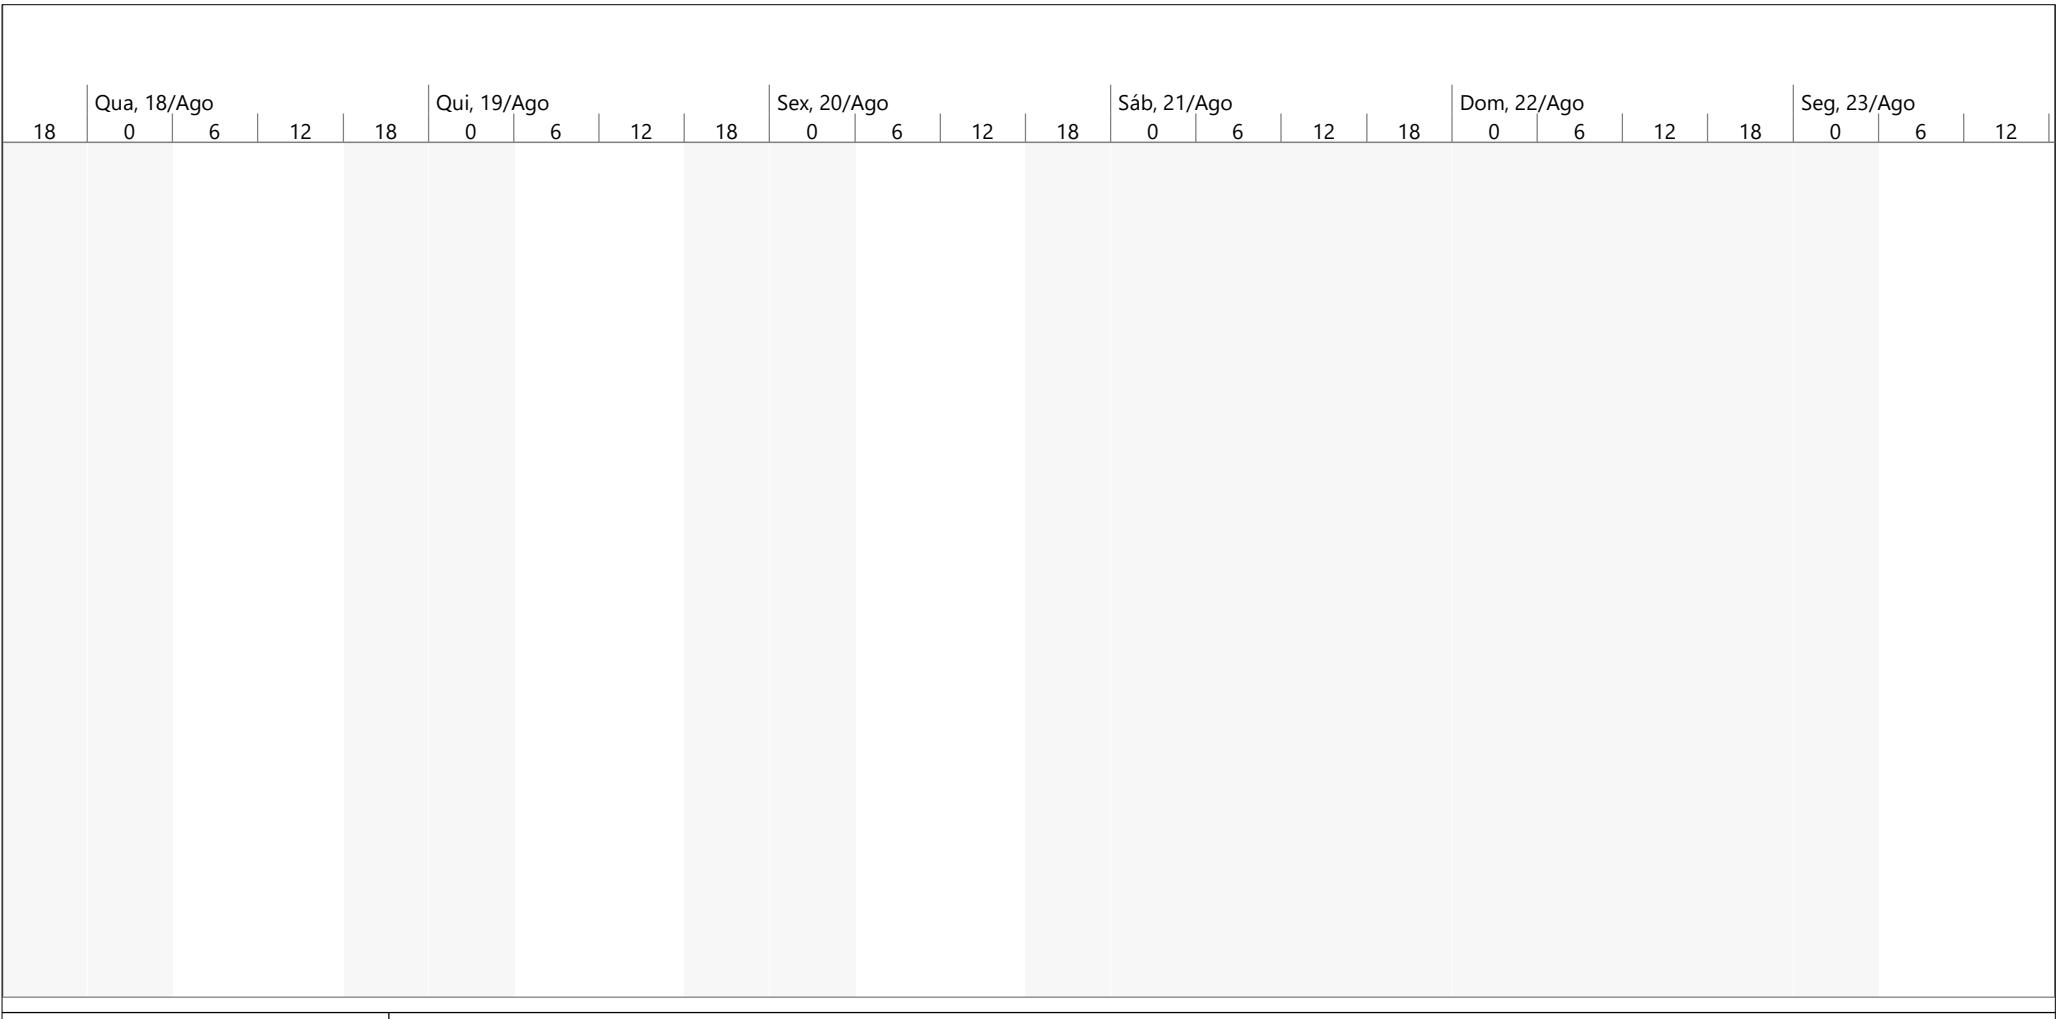


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

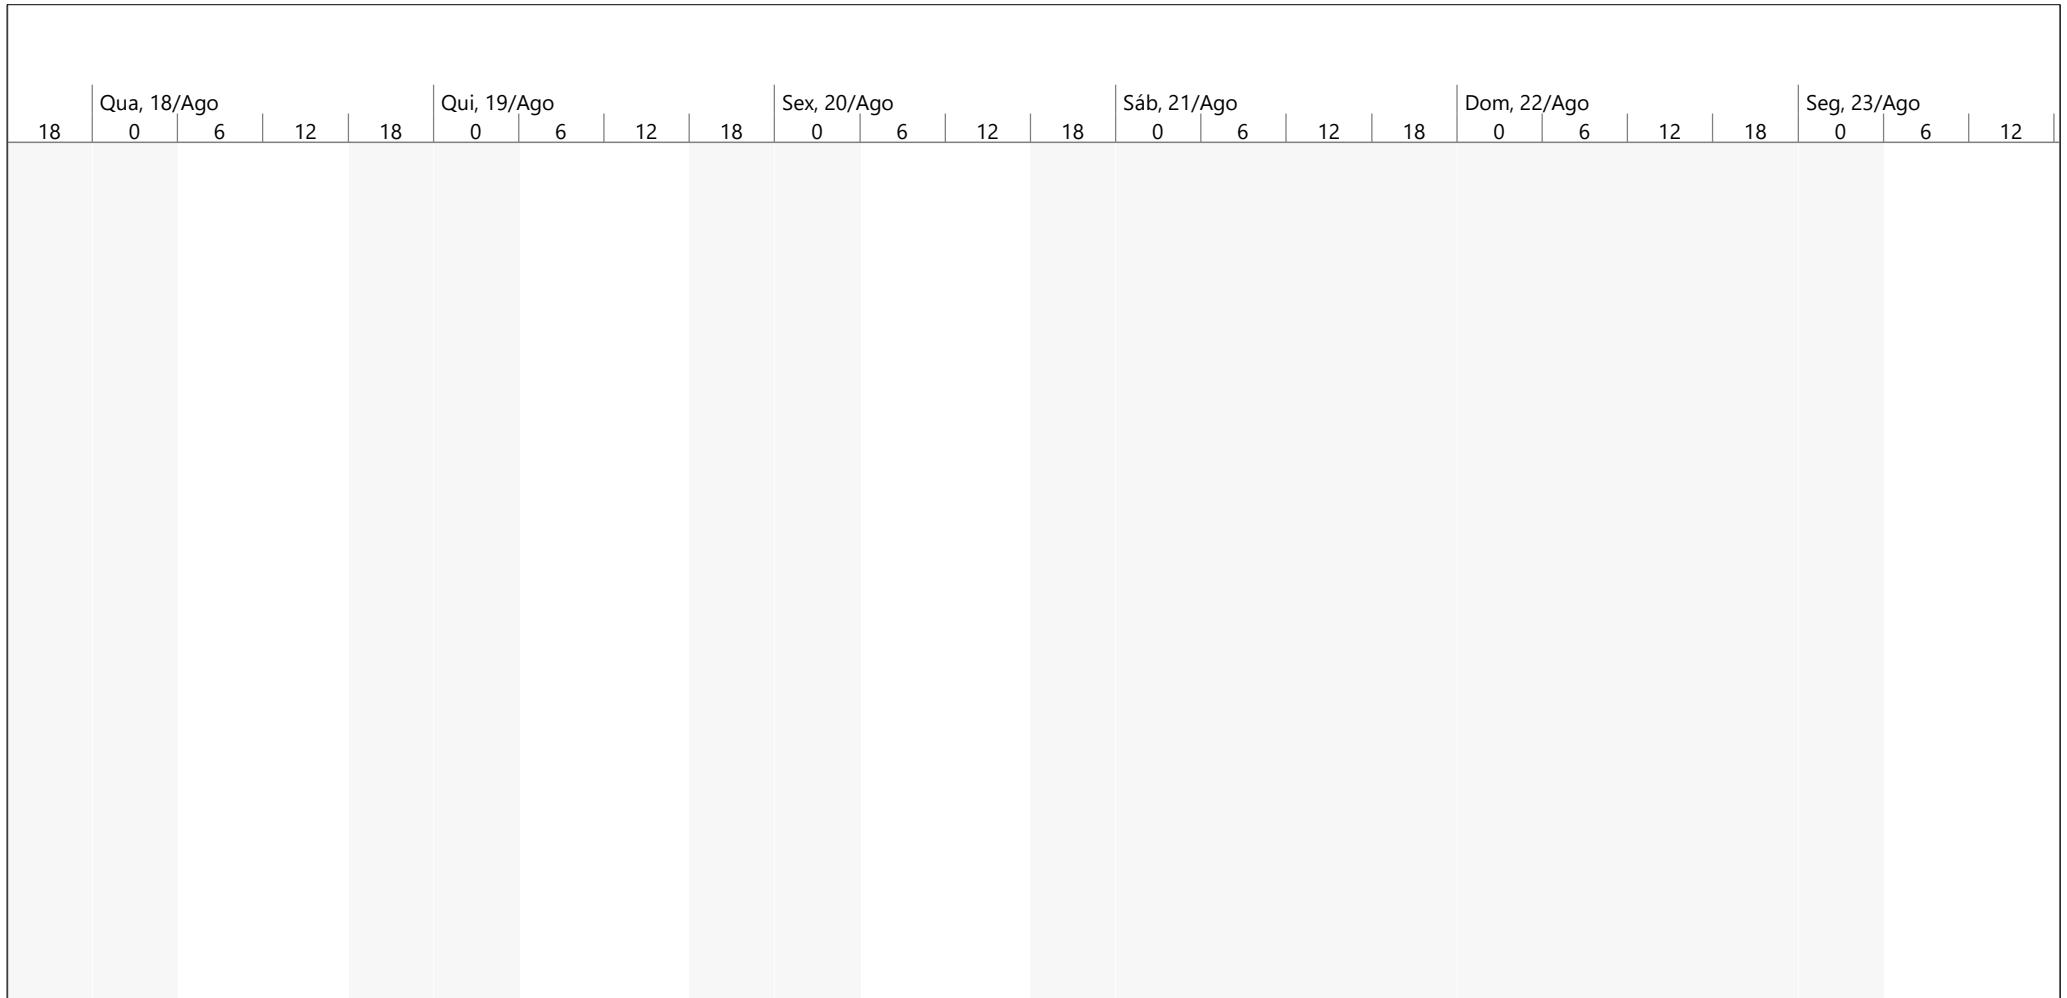

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

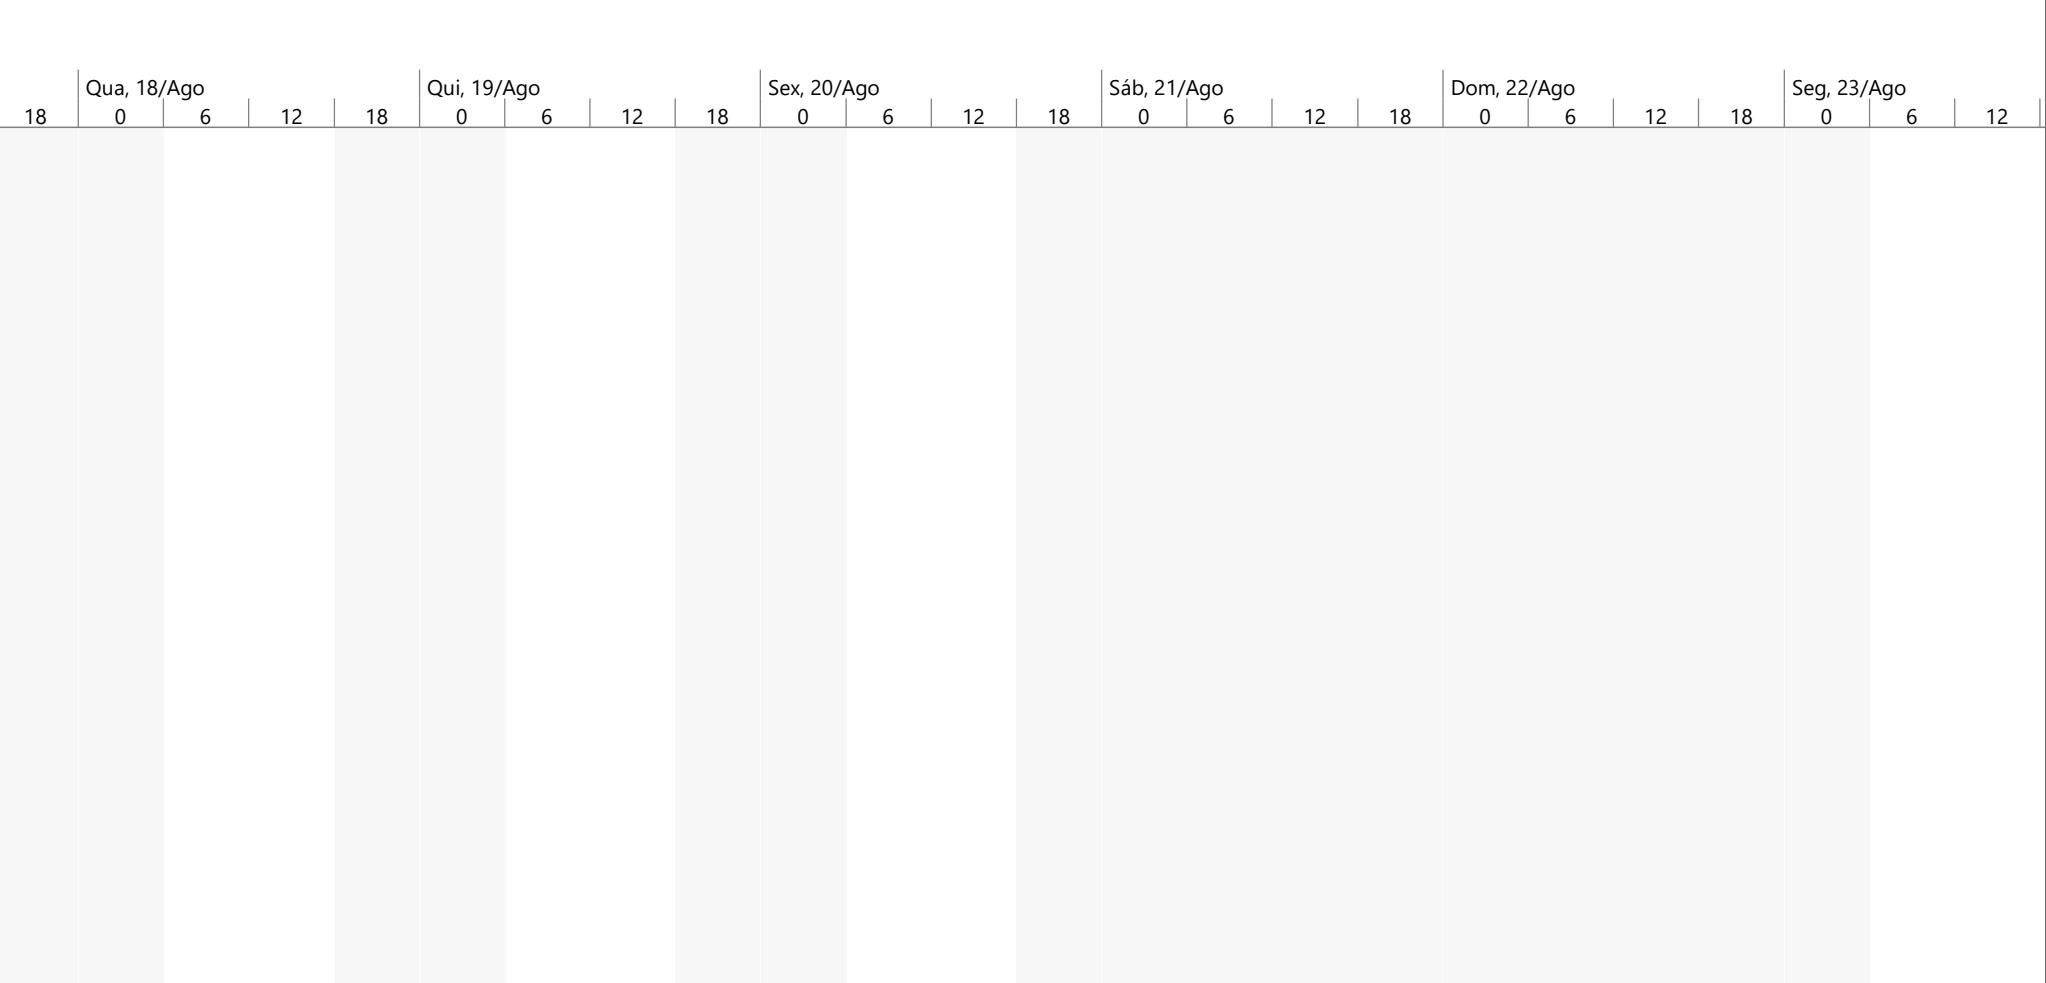

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

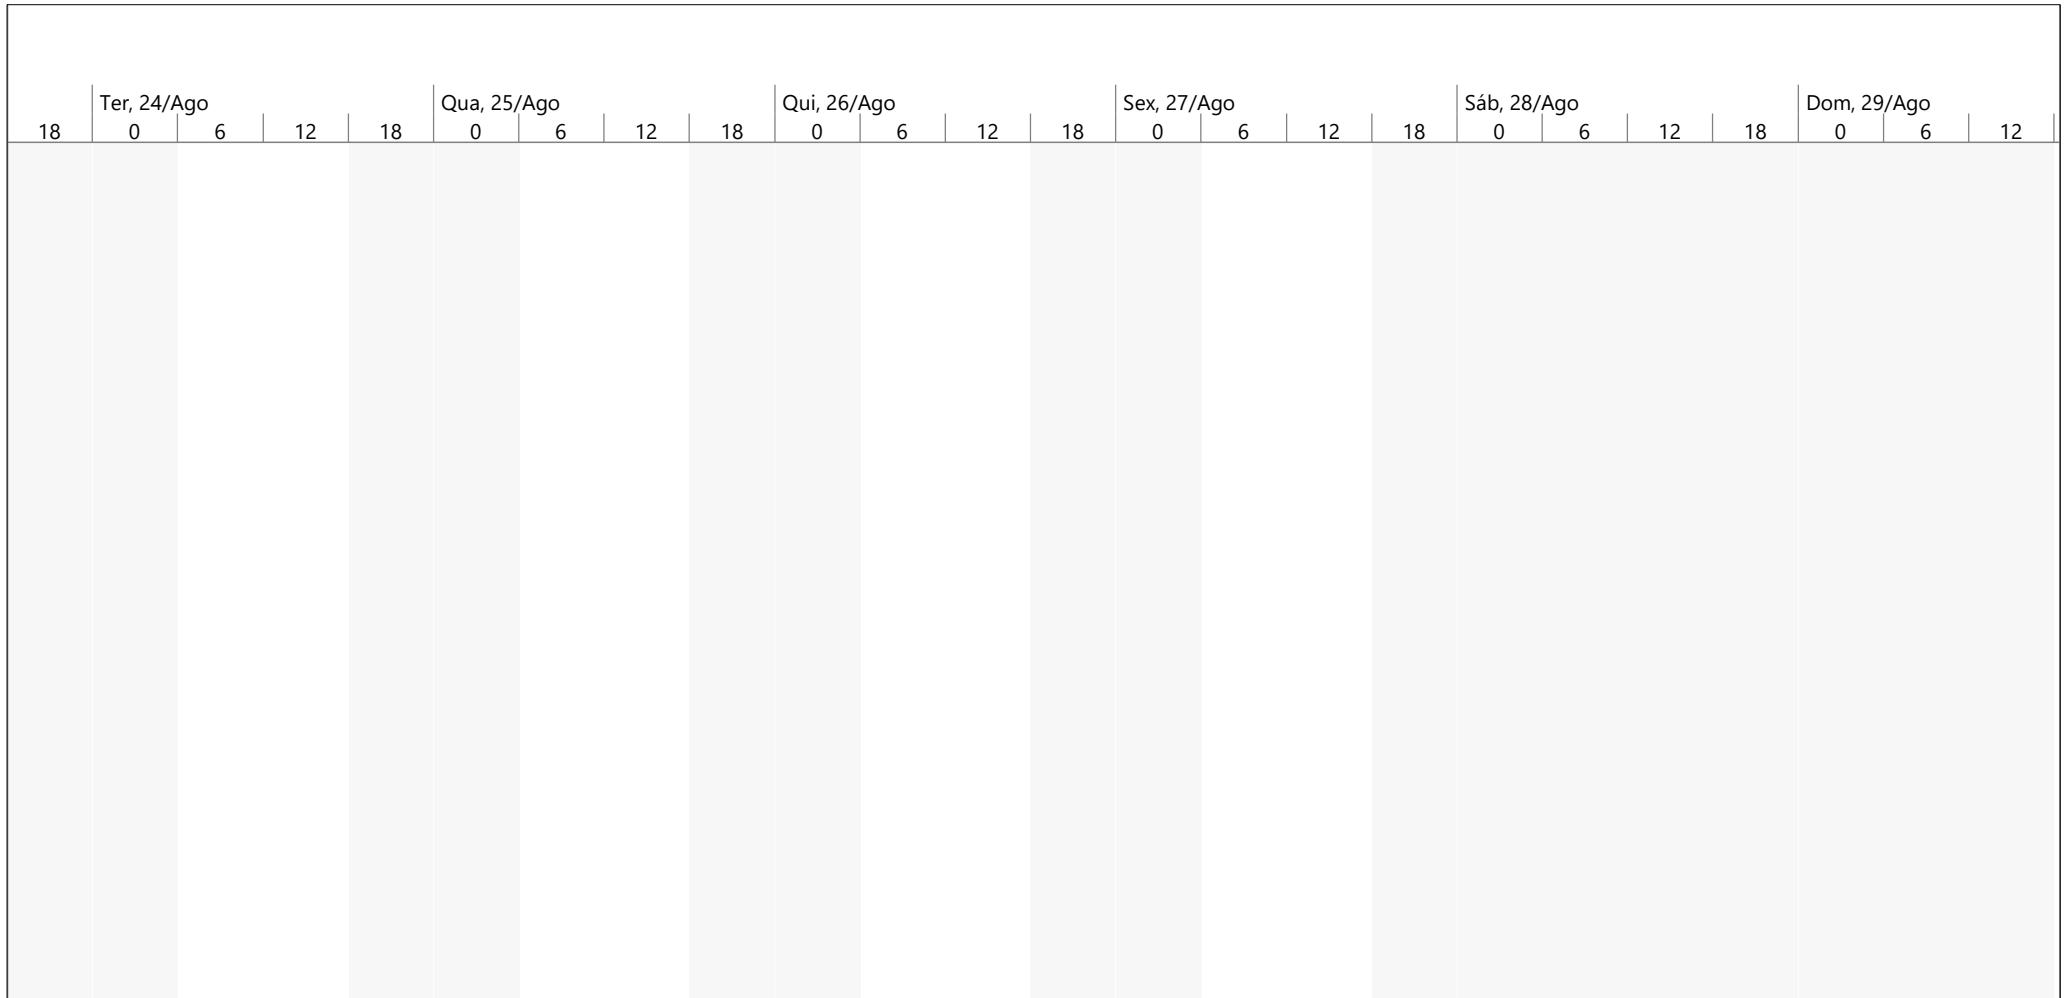


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

18	Seg, 30/Ago	0	6	12	18	Ter, 31/Ago	0	6	12	18	Qua, 01/Set	0	6	12	18	Qui, 02/Set	0	6	12	18	Sex, 03/Set	0	6	12	18	Sáb, 04/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22






Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

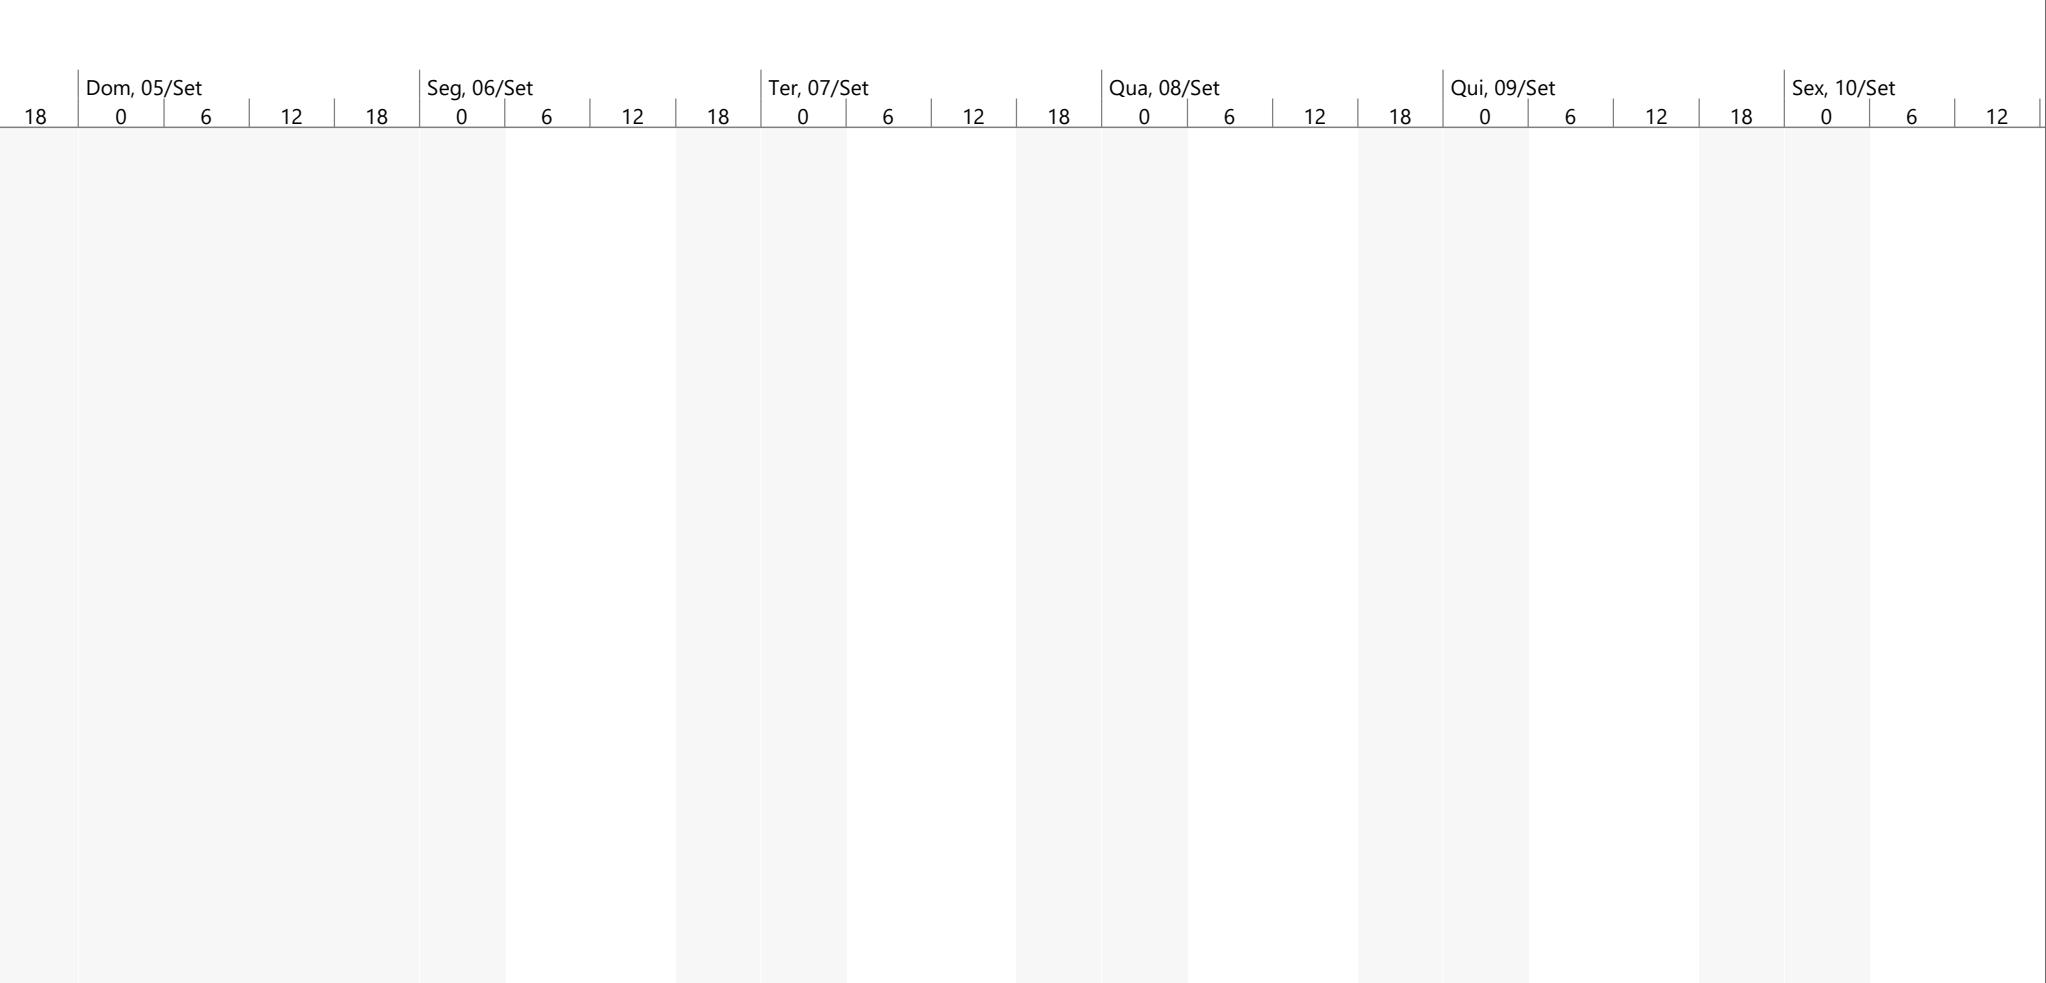

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

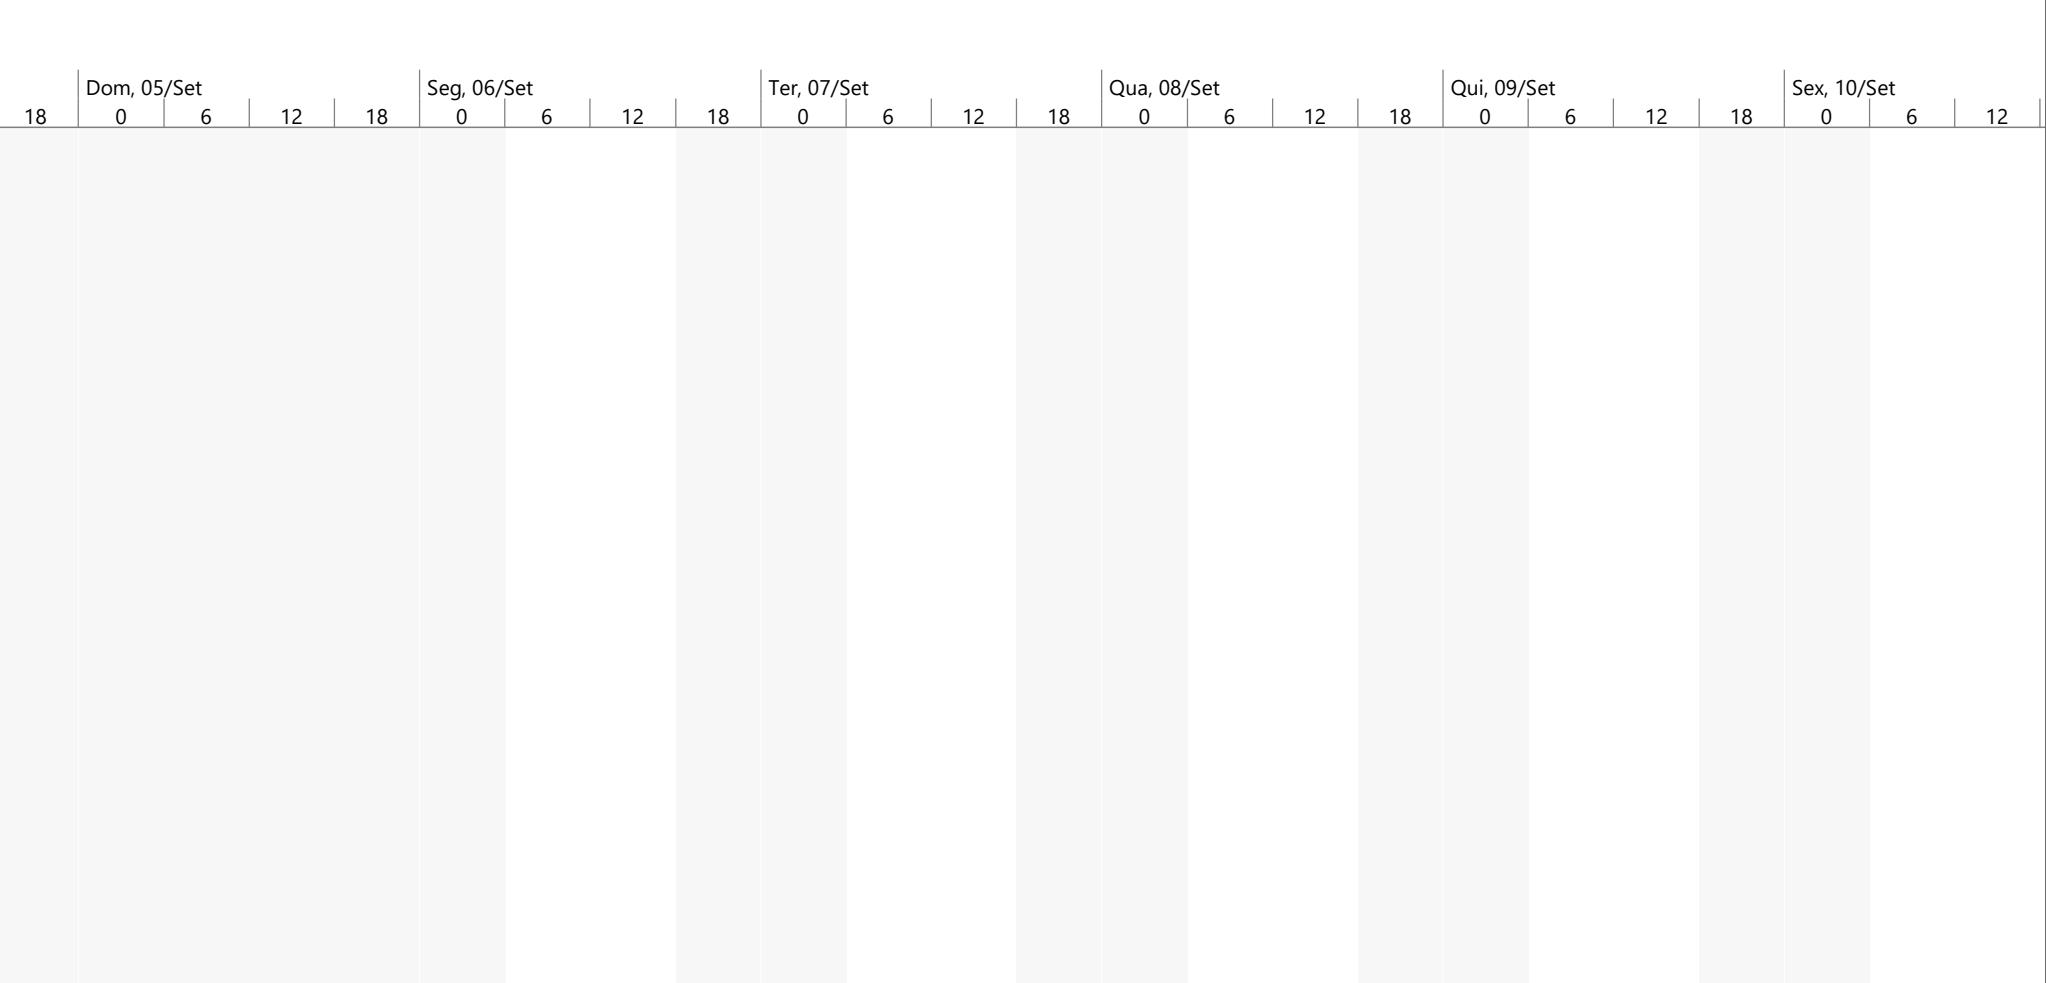

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

18	Sáb, 11/Set	0	6	12	18	Dom, 12/Set	0	6	12	18	Seg, 13/Set	0	6	12	18	Ter, 14/Set	0	6	12	18	Qua, 15/Set	0	6	12	Qui, 16/Set	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	-------------	---	---	----


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

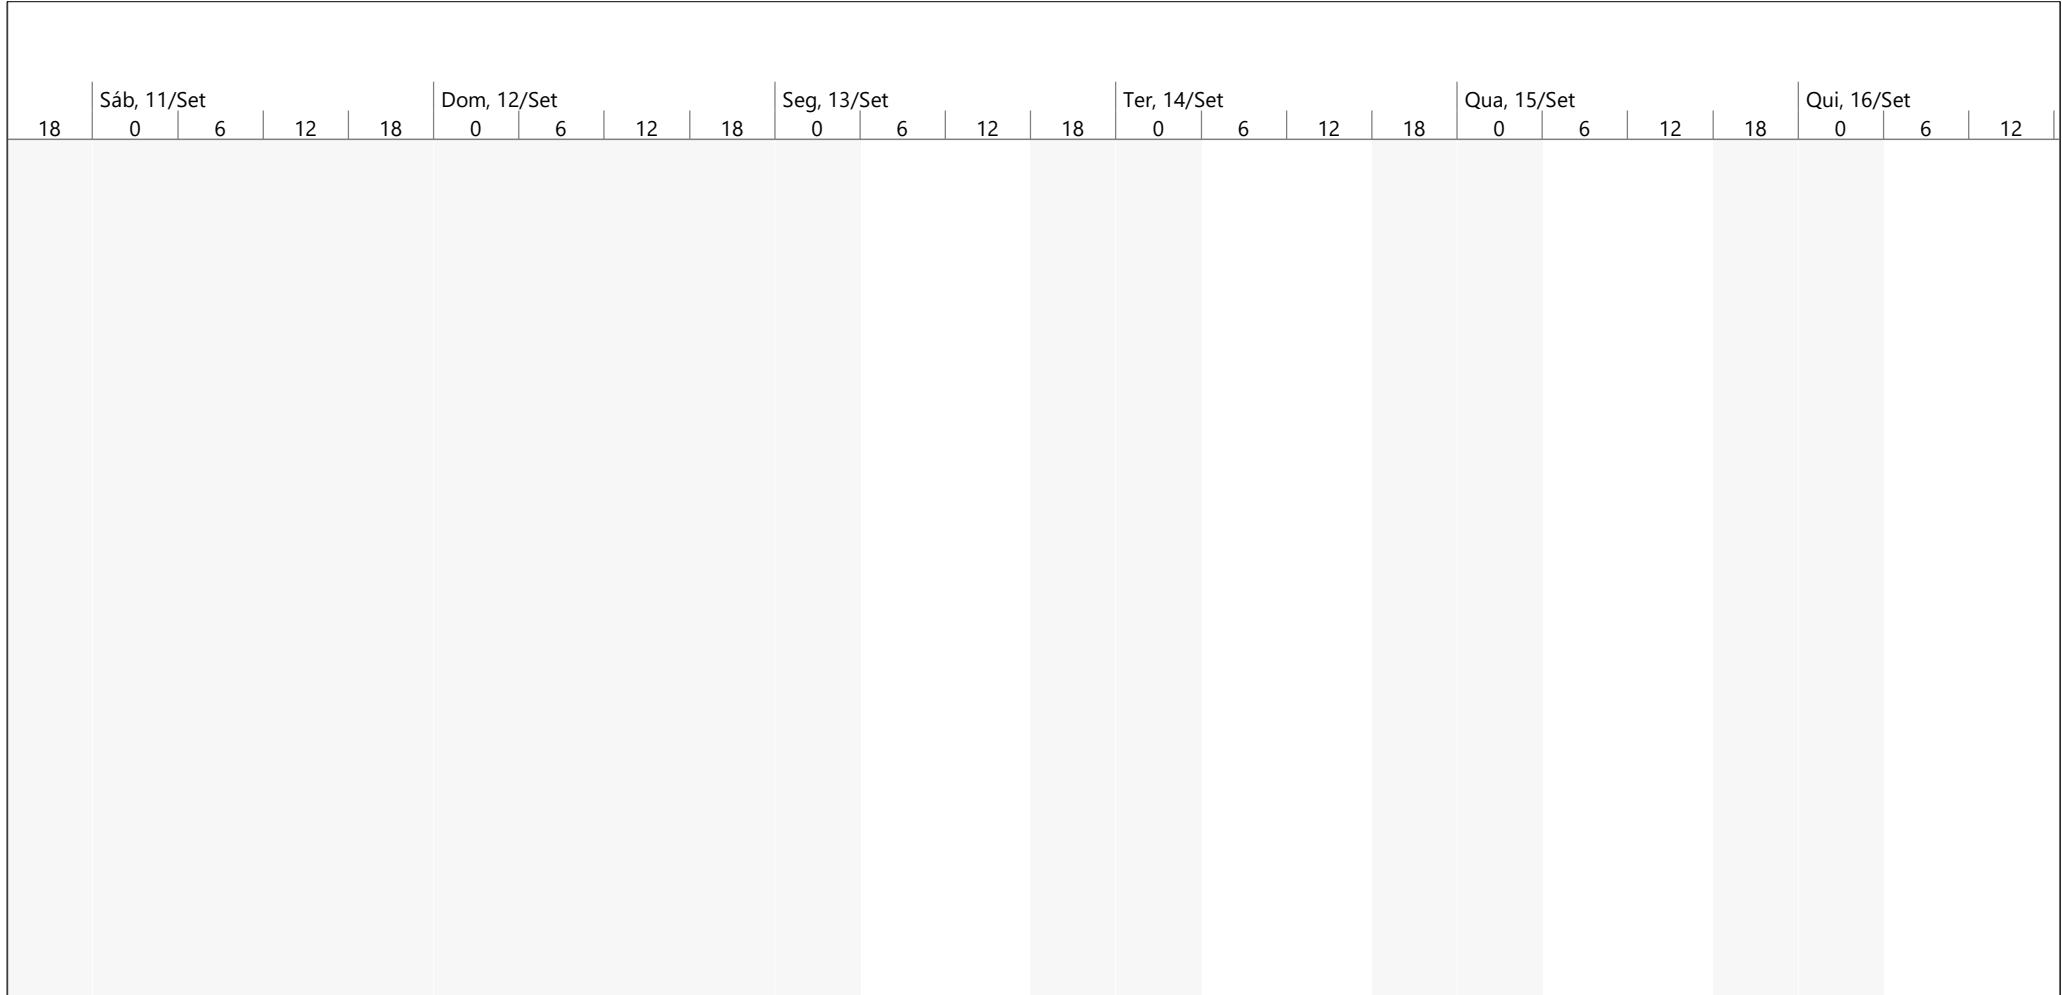


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

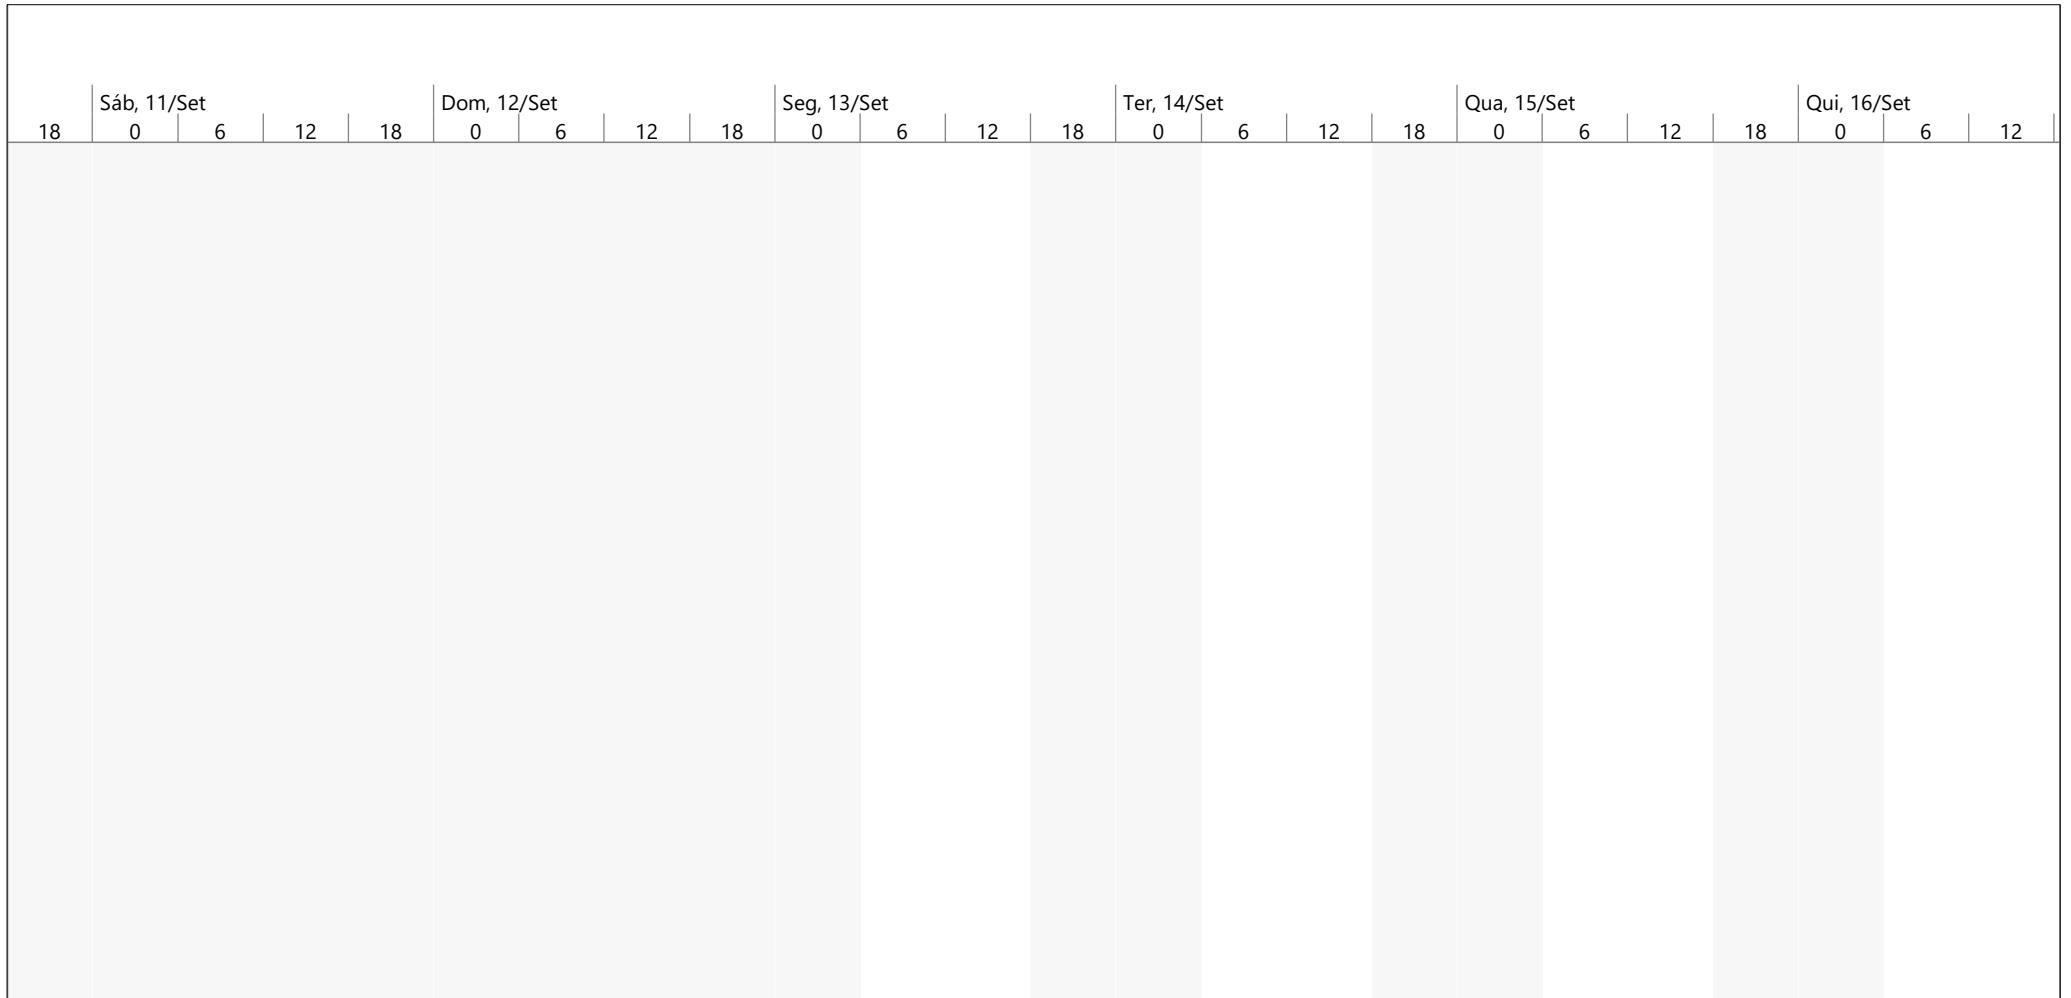

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

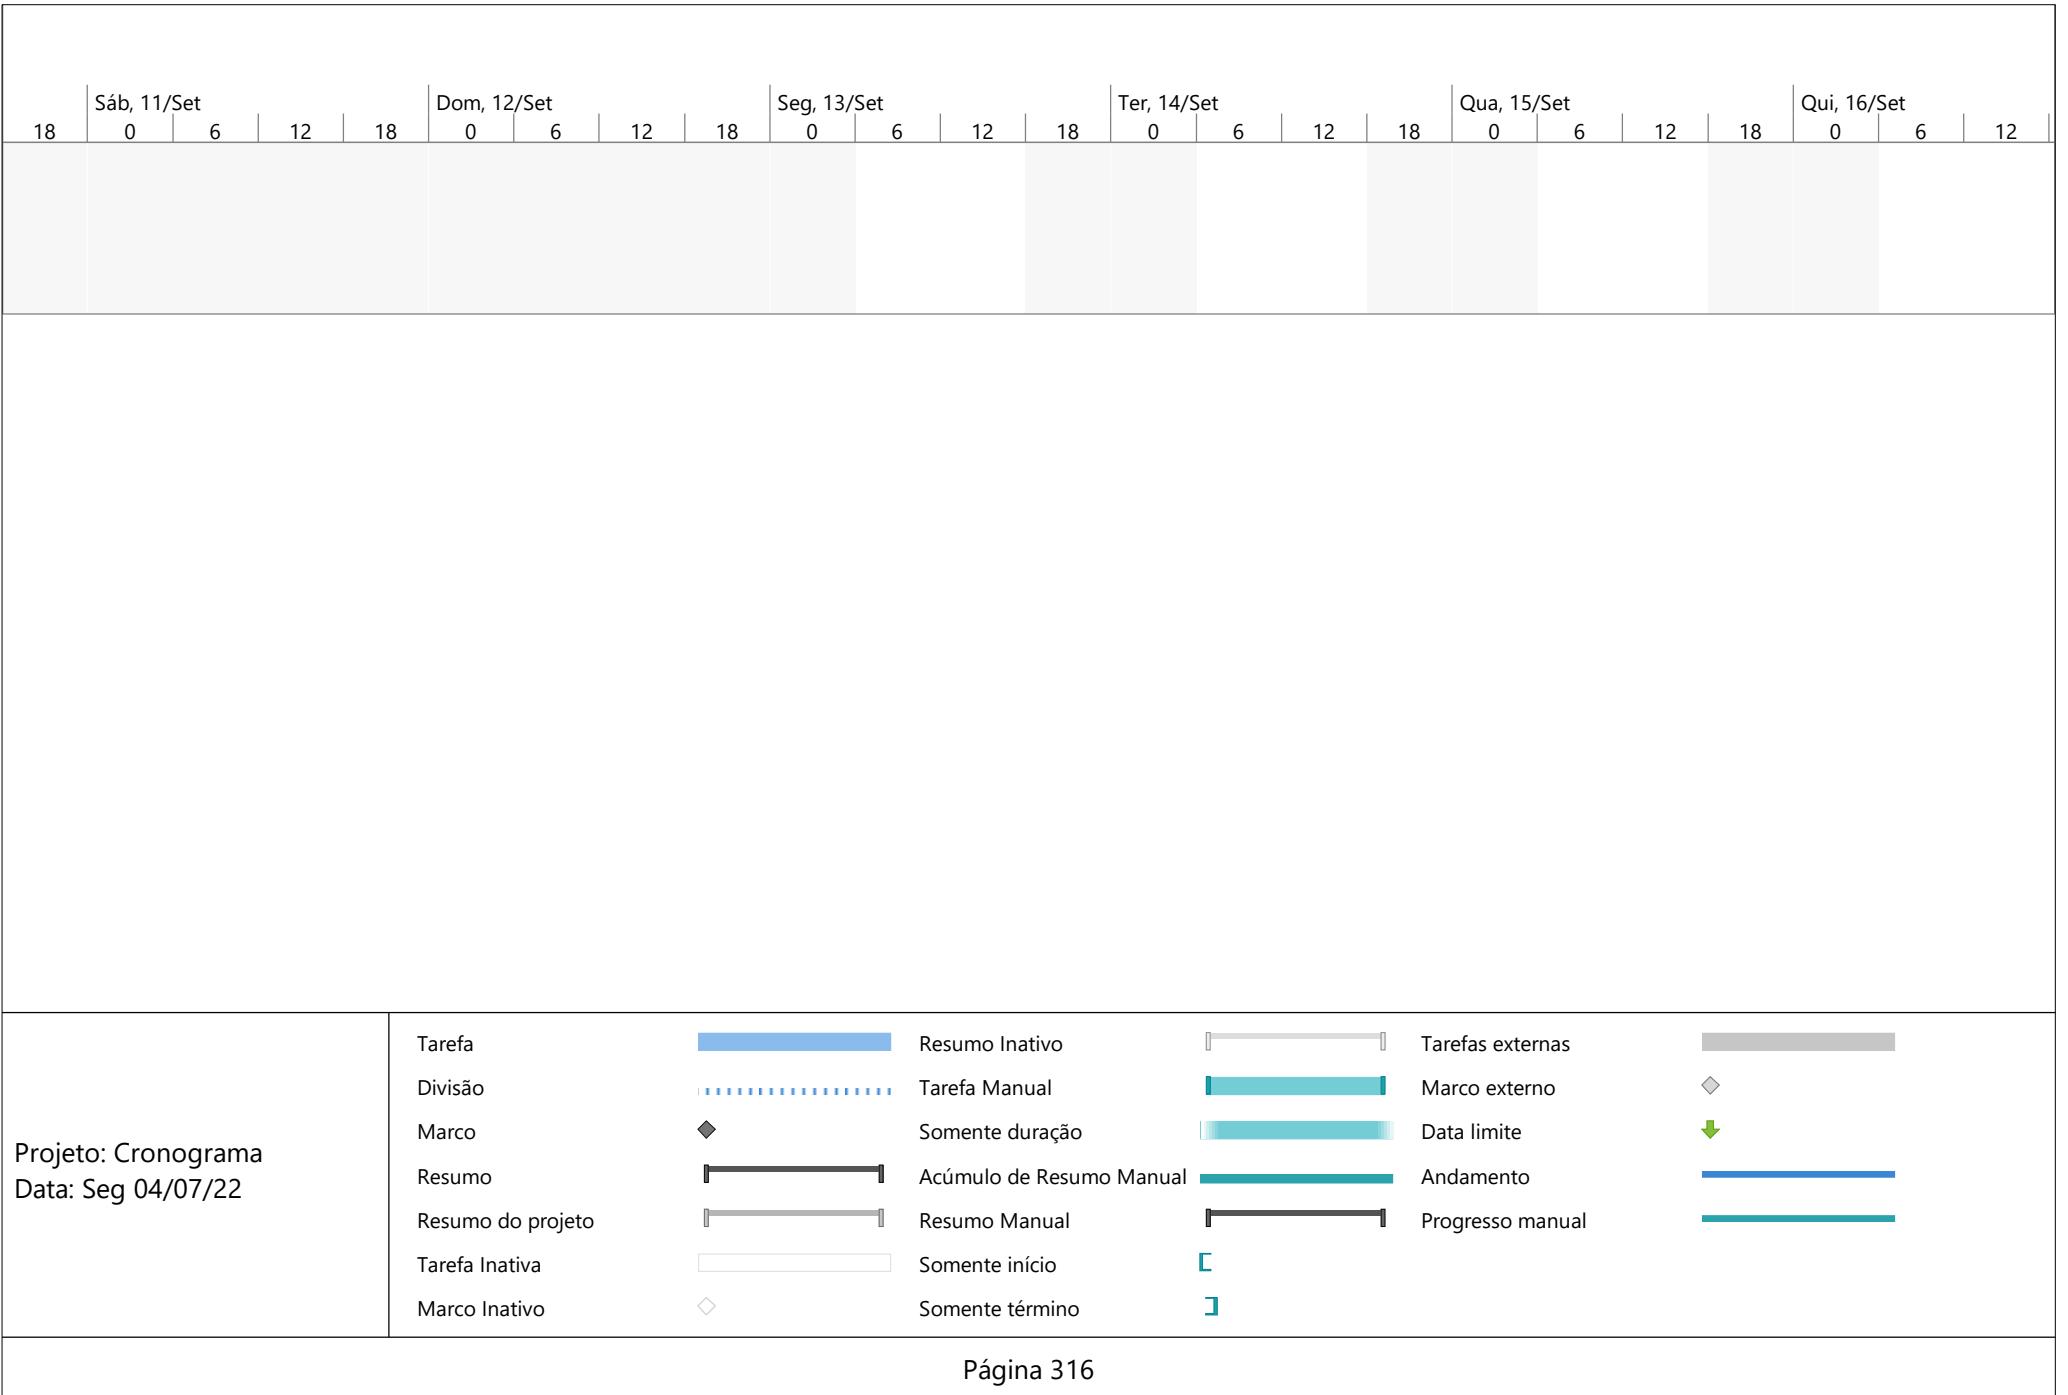




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

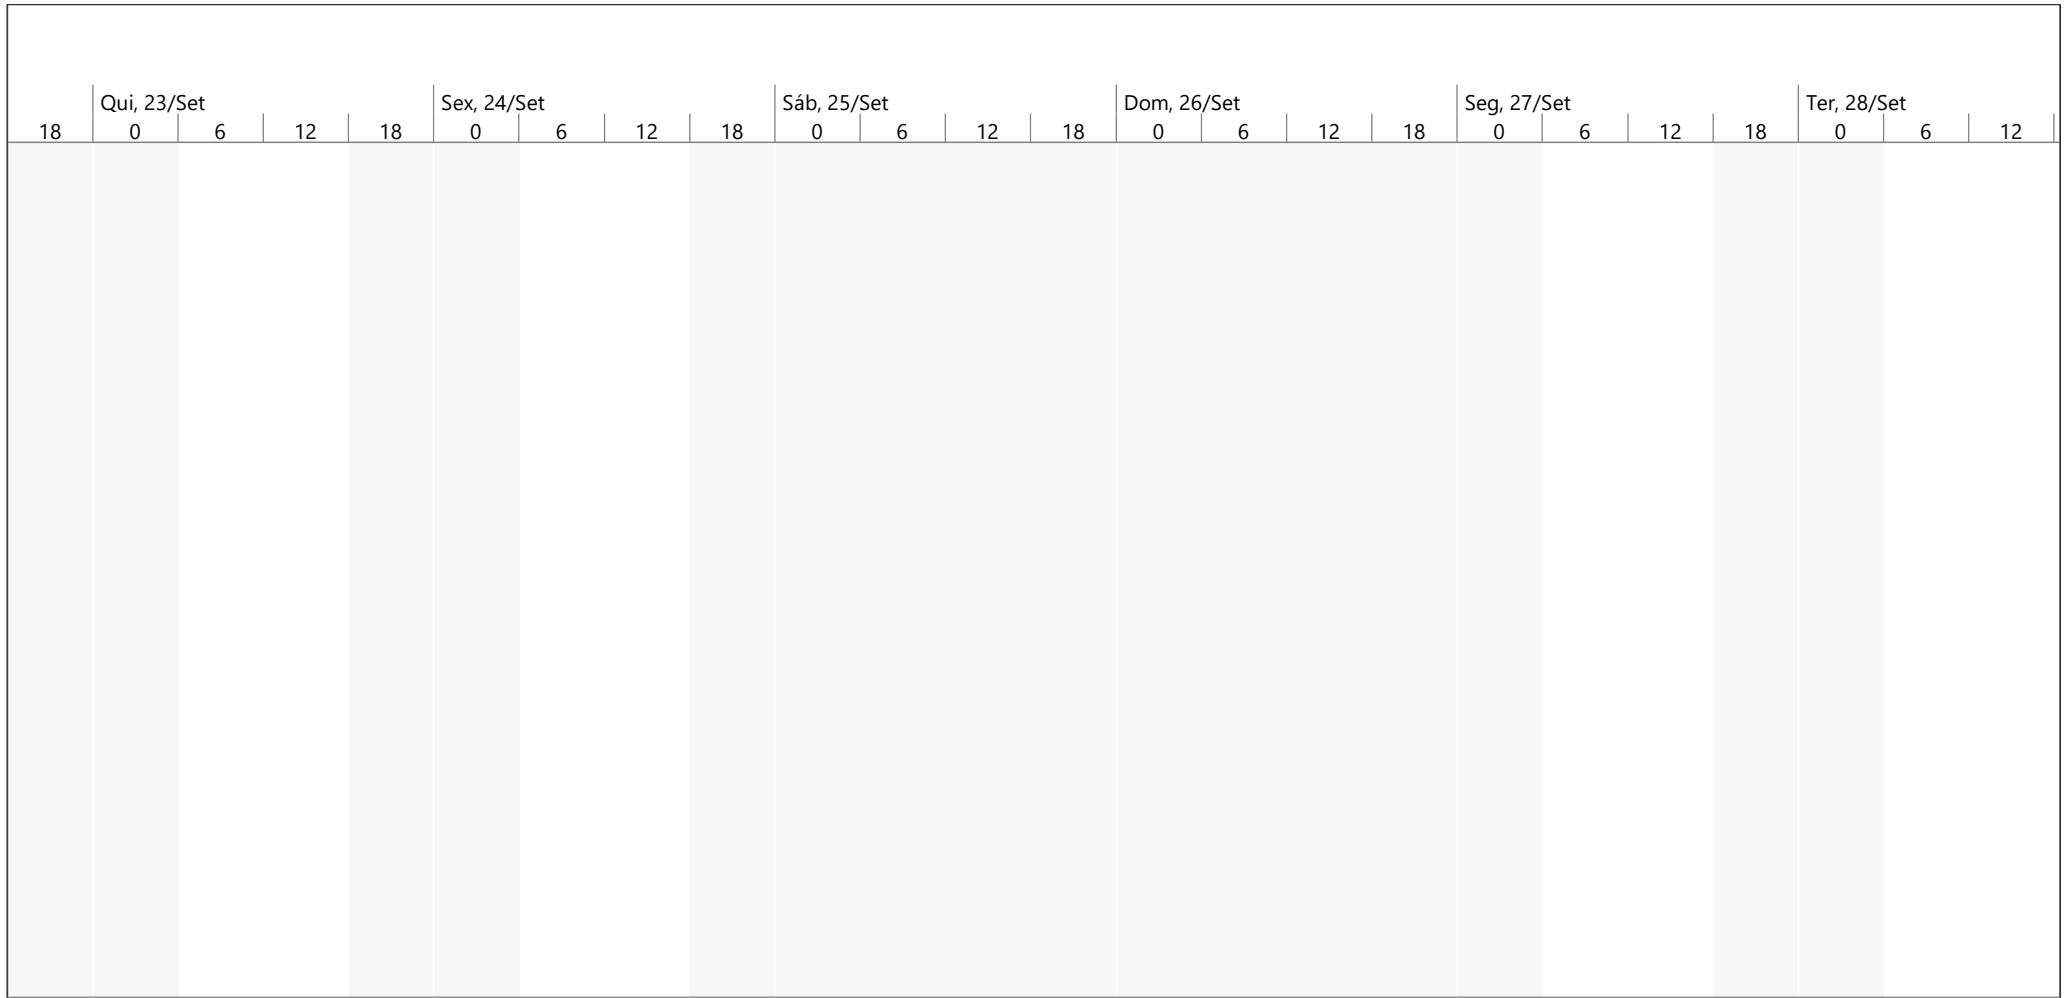


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

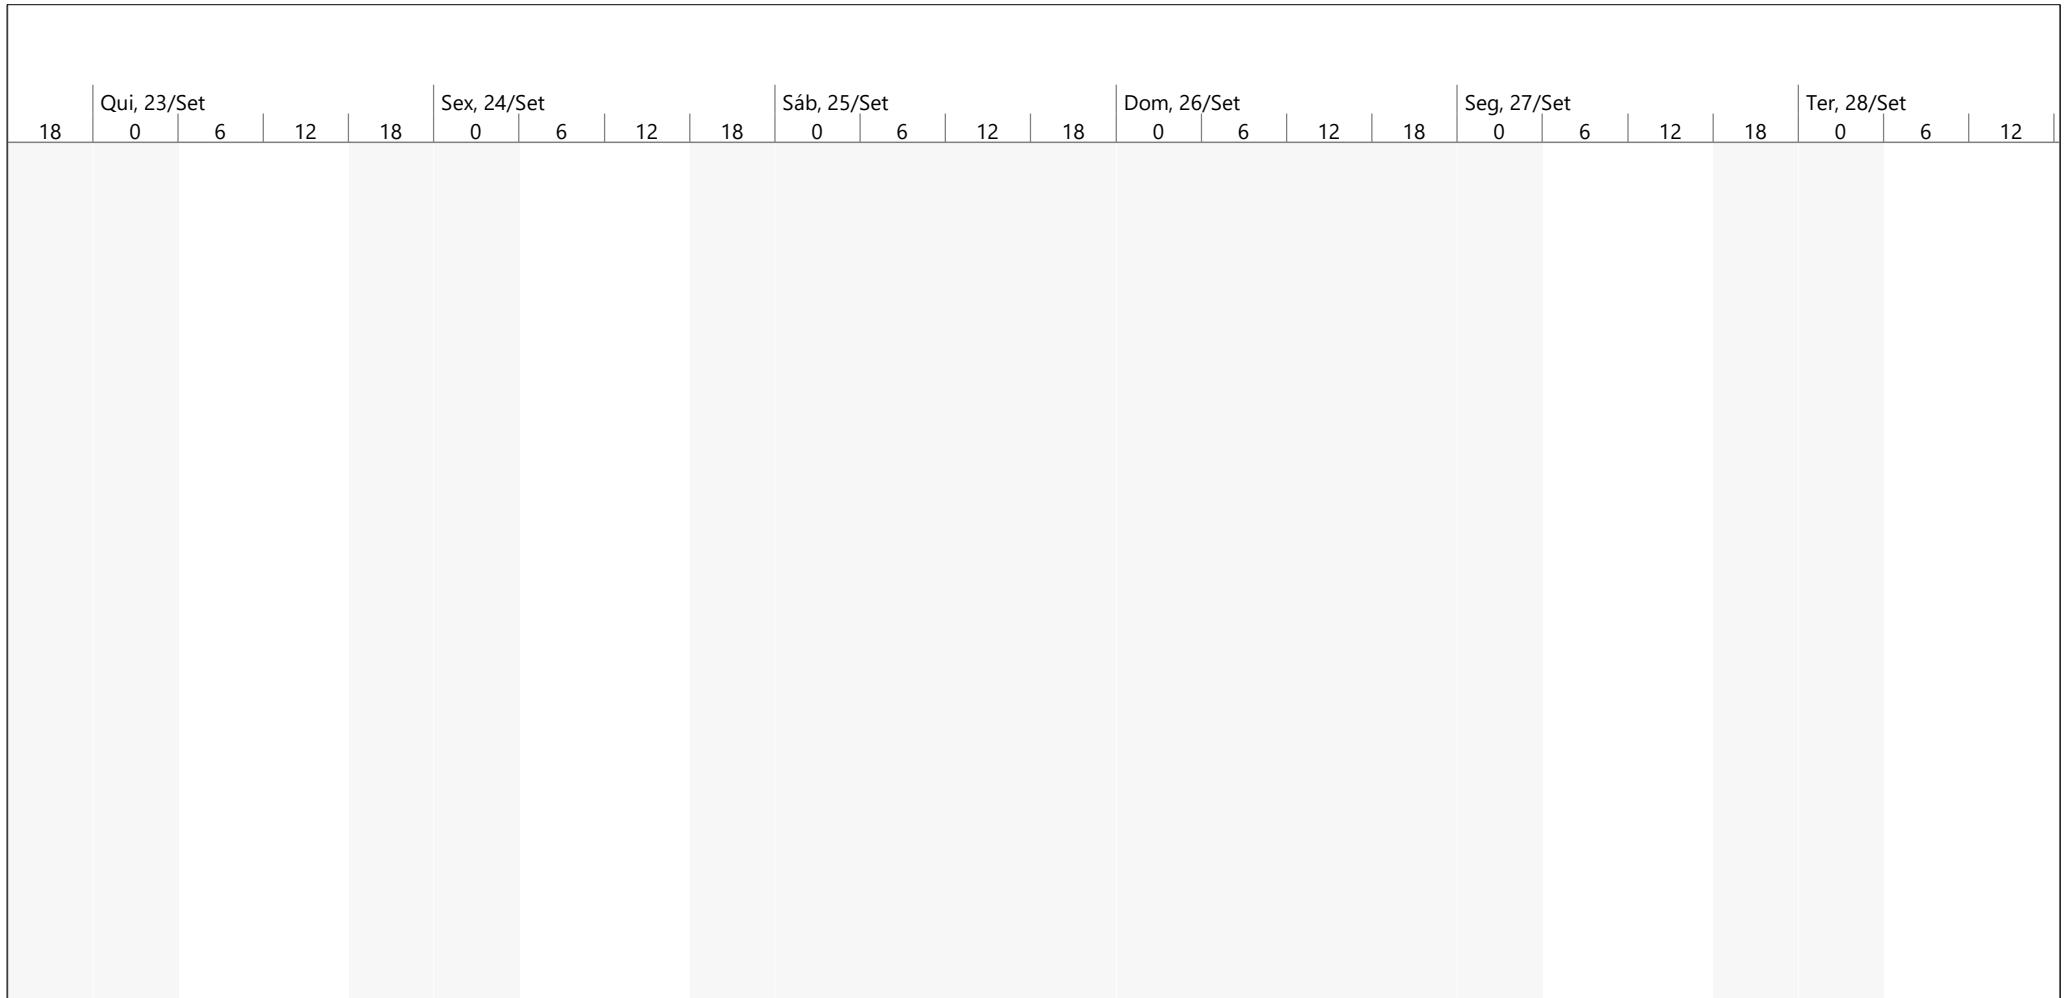


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

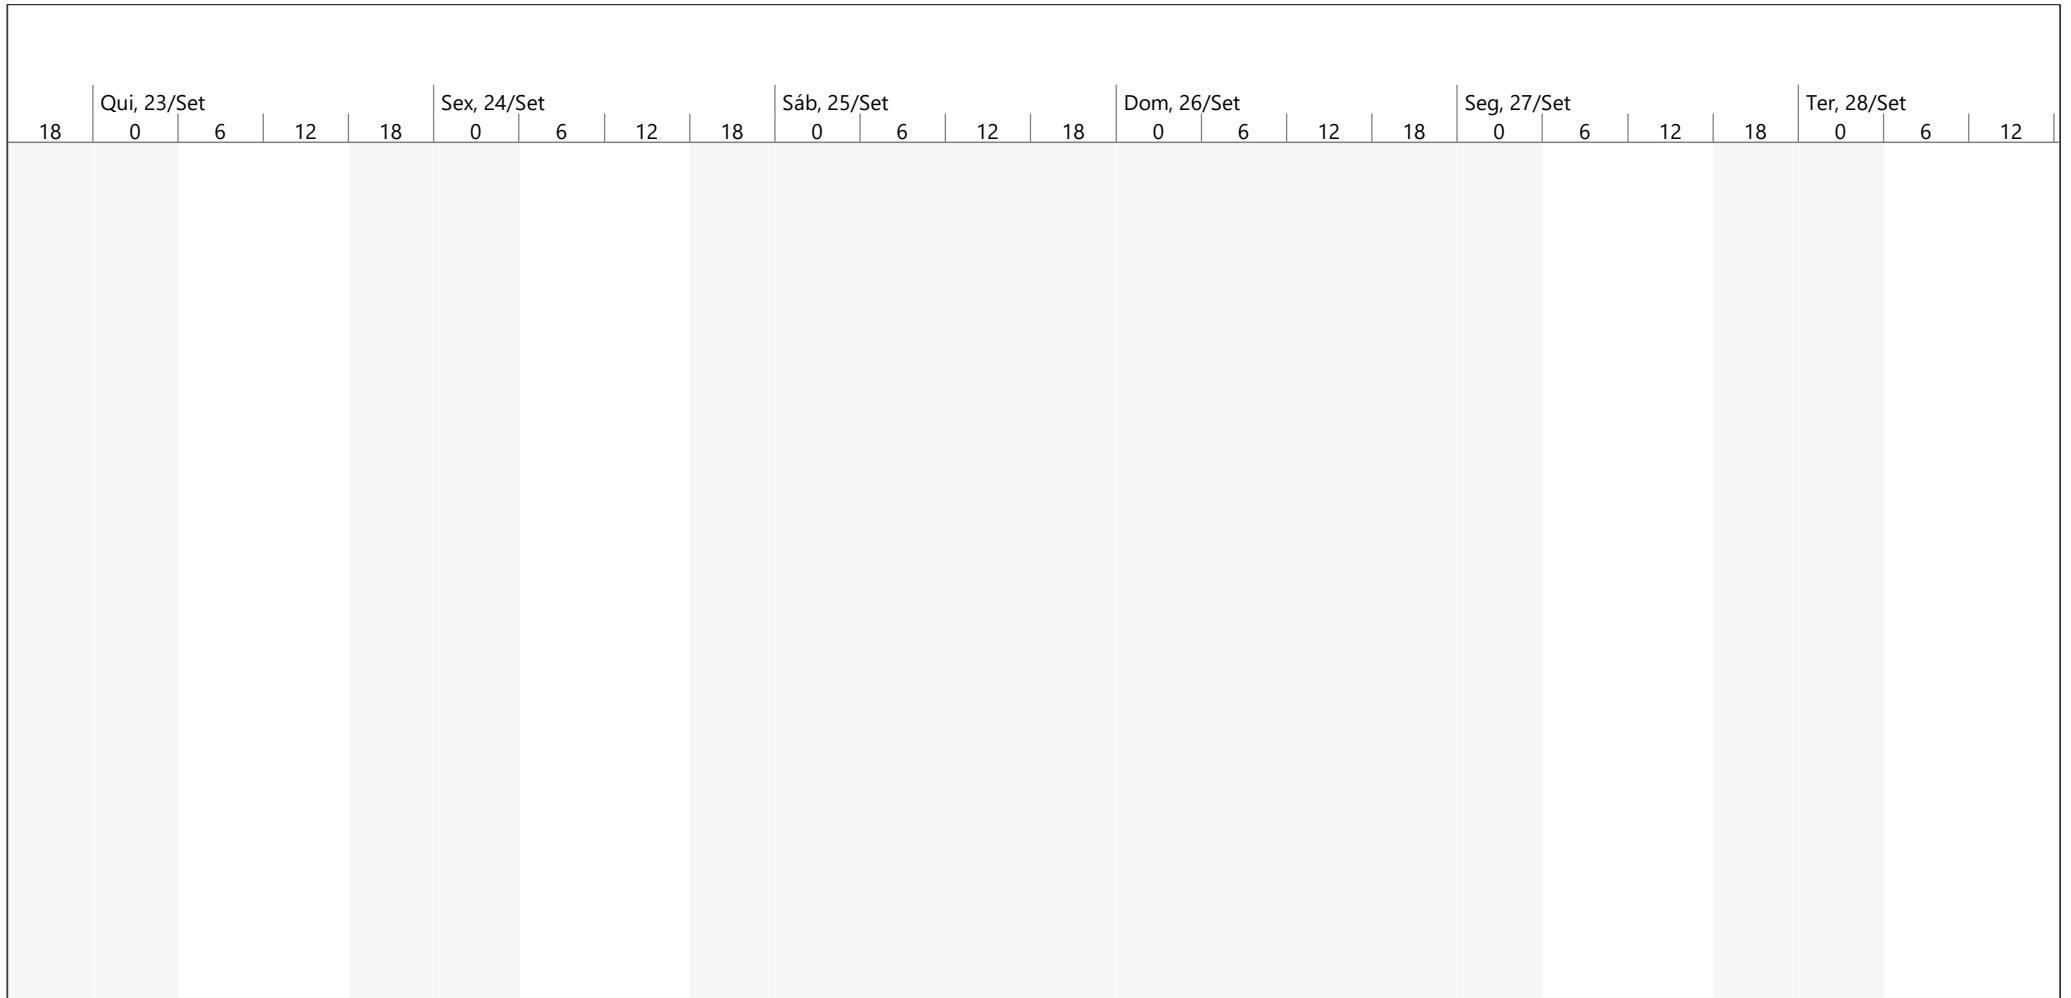

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

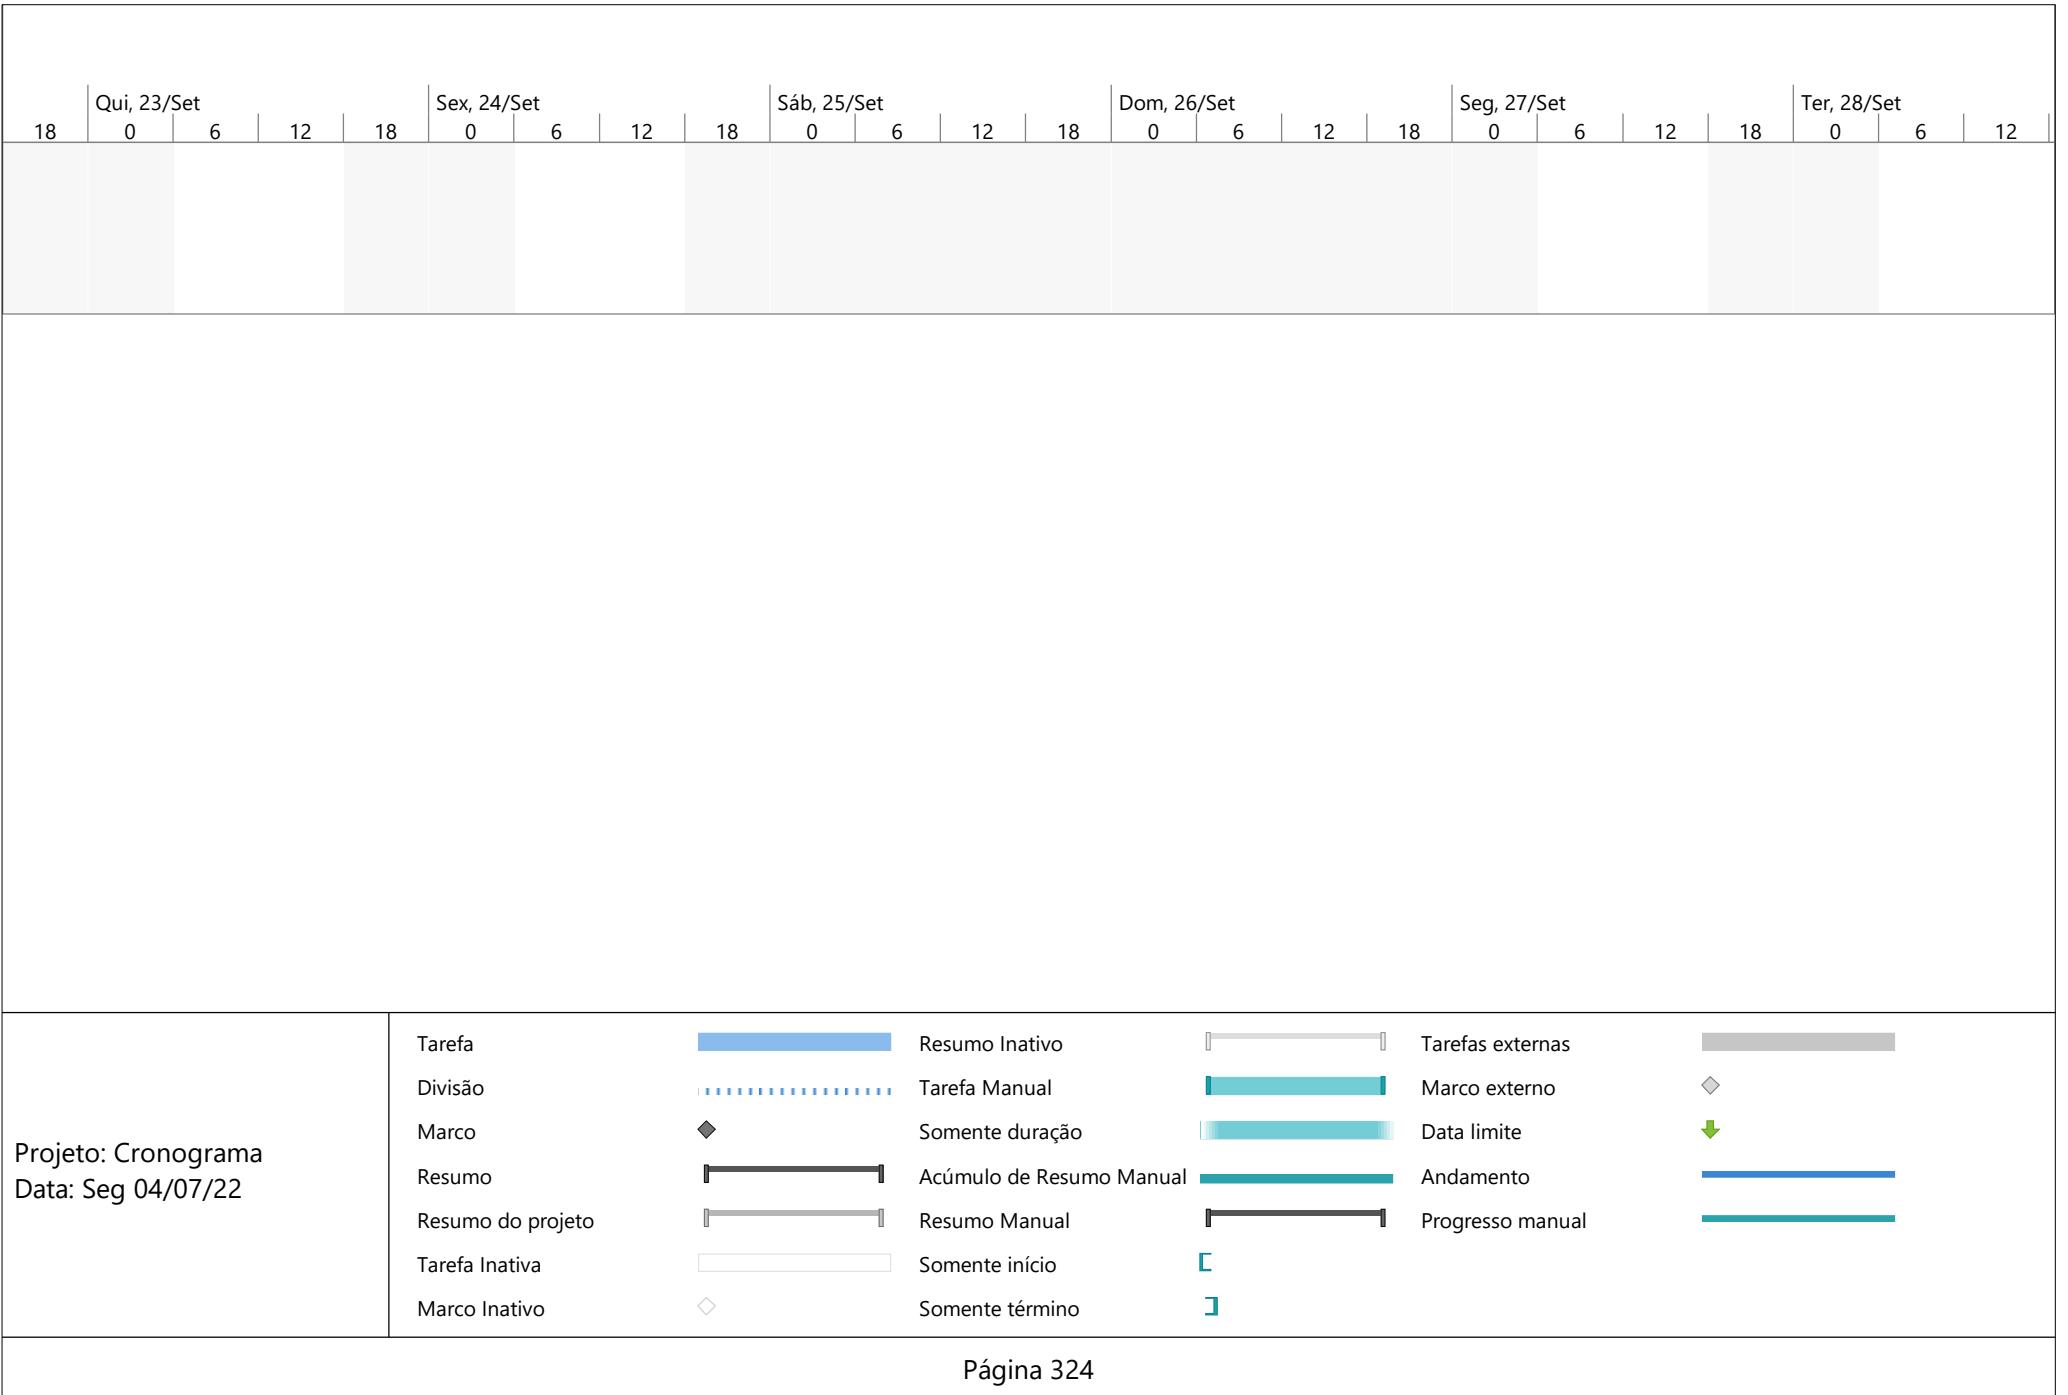

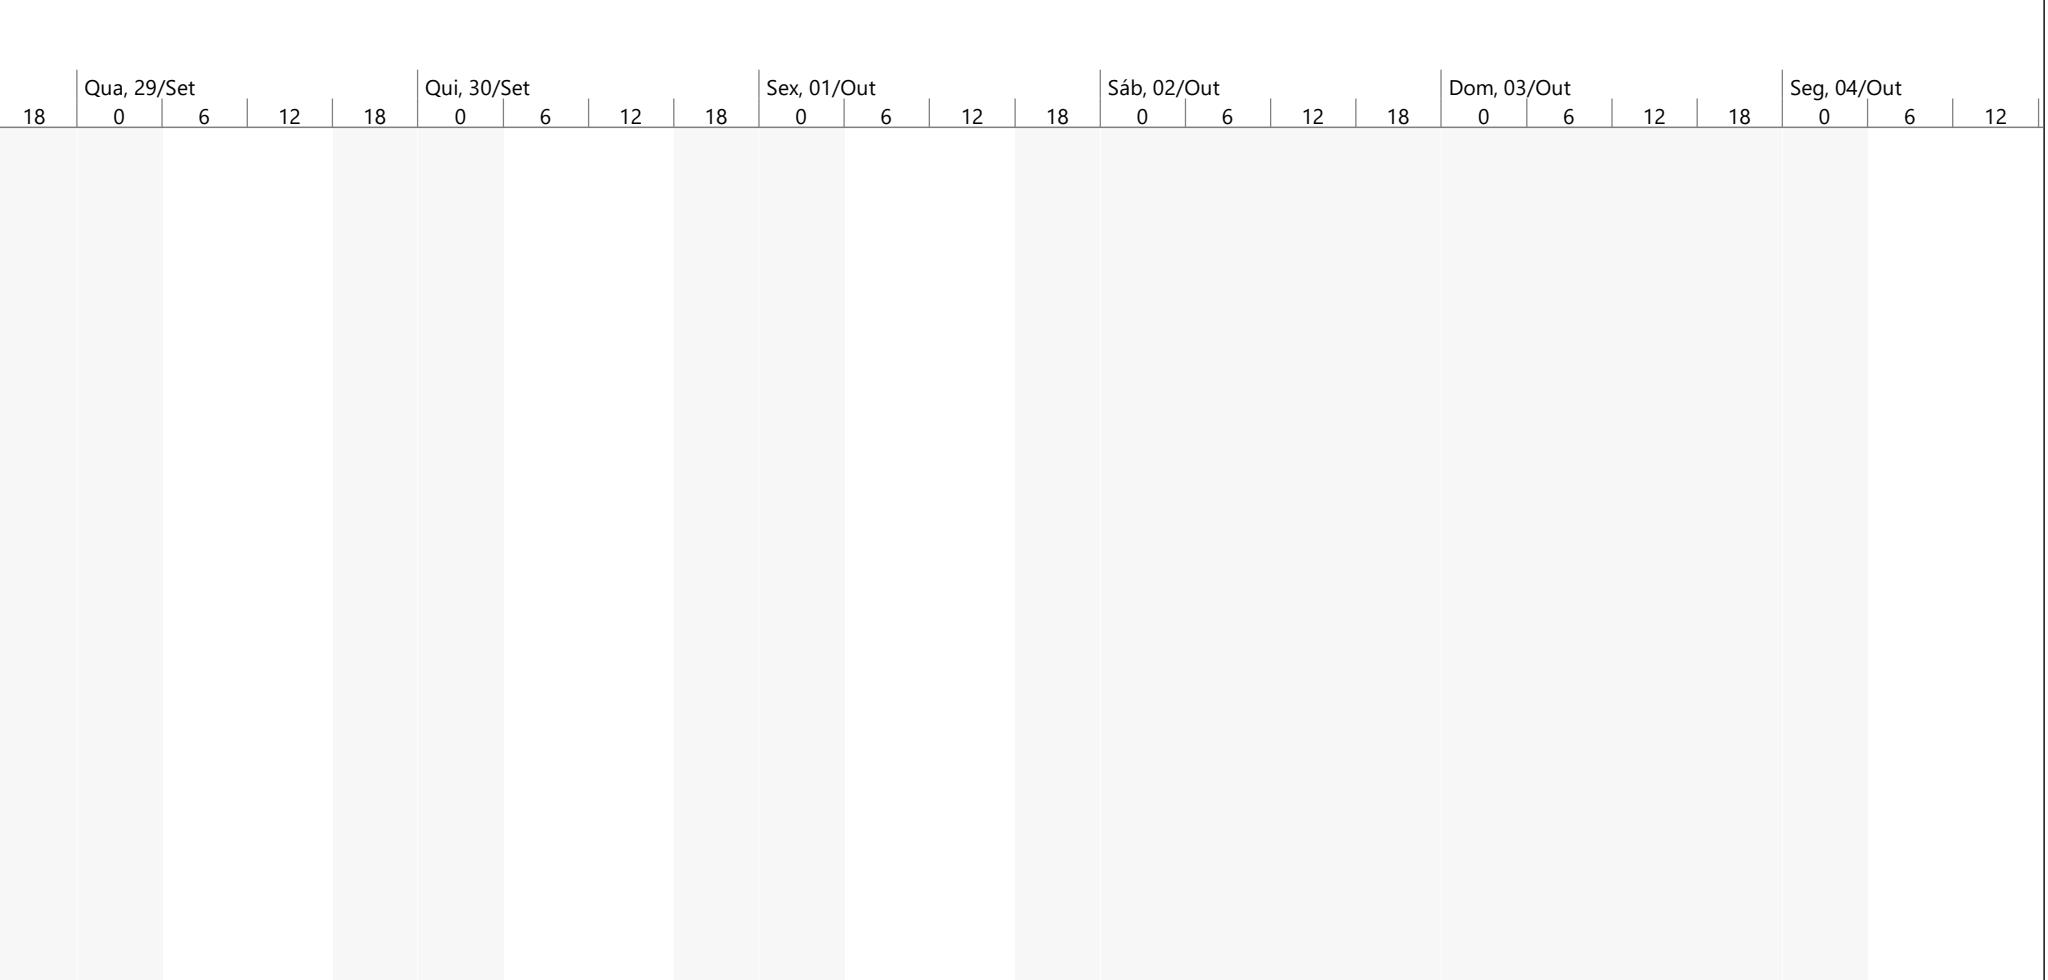


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

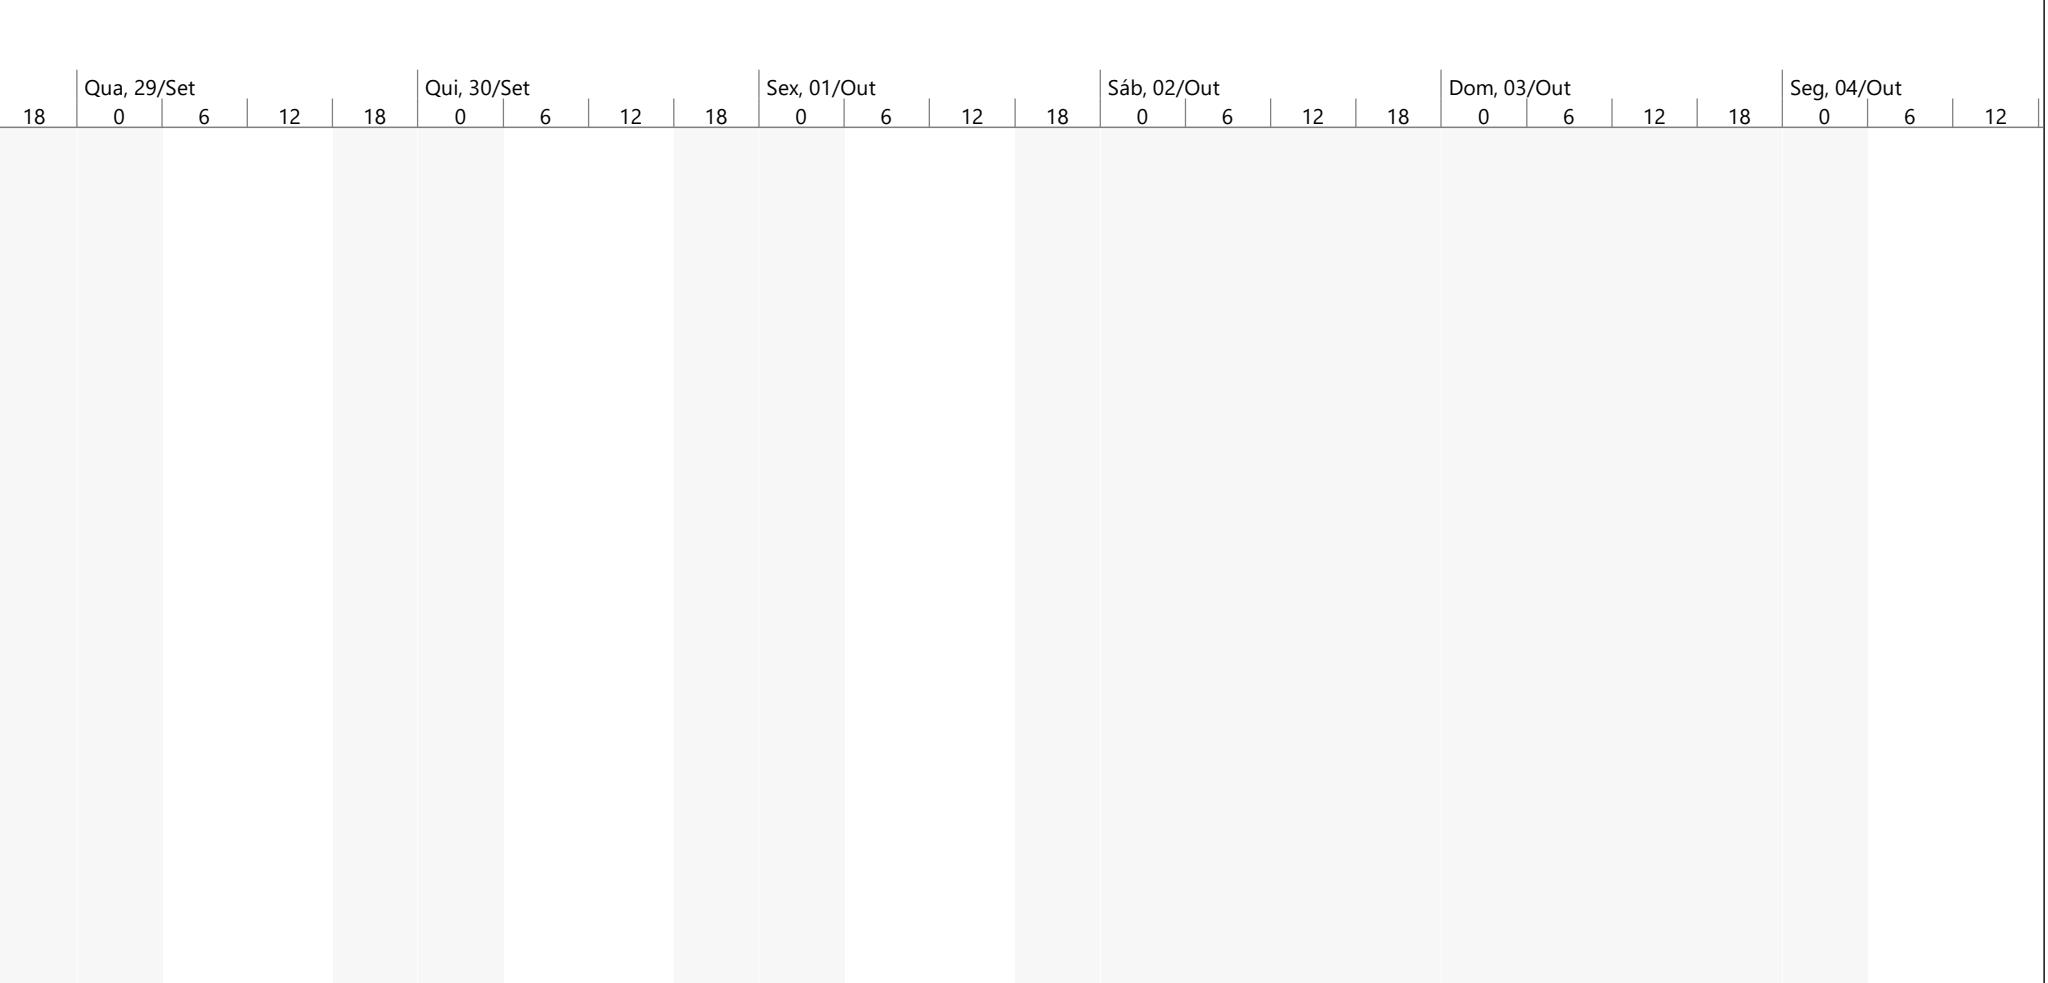


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

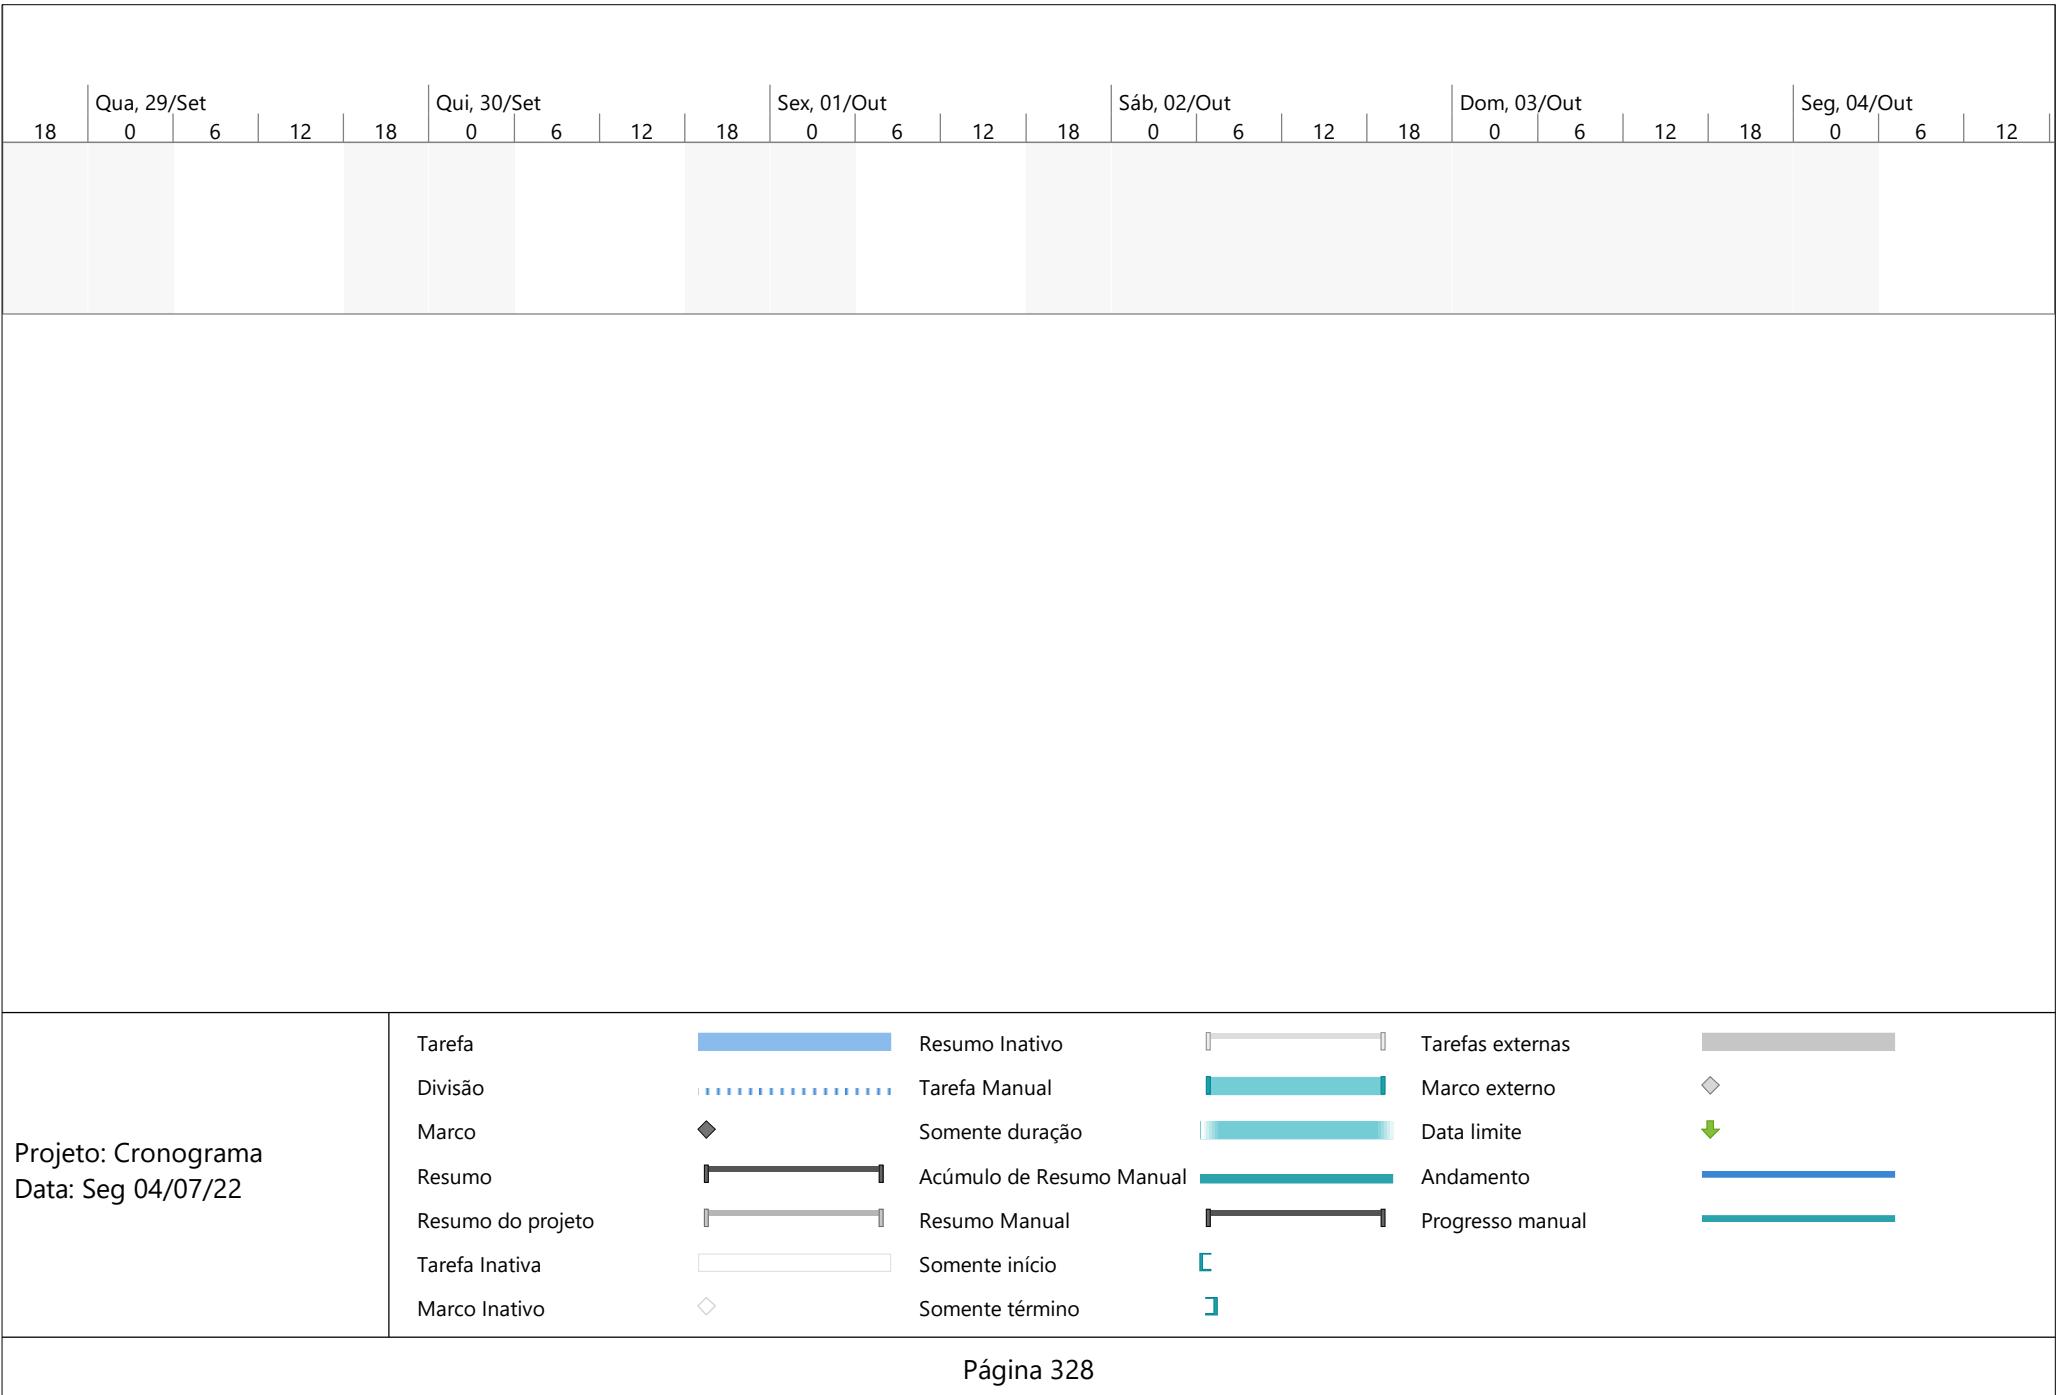




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

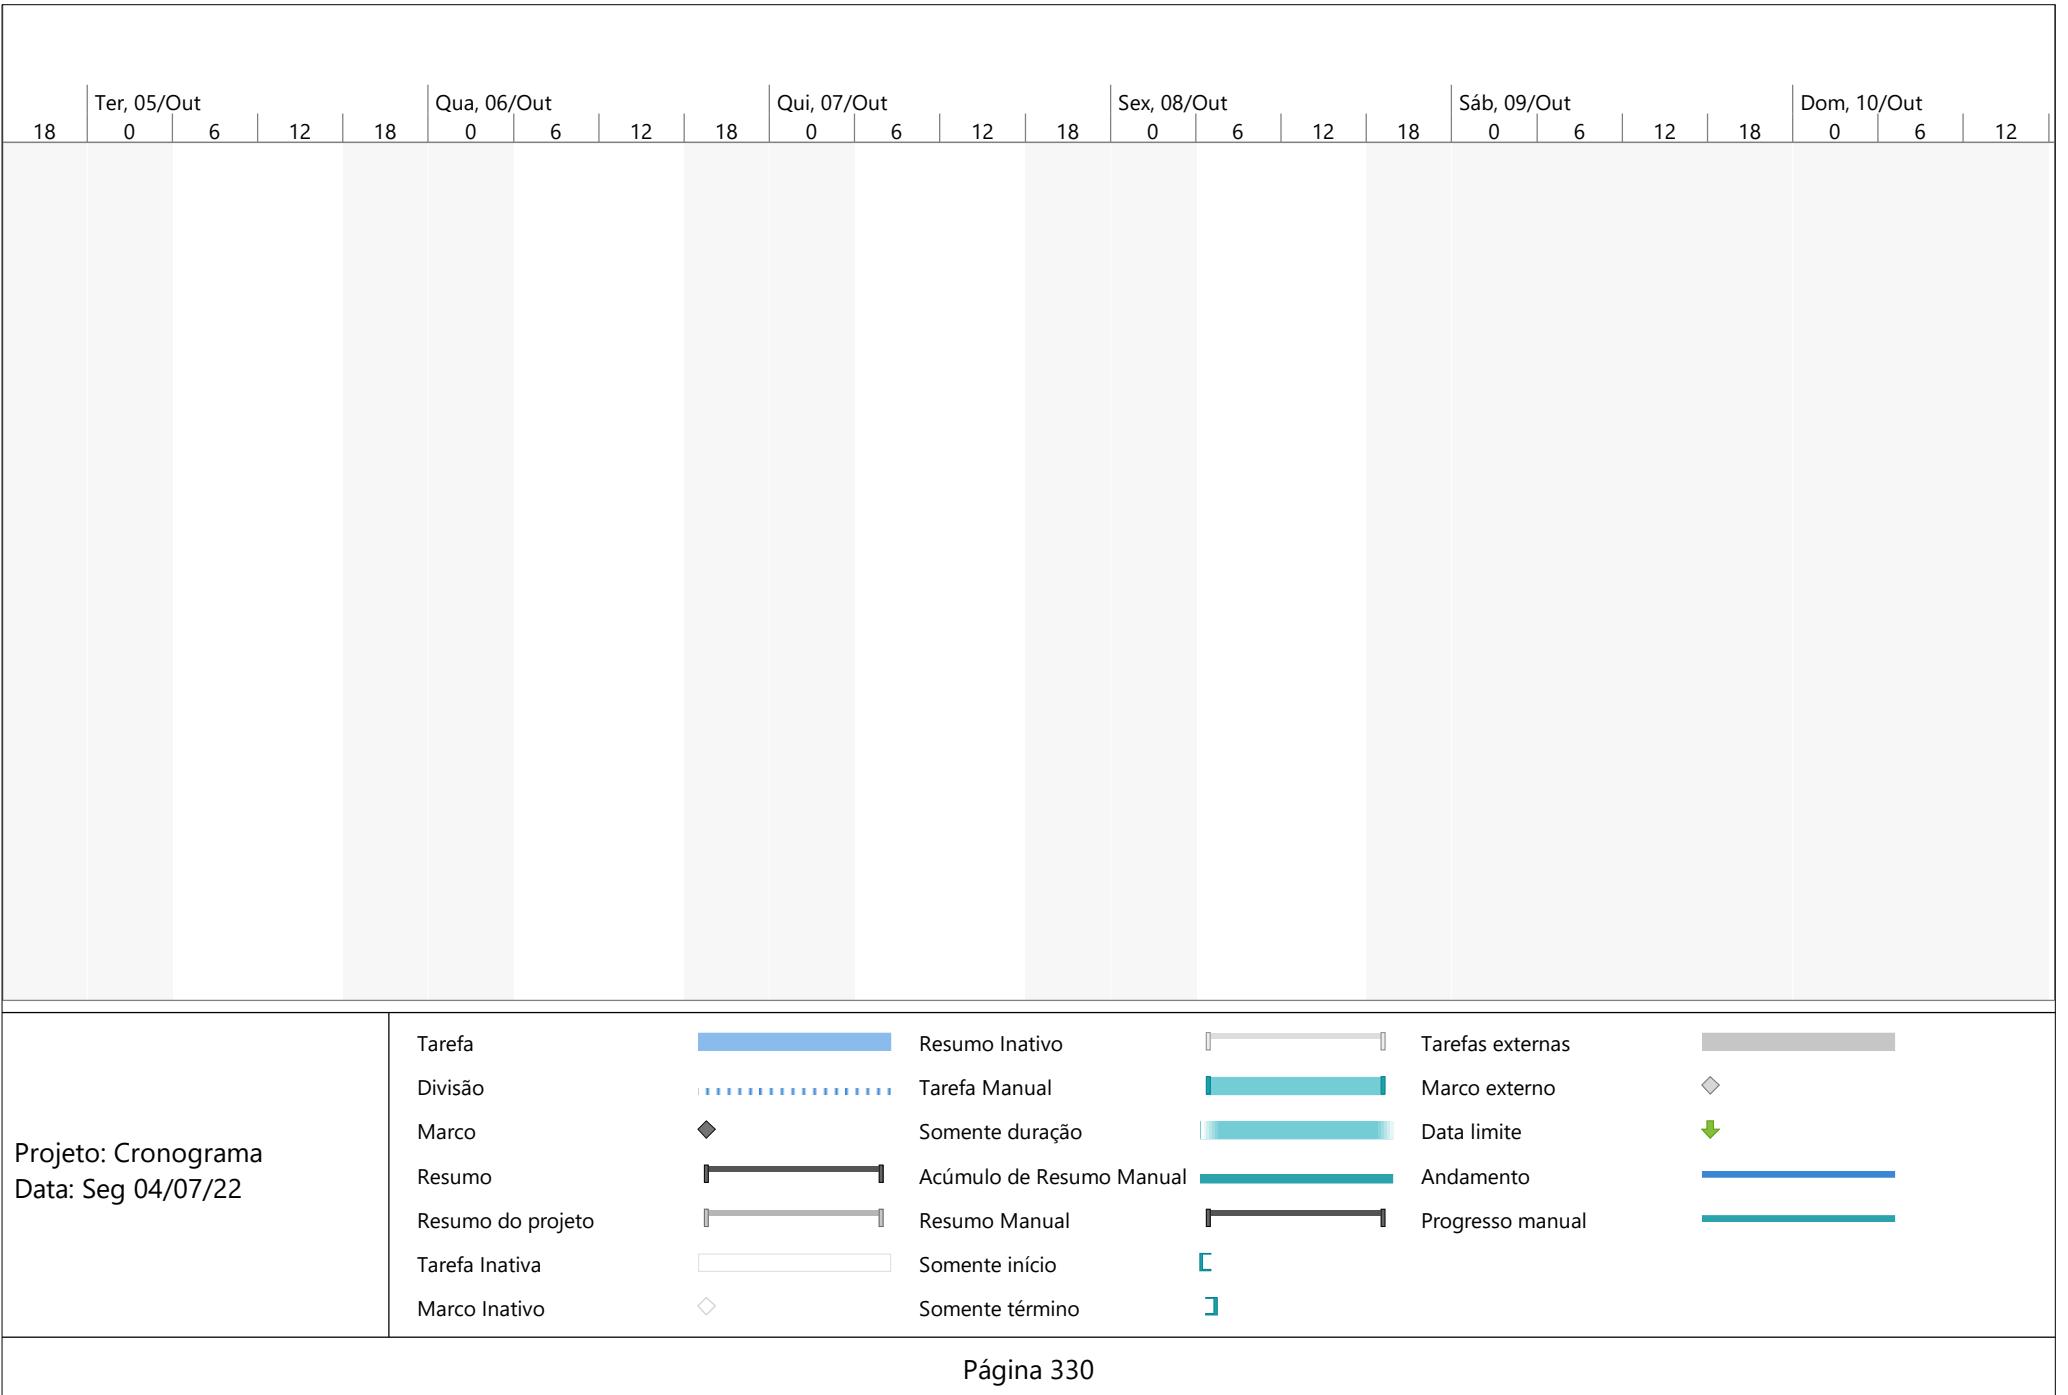




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

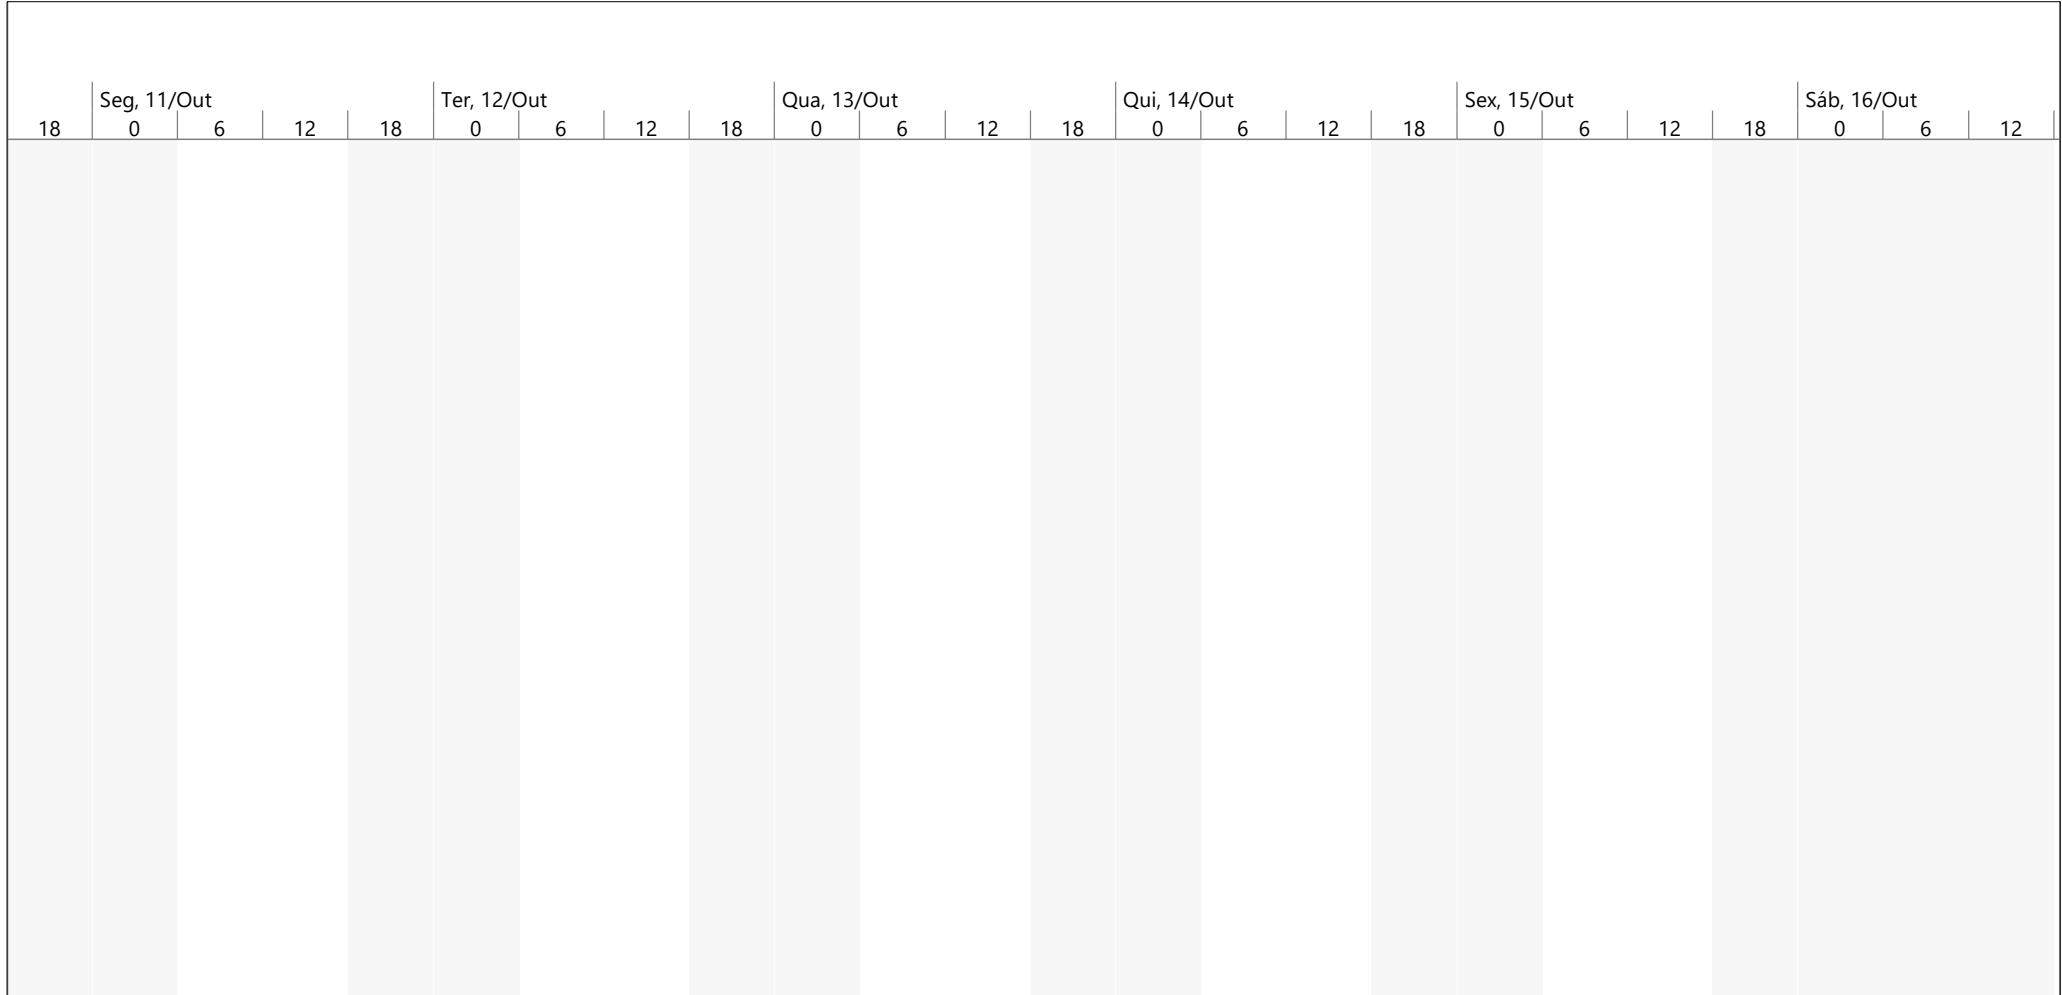


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

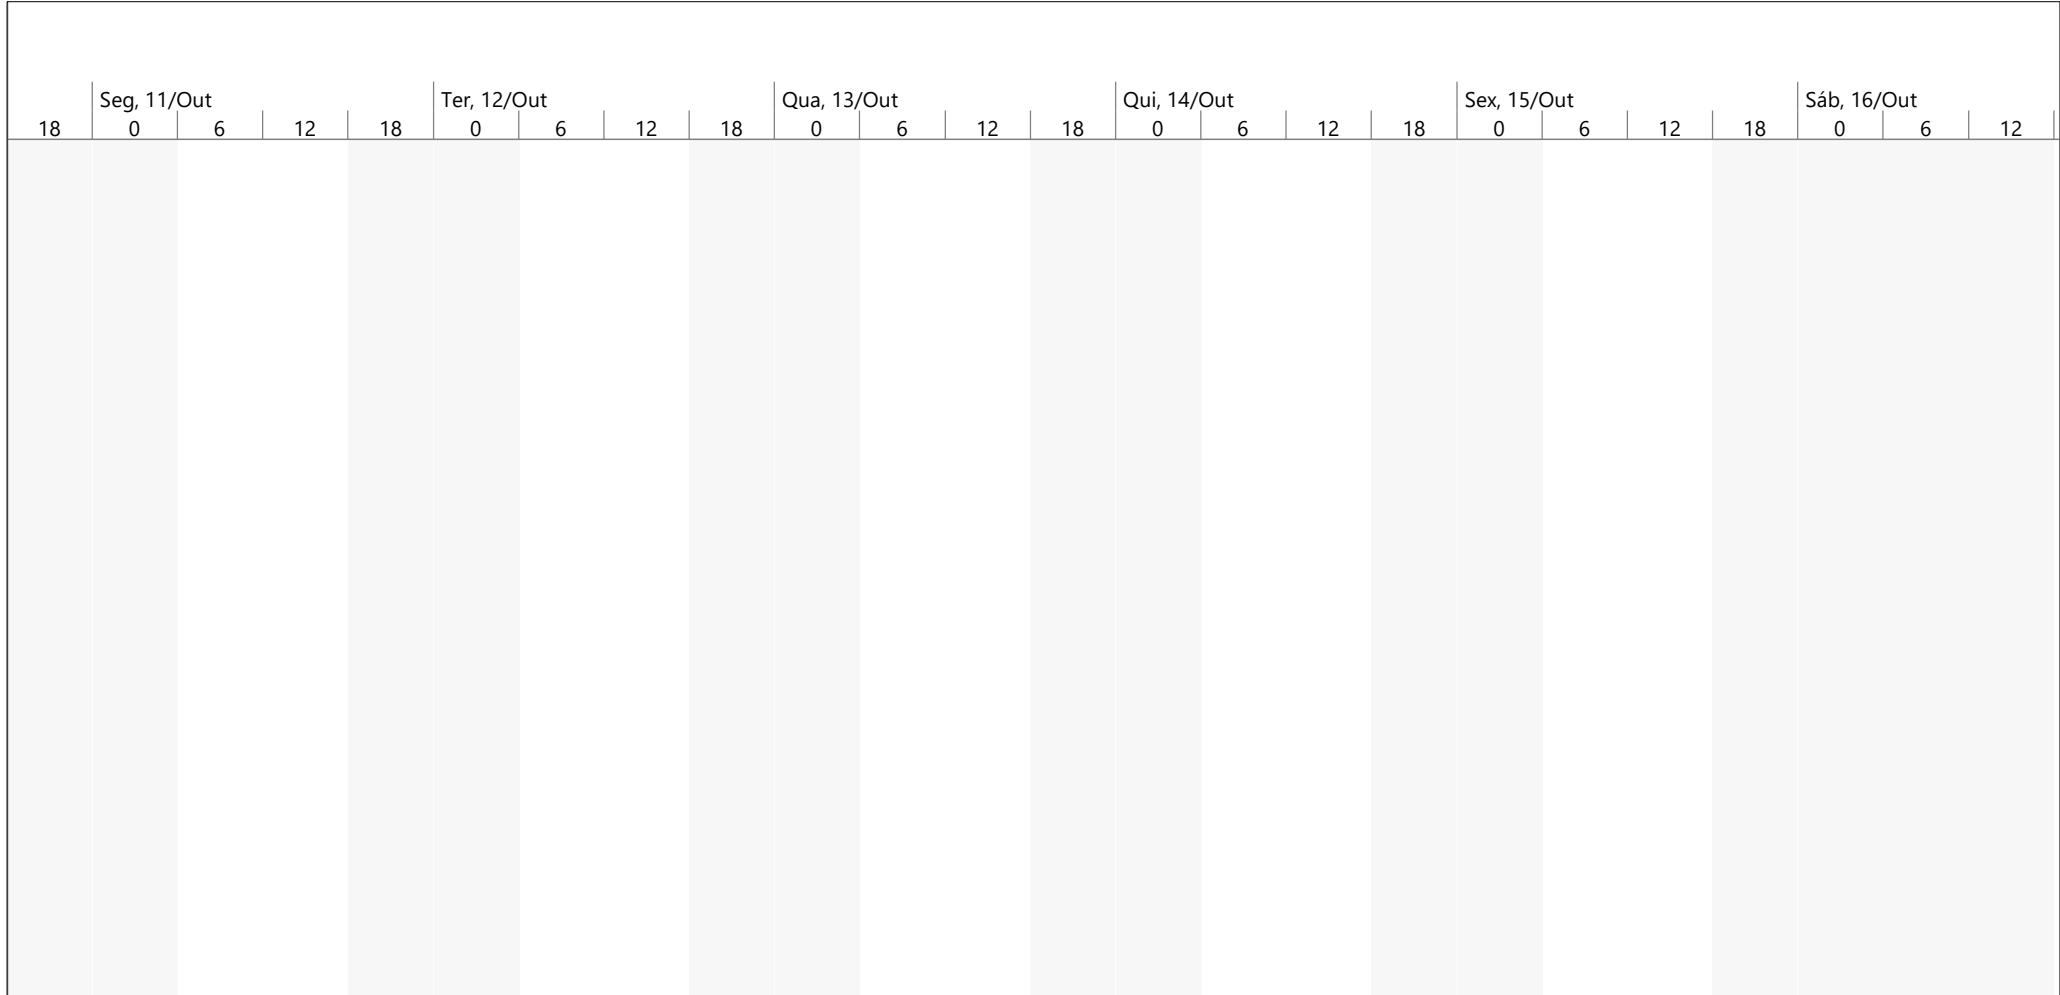


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

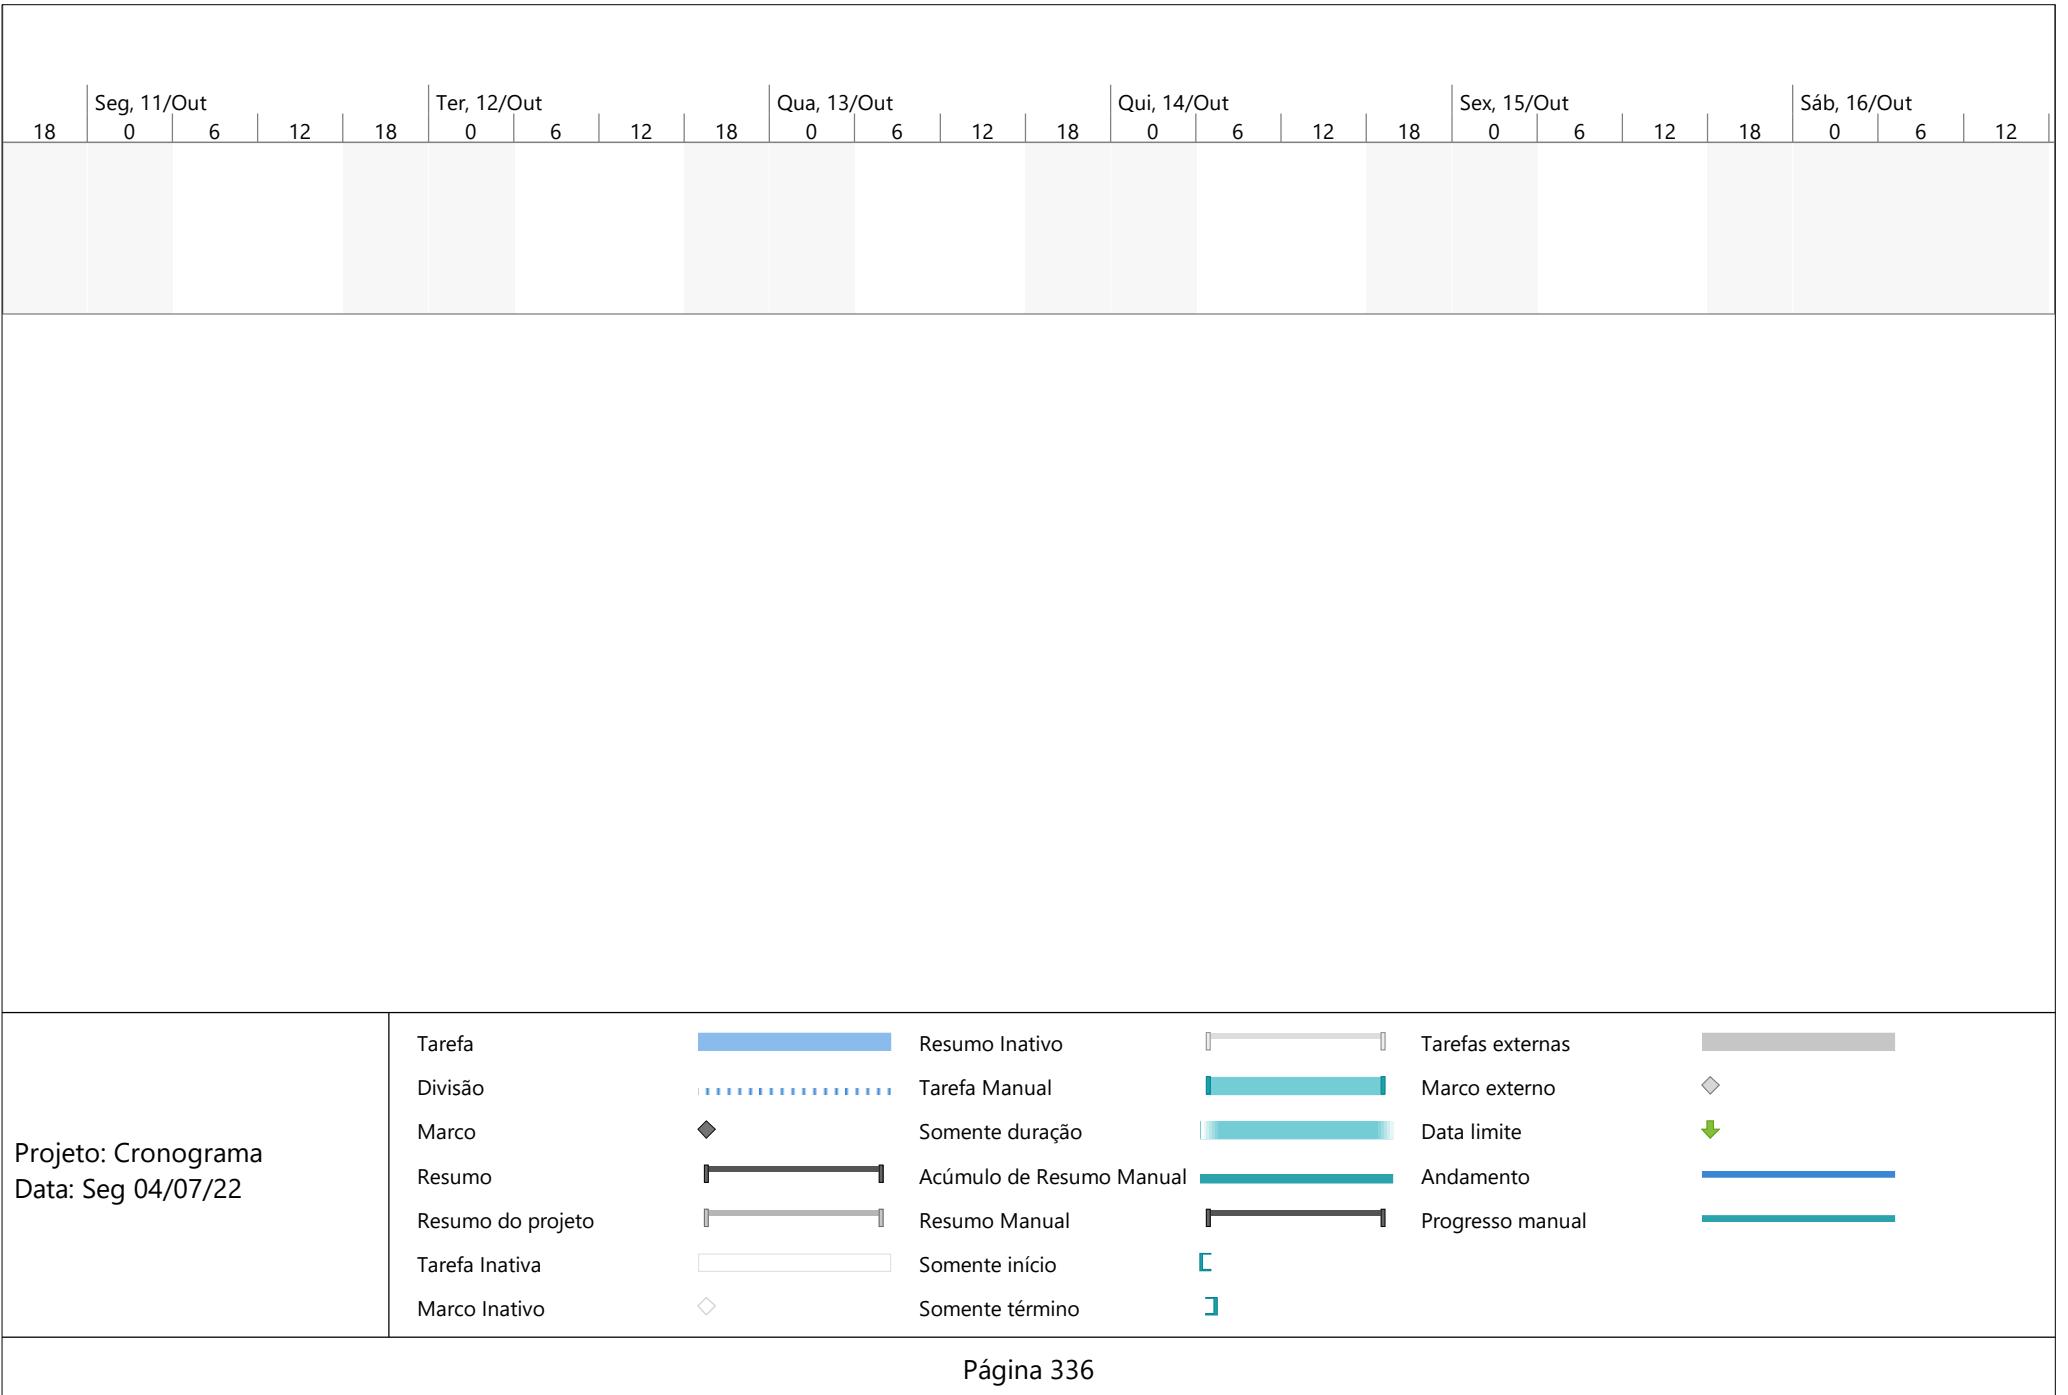

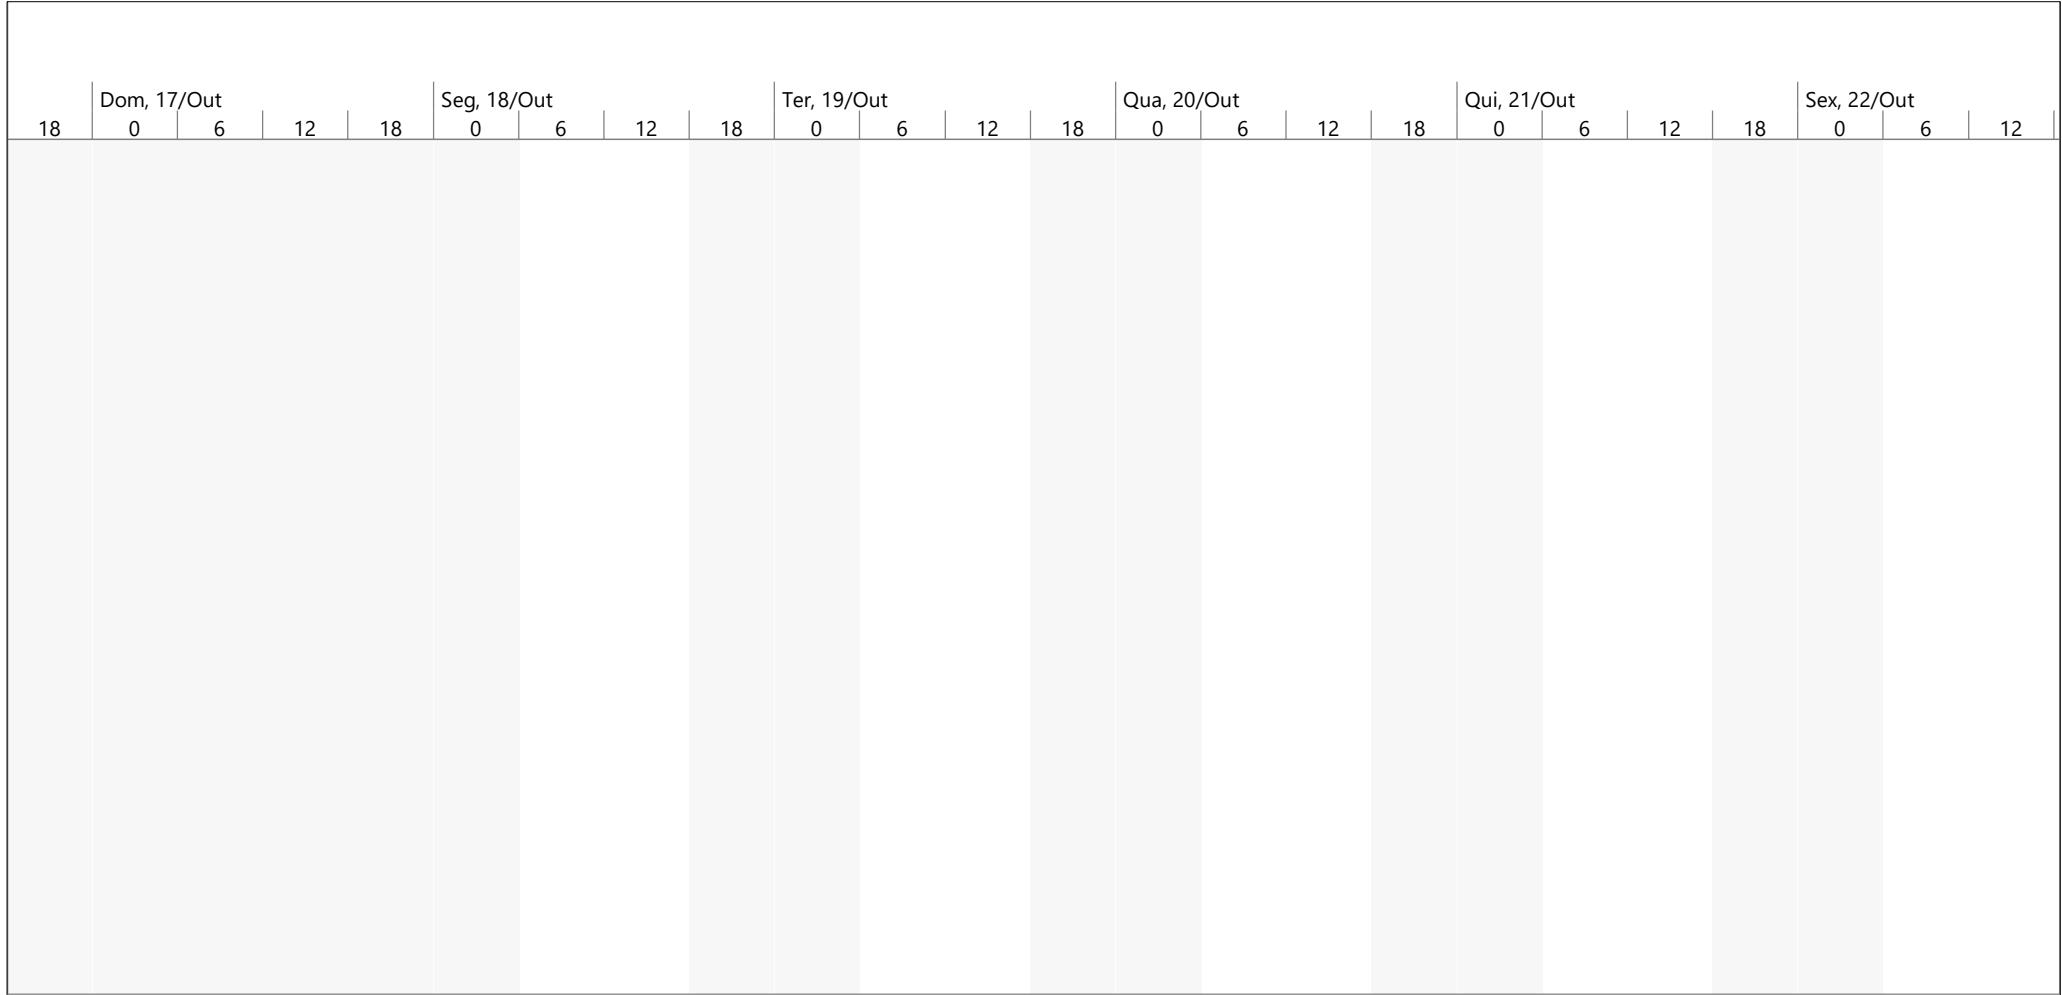


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

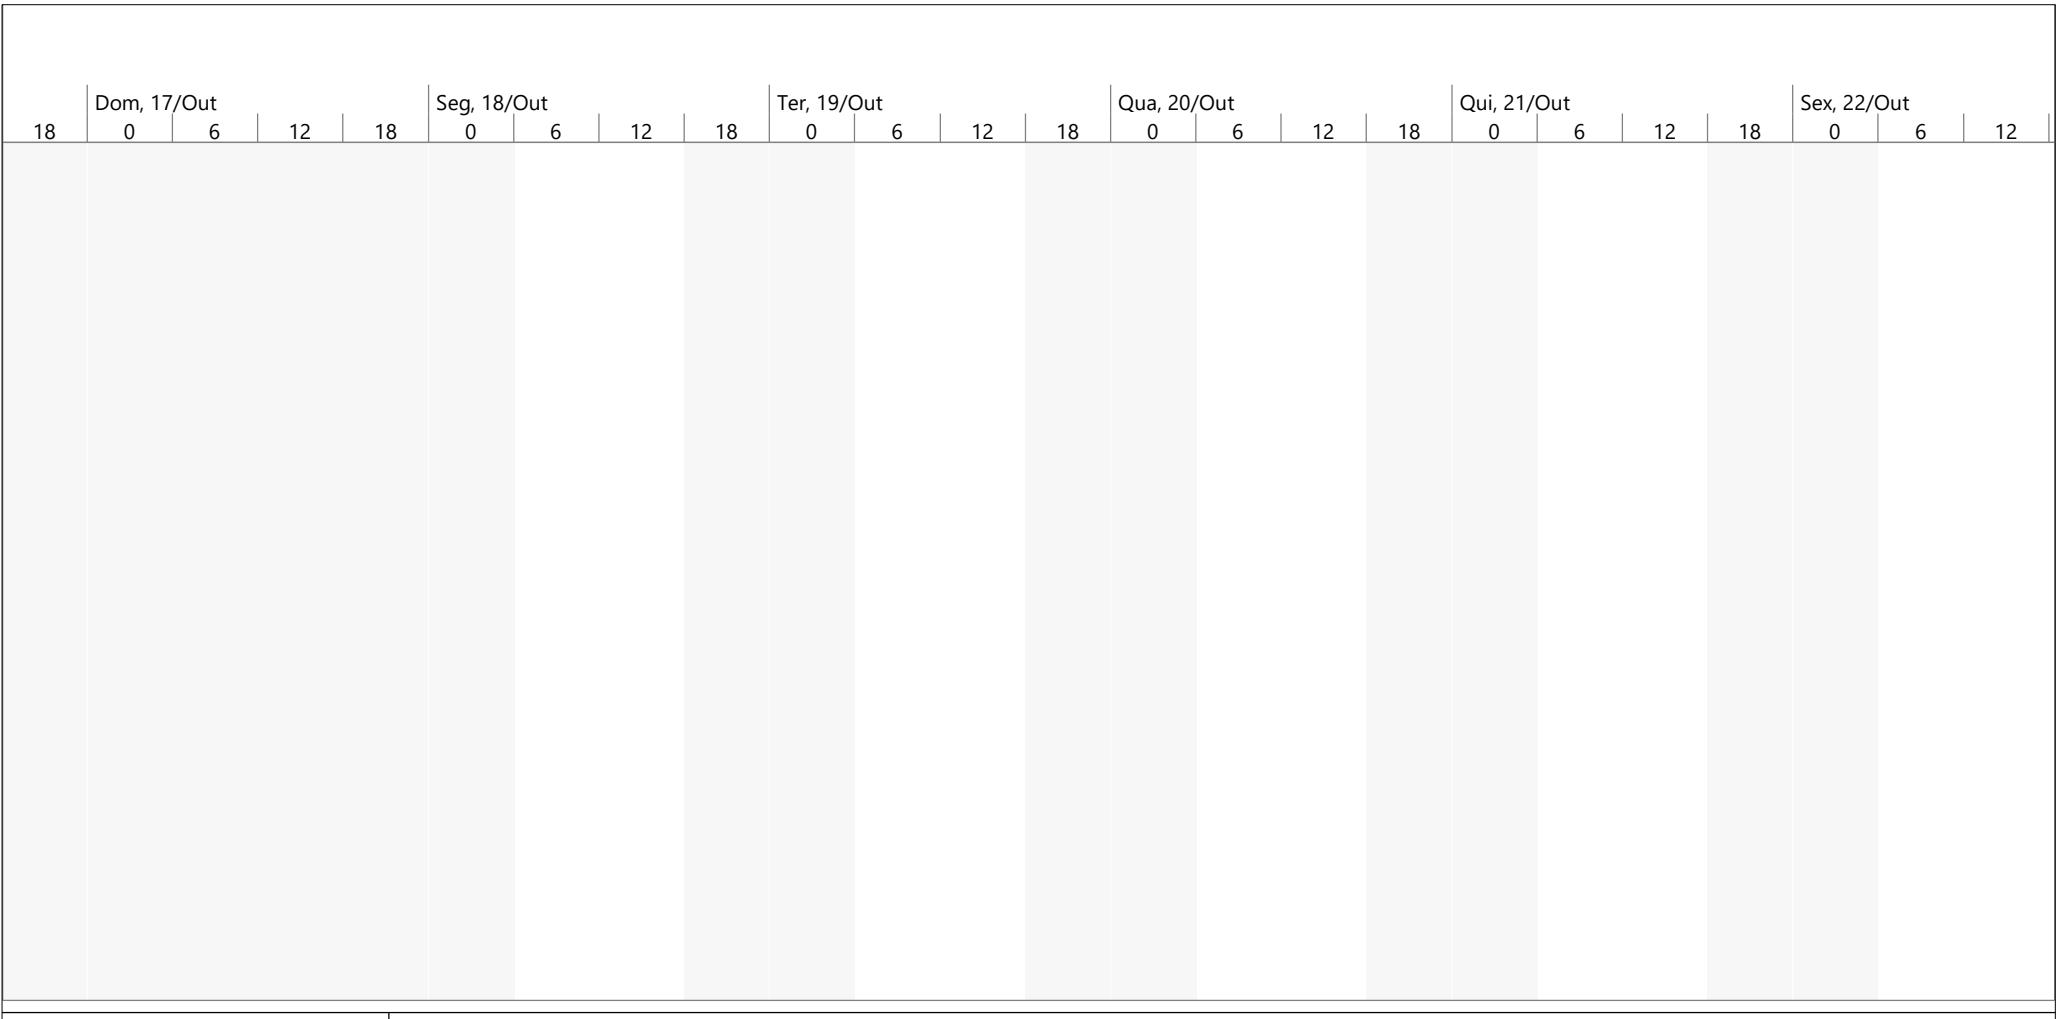


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

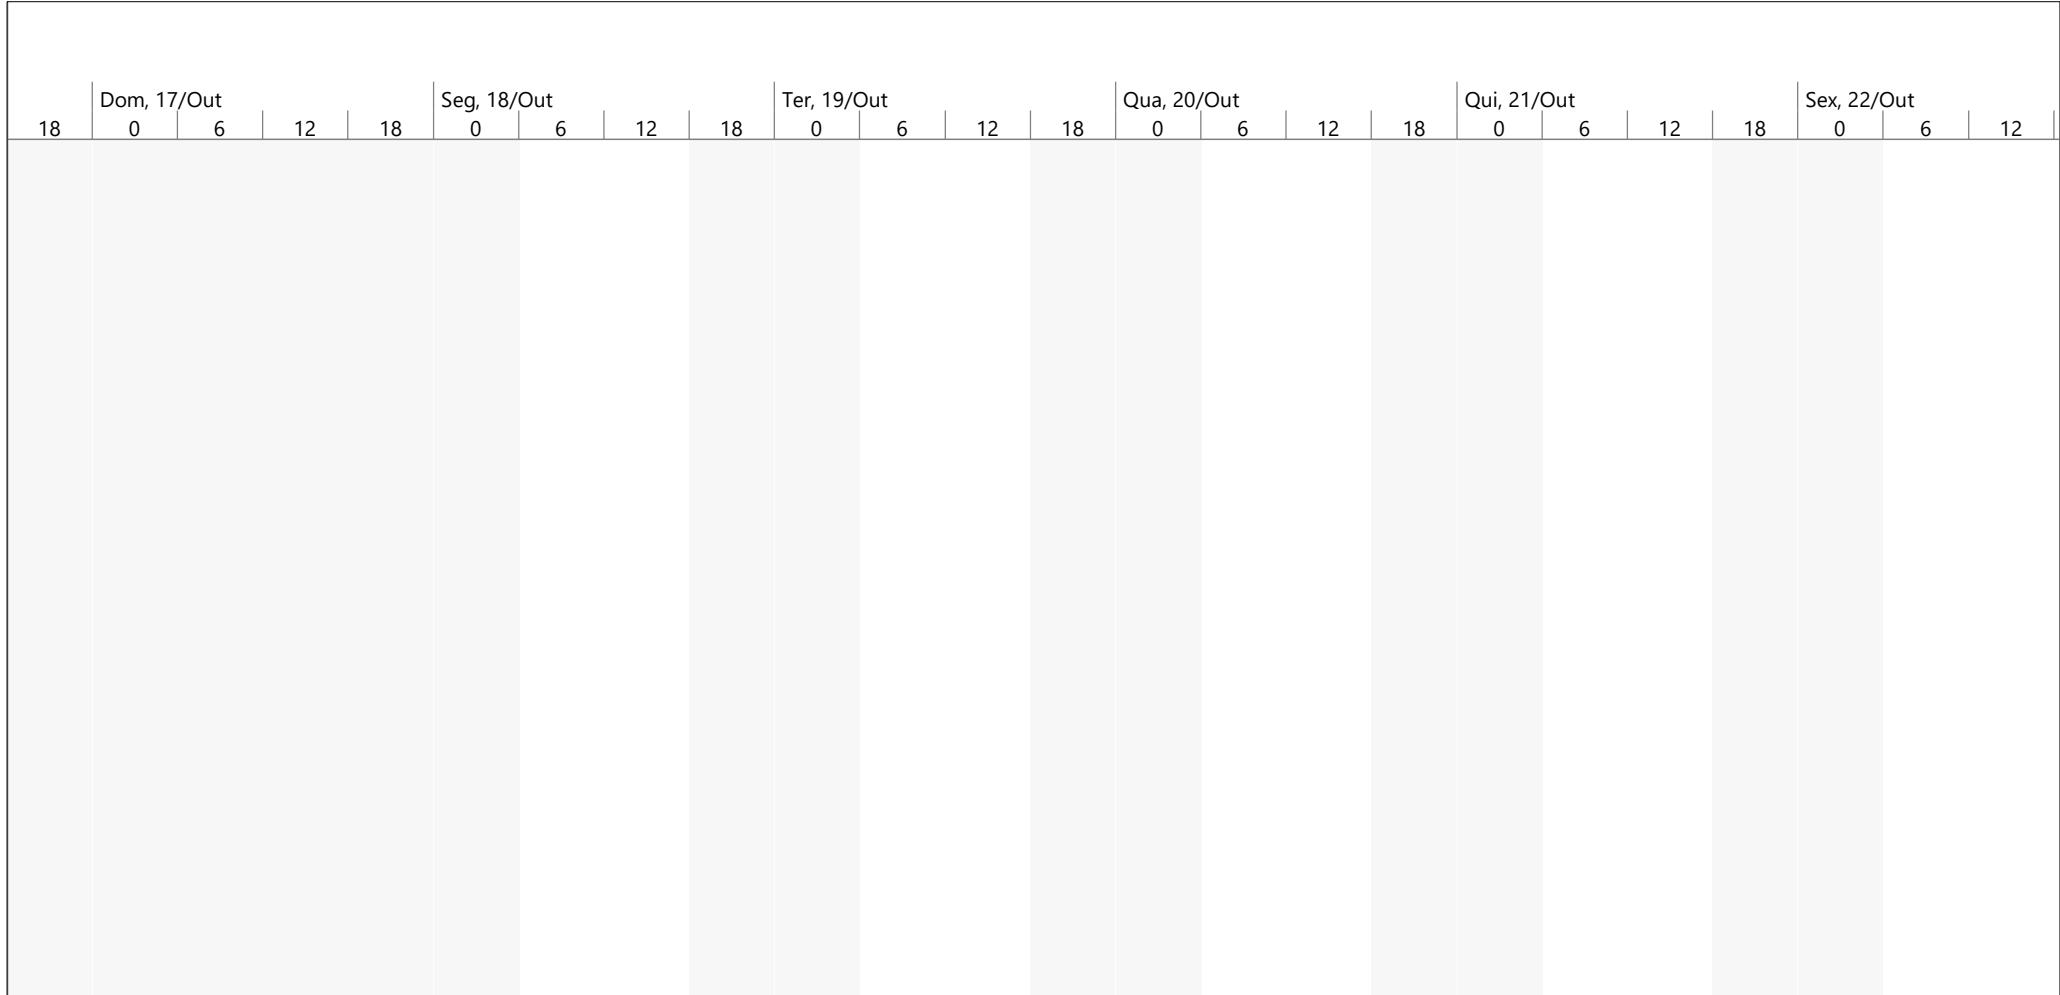

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

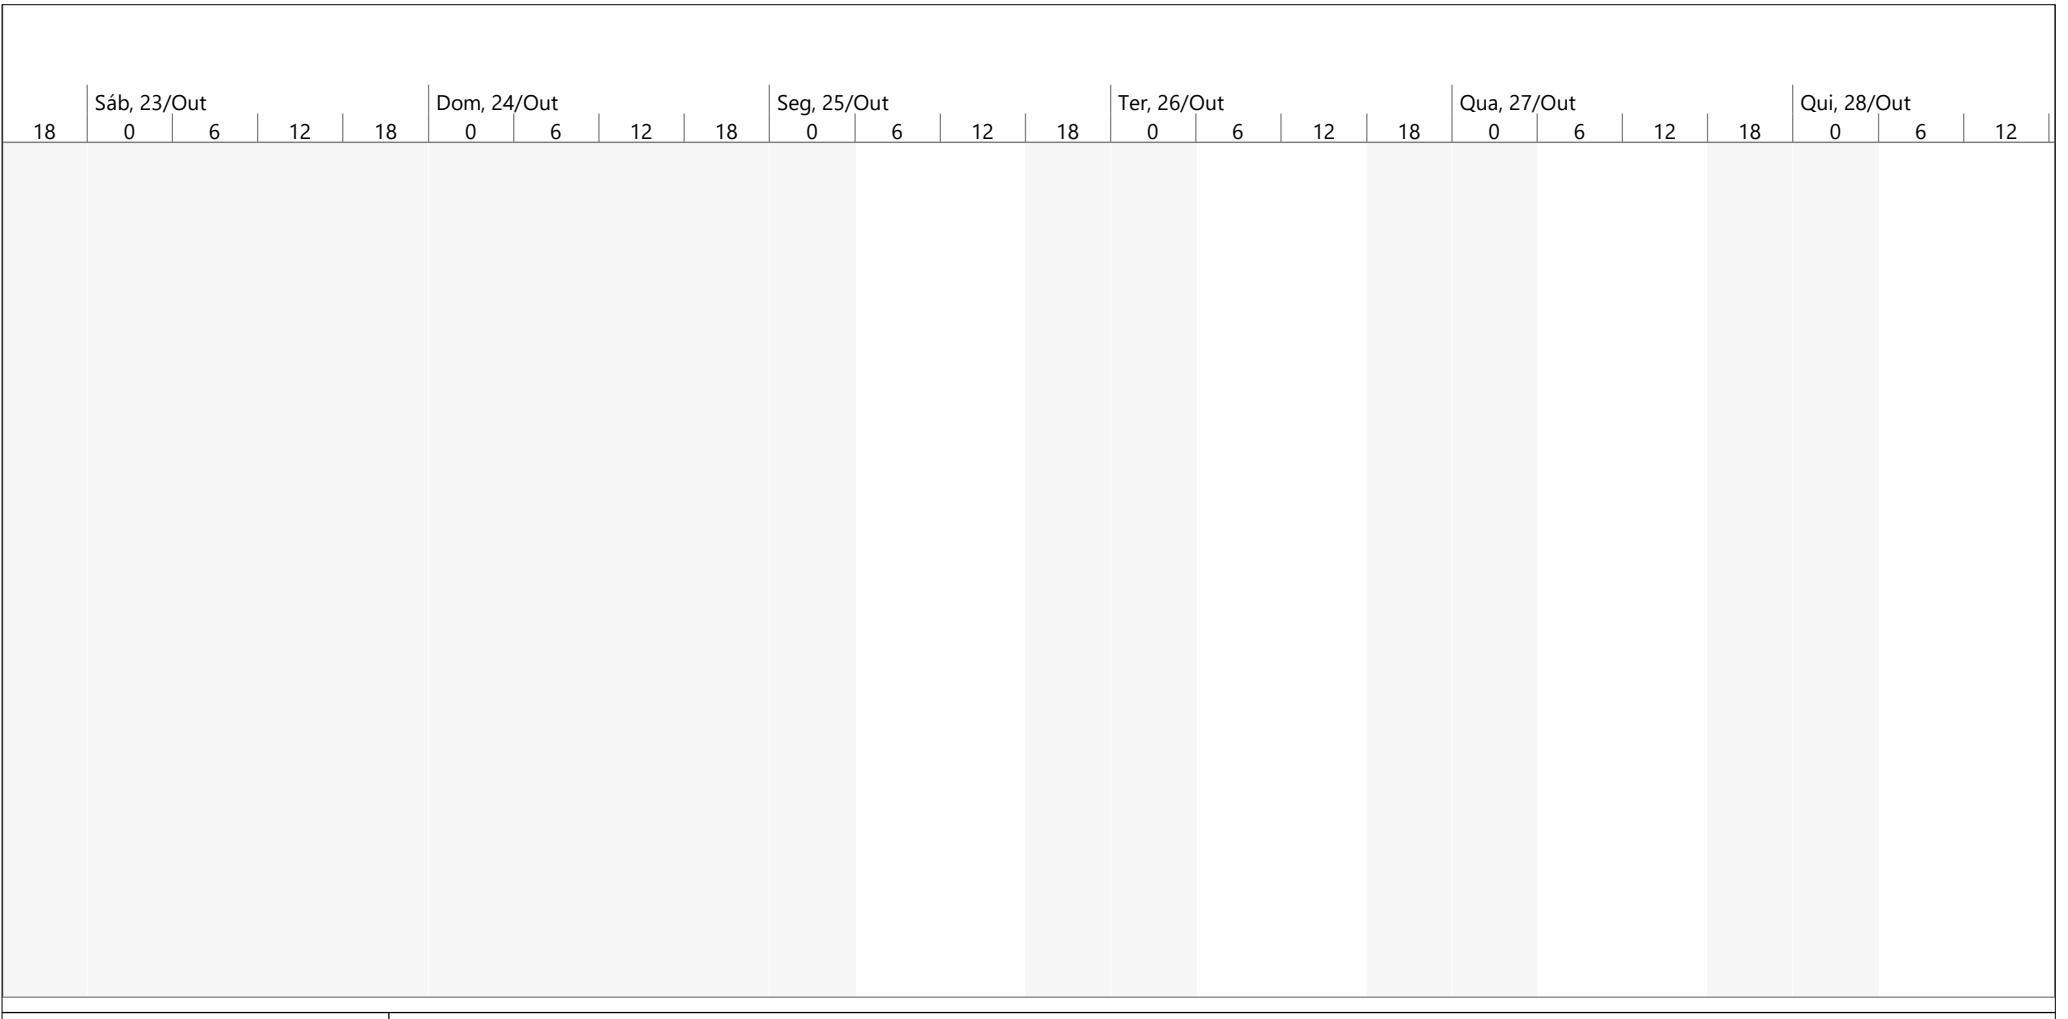


Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

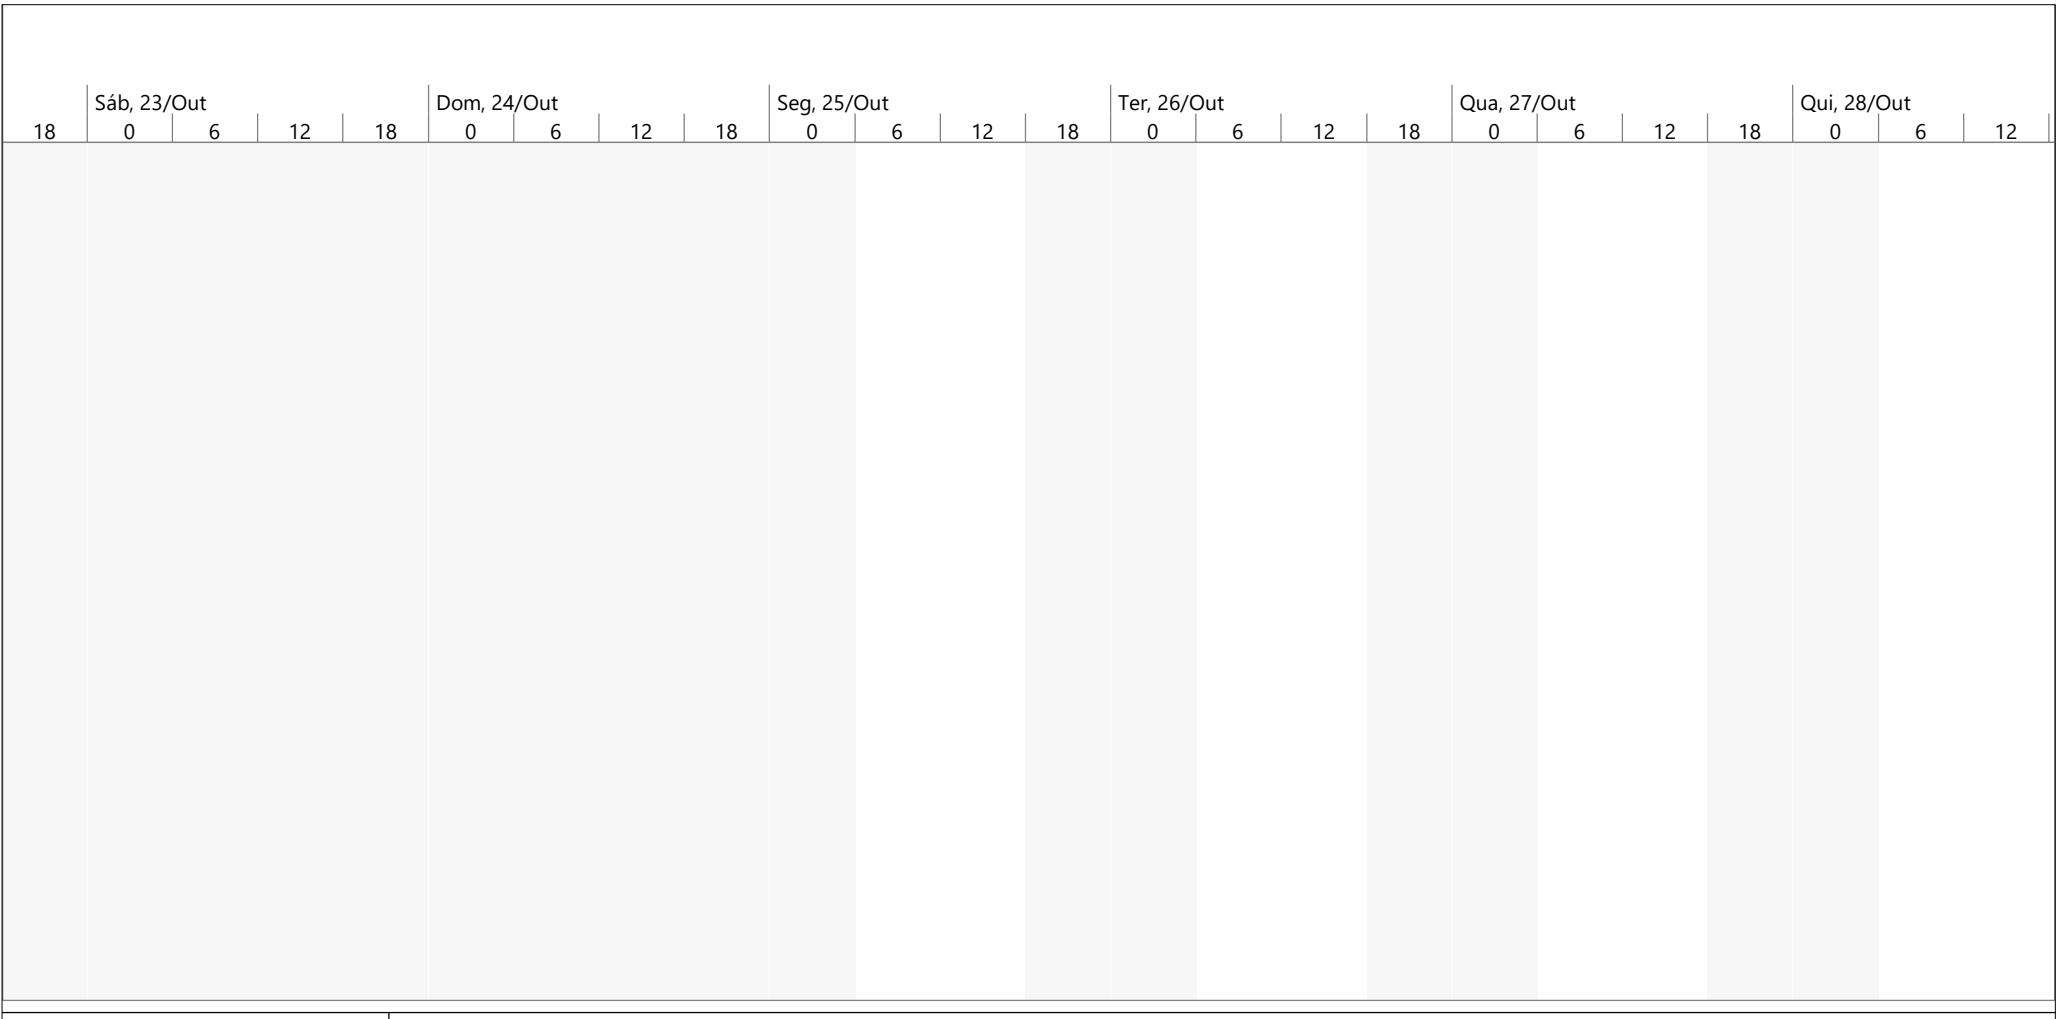


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		

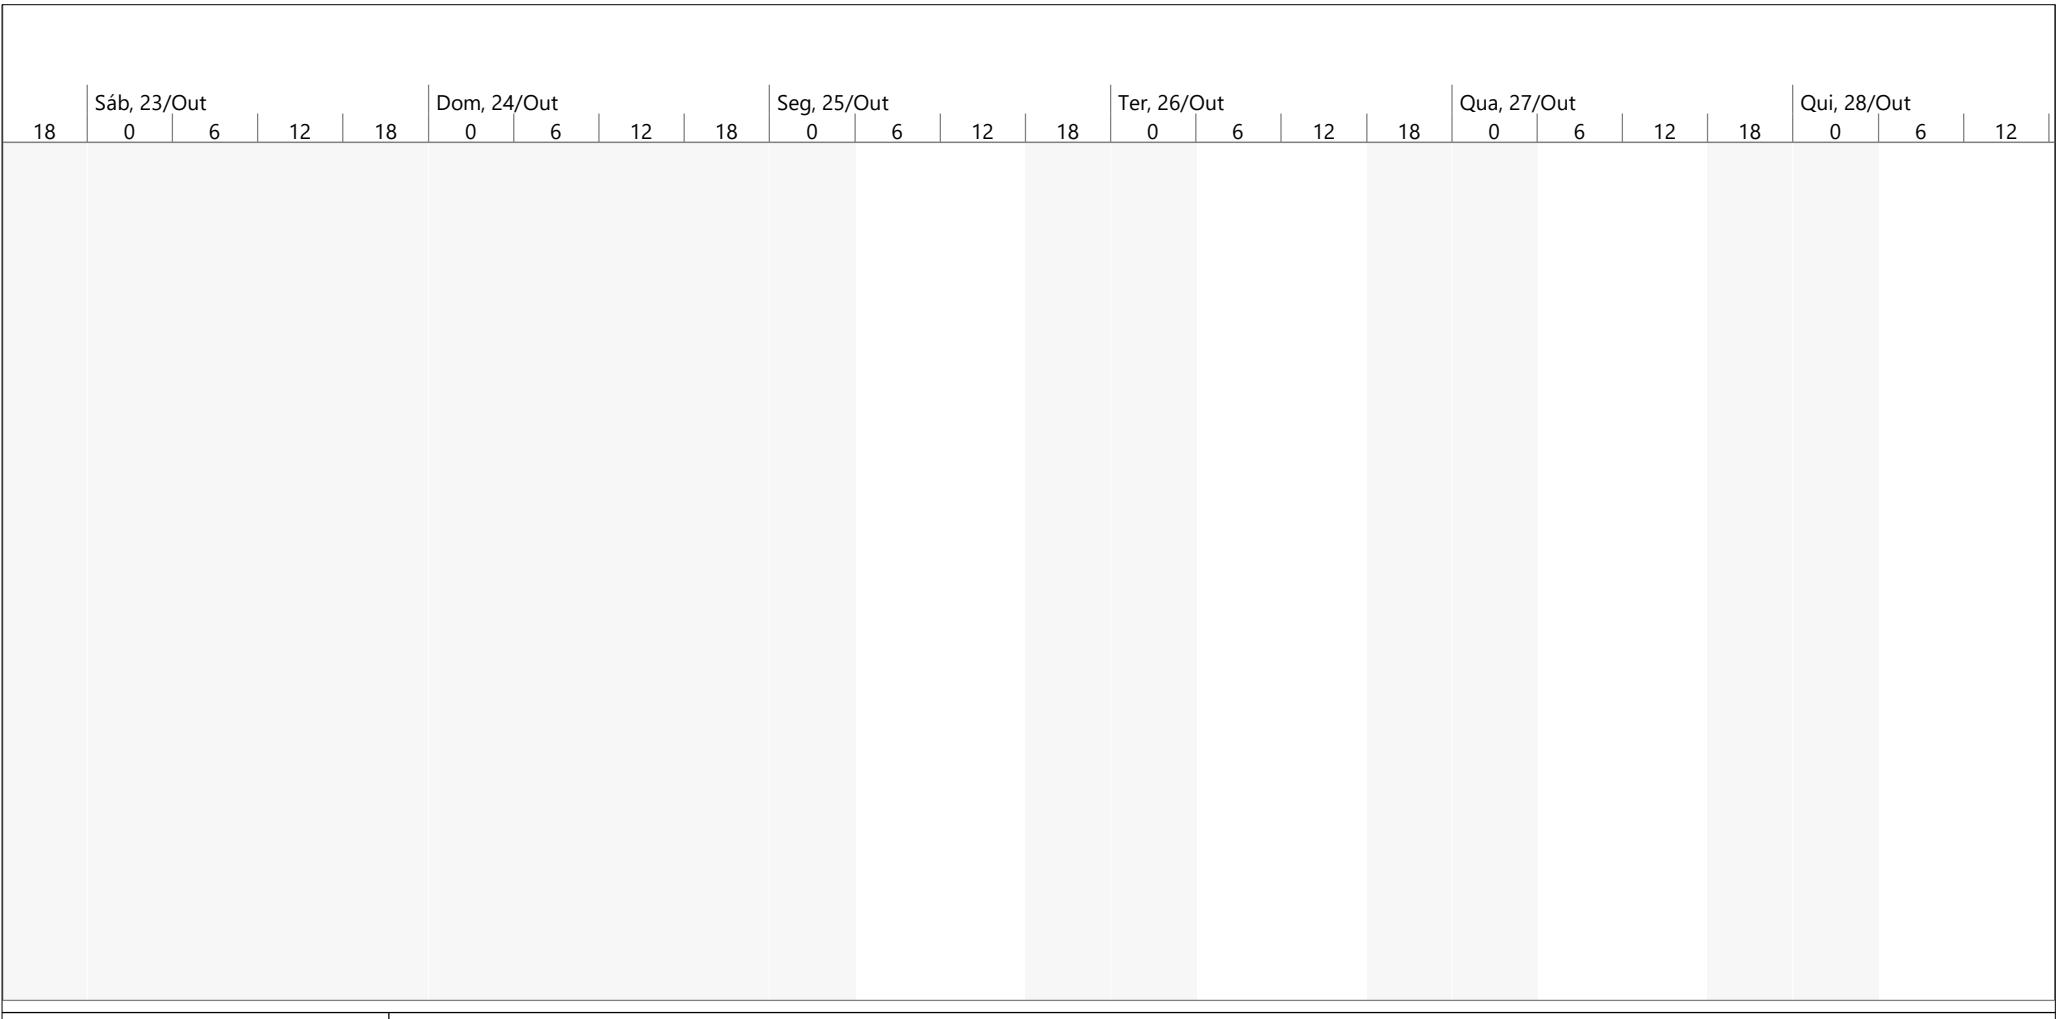

Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

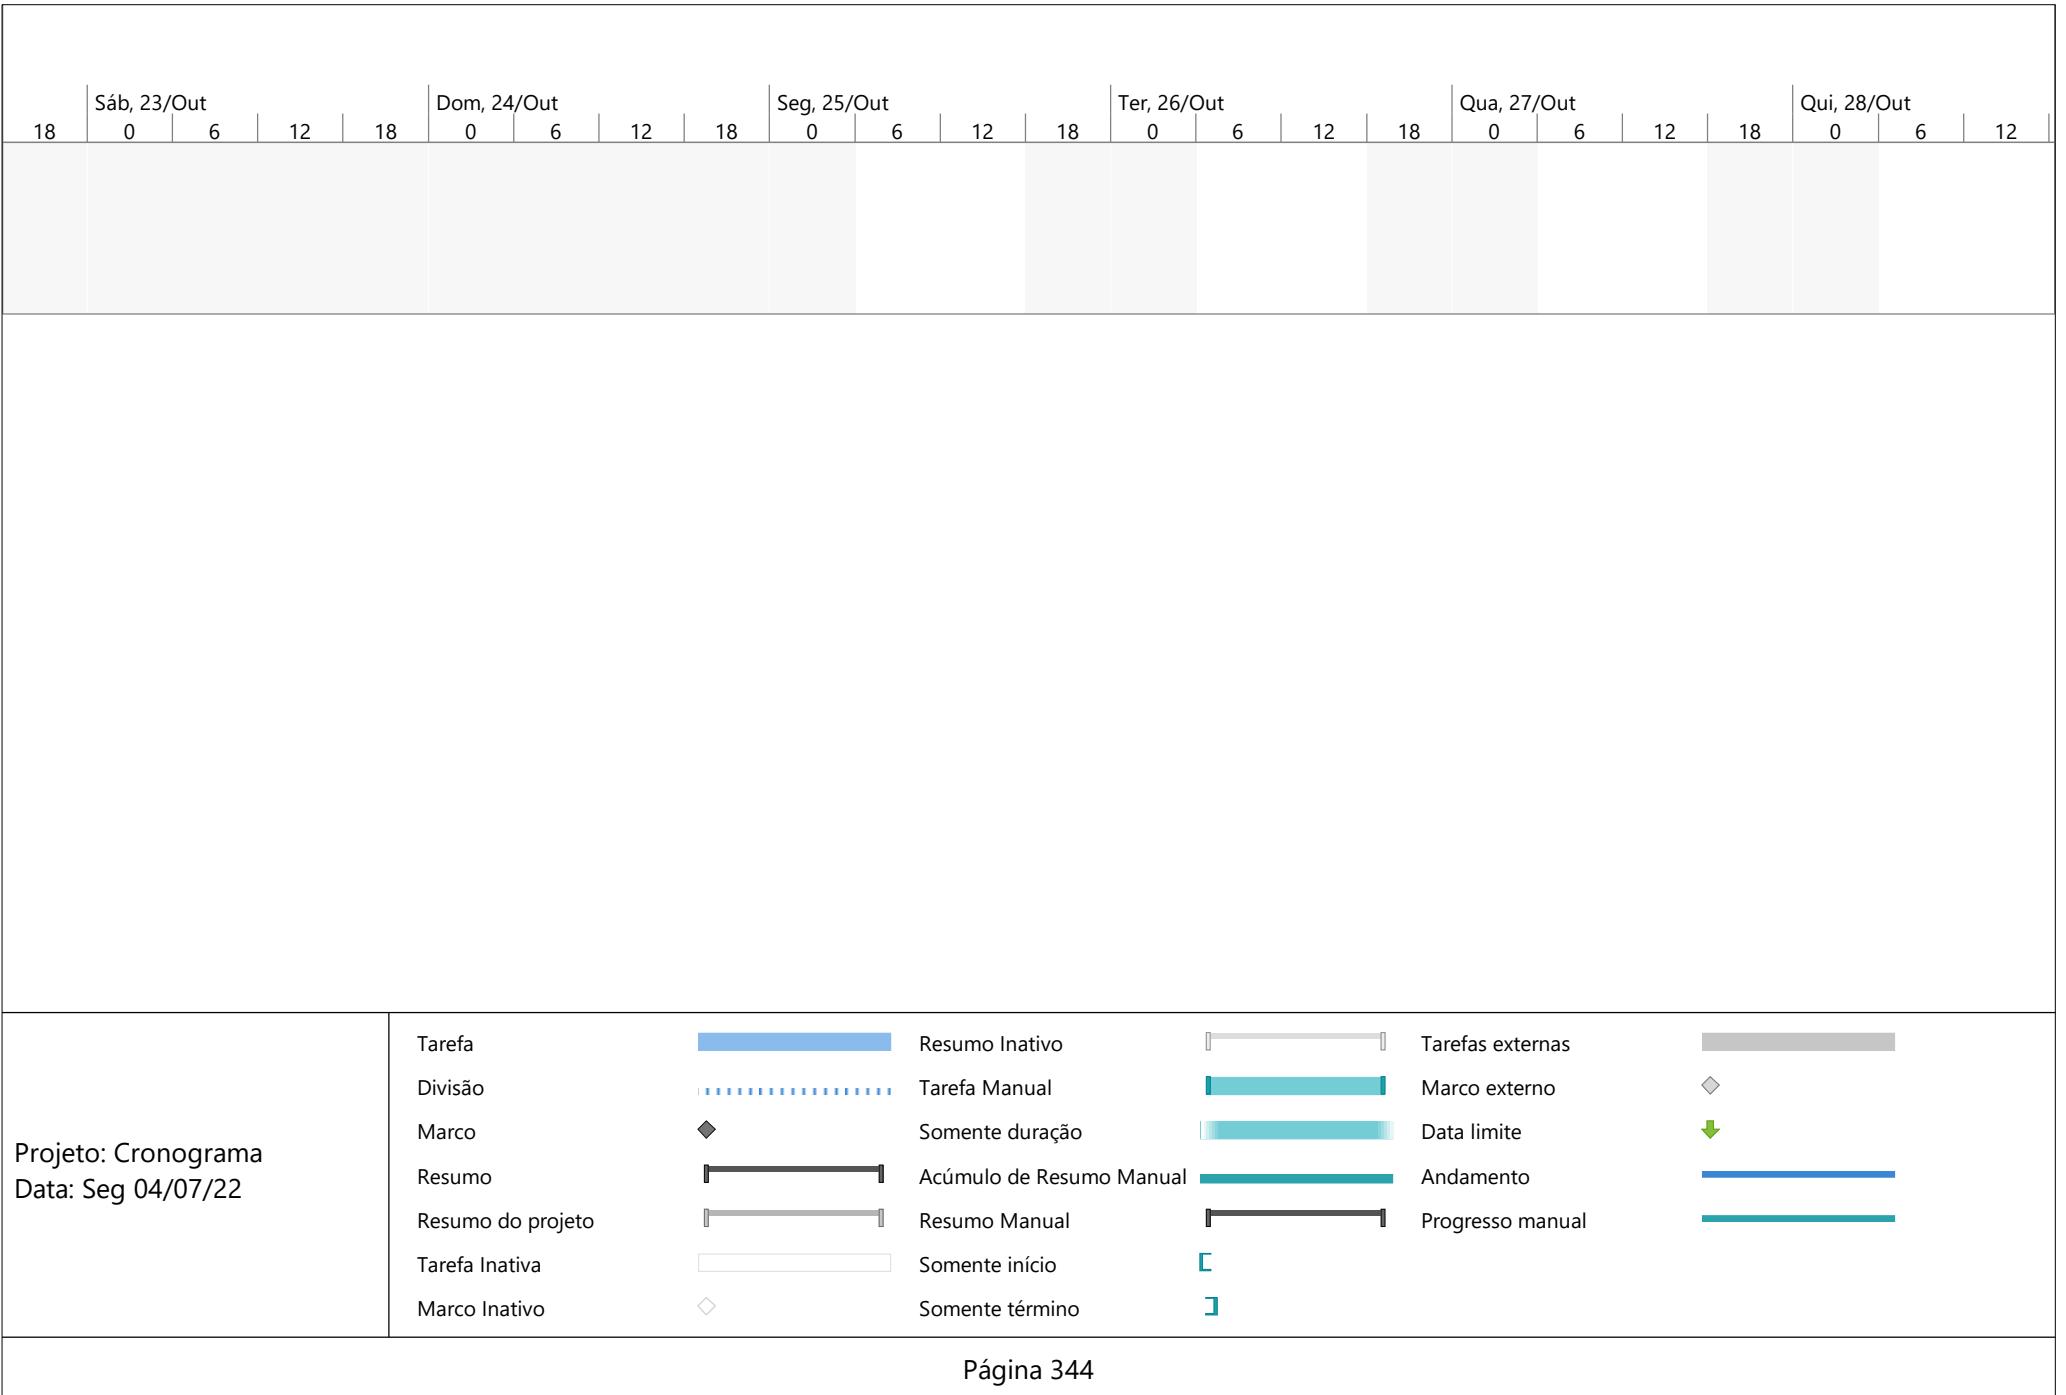

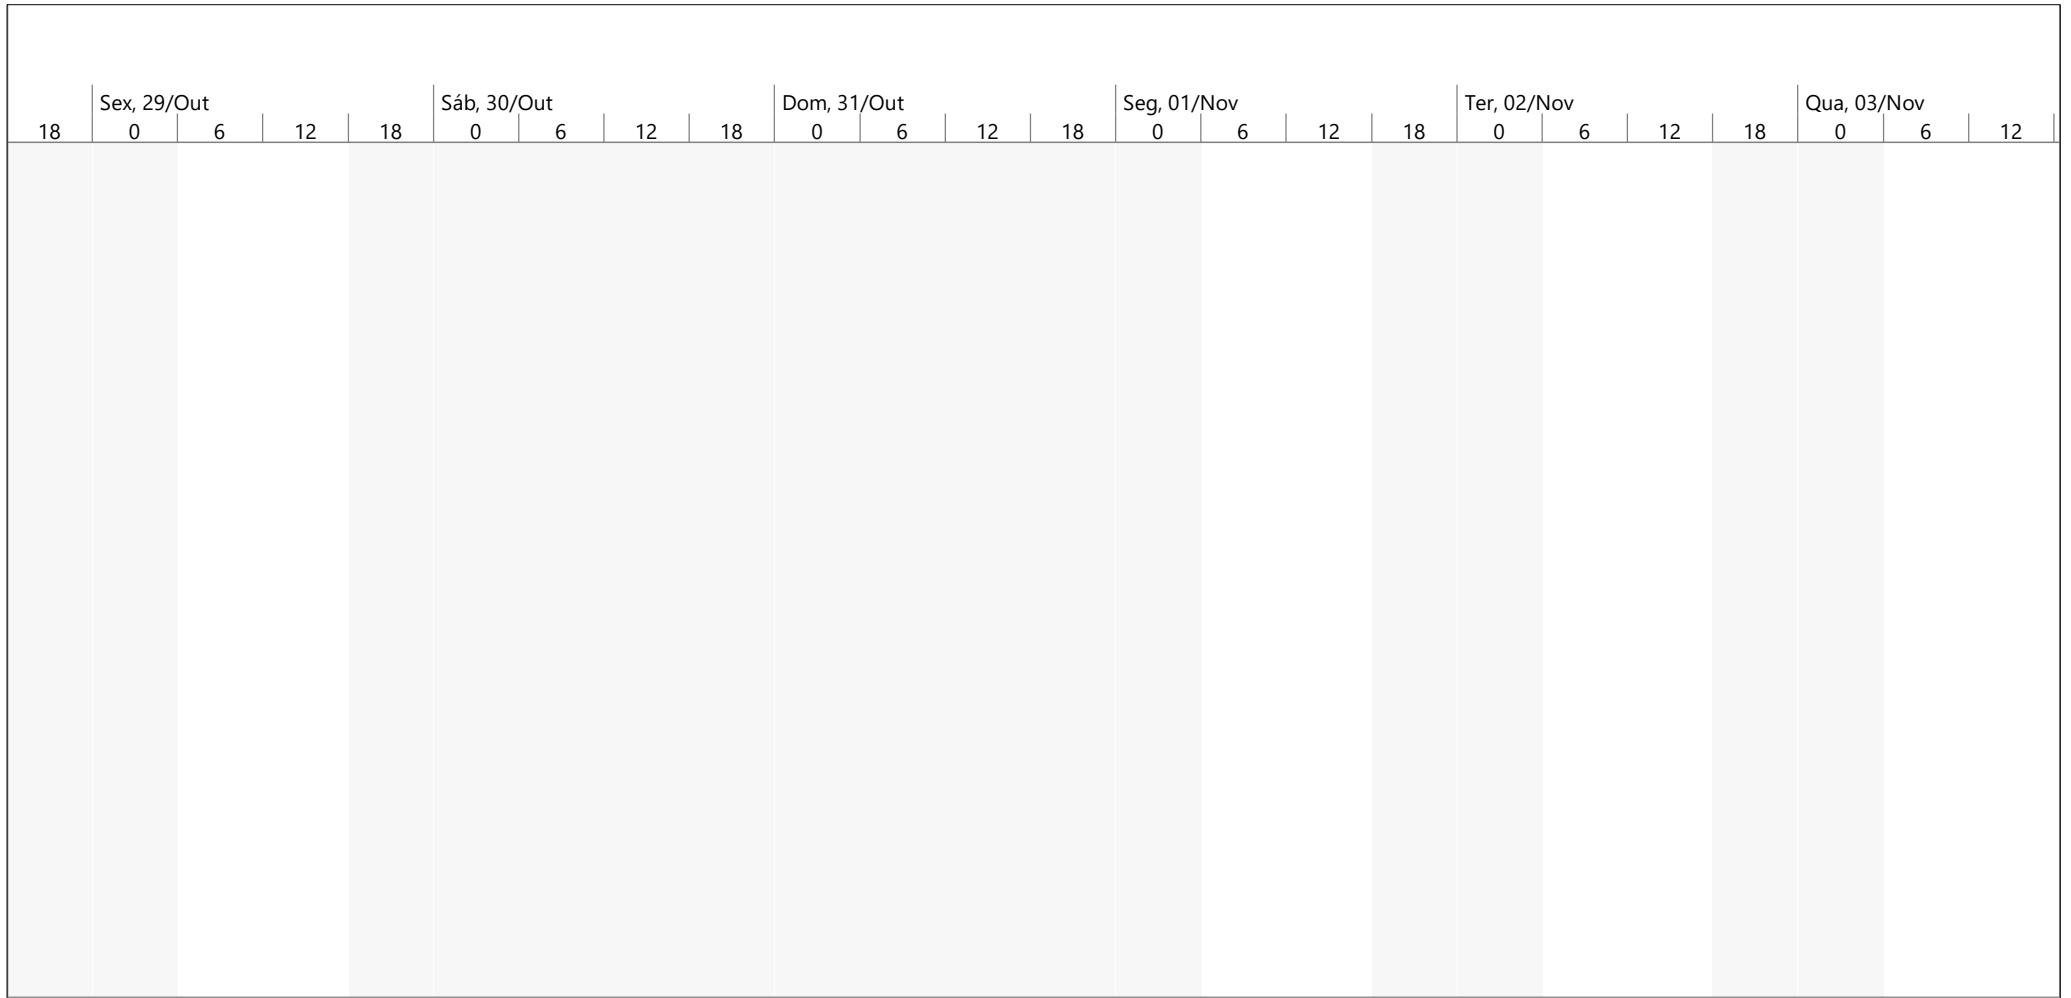


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

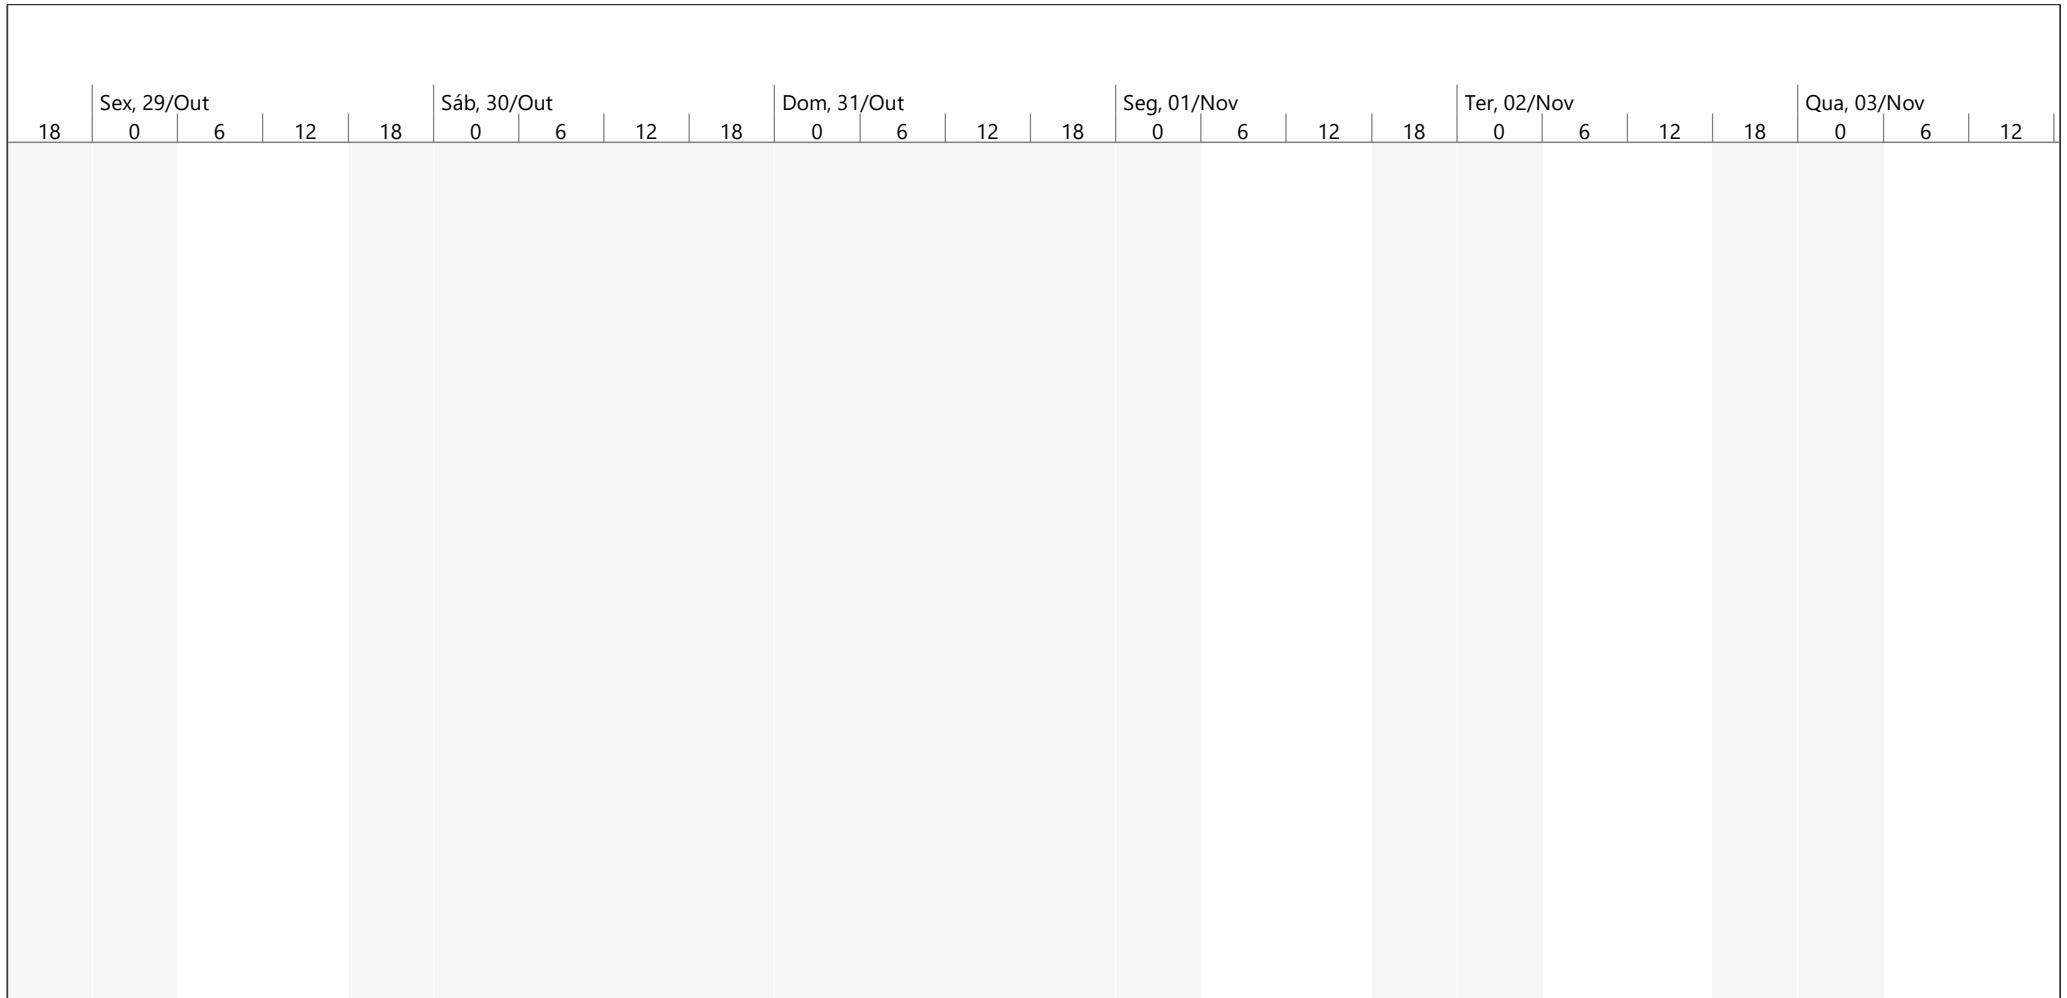


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

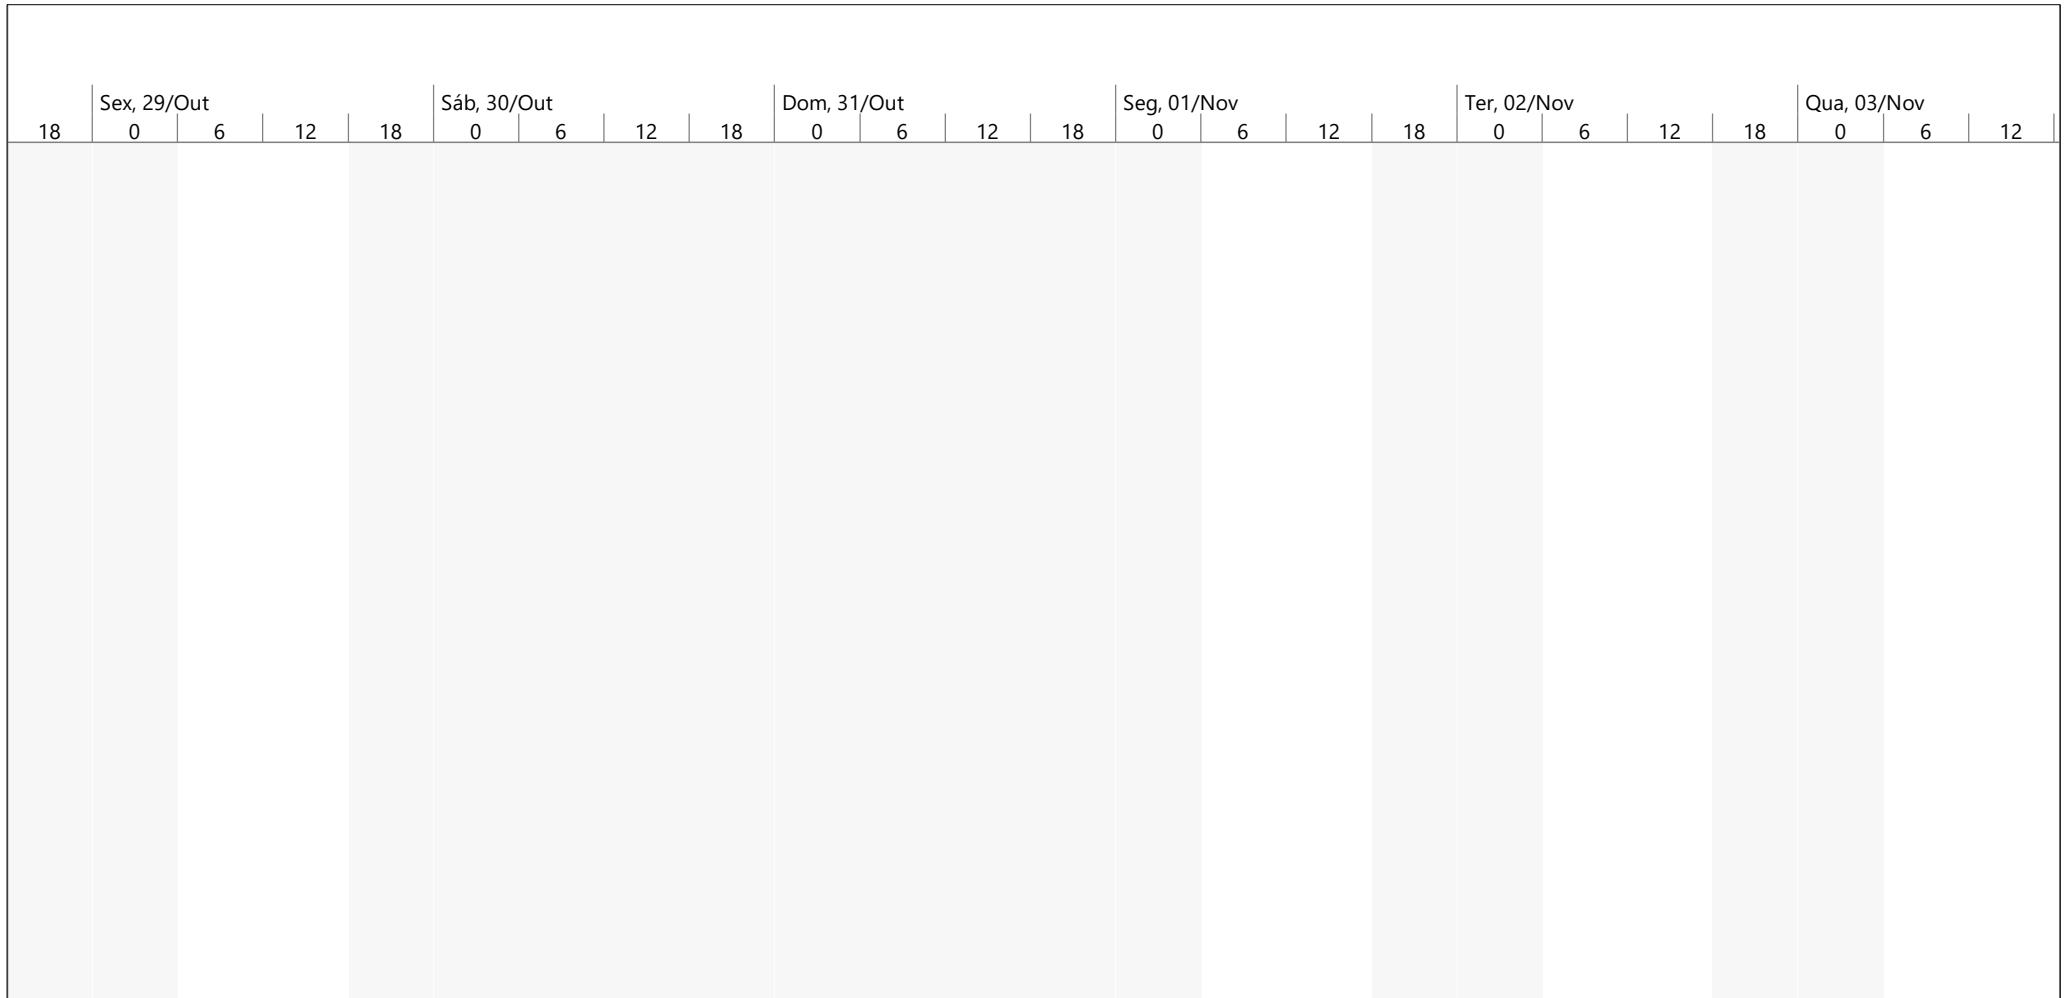

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

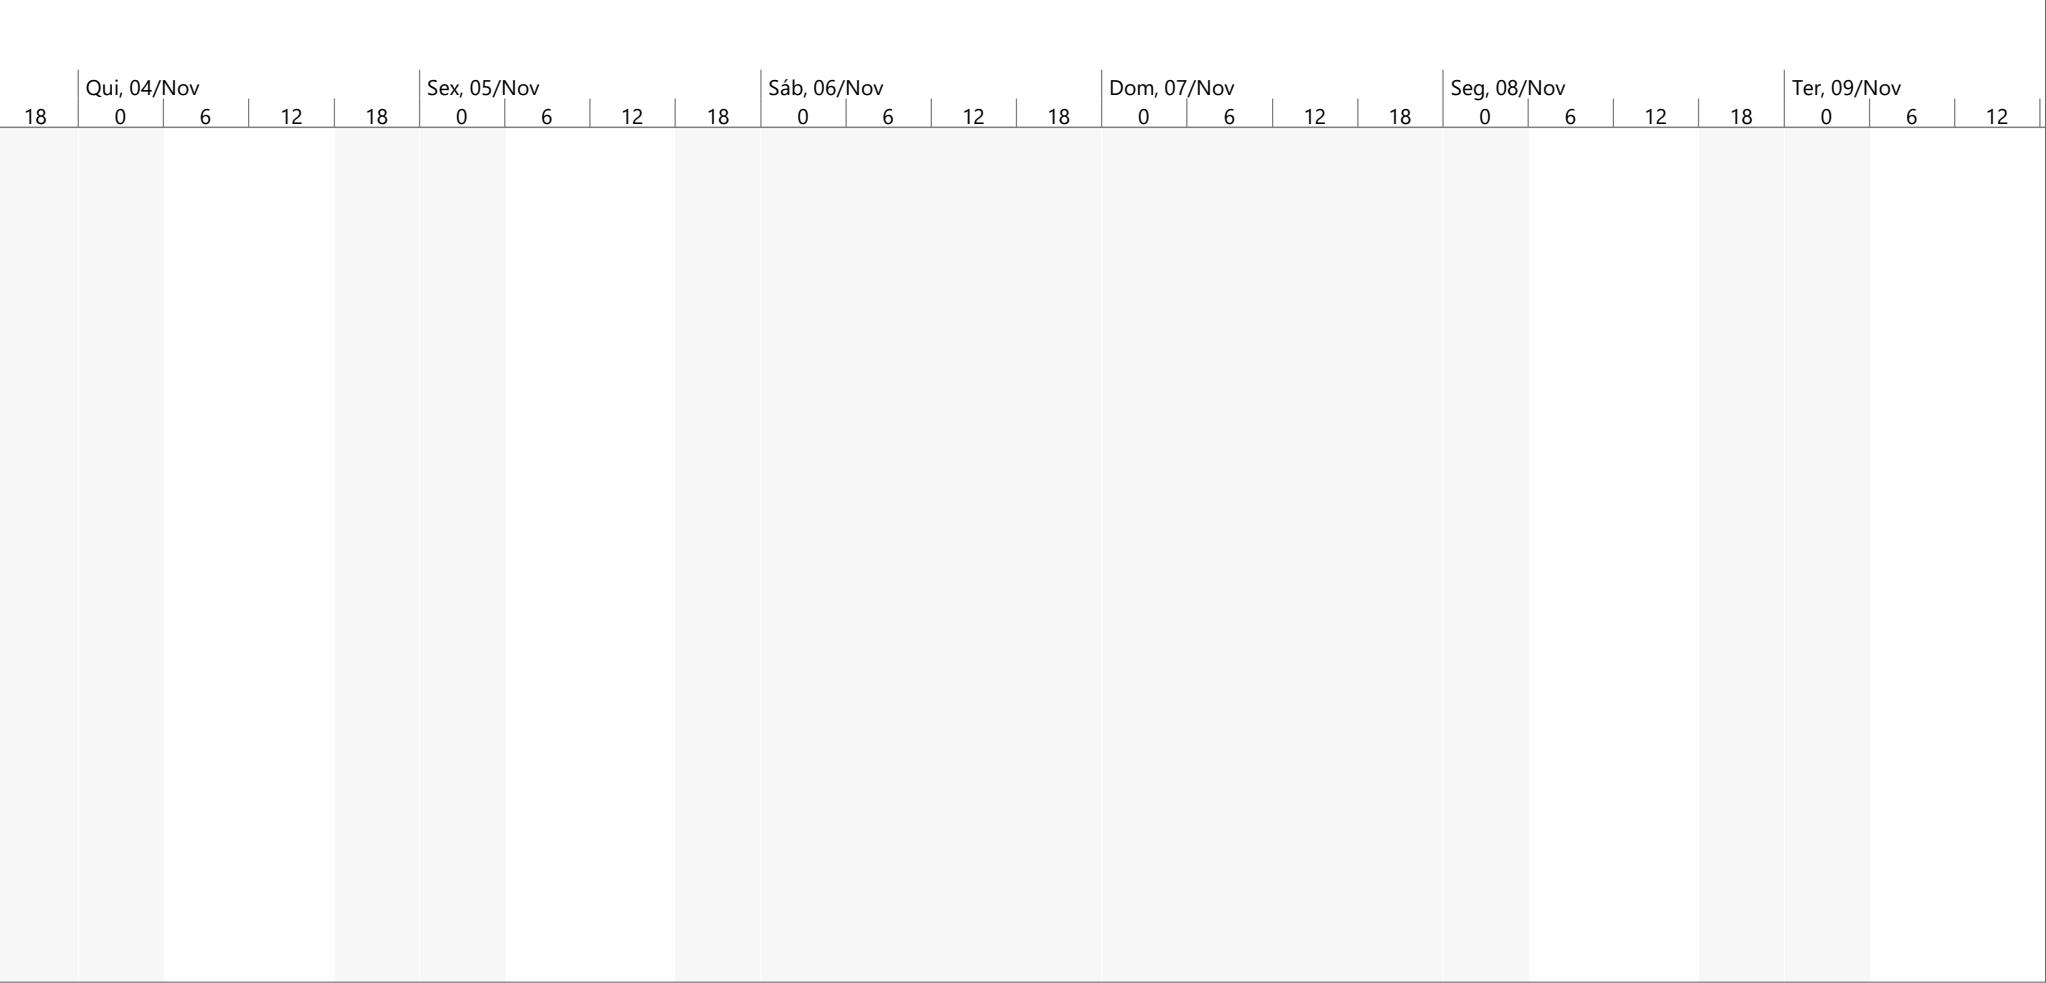


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

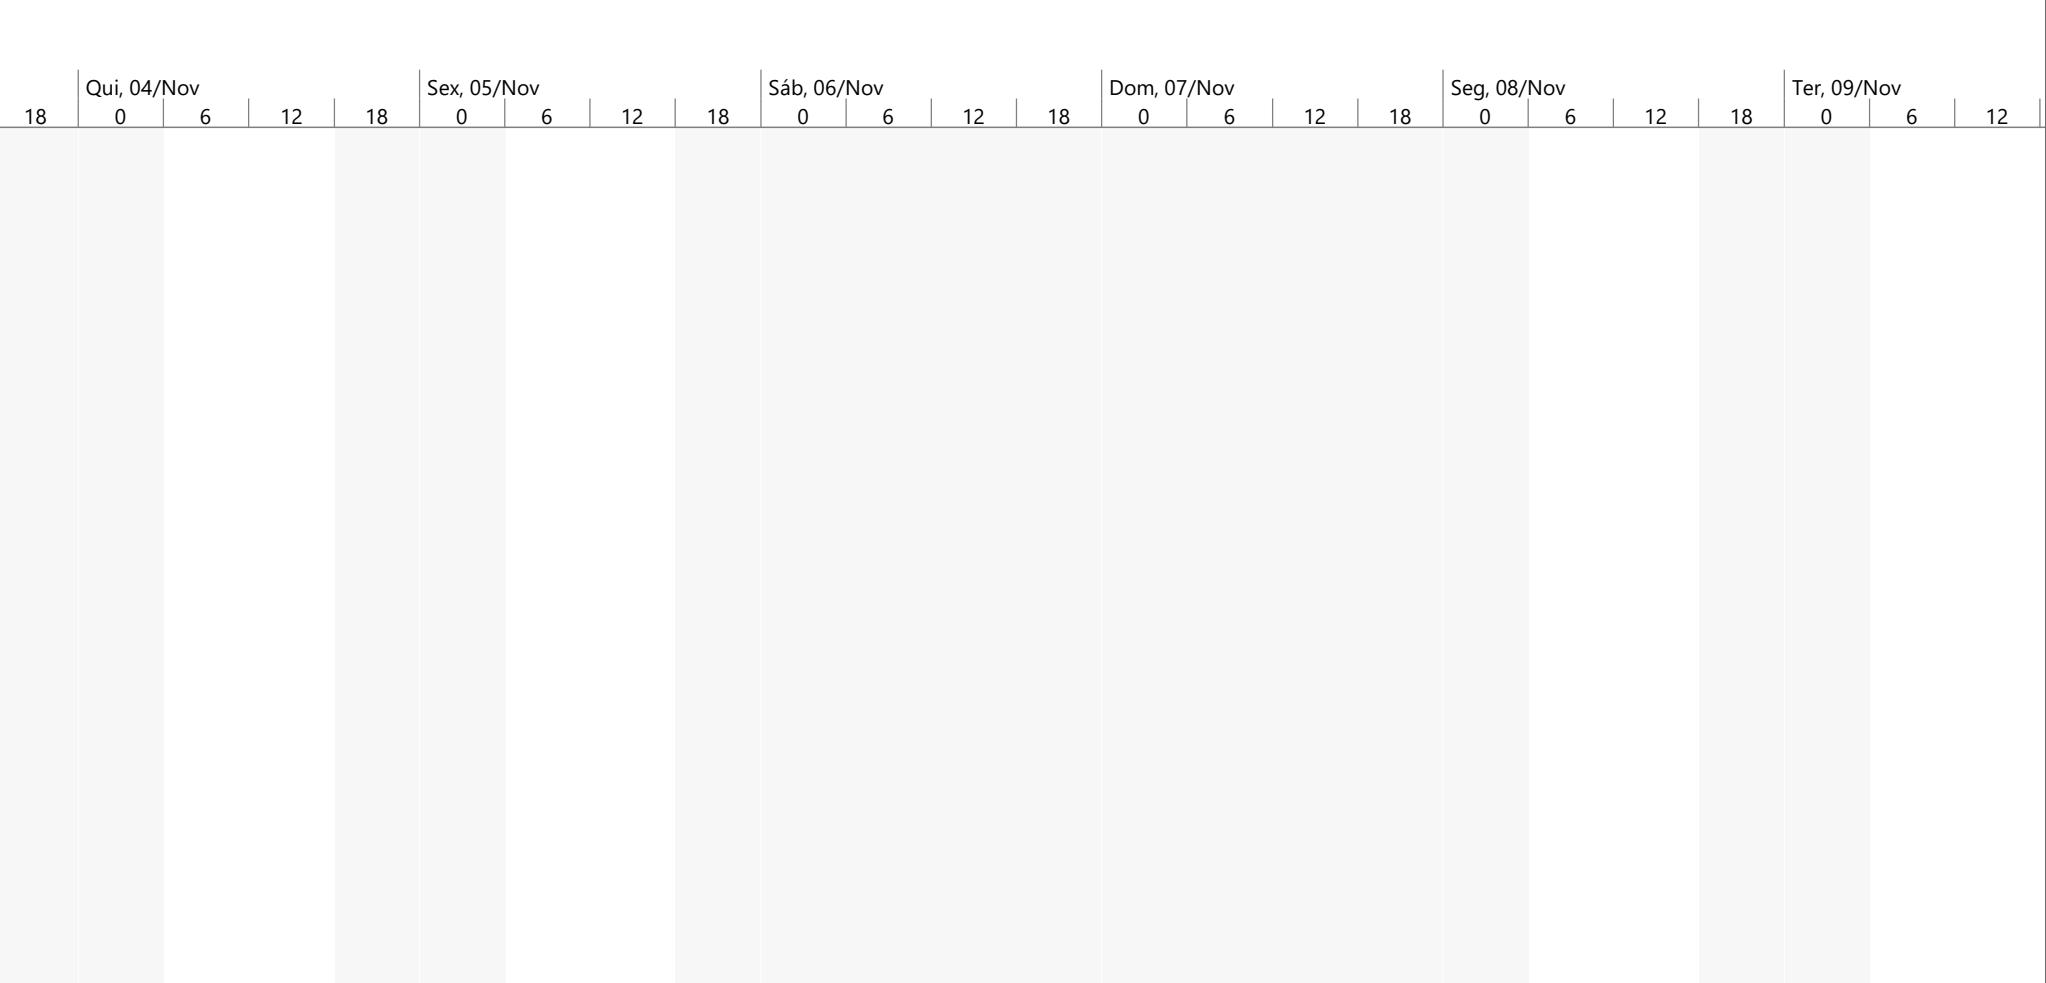


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

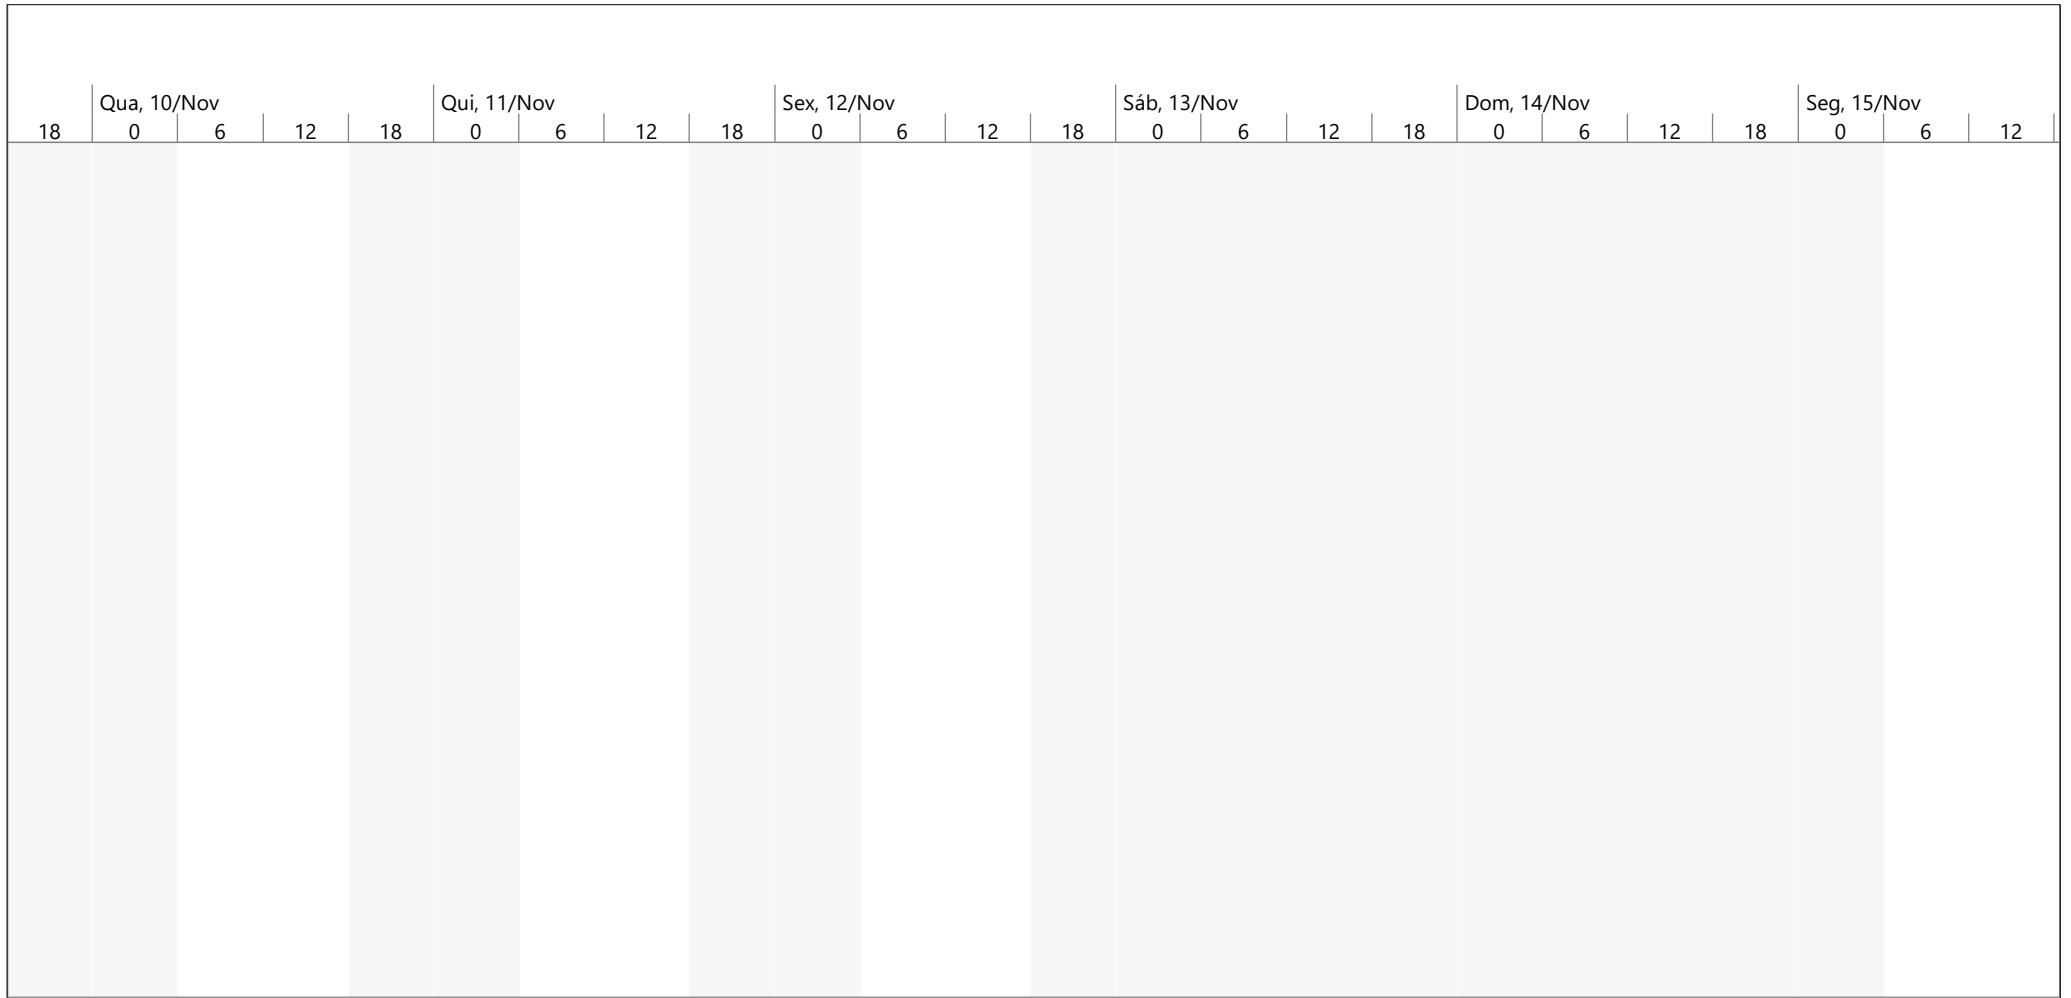


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

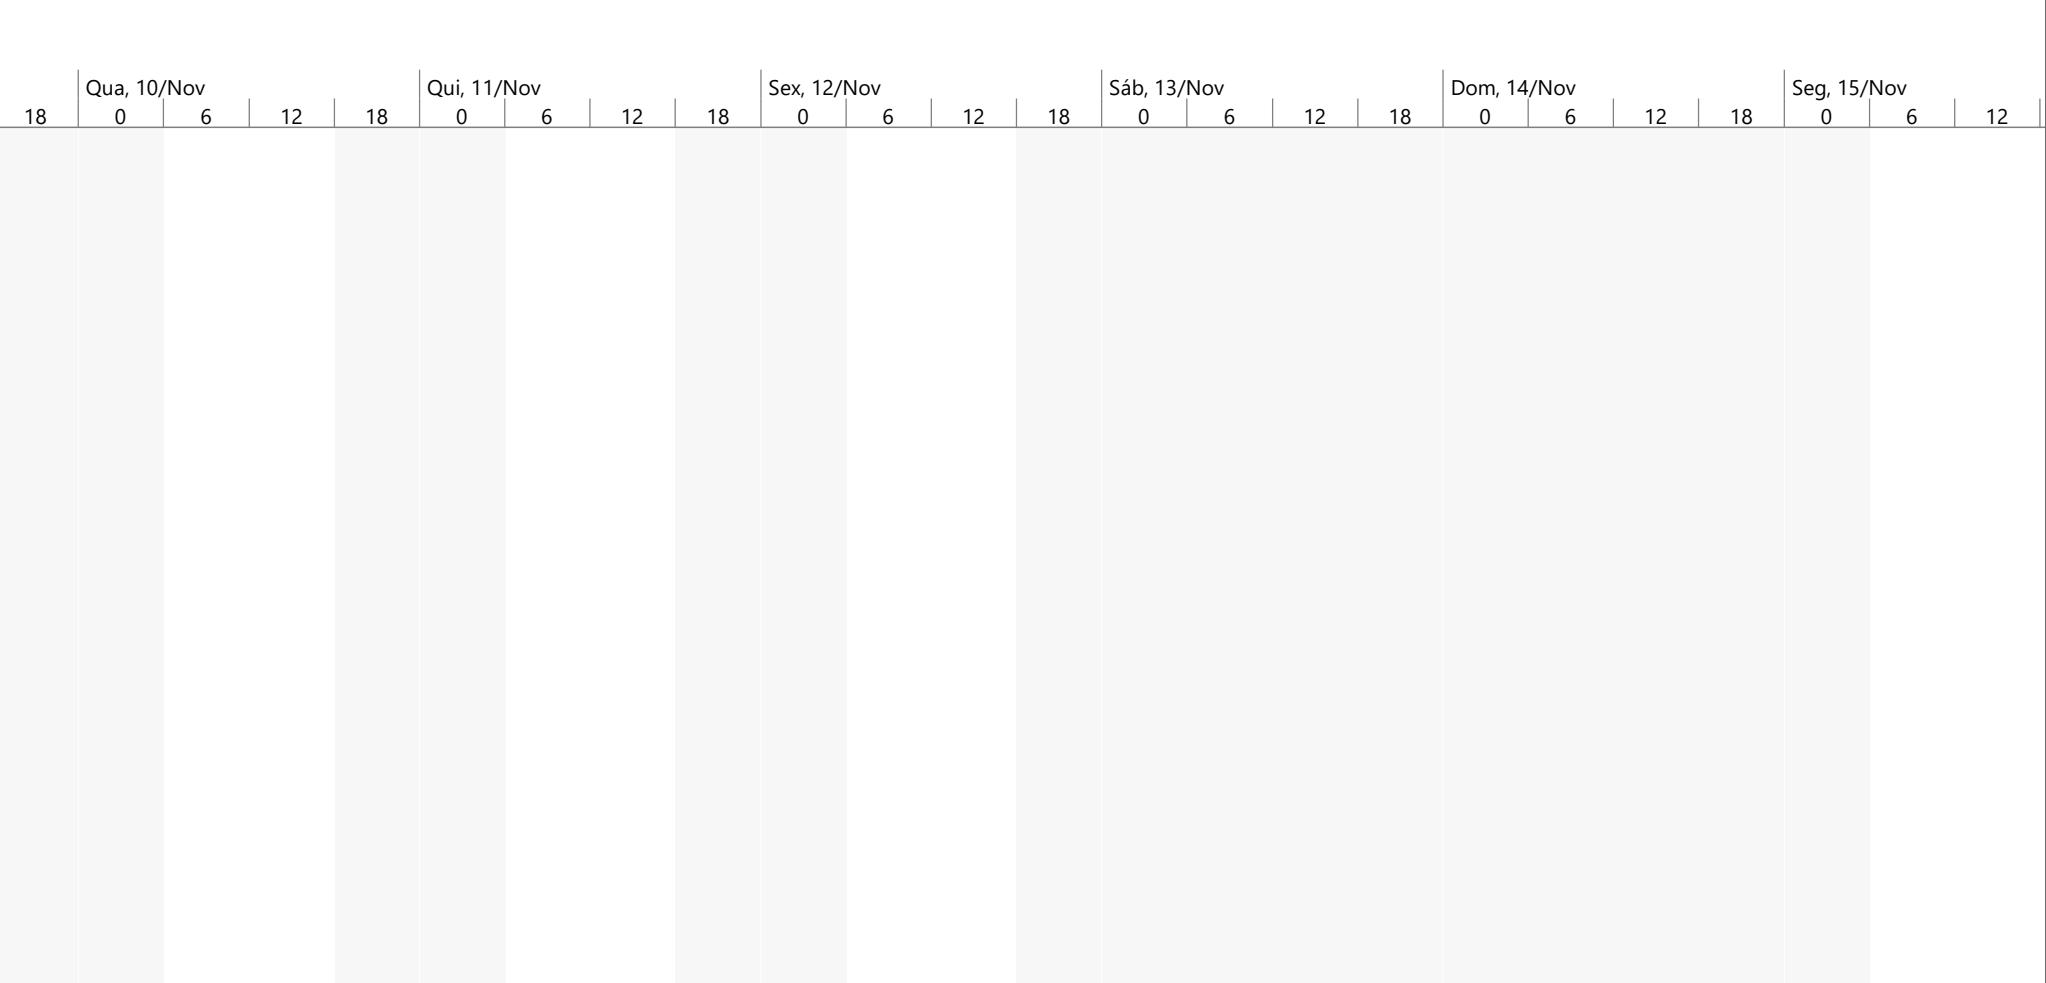


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

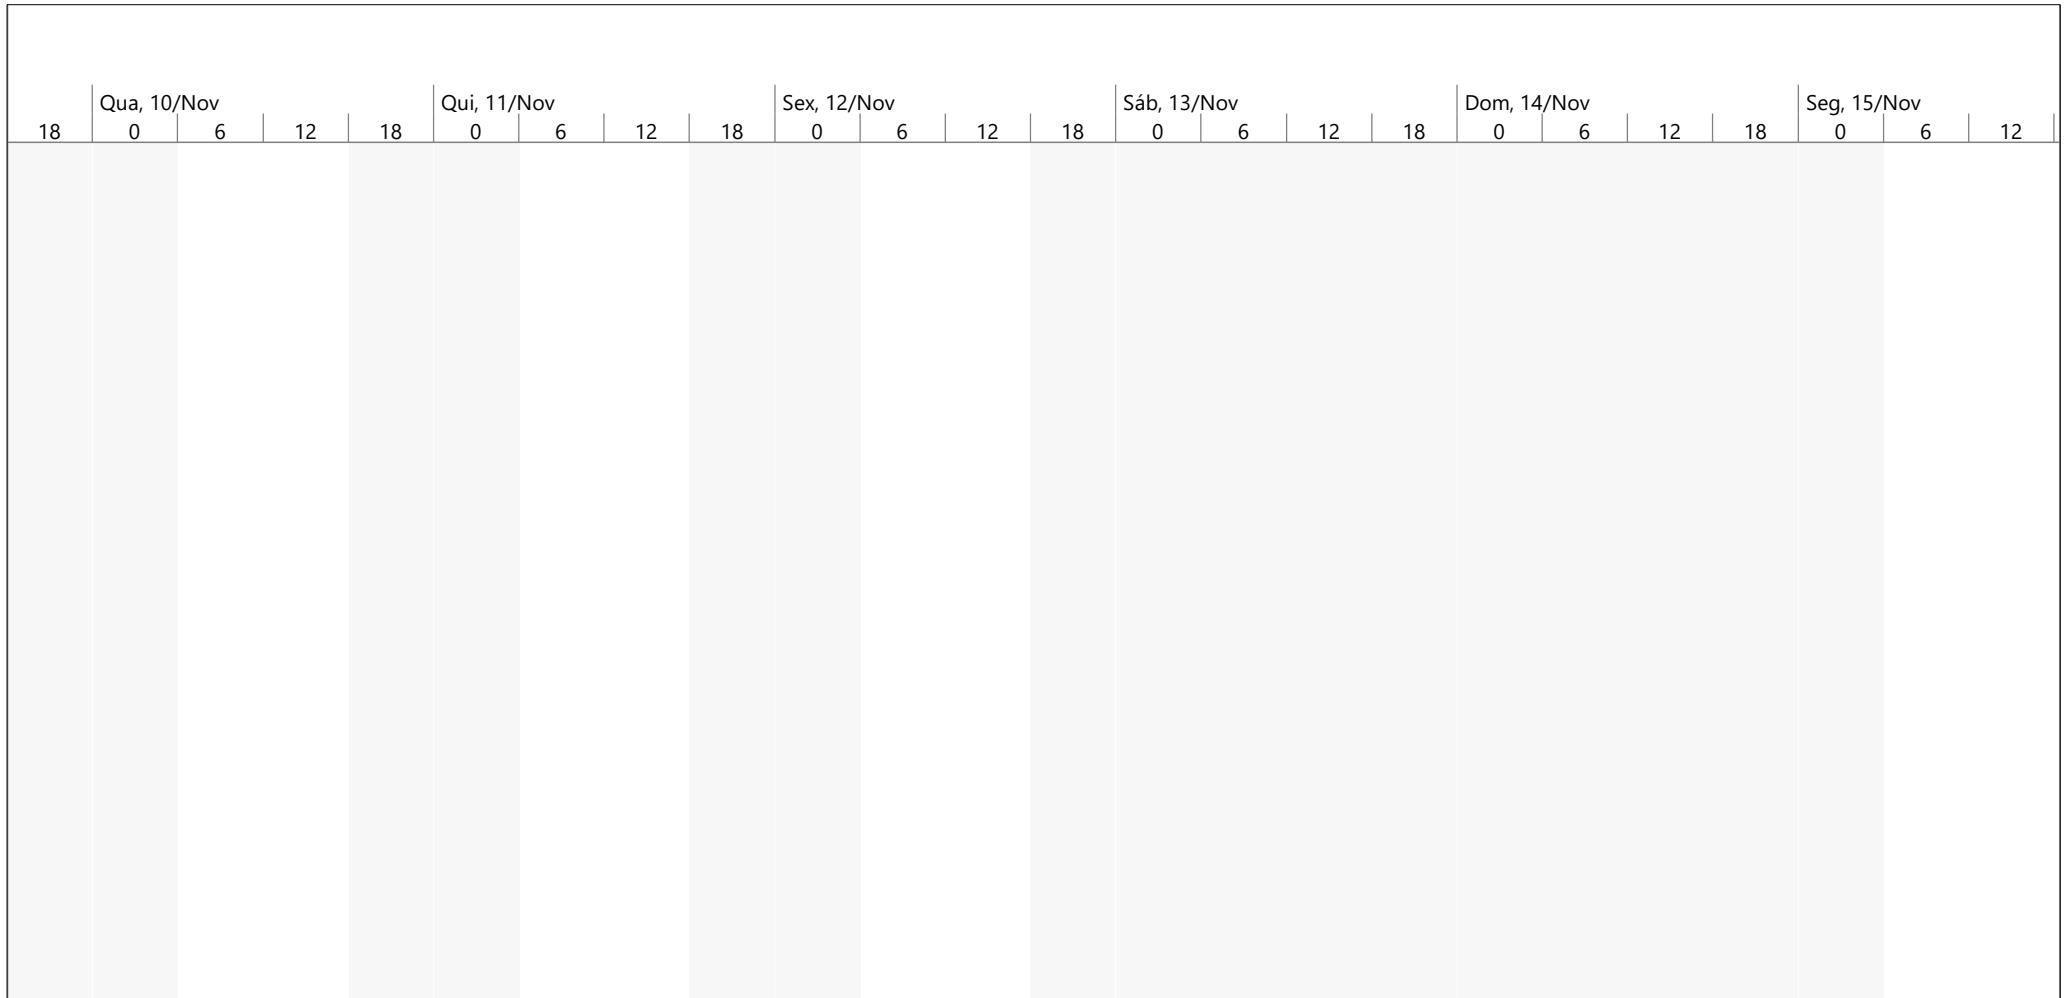


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

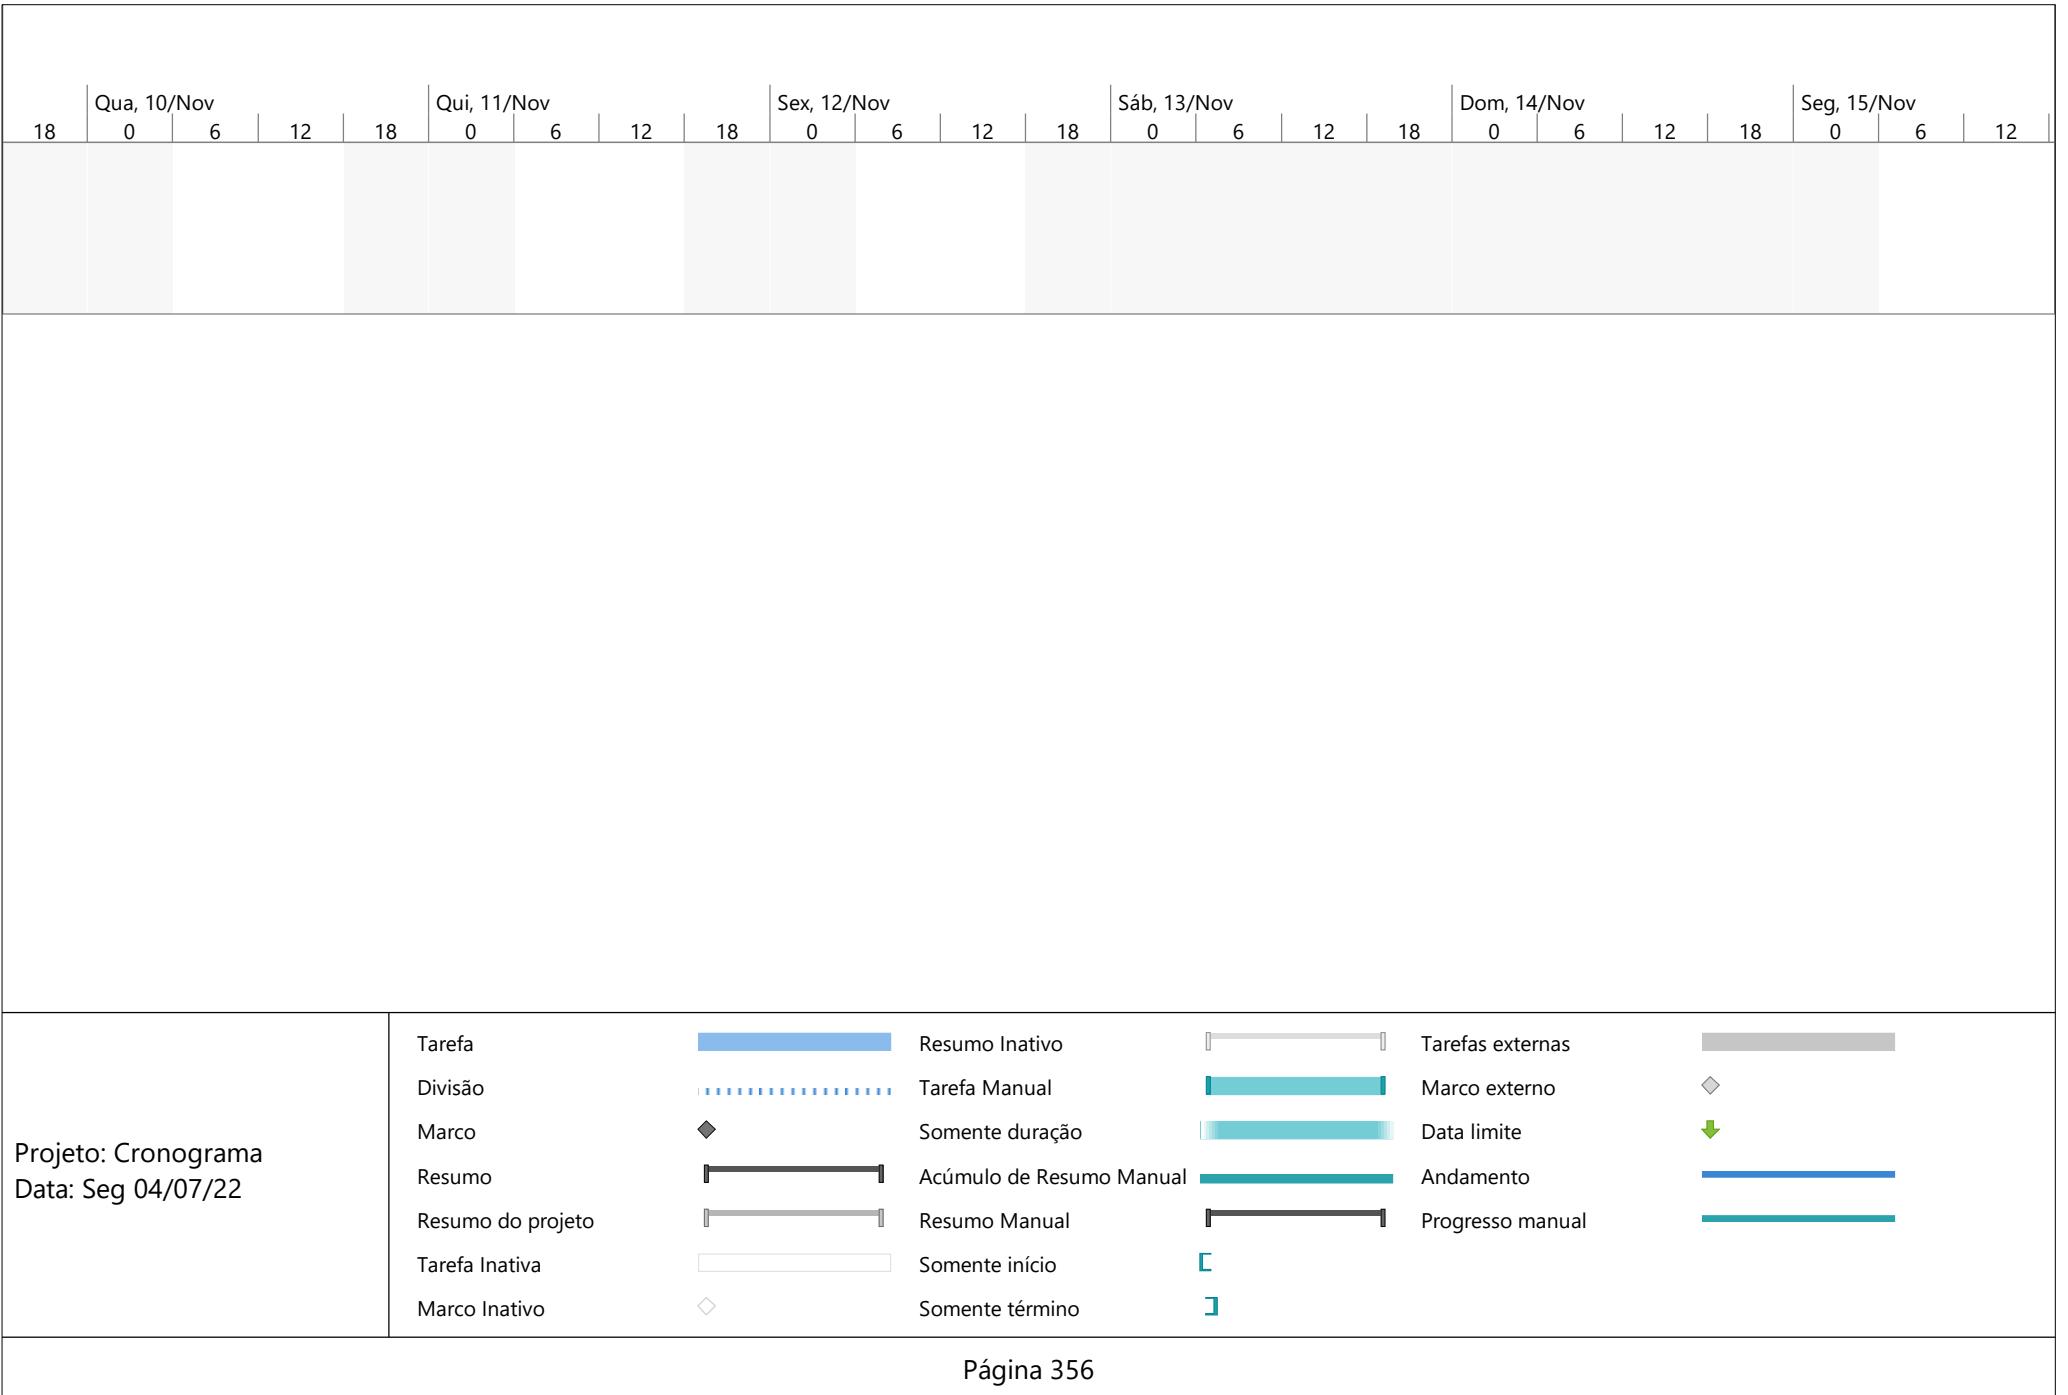

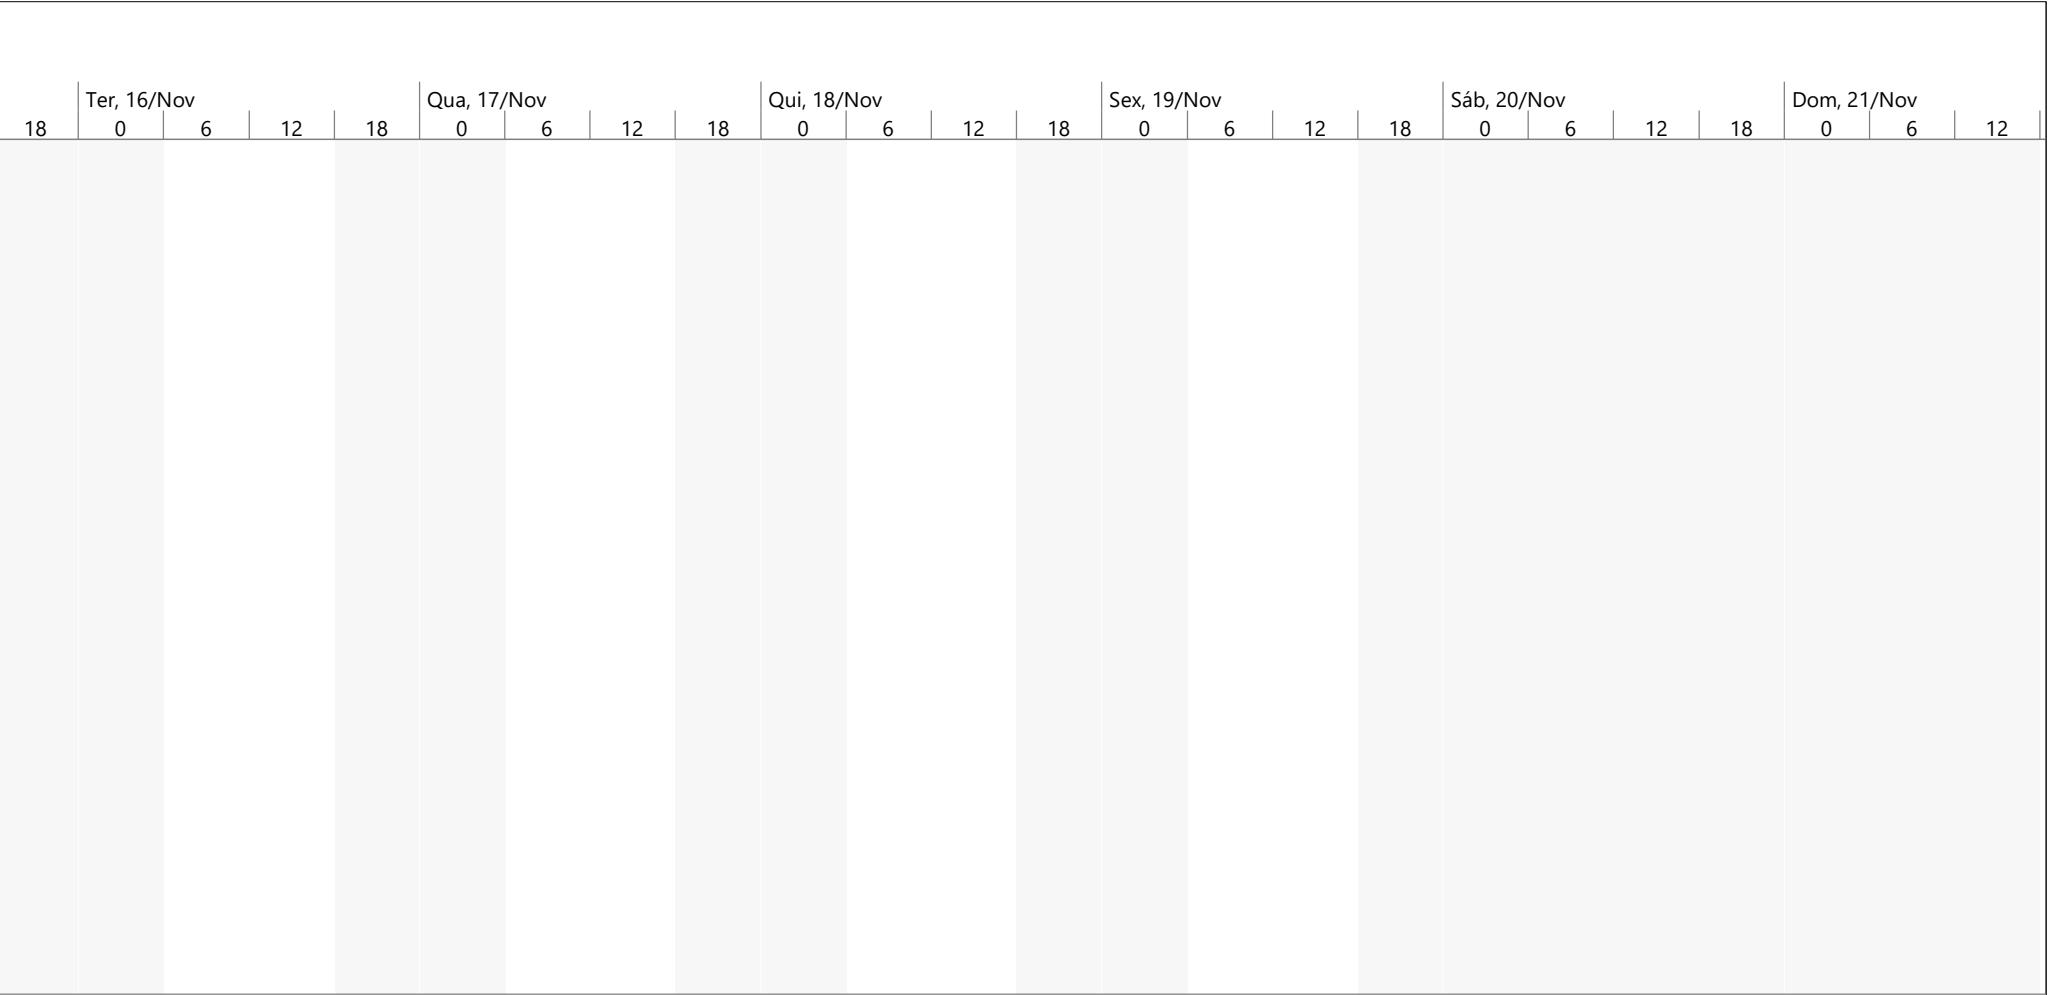


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

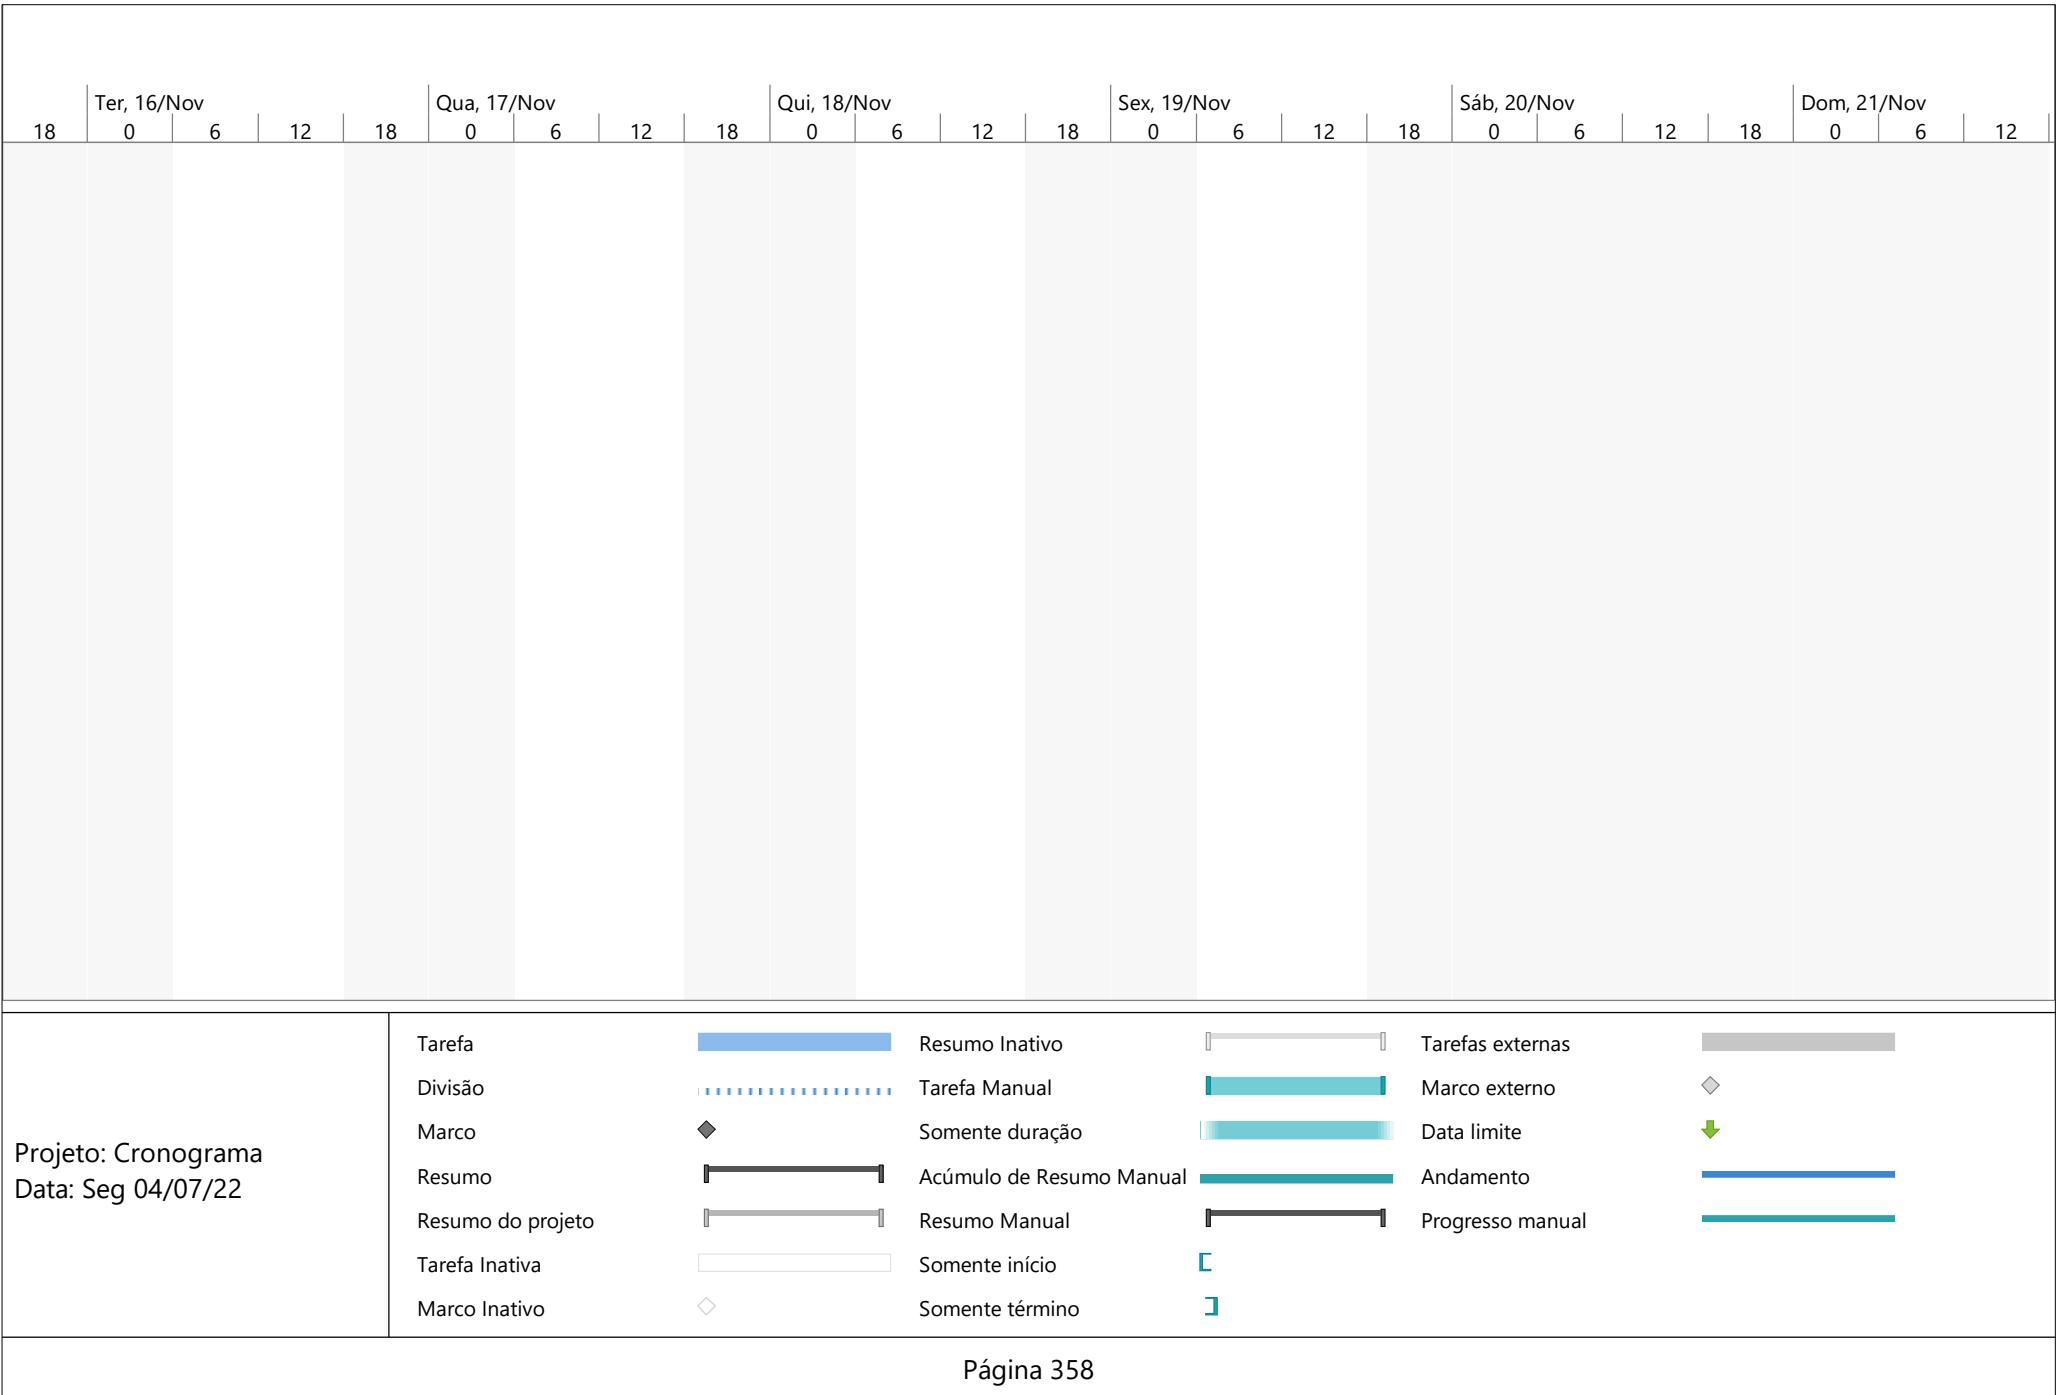




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

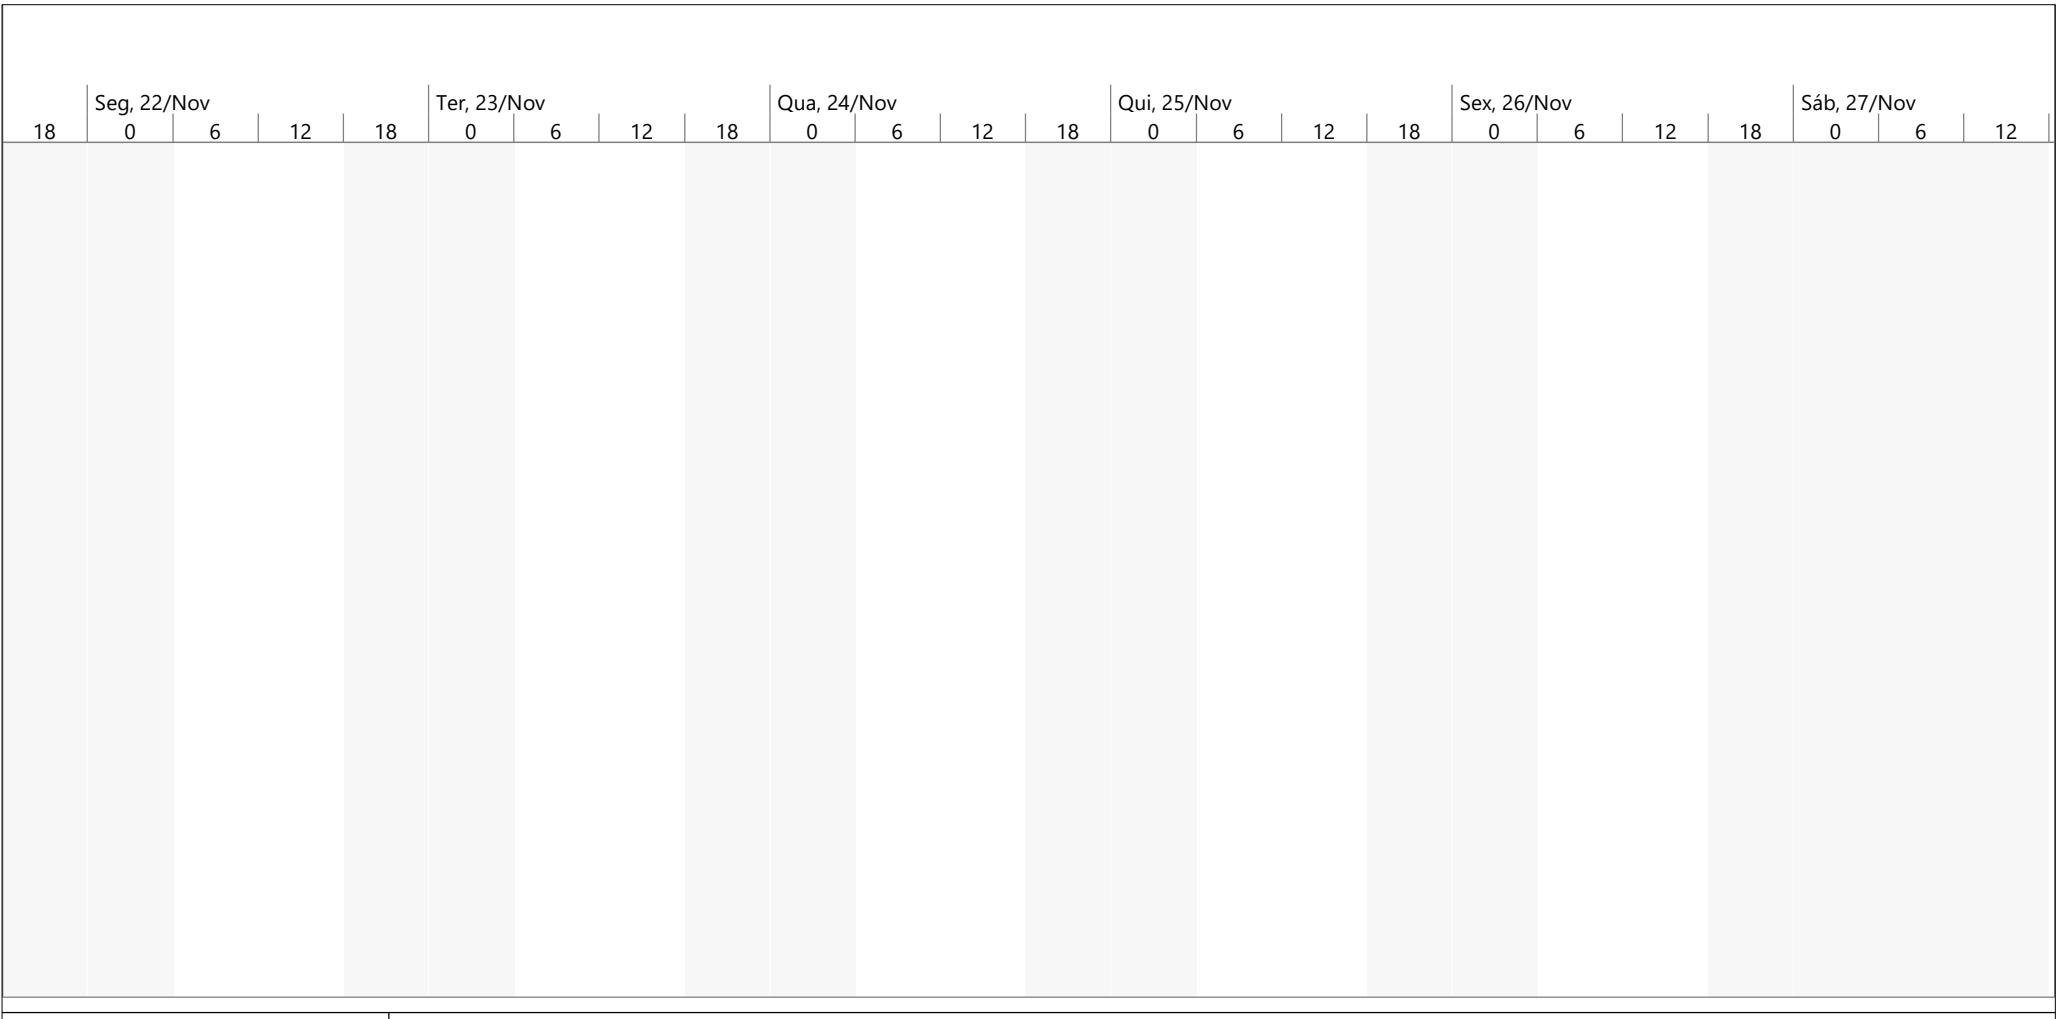


Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

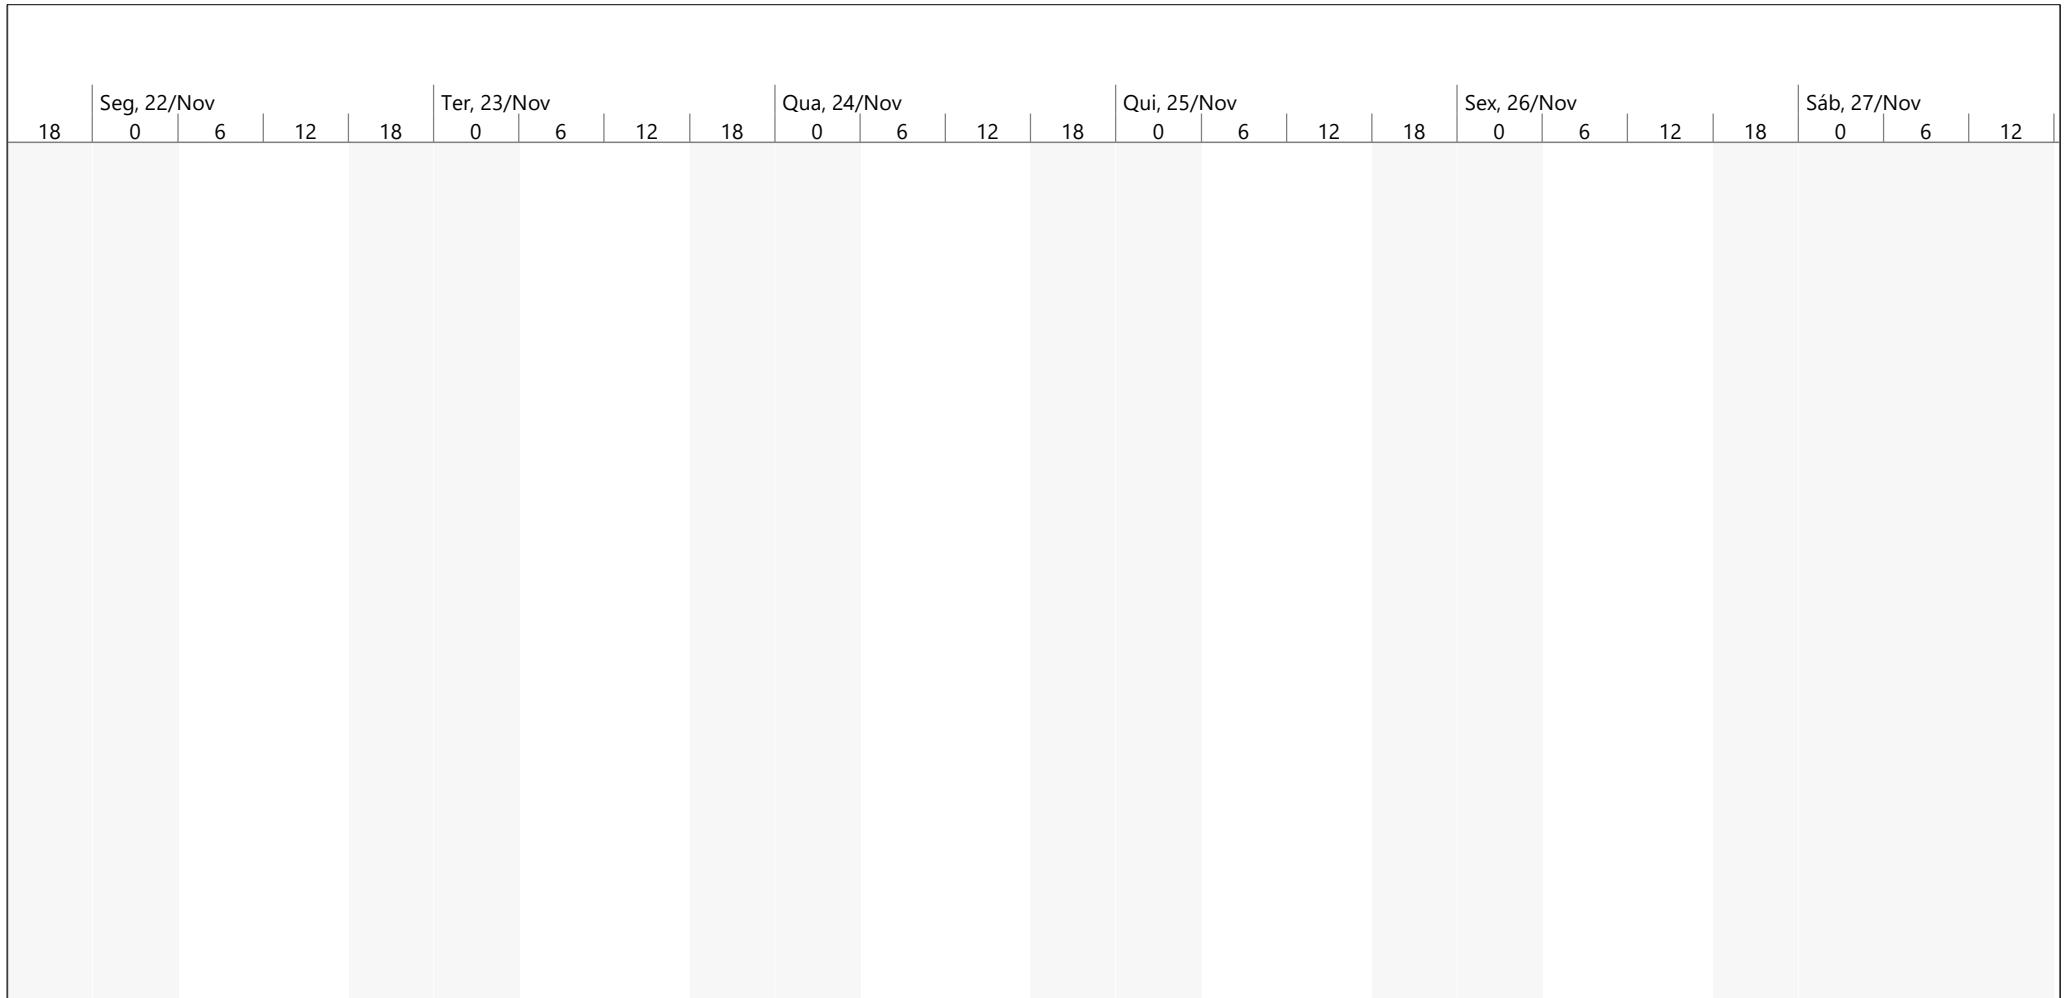


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

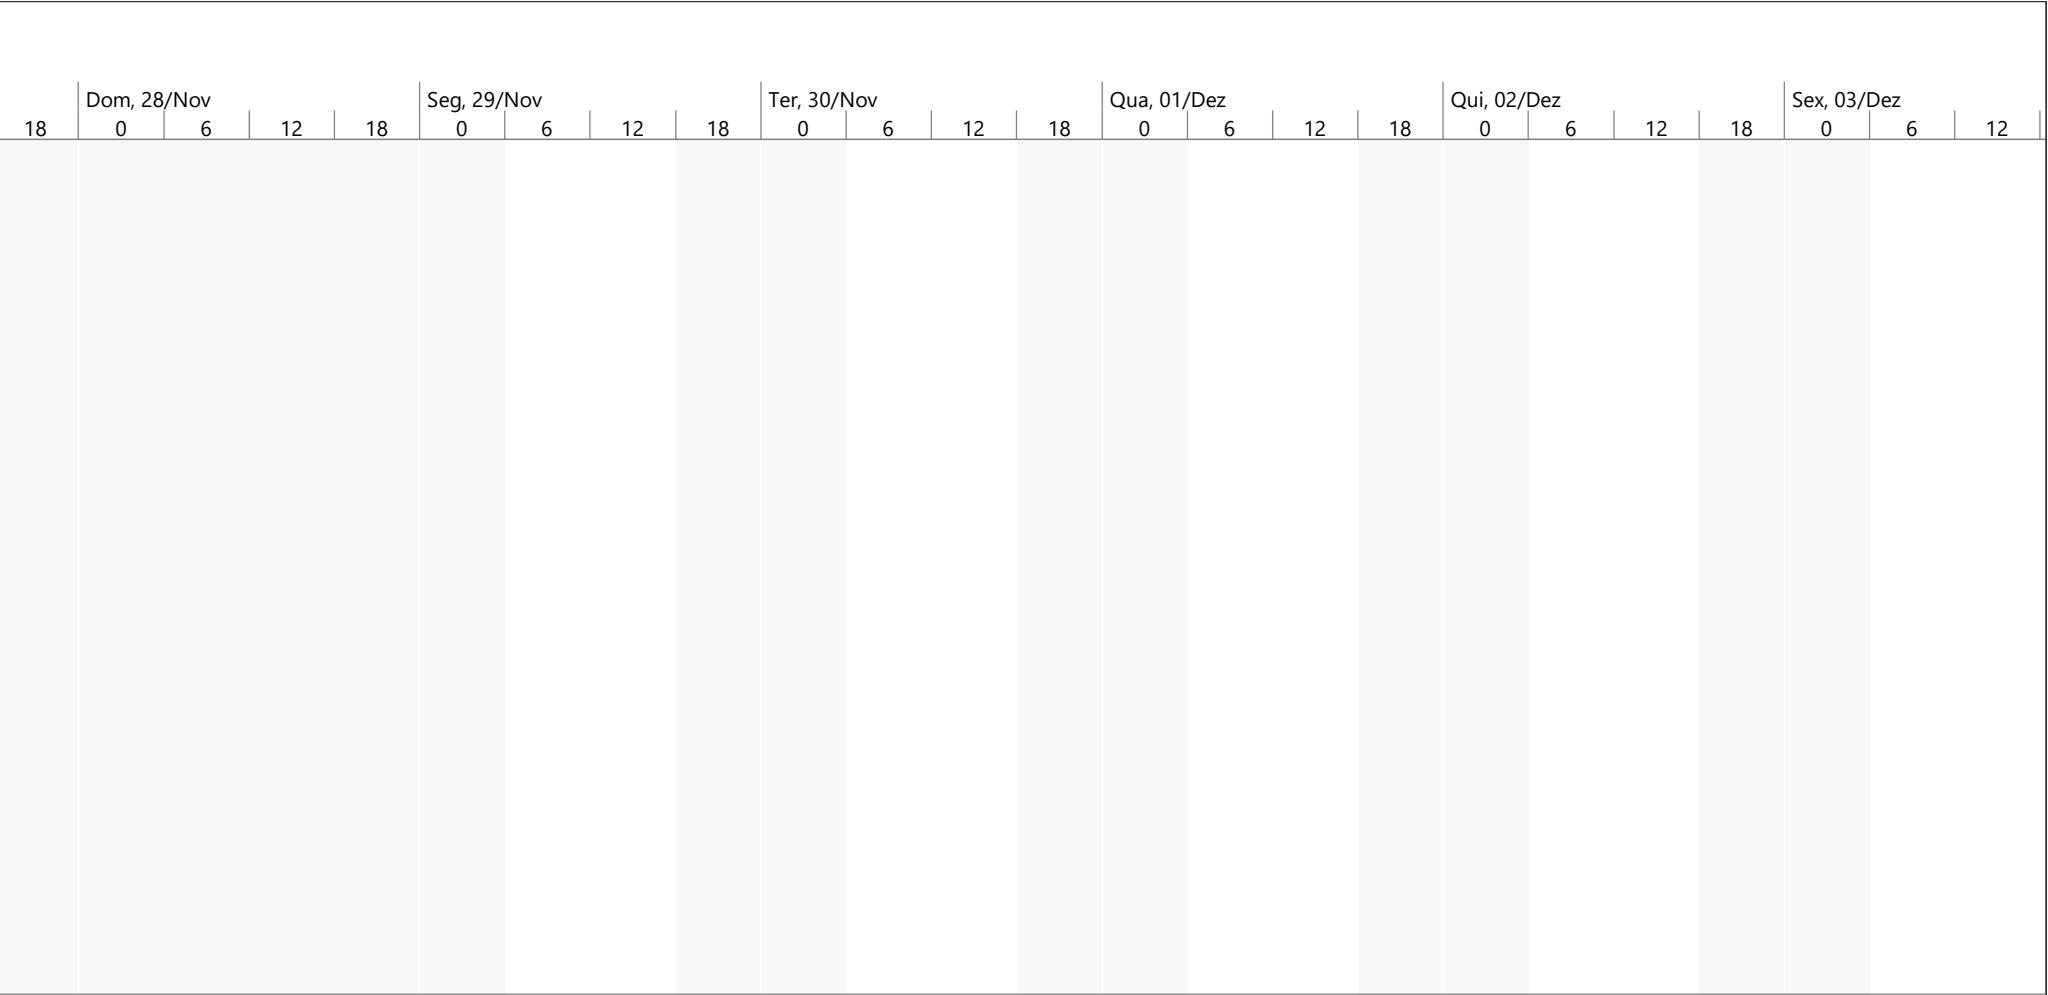


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

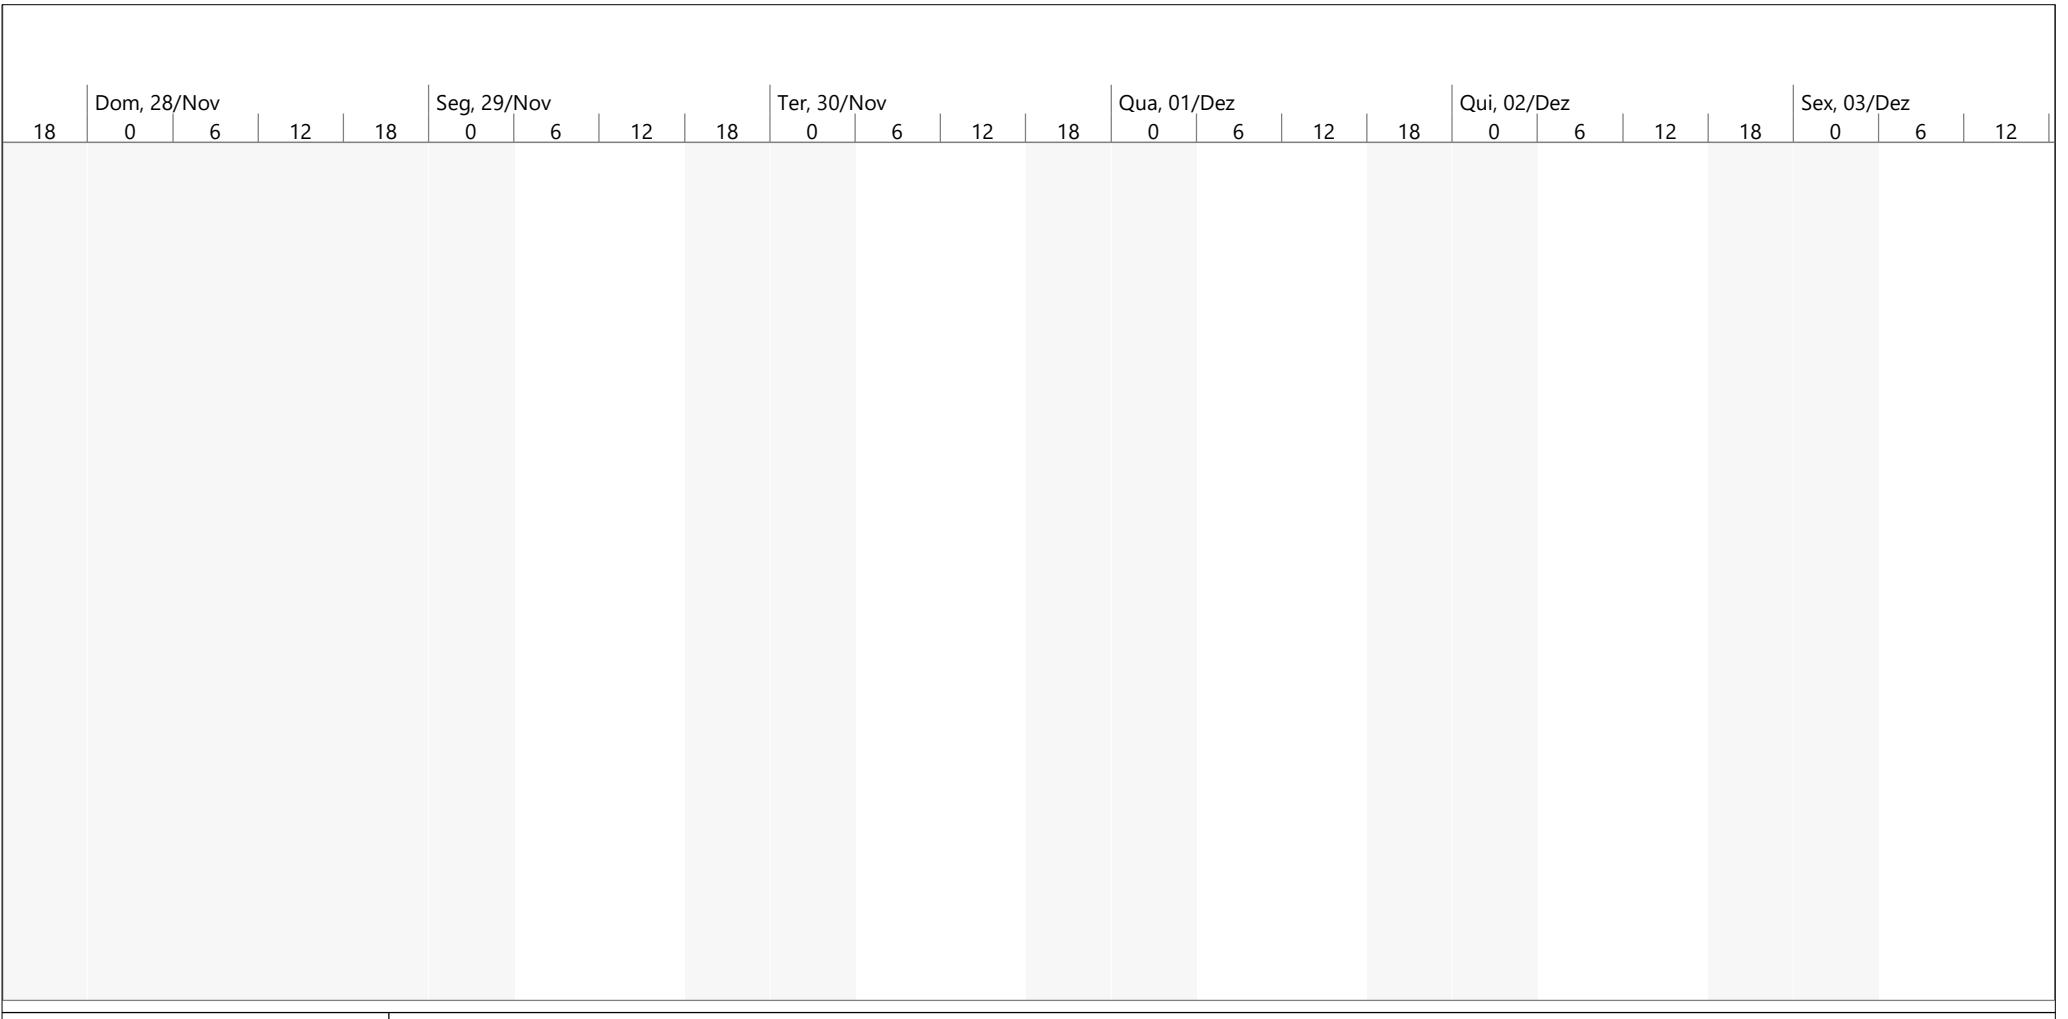


Projeto: Cronograma
Data: Seq 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo
Marco		Somente duração		Data limite
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual
Tarefa Inativa		Somente início		
Marco Inativo		Somente término		

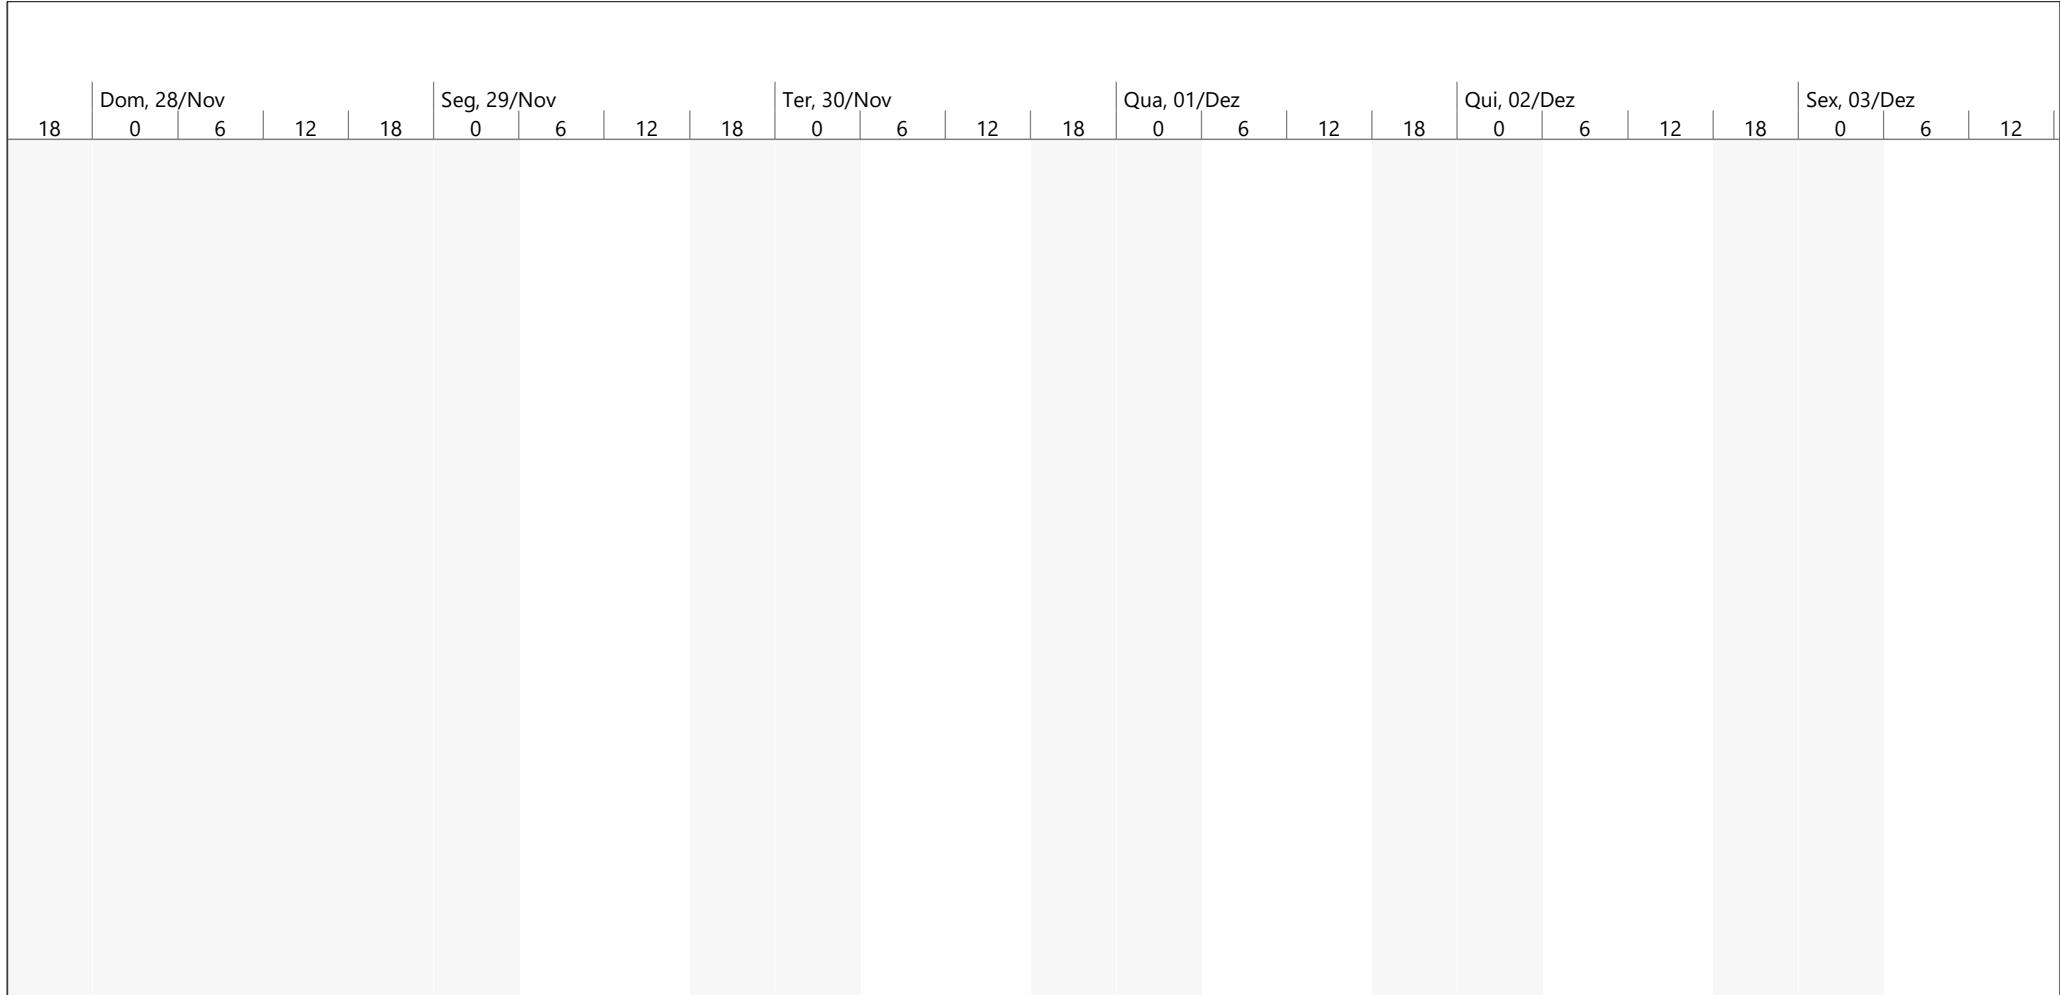

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

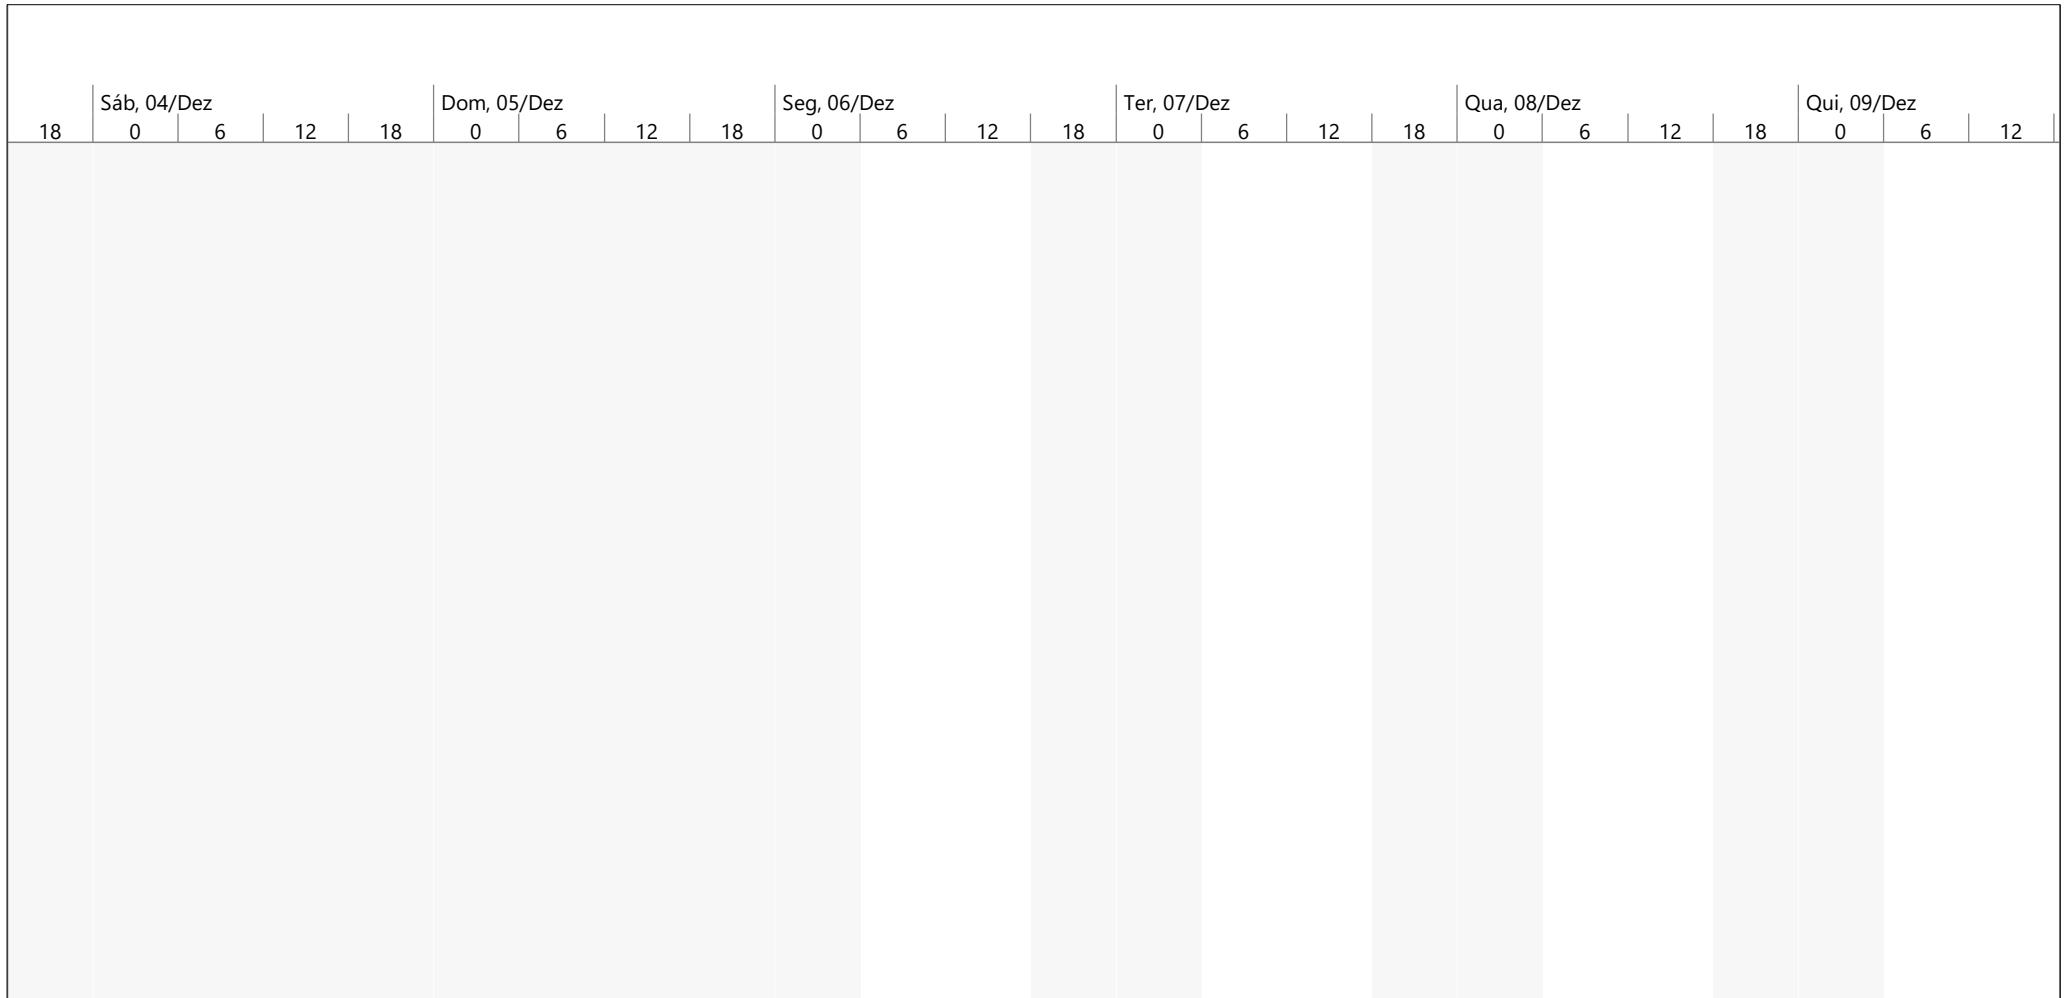



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

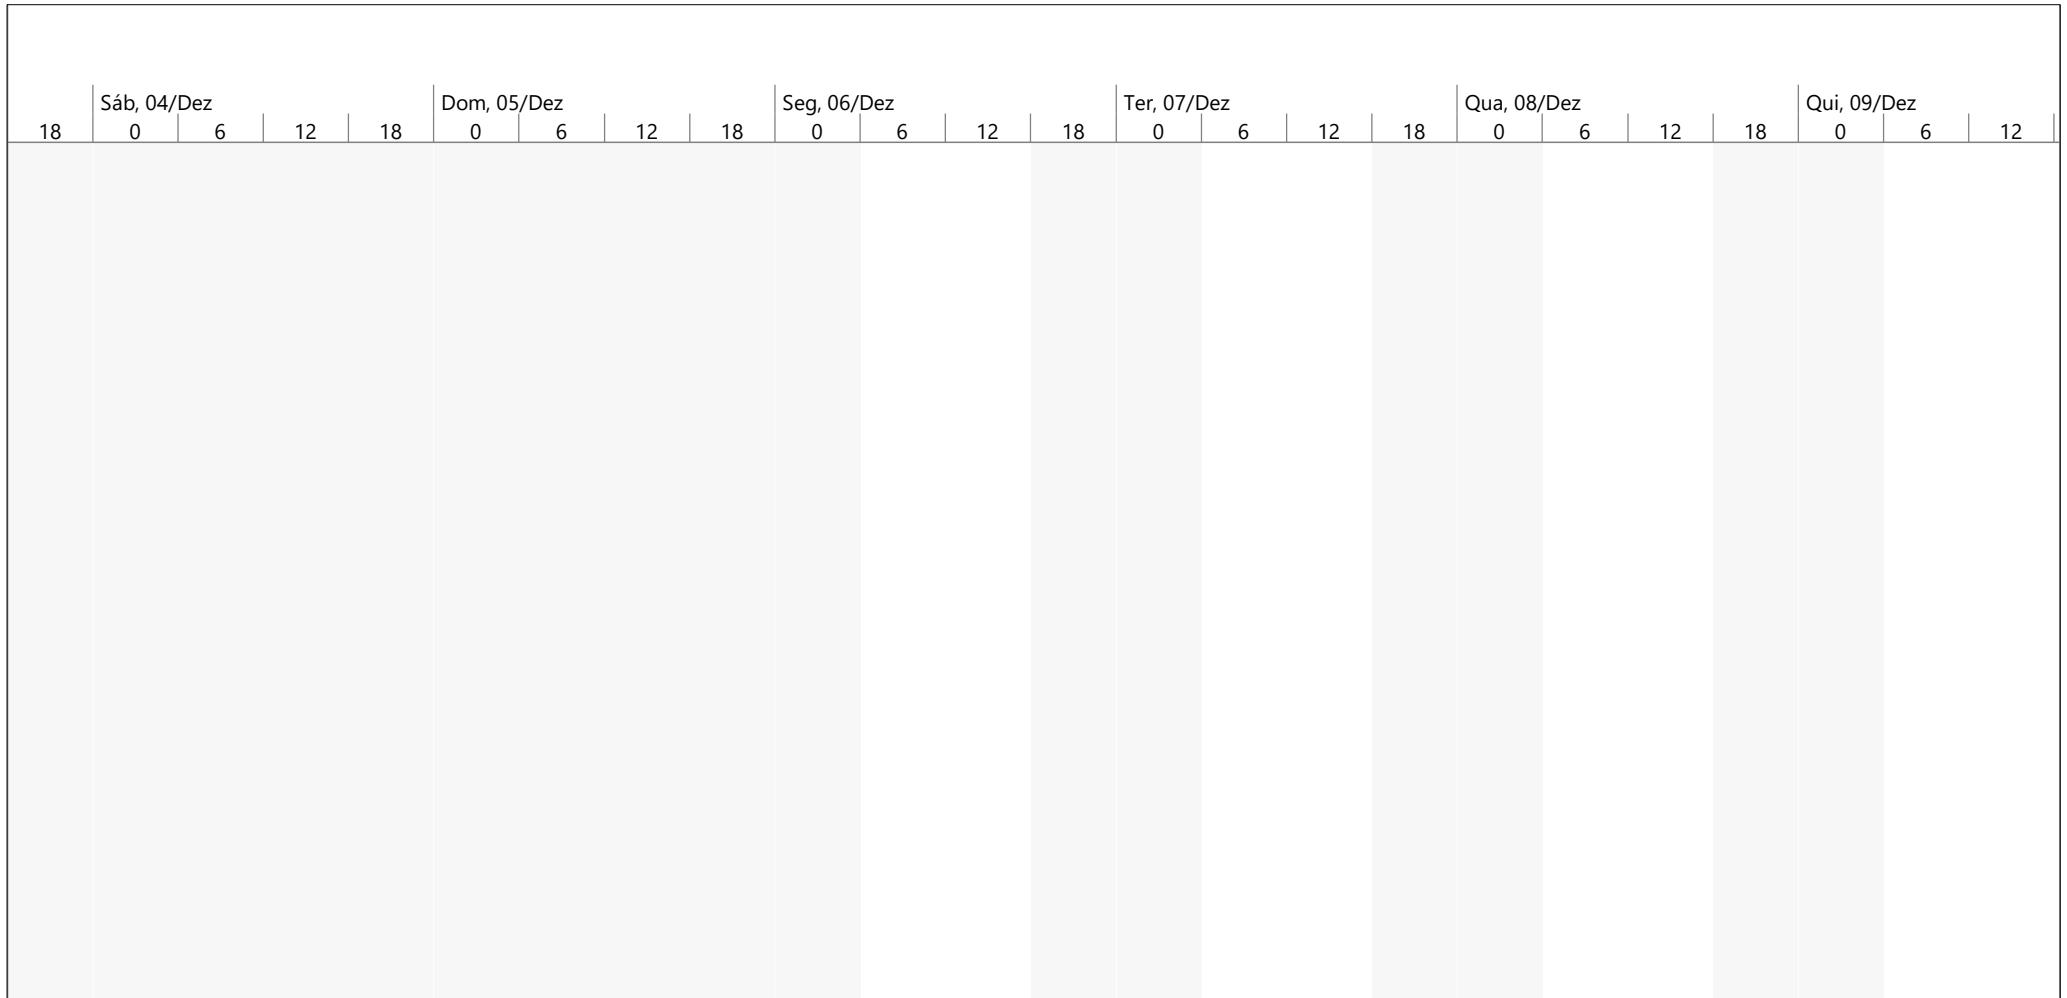


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

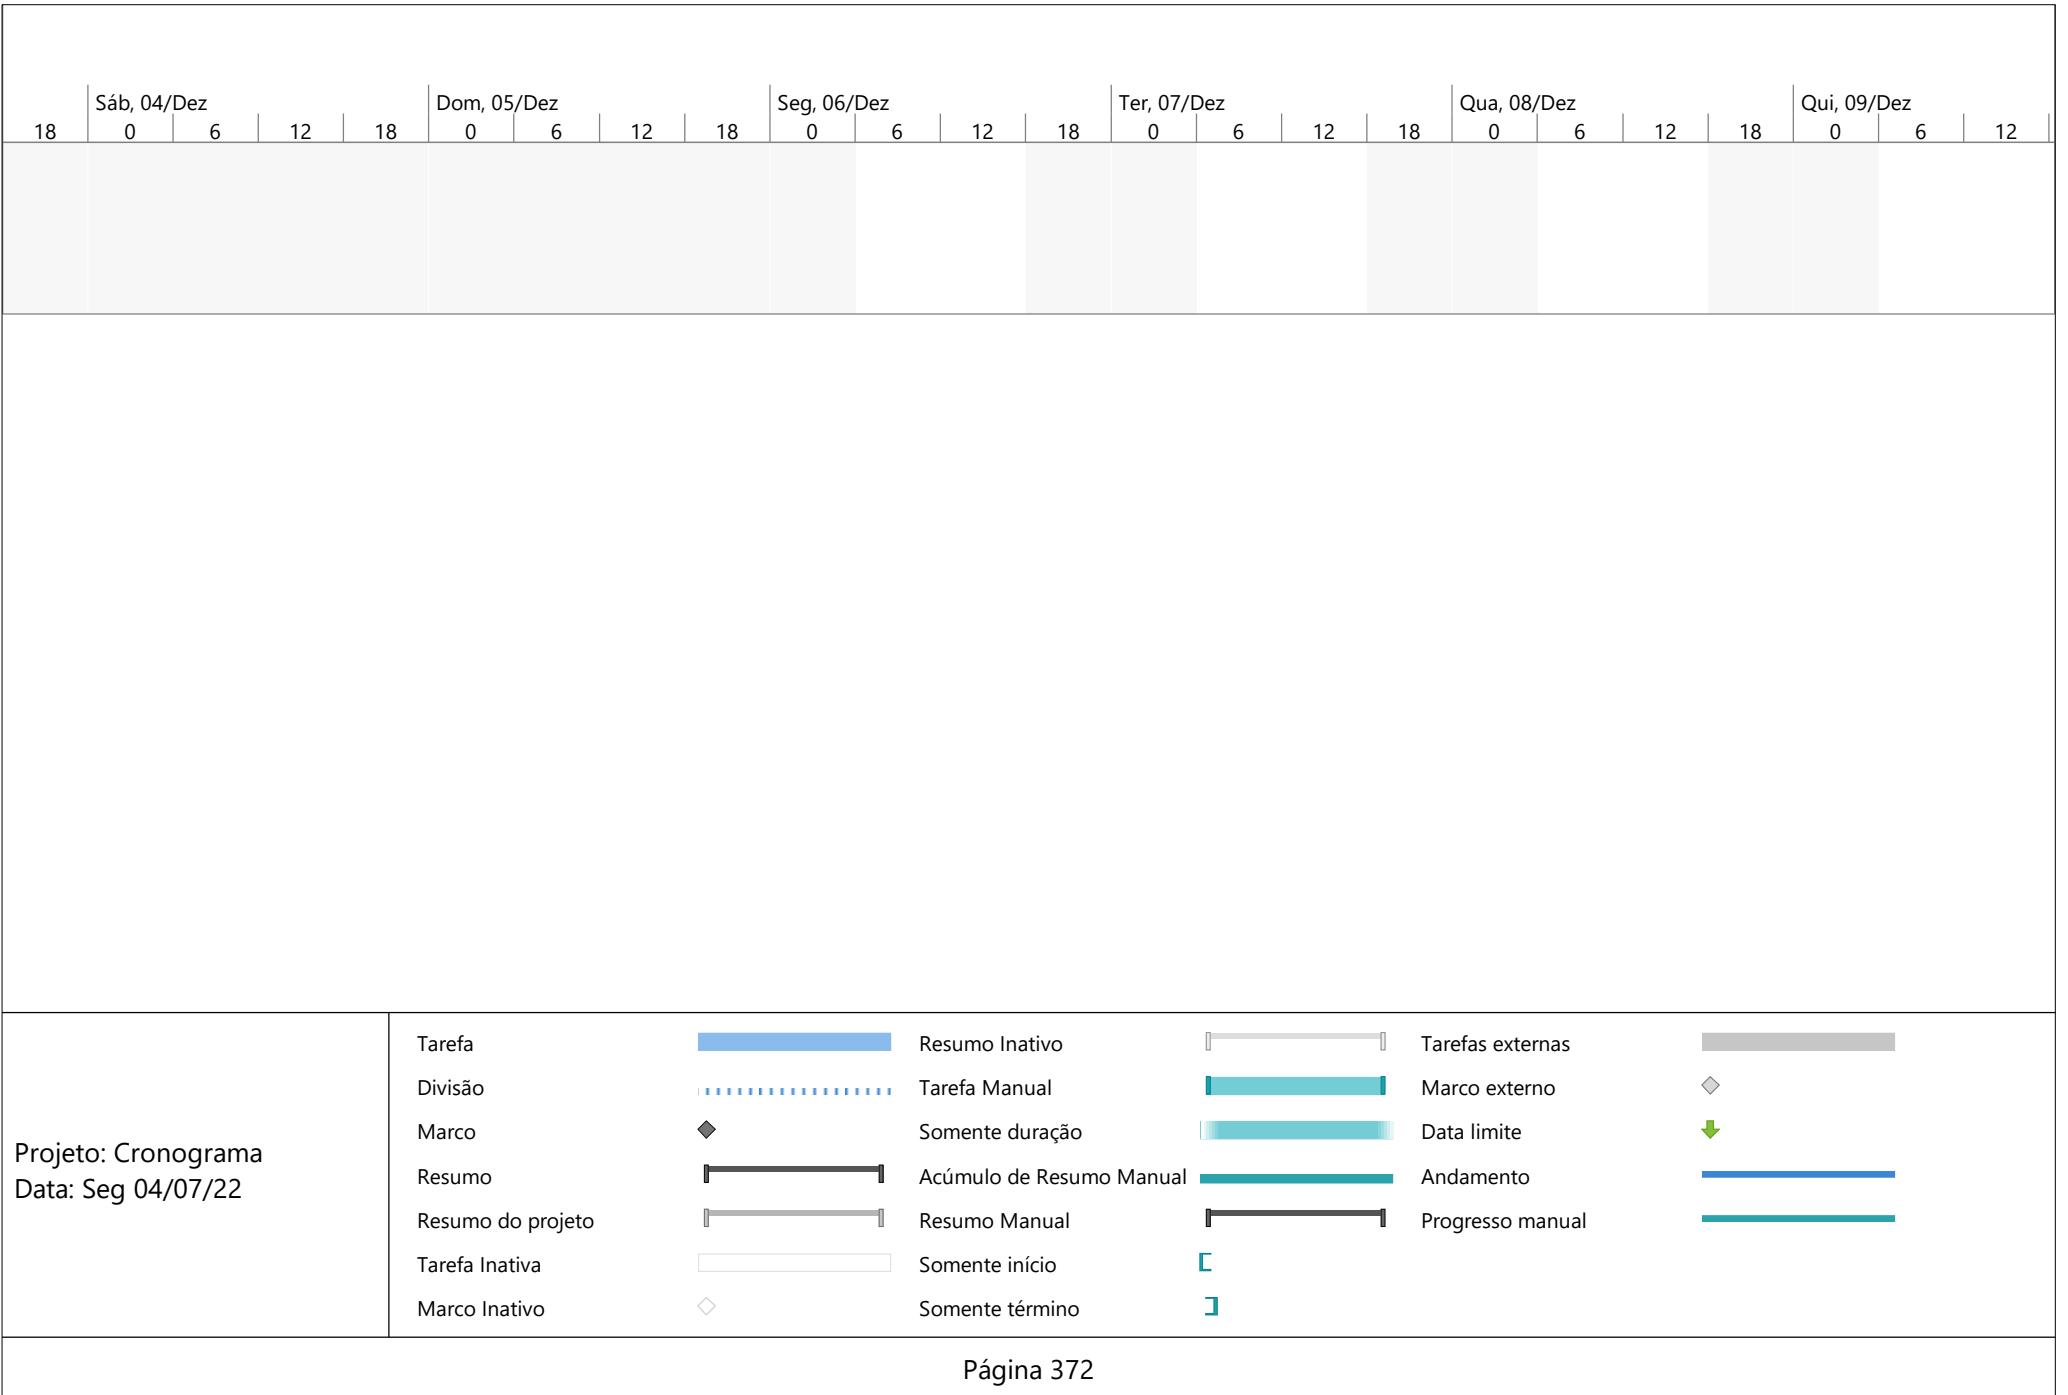


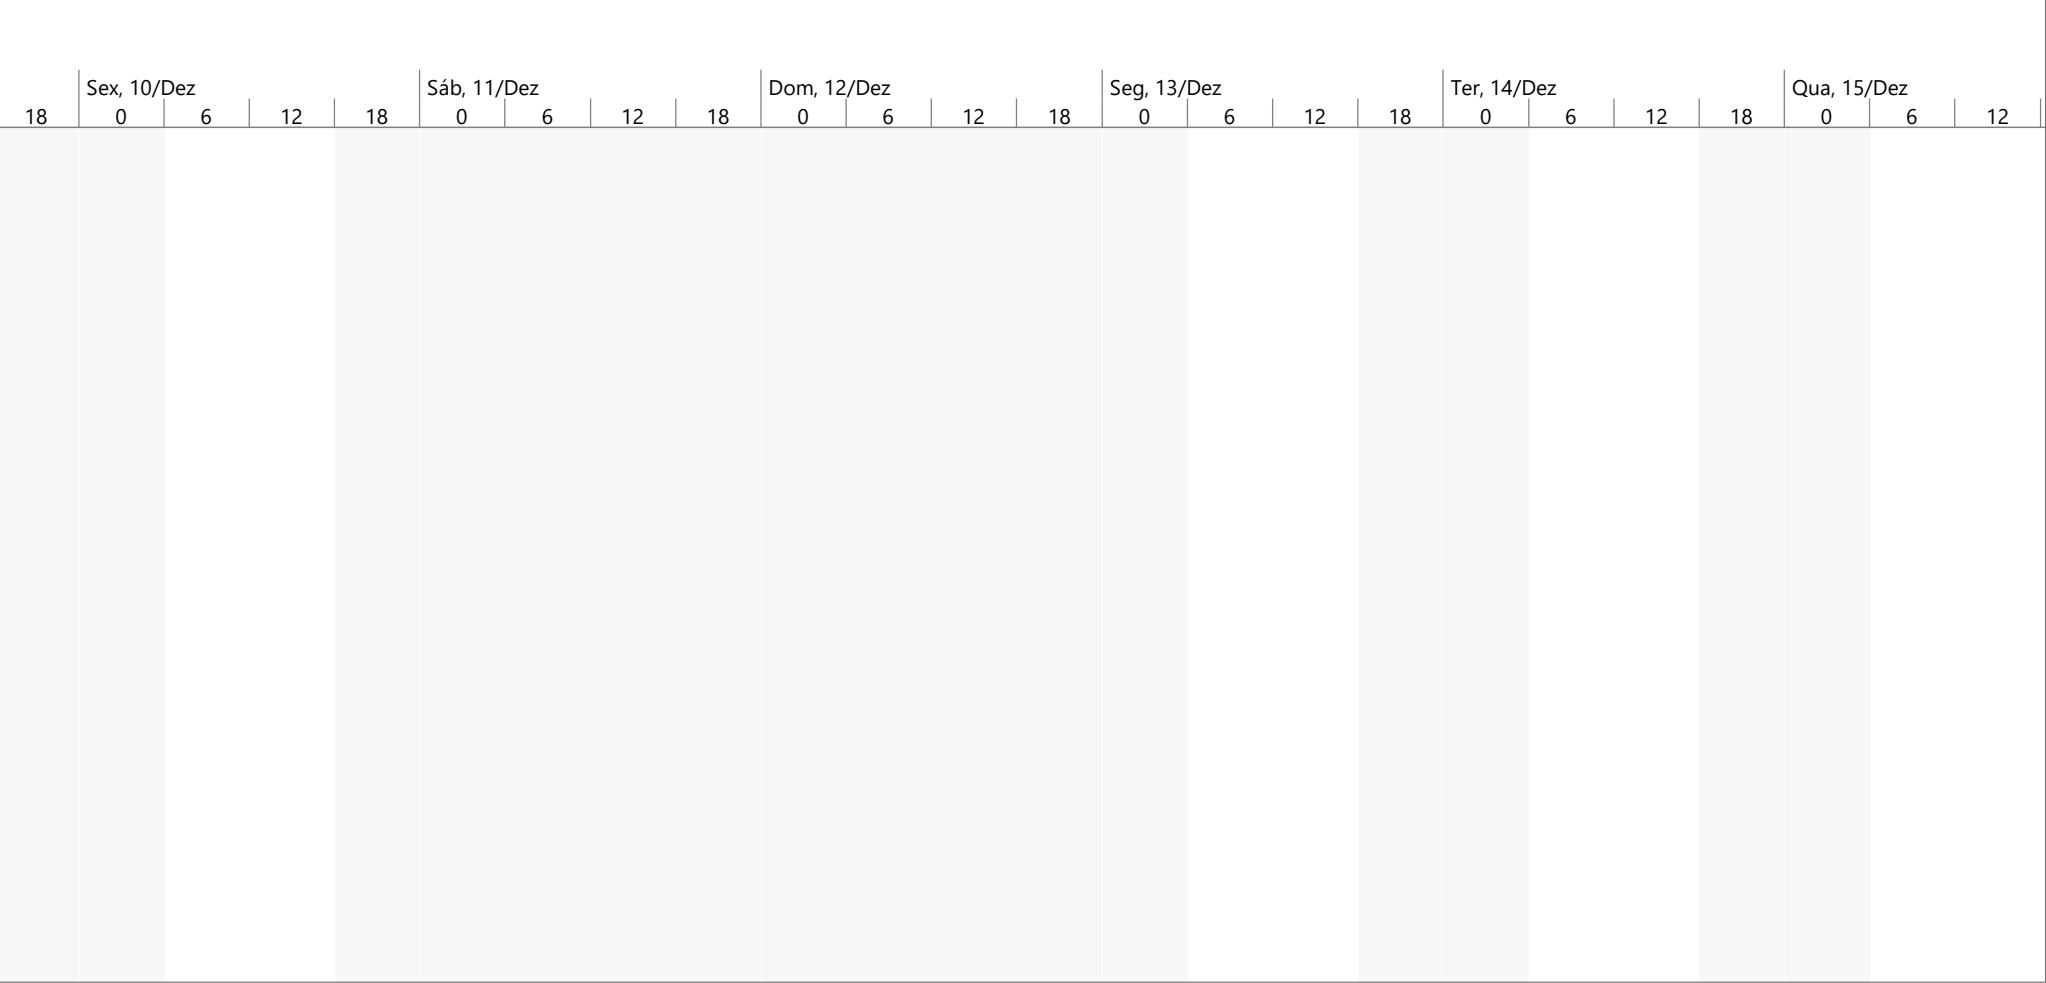


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

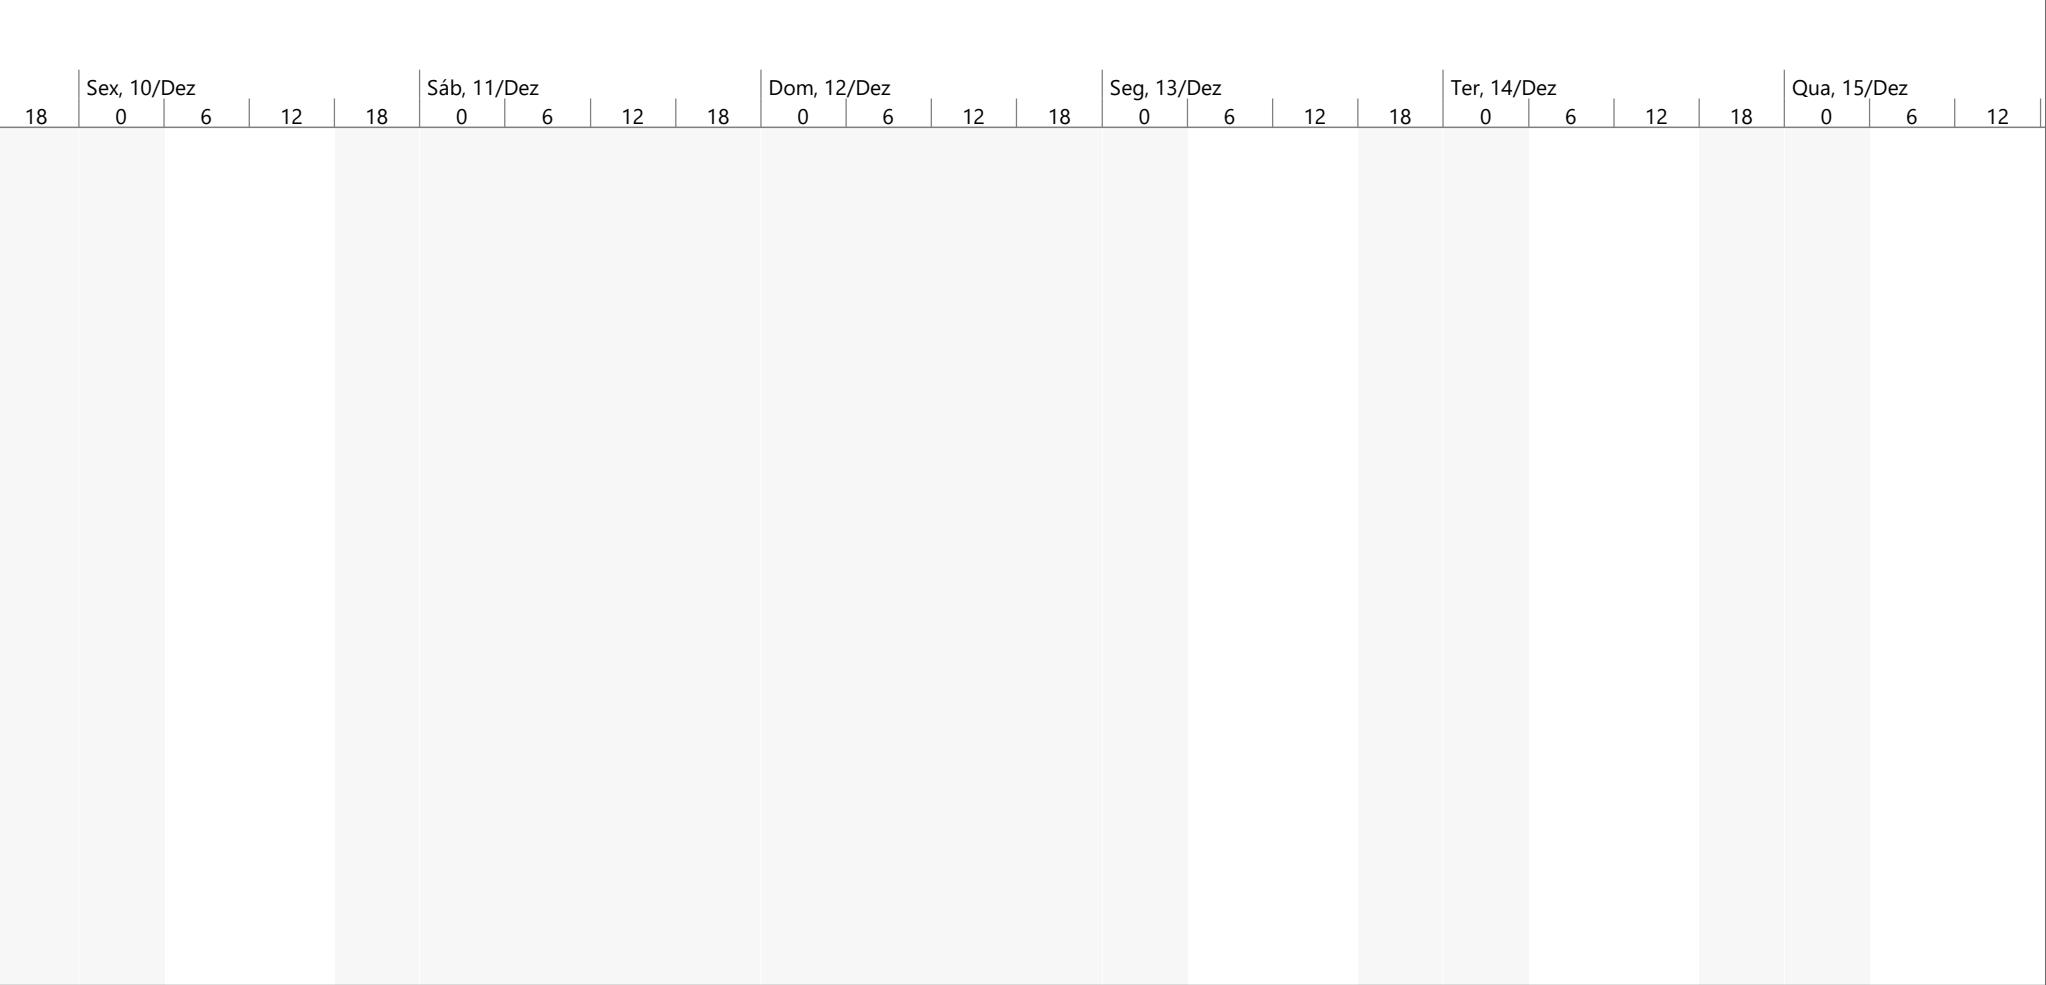

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

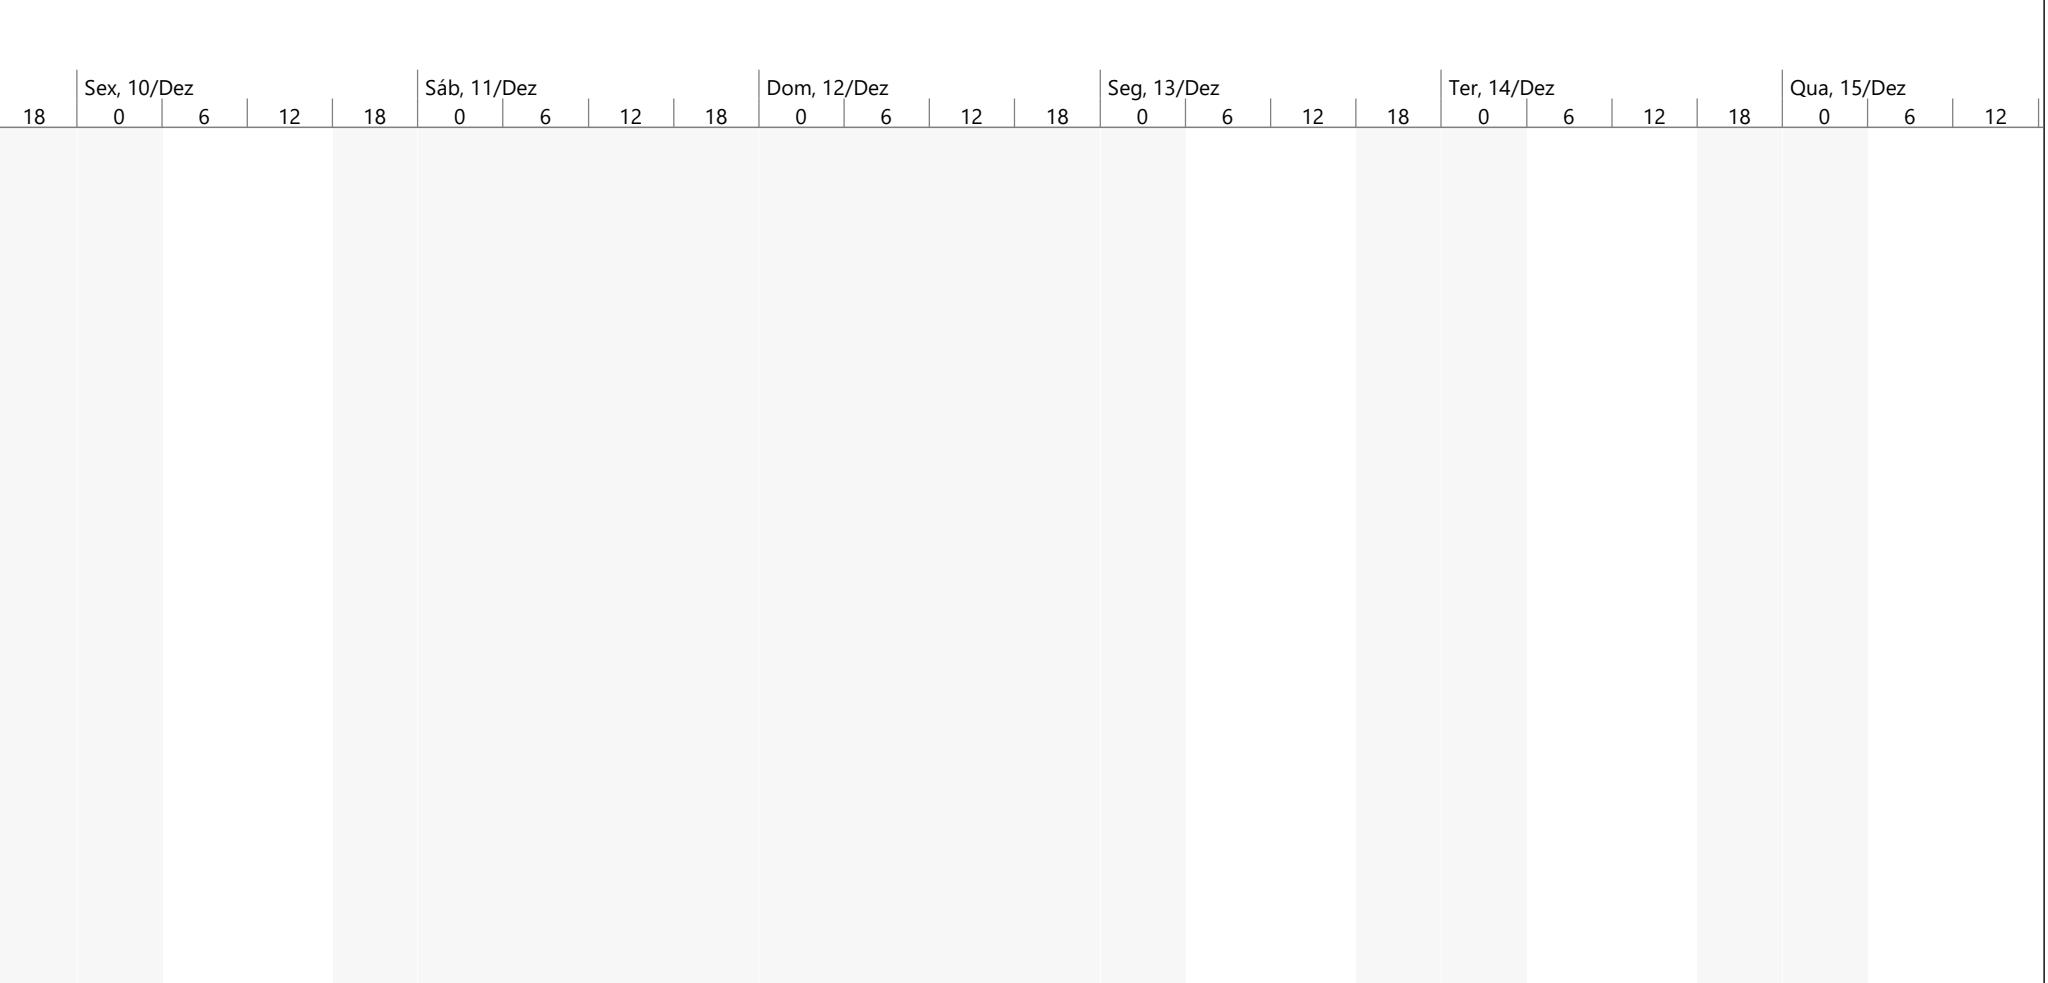


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

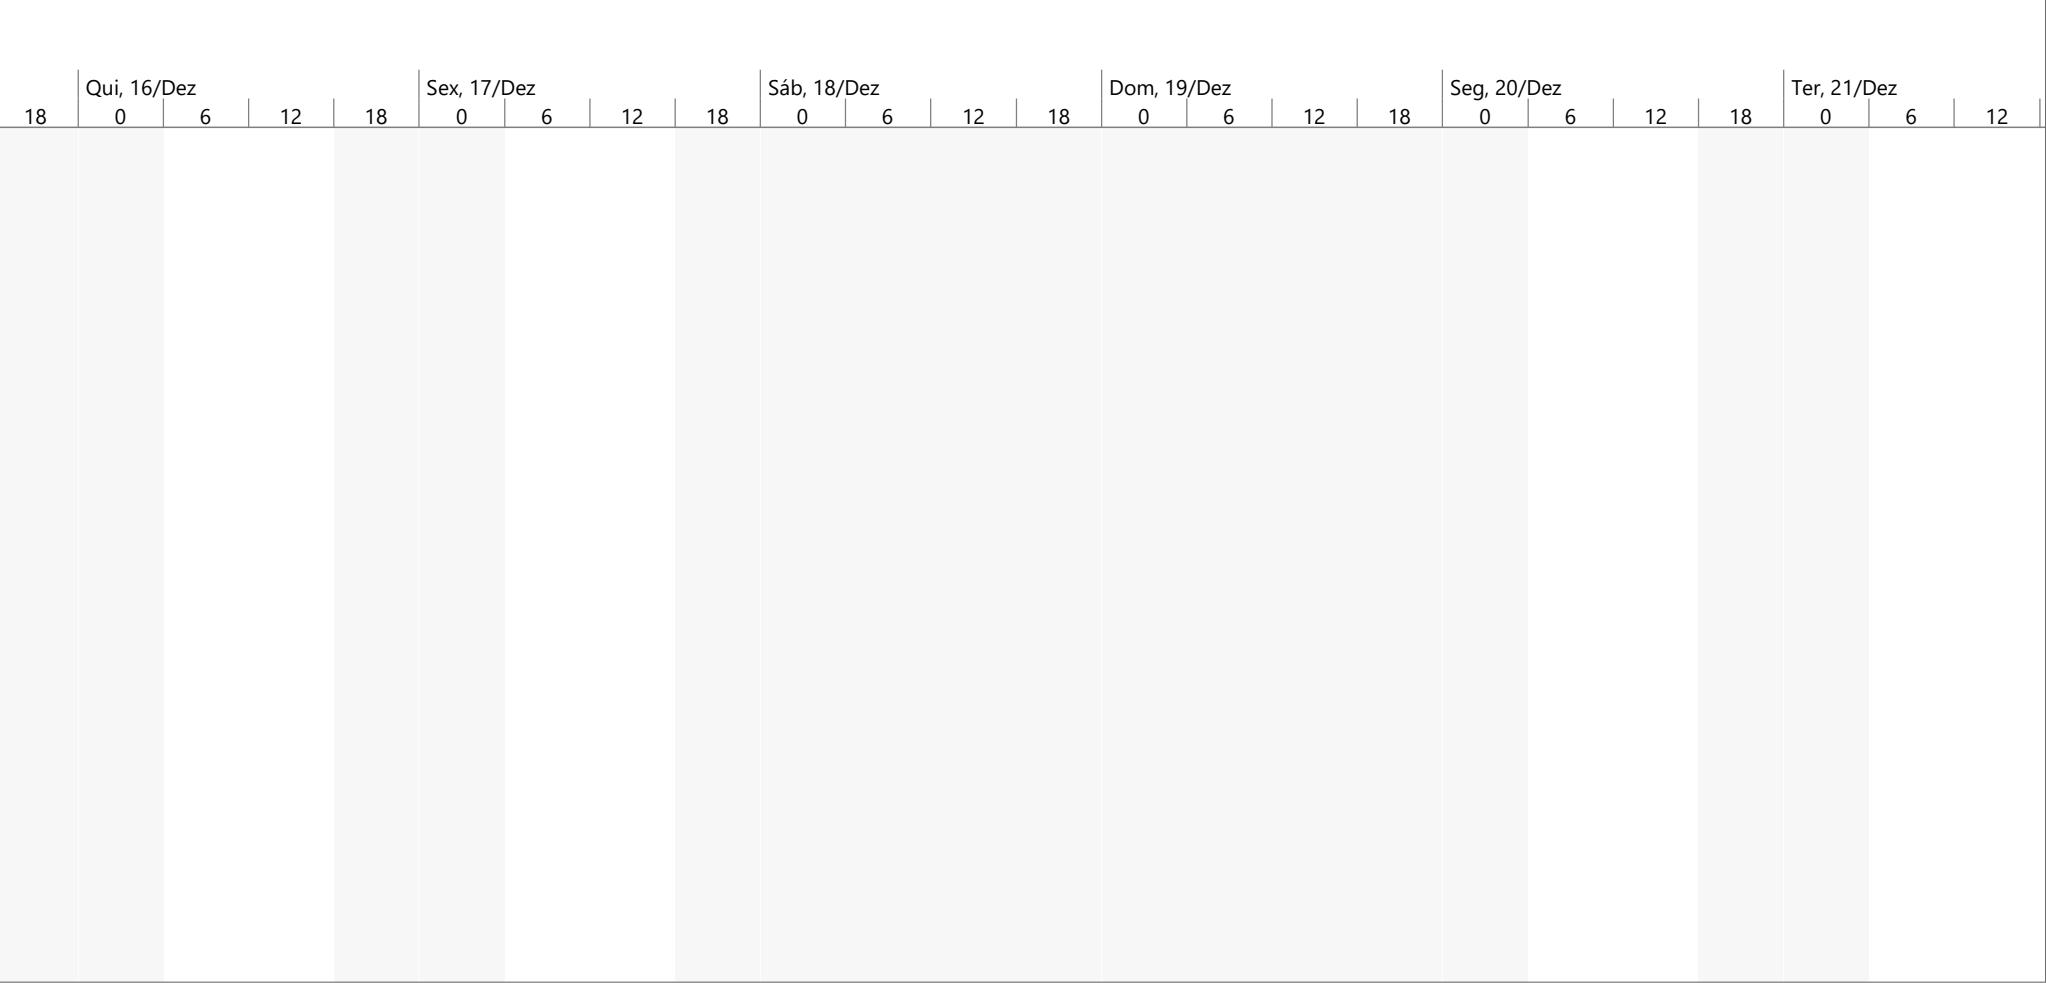


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

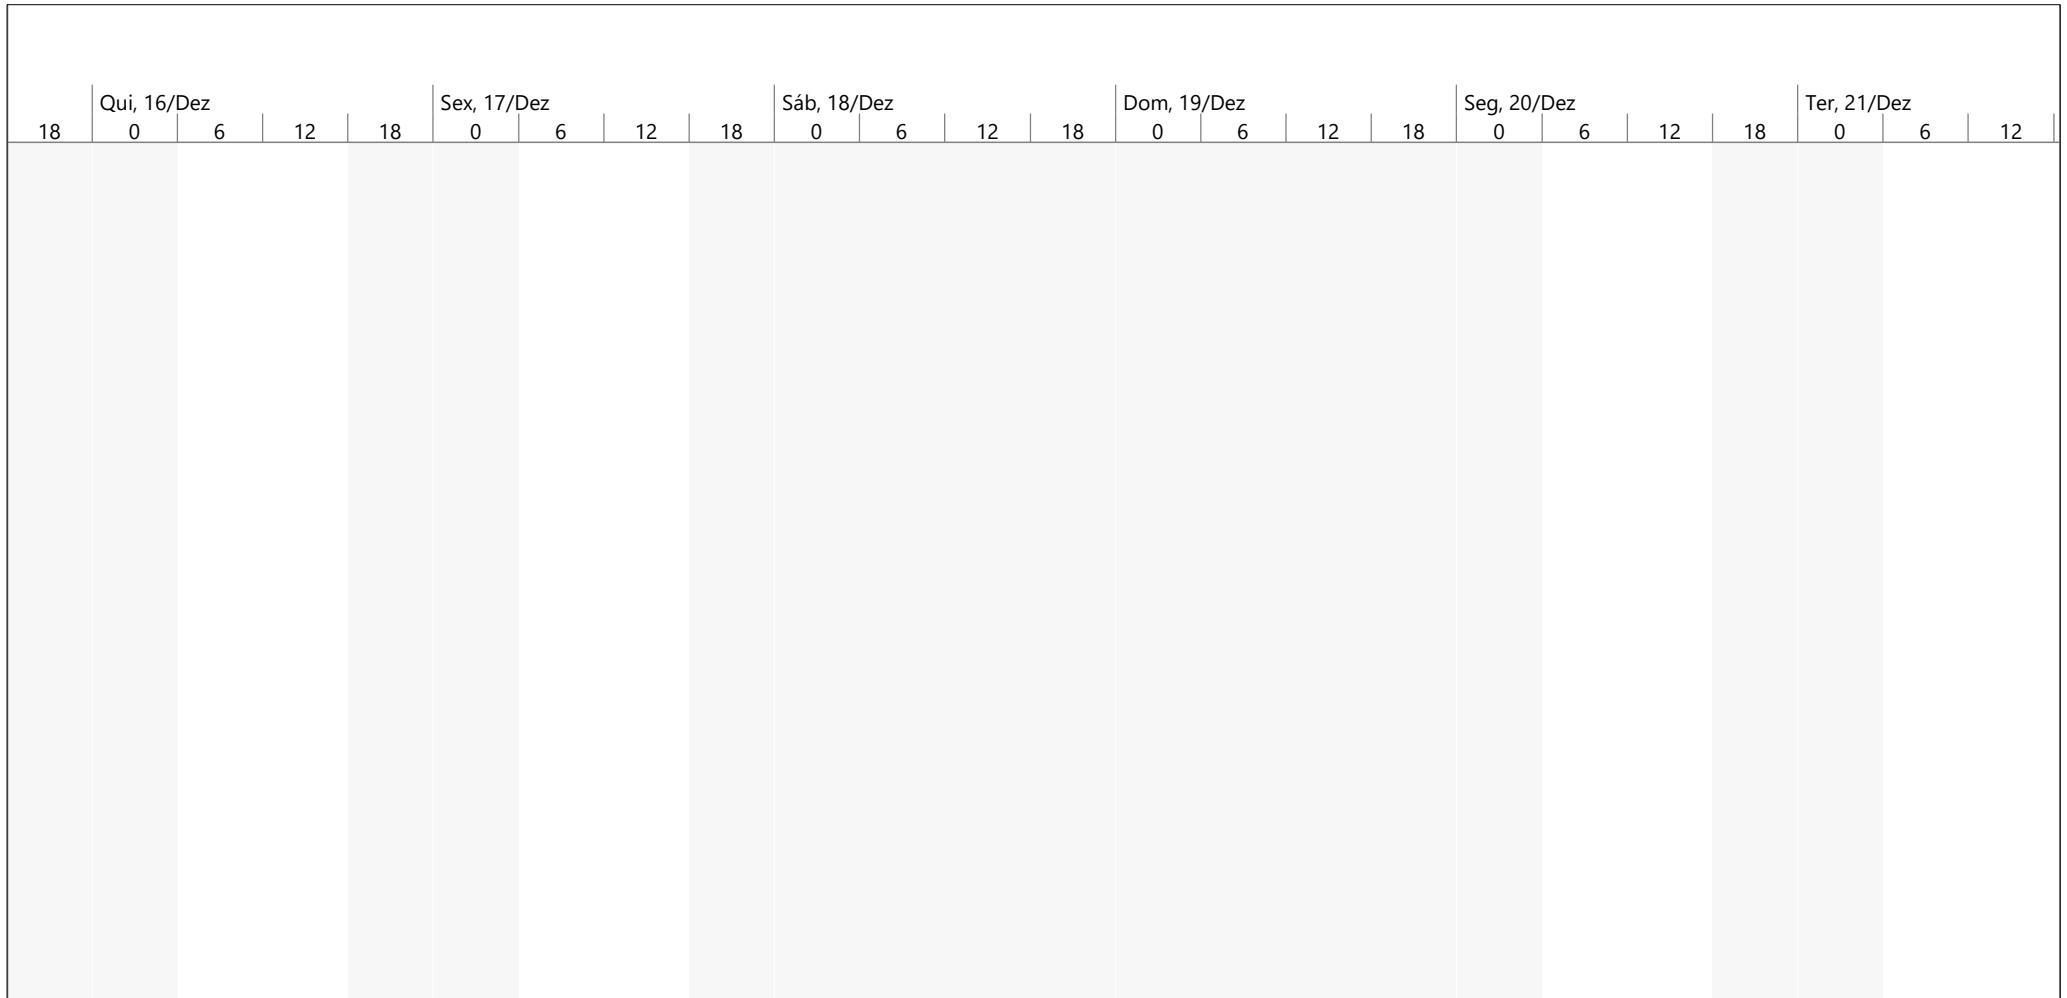

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

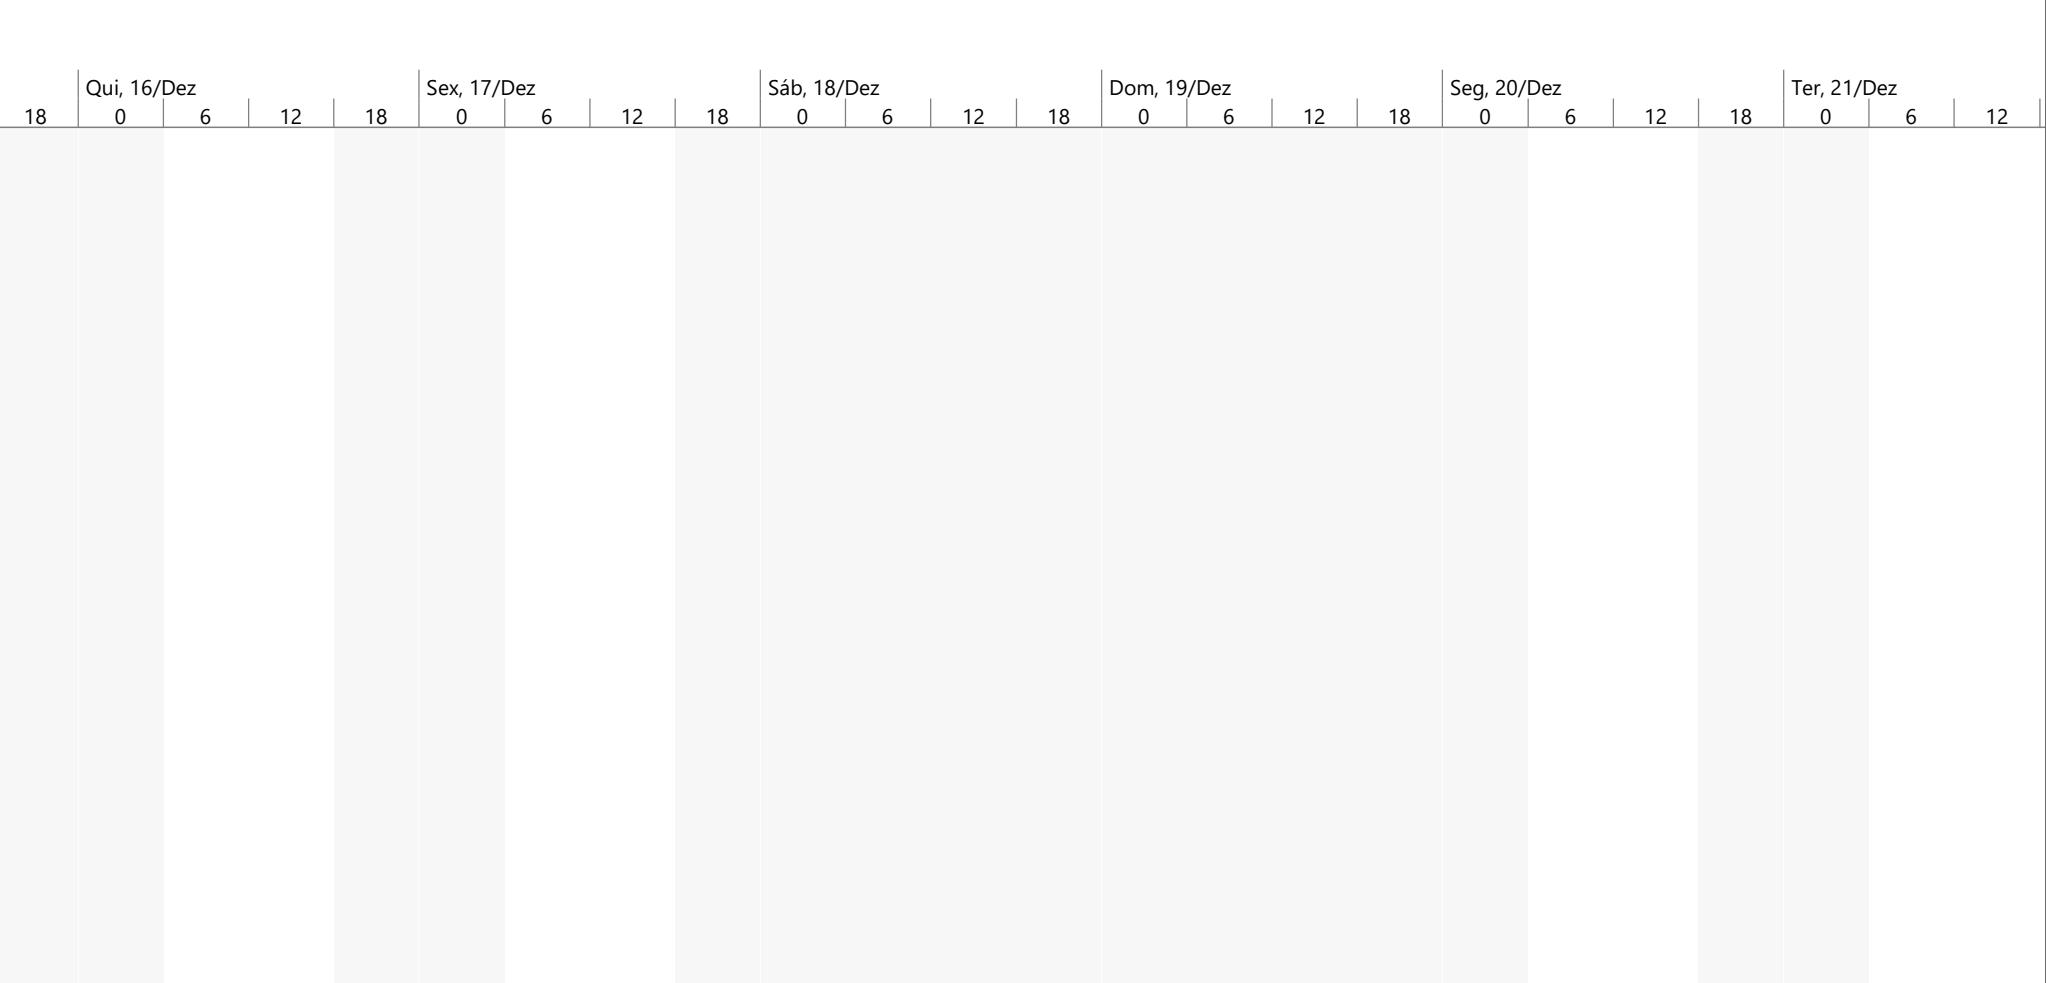


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18	Qua, 22/Dez	0	6	12	18	Qui, 23/Dez	0	6	12	18	Sex, 24/Dez	0	6	12	18	Sáb, 25/Dez	0	6	12	18	Dom, 26/Dez	0	6	12	18	Seg, 27/Dez	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

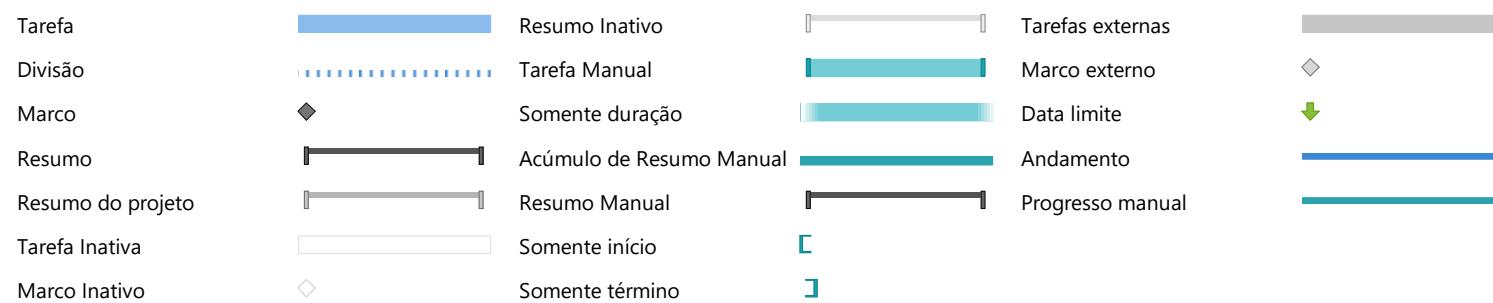


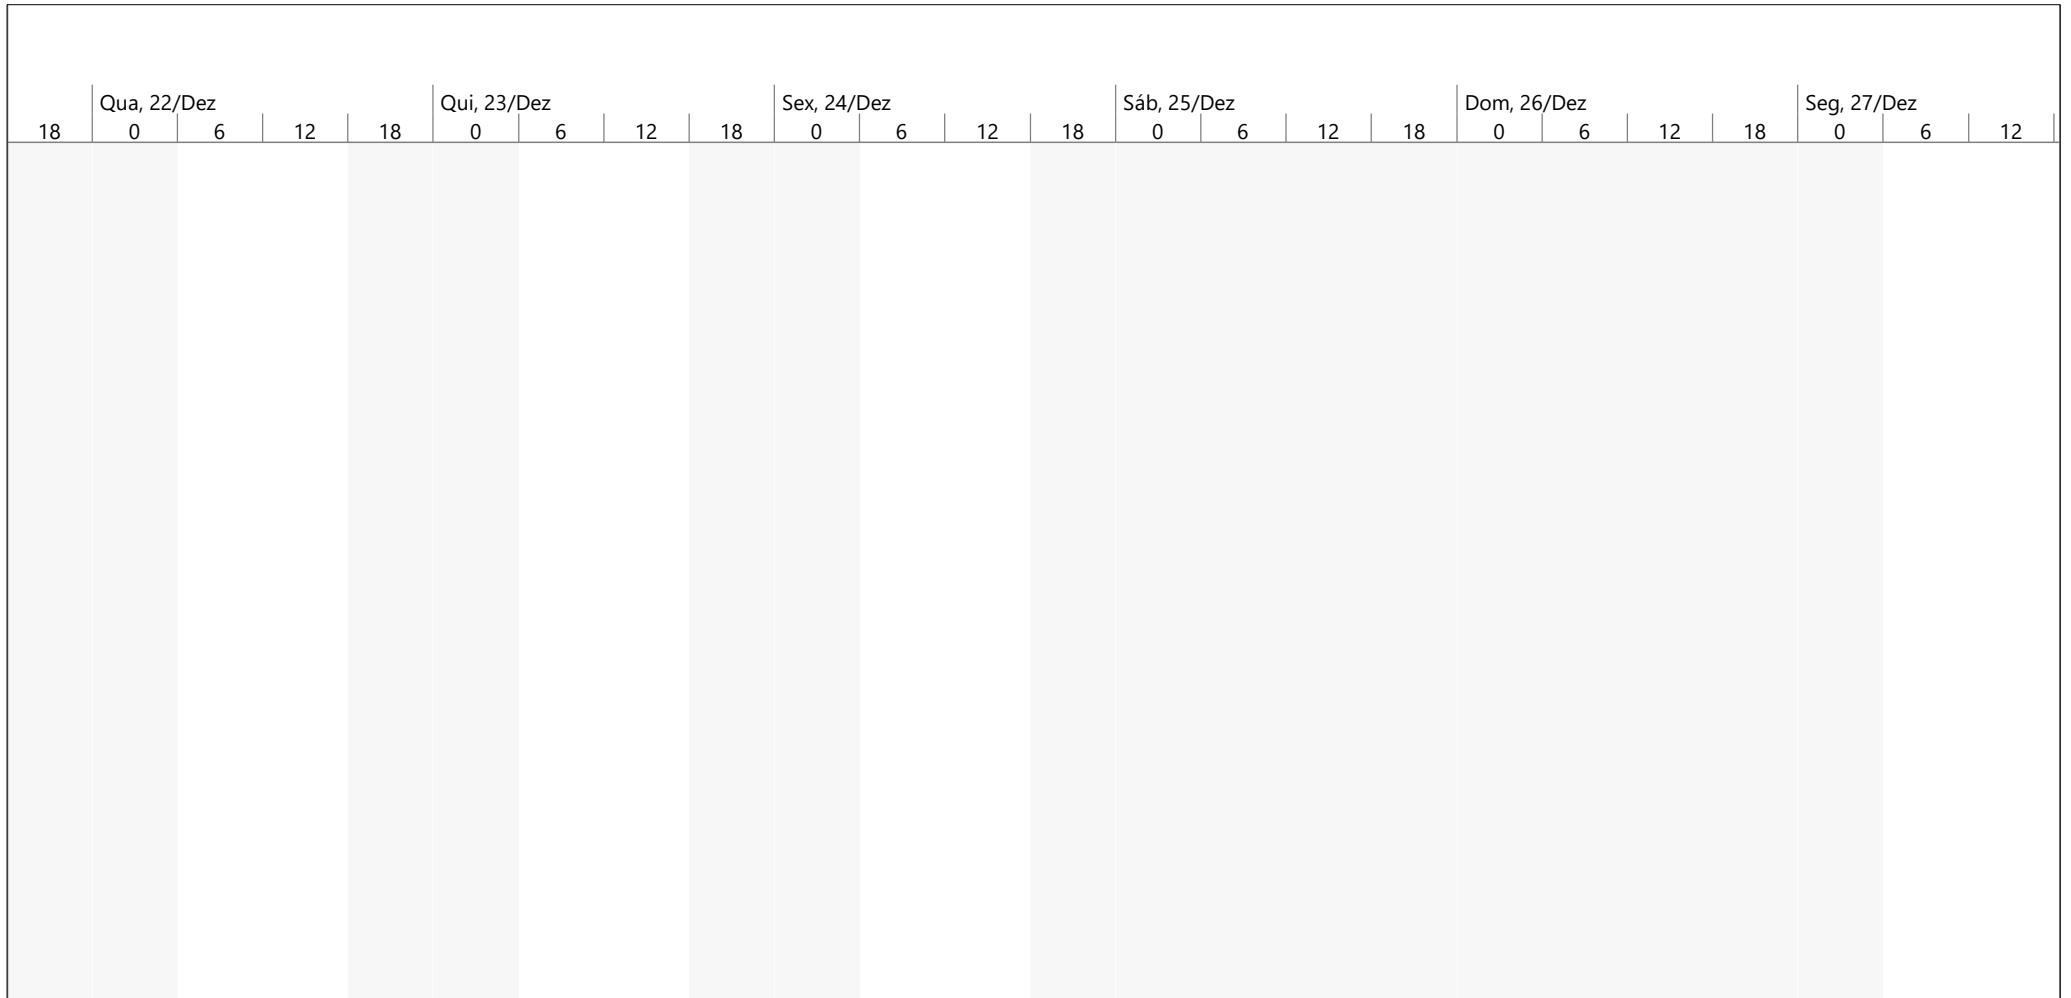

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

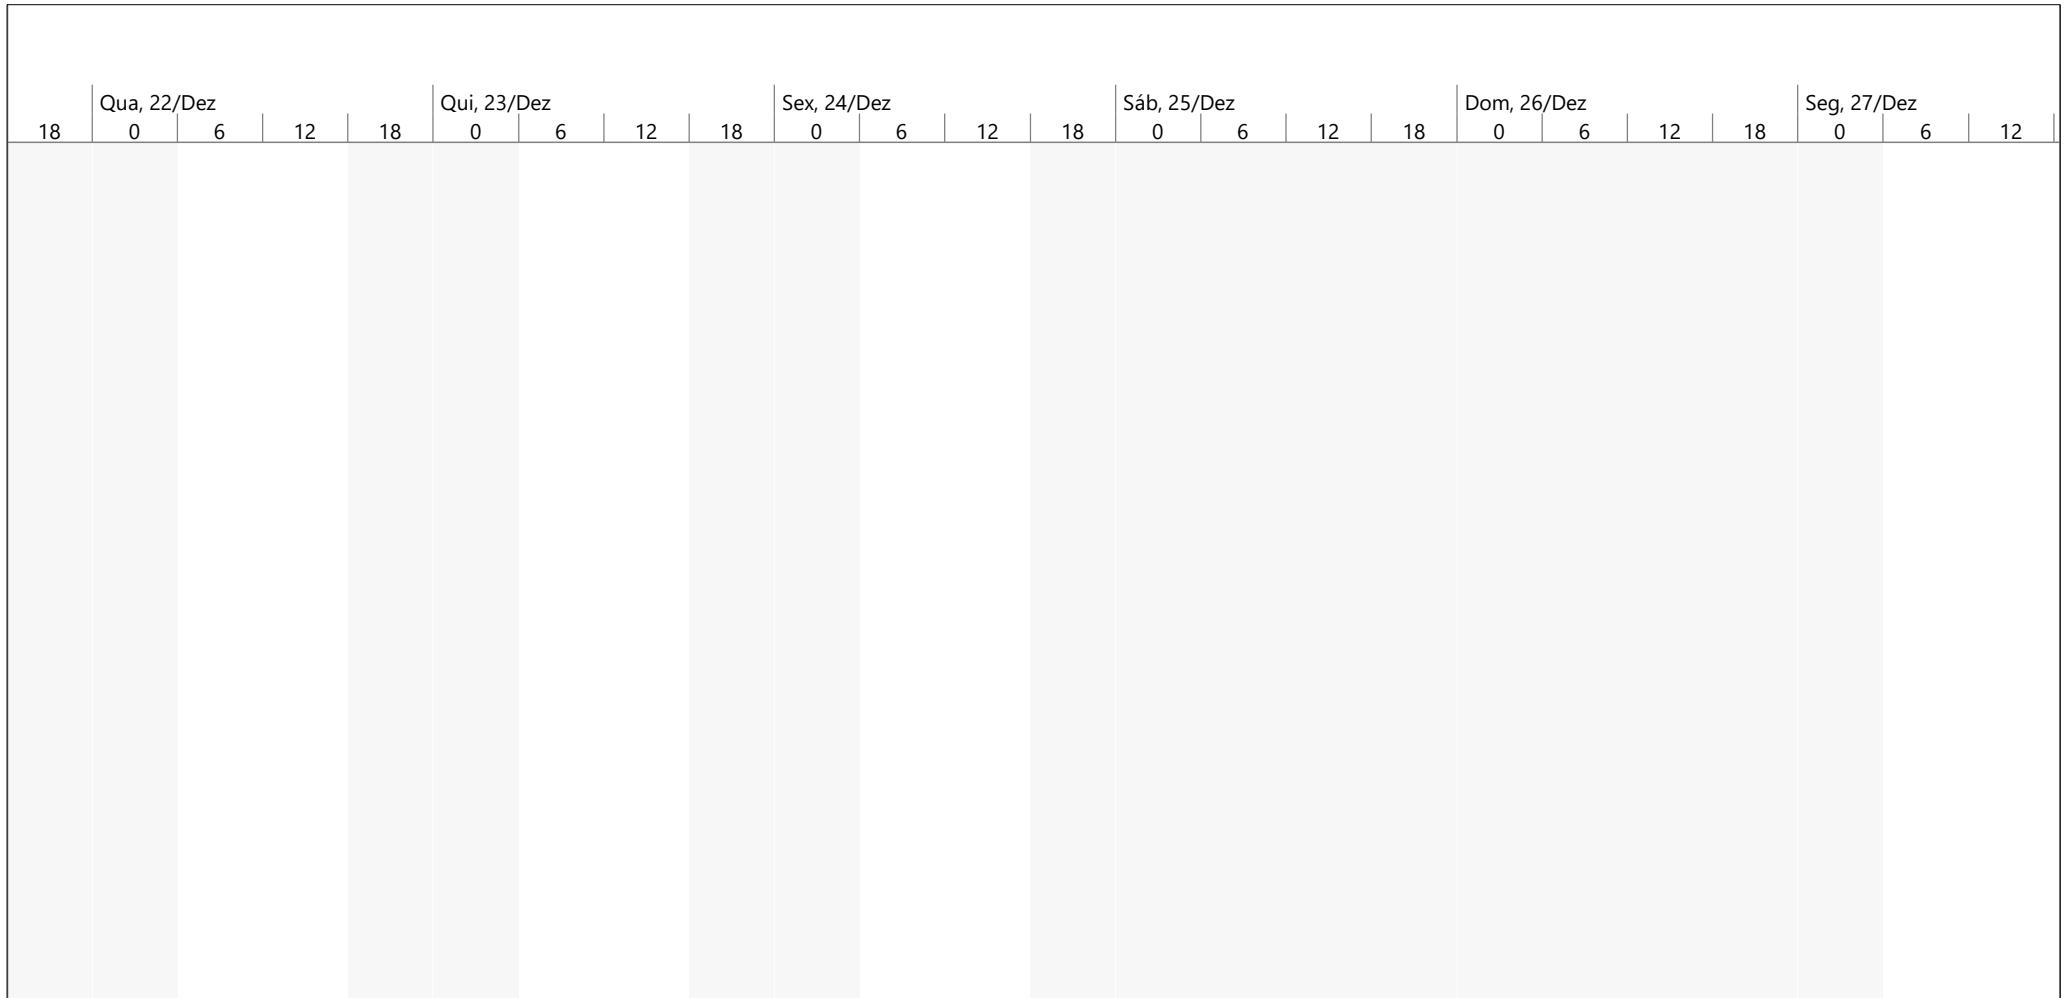

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

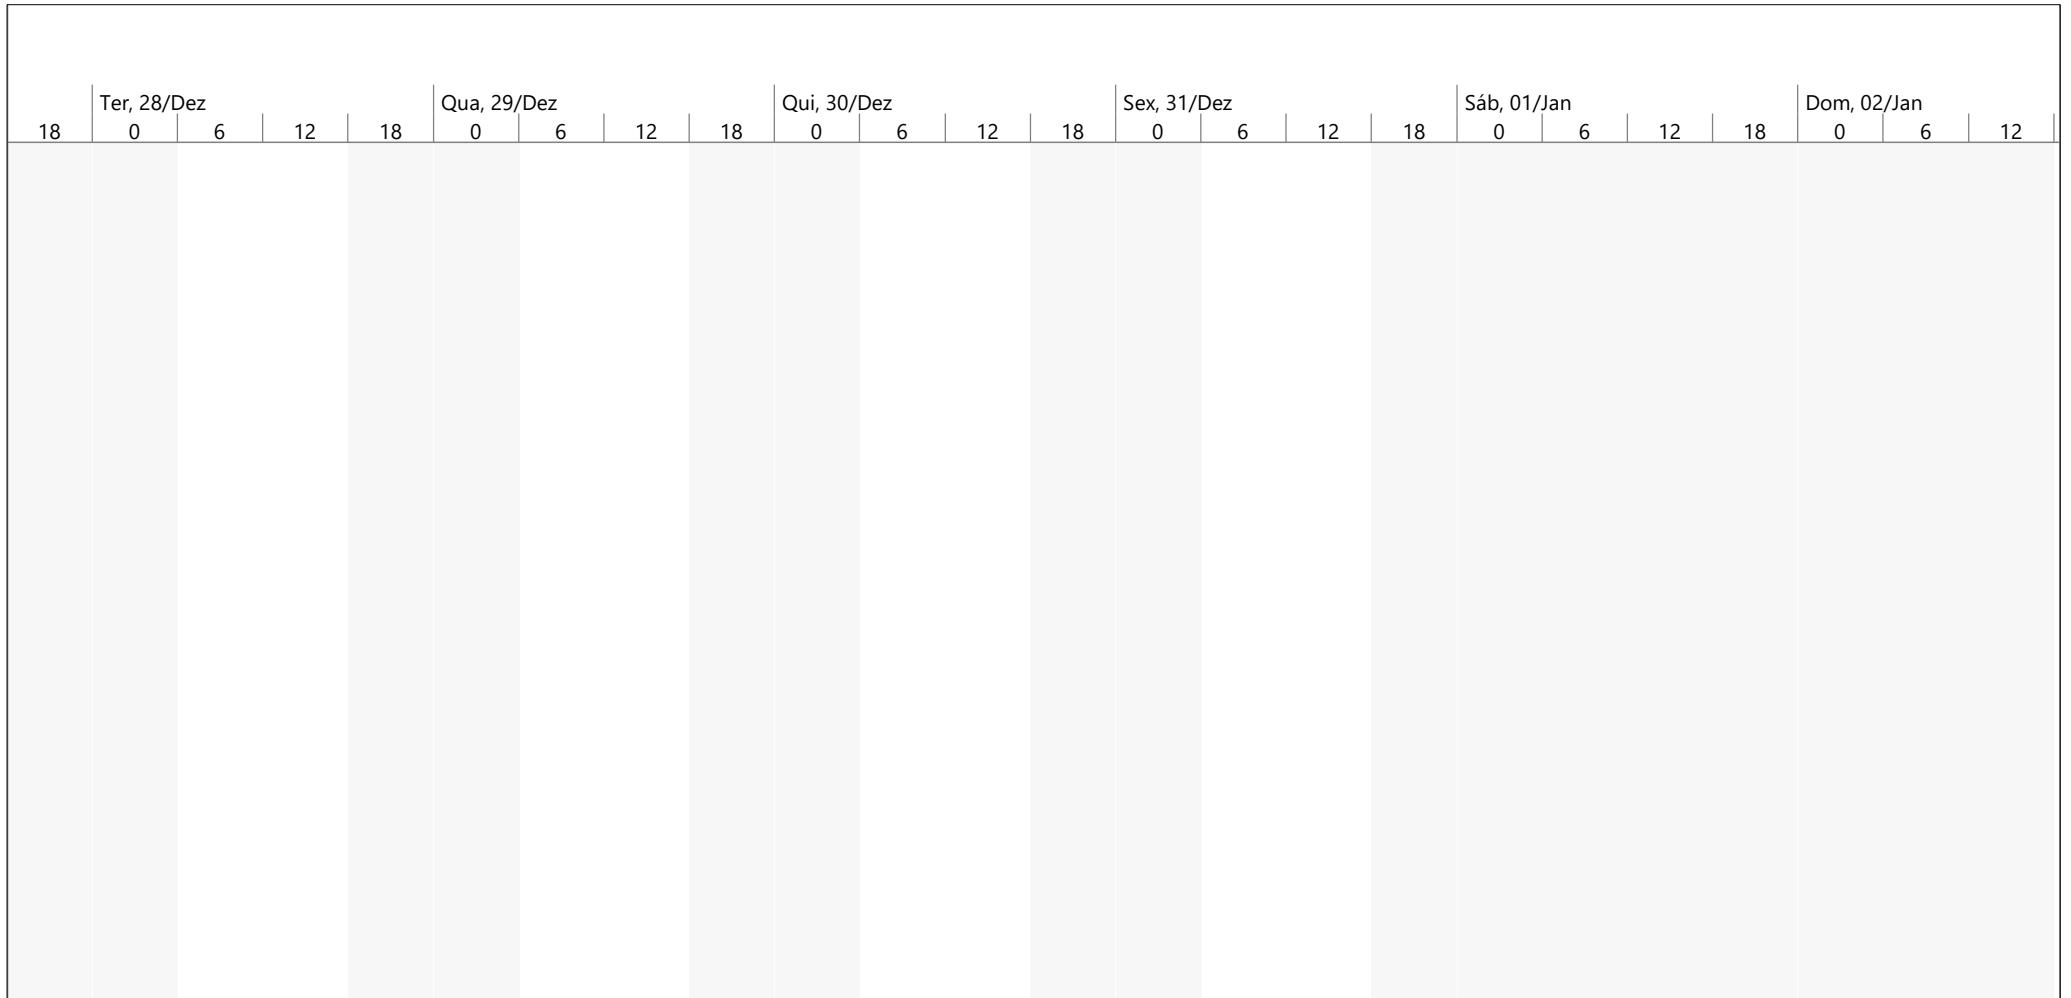


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

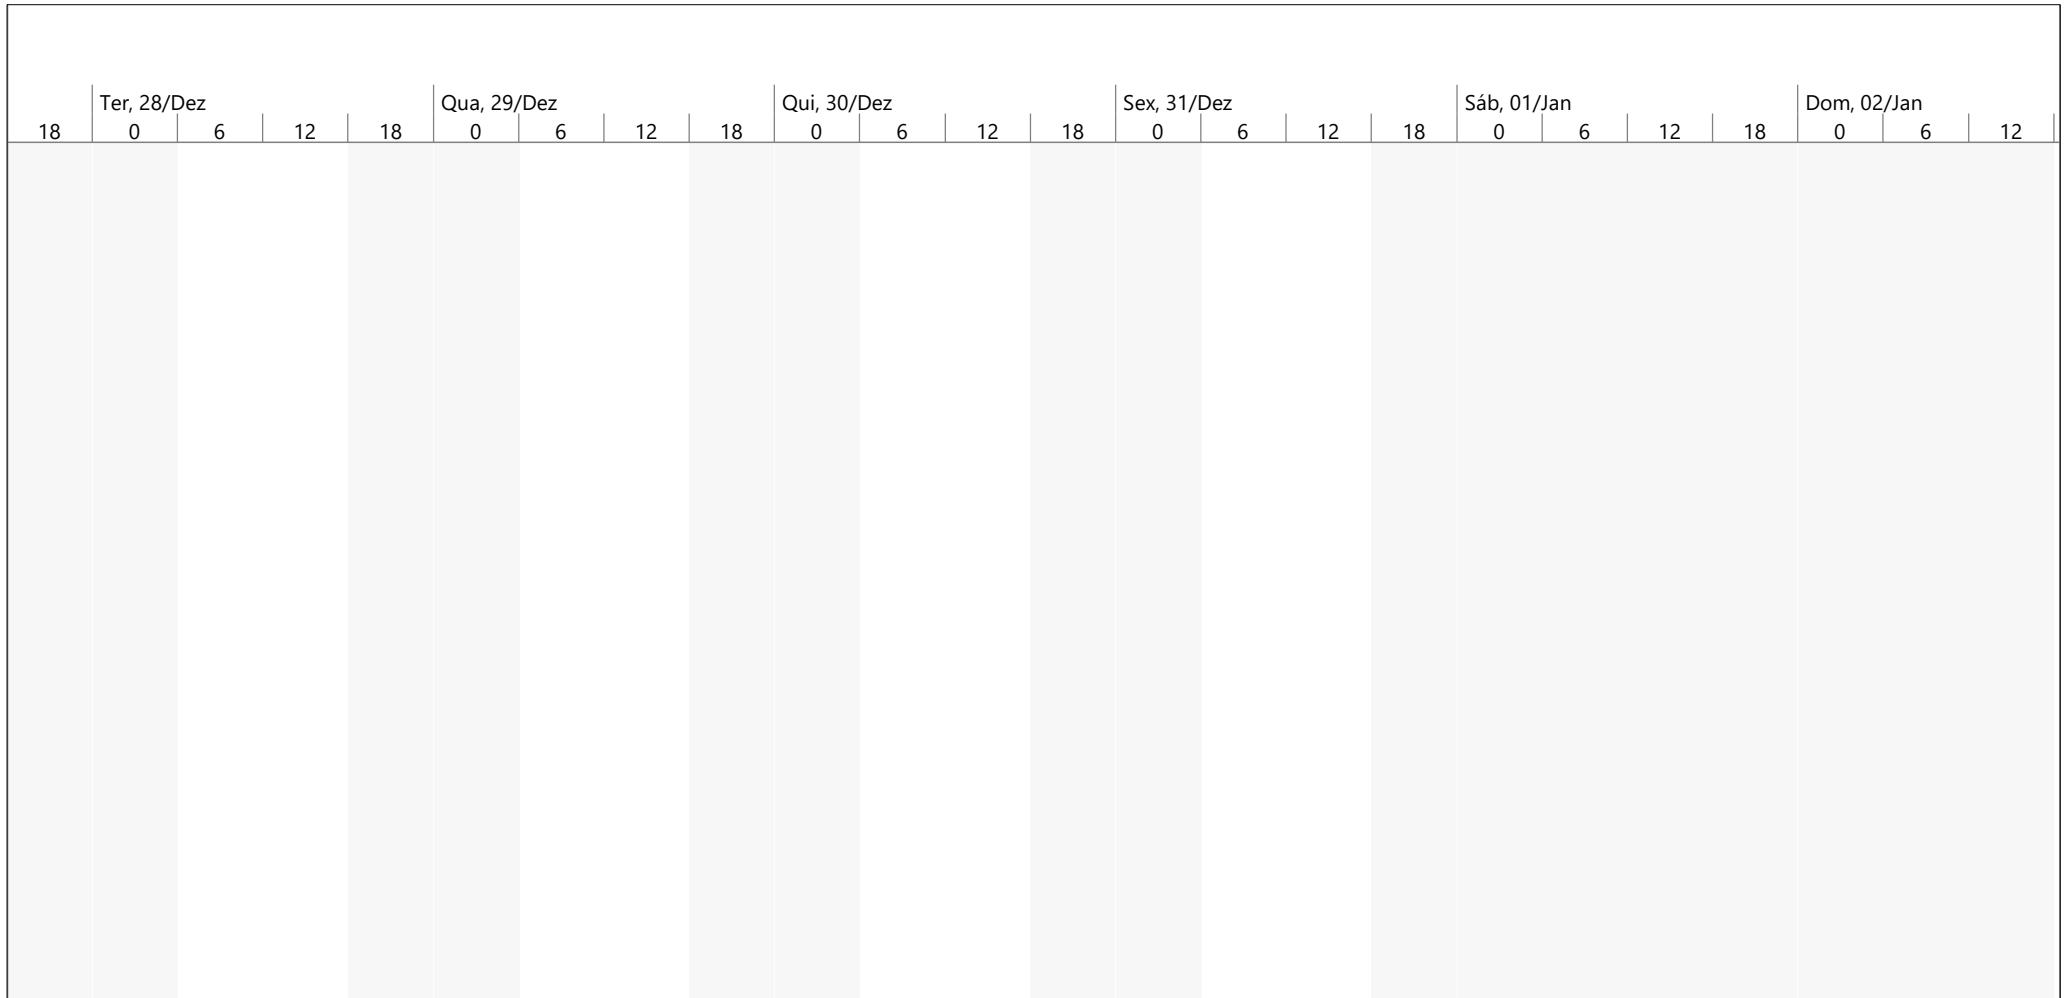


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

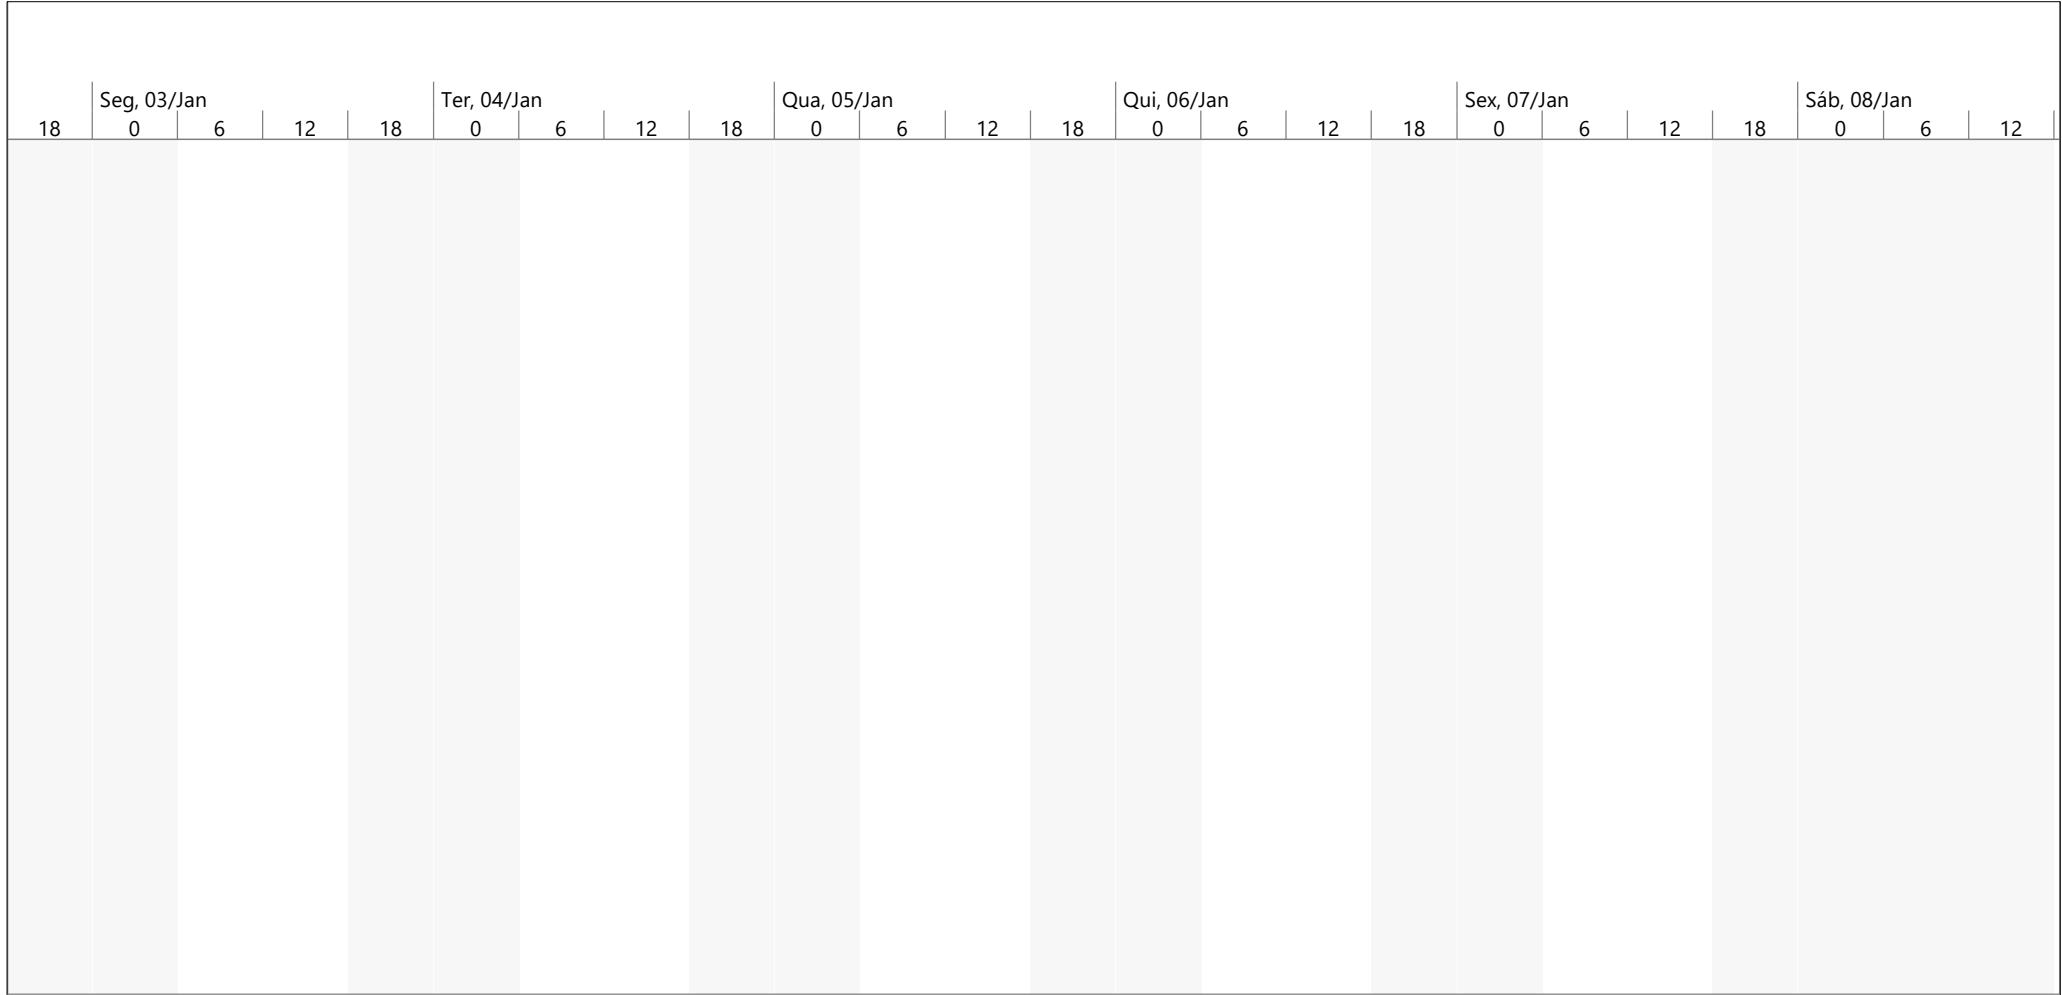


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

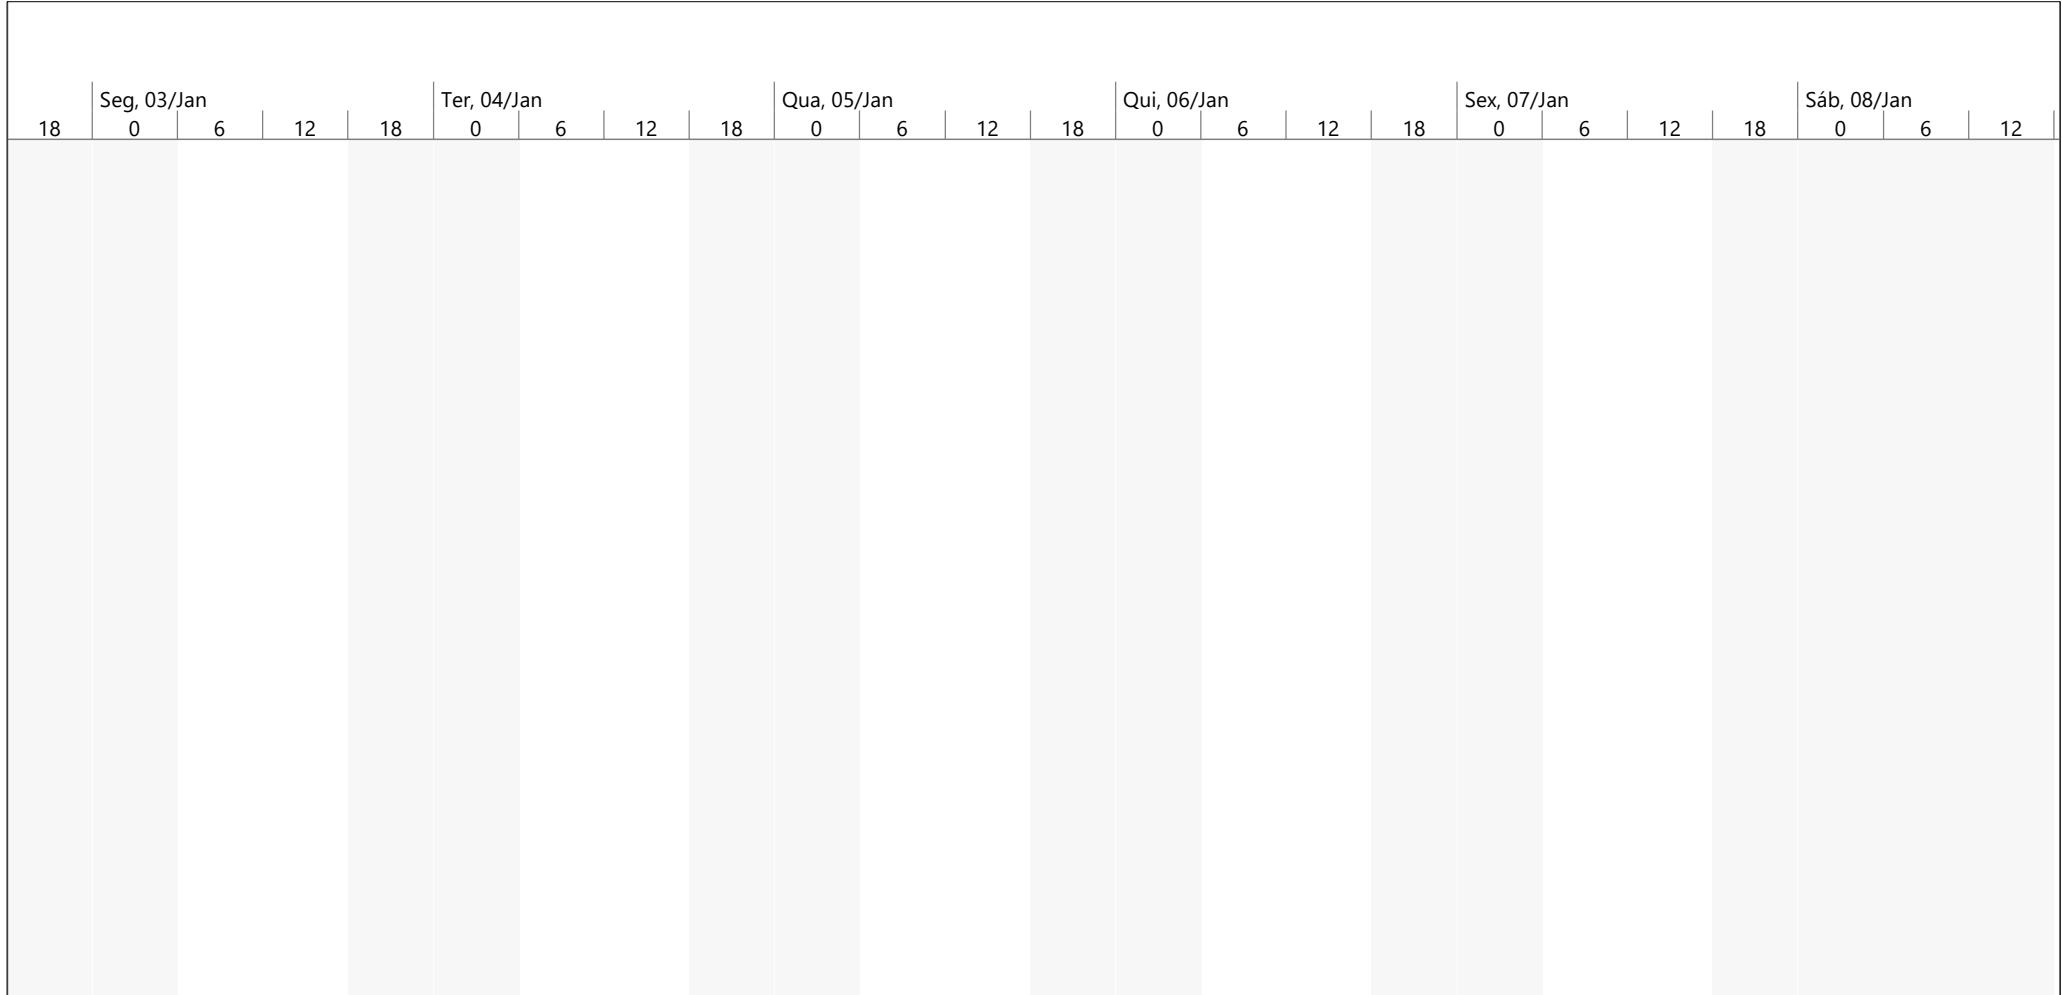


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

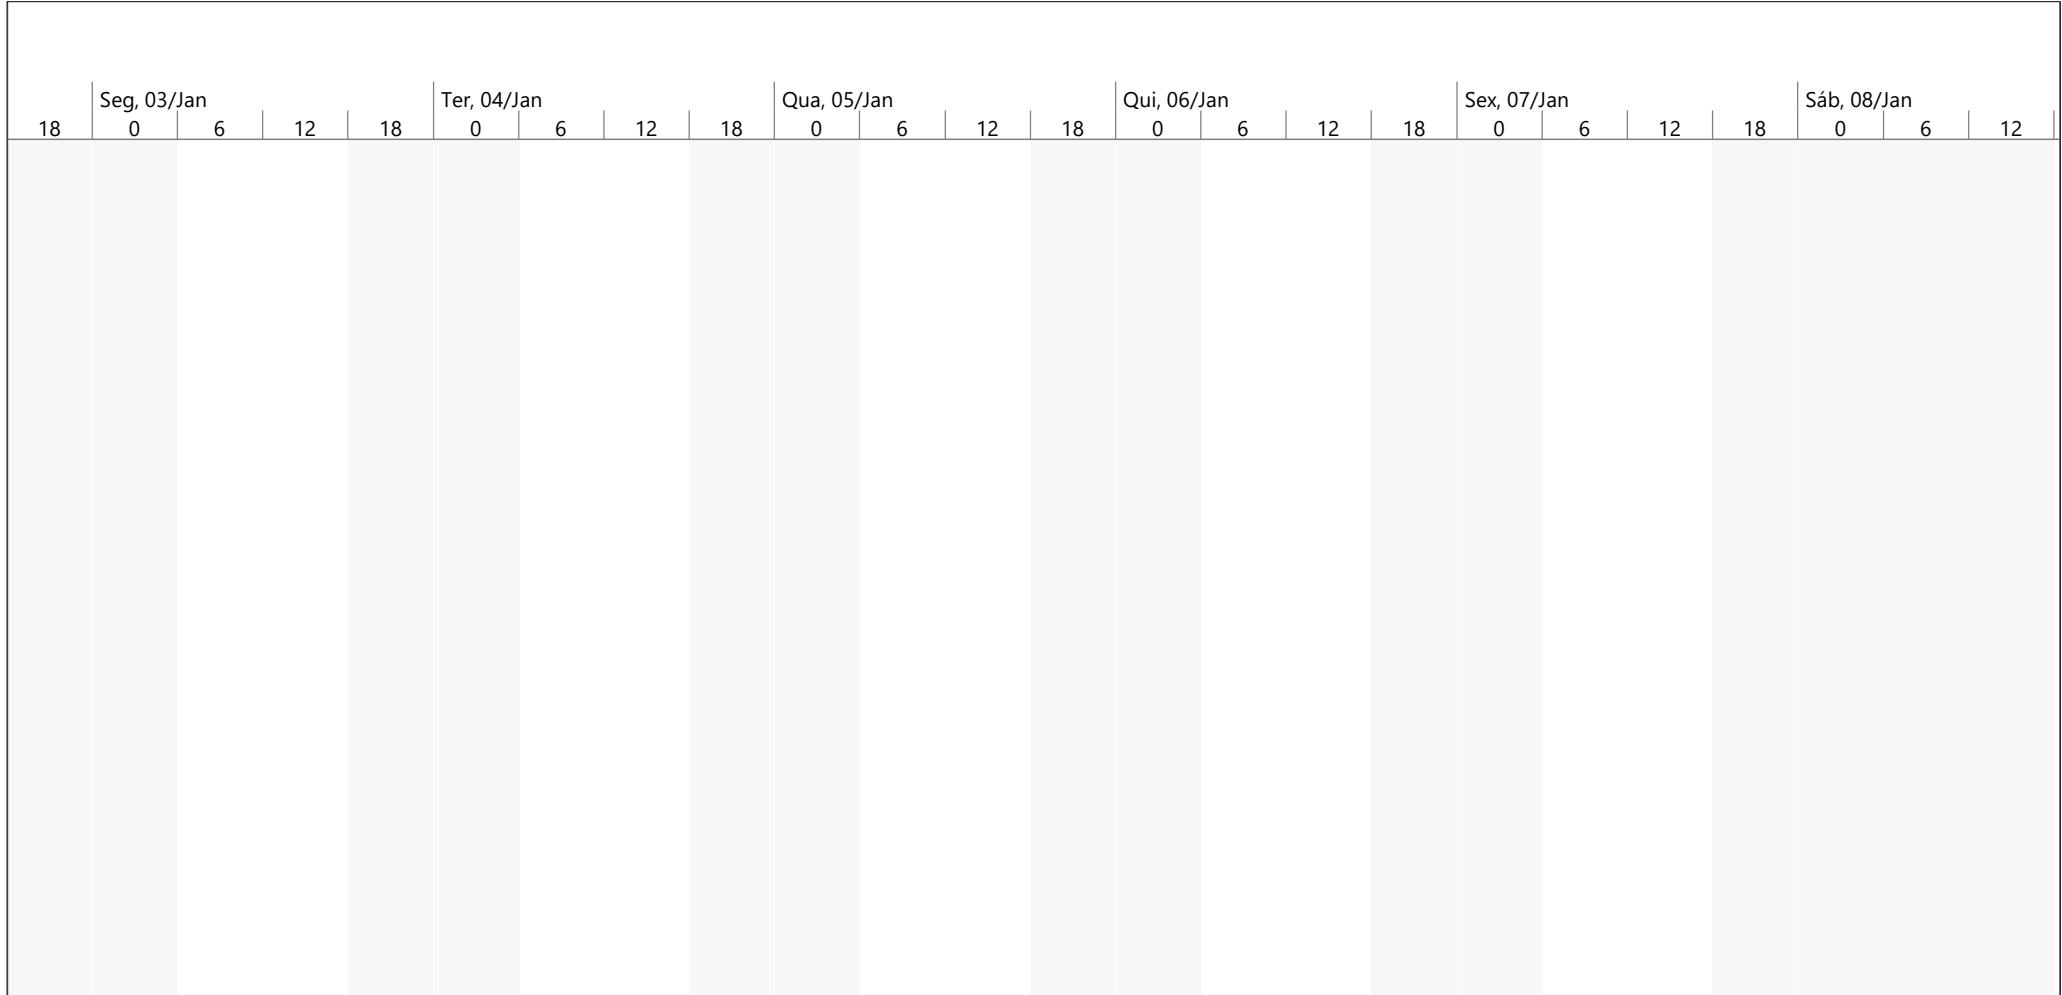


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

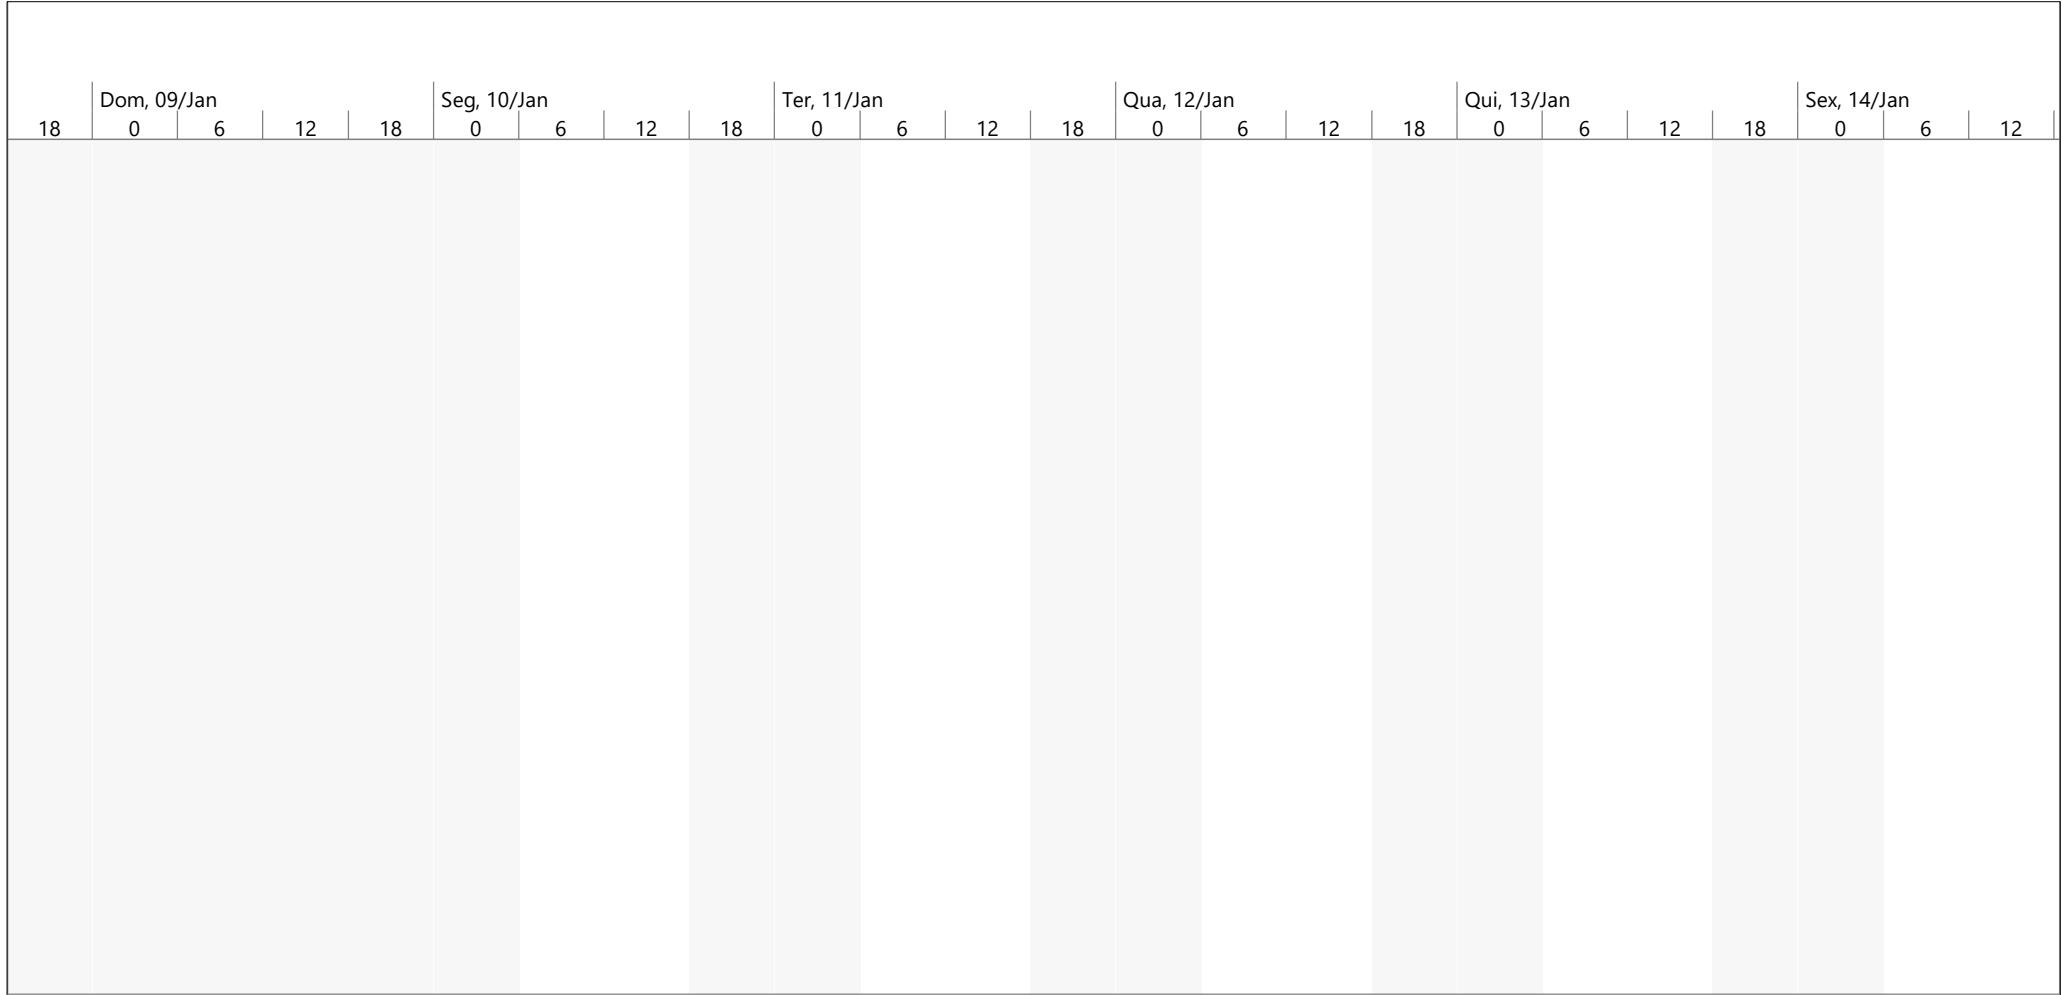


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

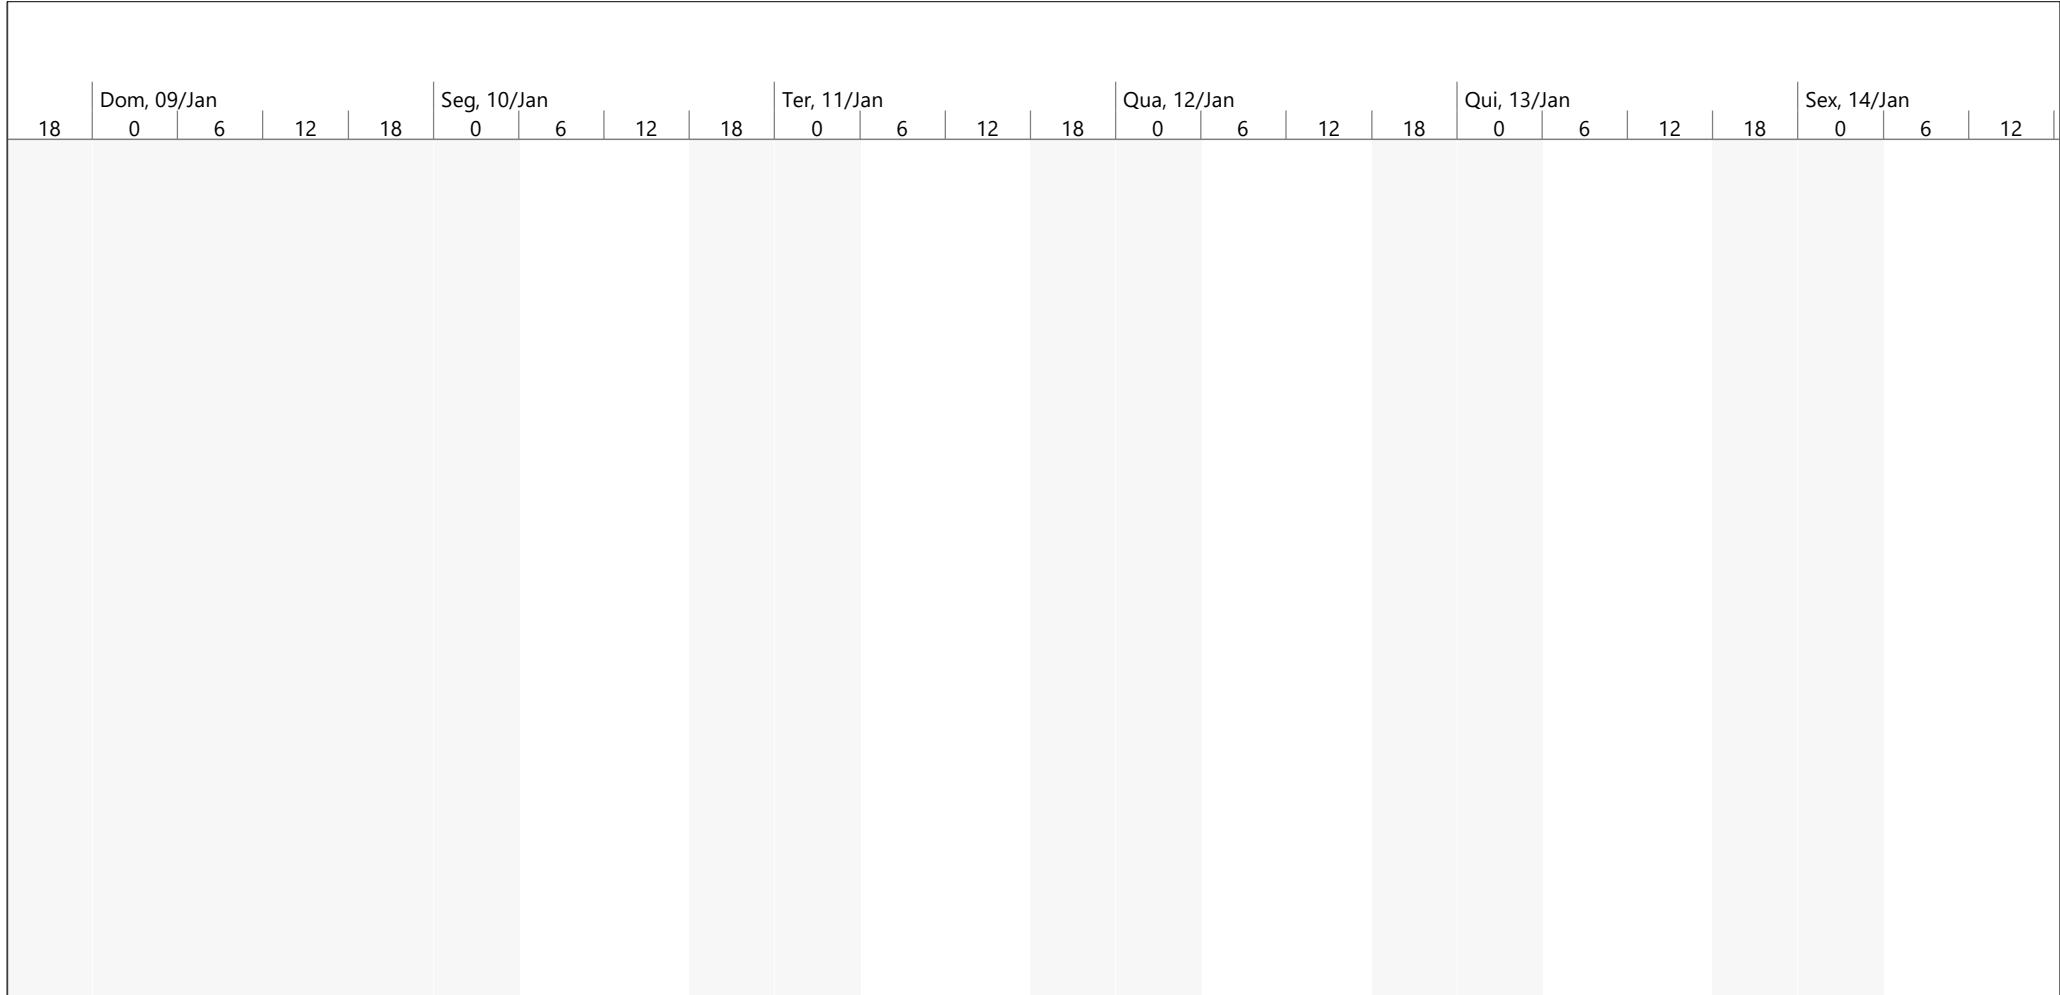

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

18	Sáb, 15/Jan	0	6	12	18	Dom, 16/Jan	0	6	12	18	Seg, 17/Jan	0	6	12	18	Ter, 18/Jan	0	6	12	18	Qua, 19/Jan	0	6	12	18	Qui, 20/Jan	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

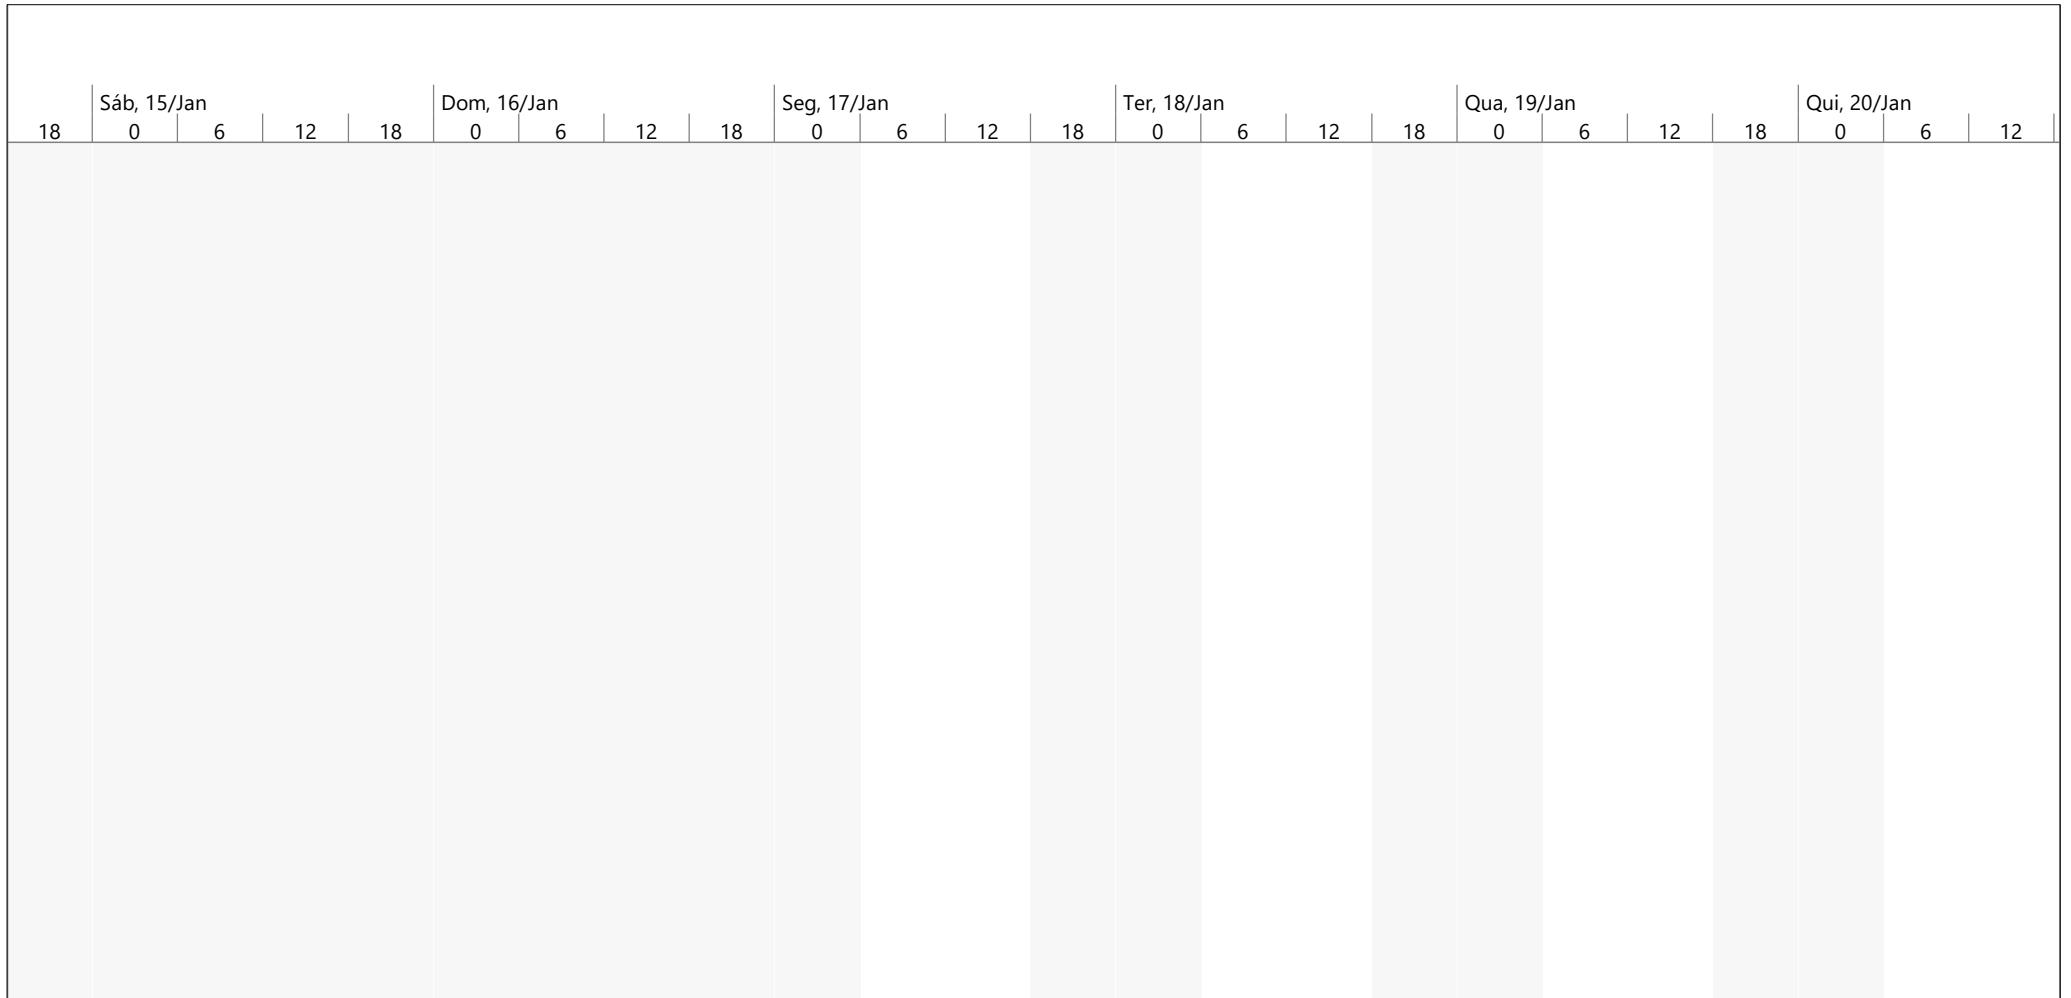


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

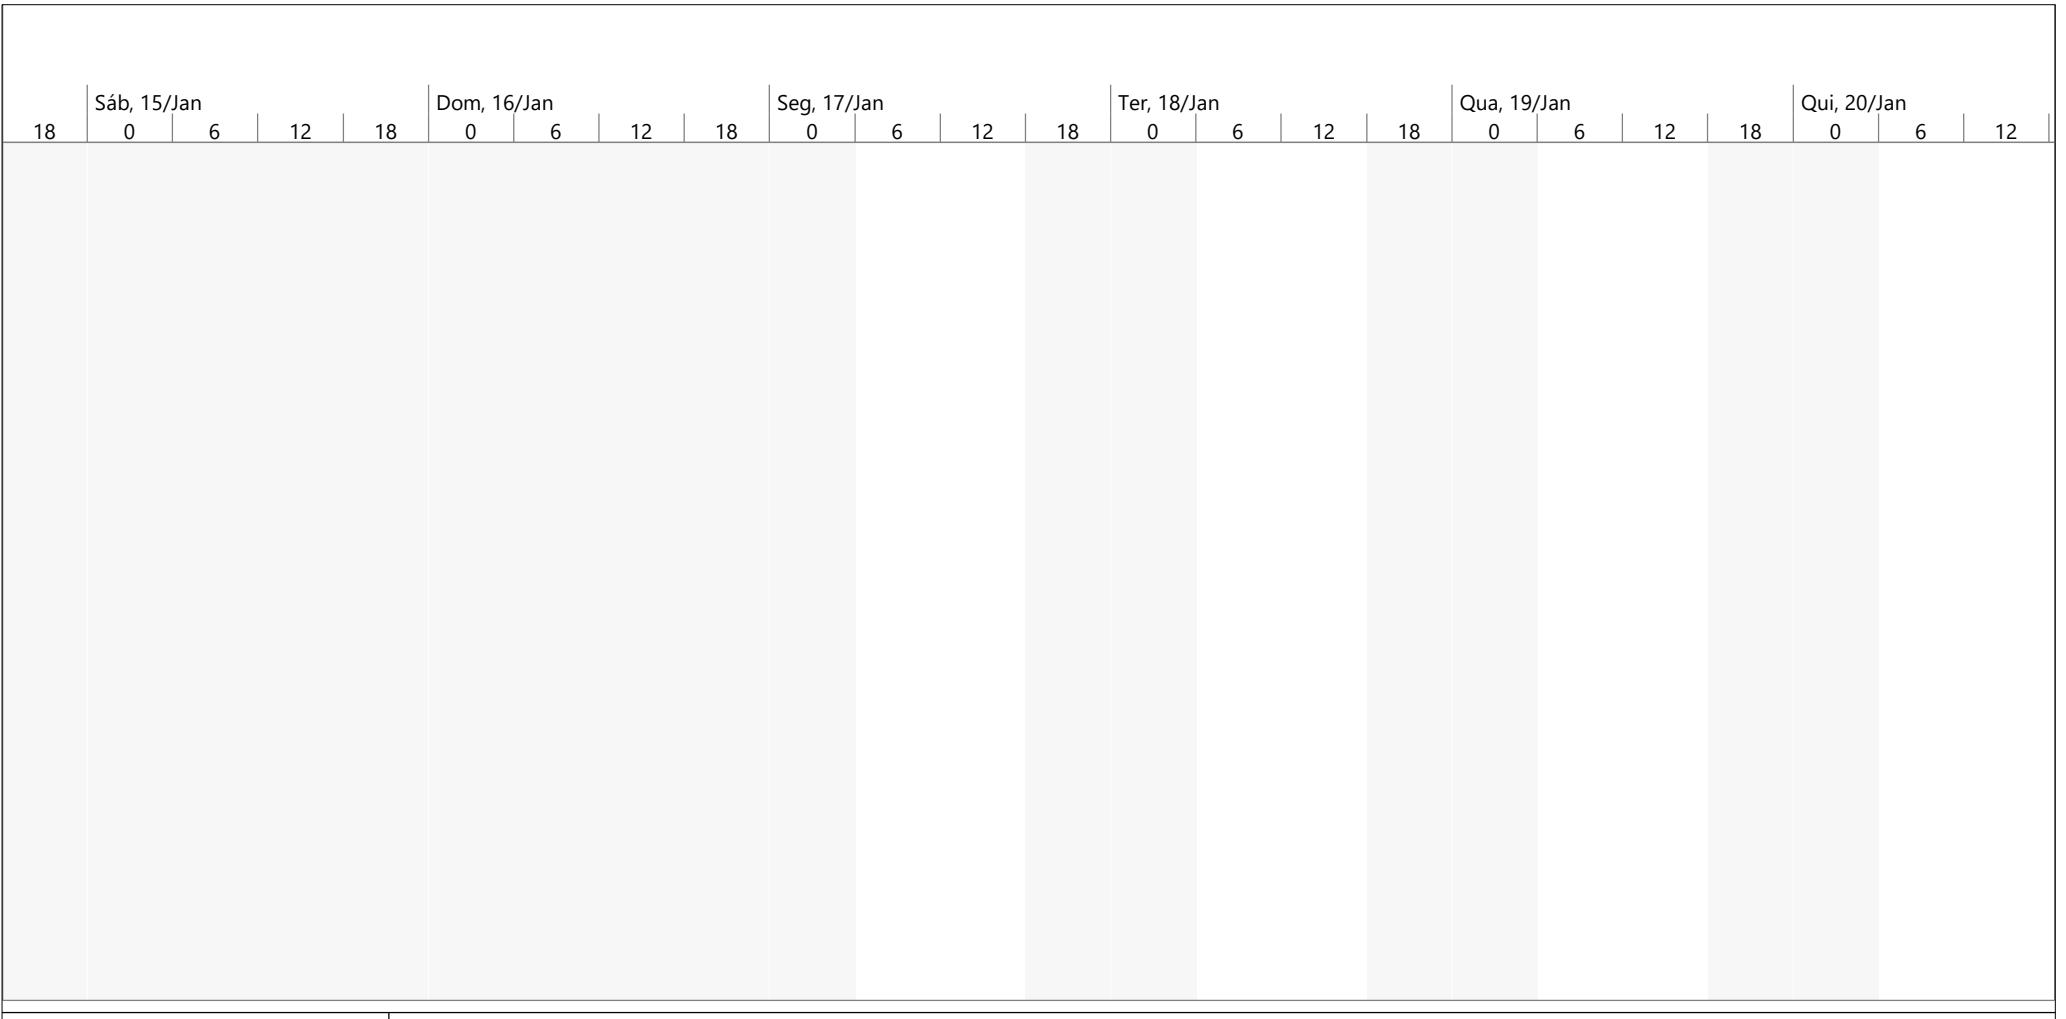


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

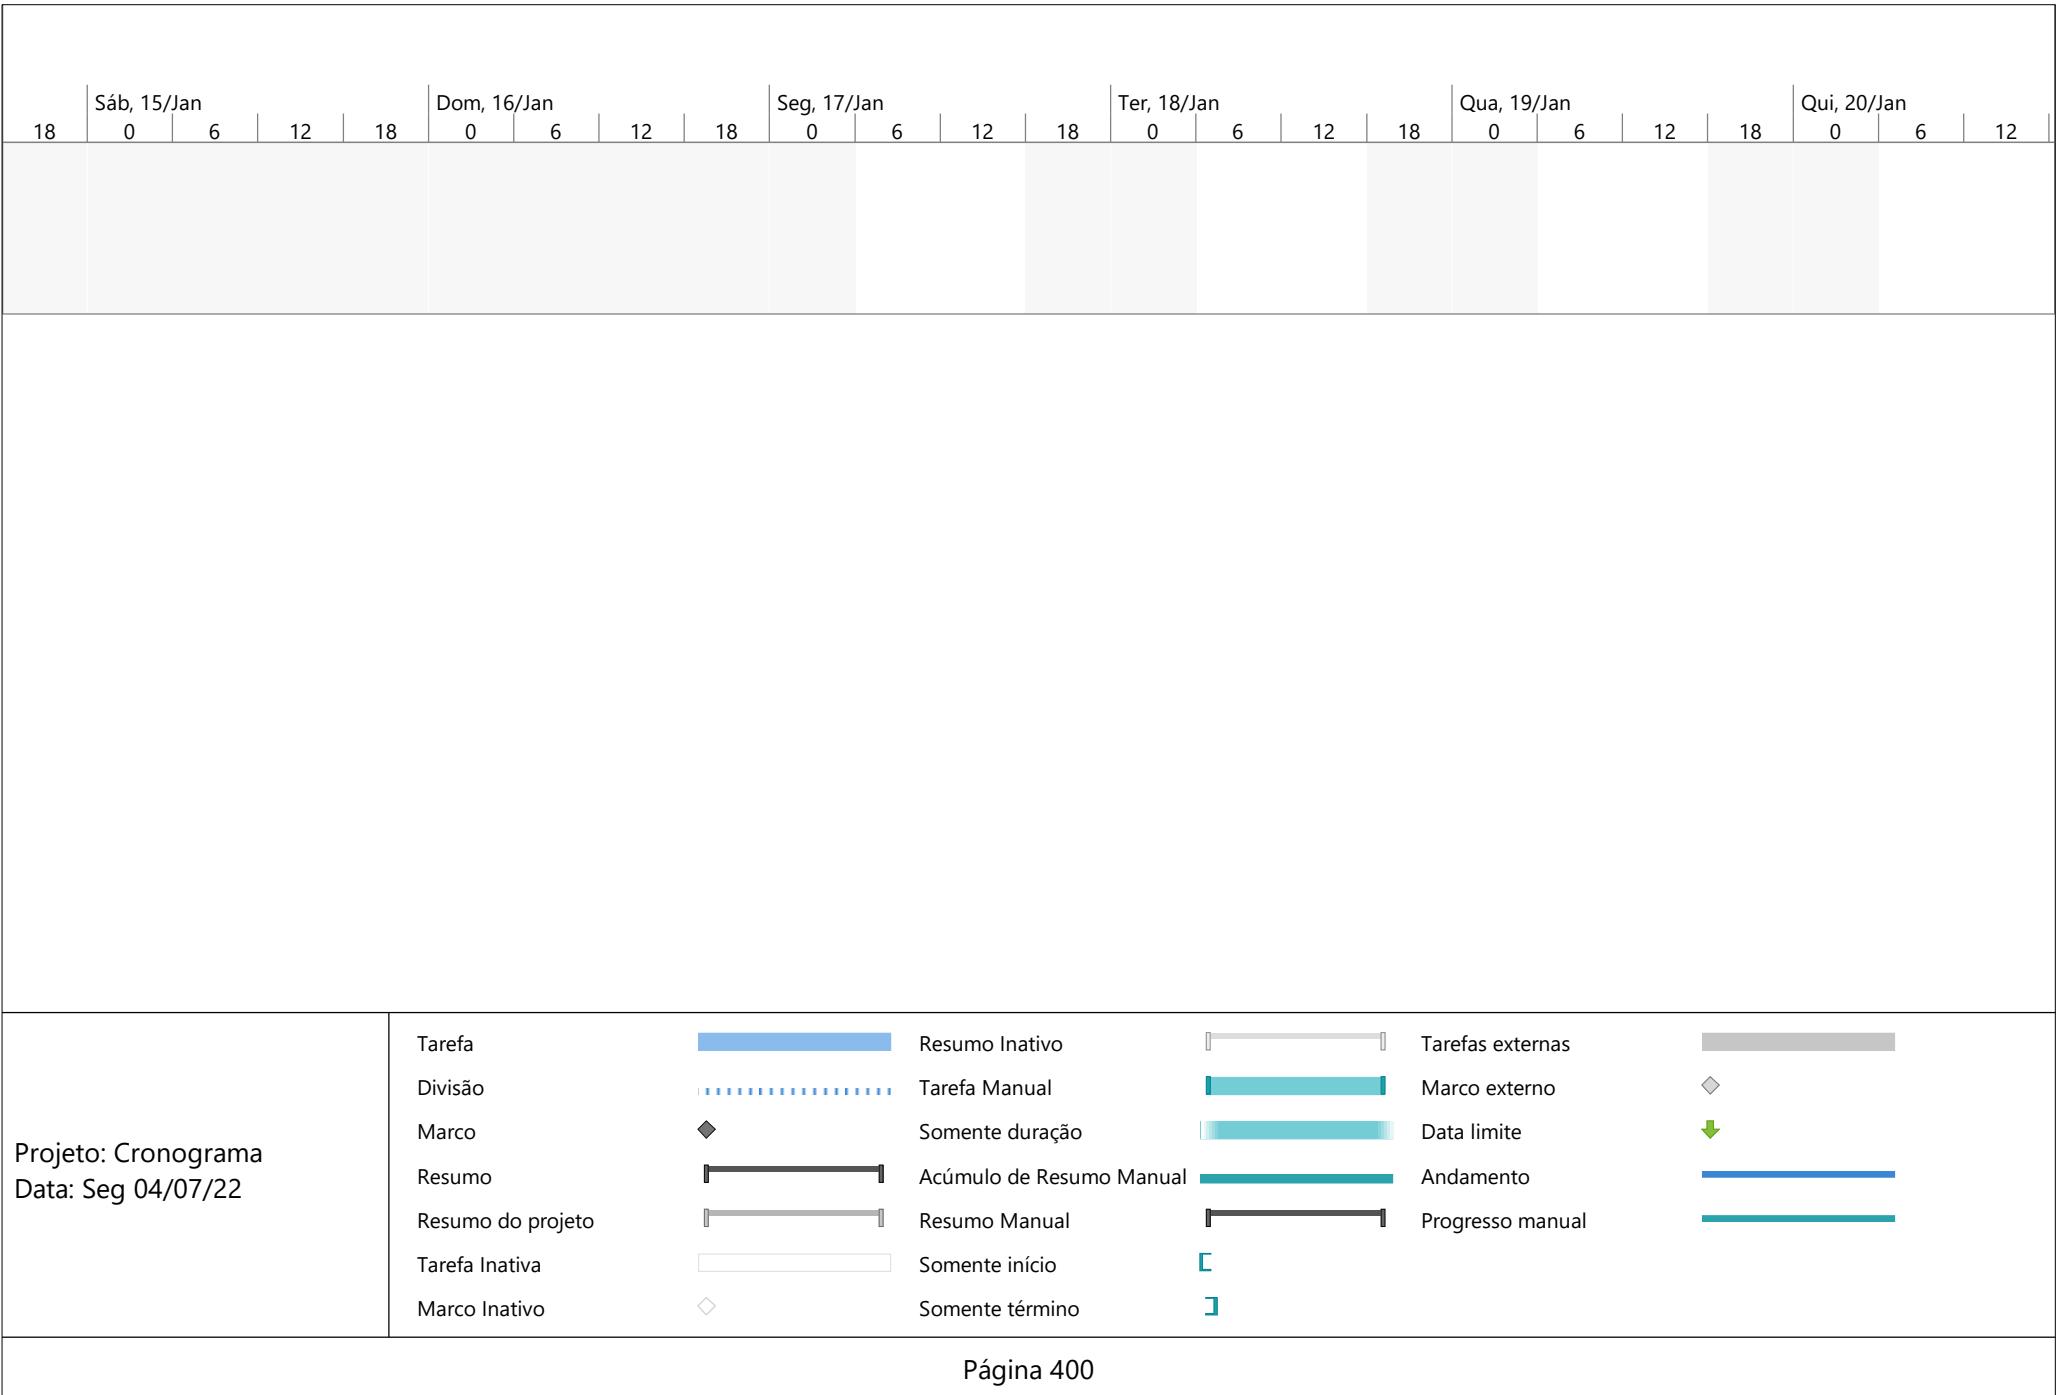


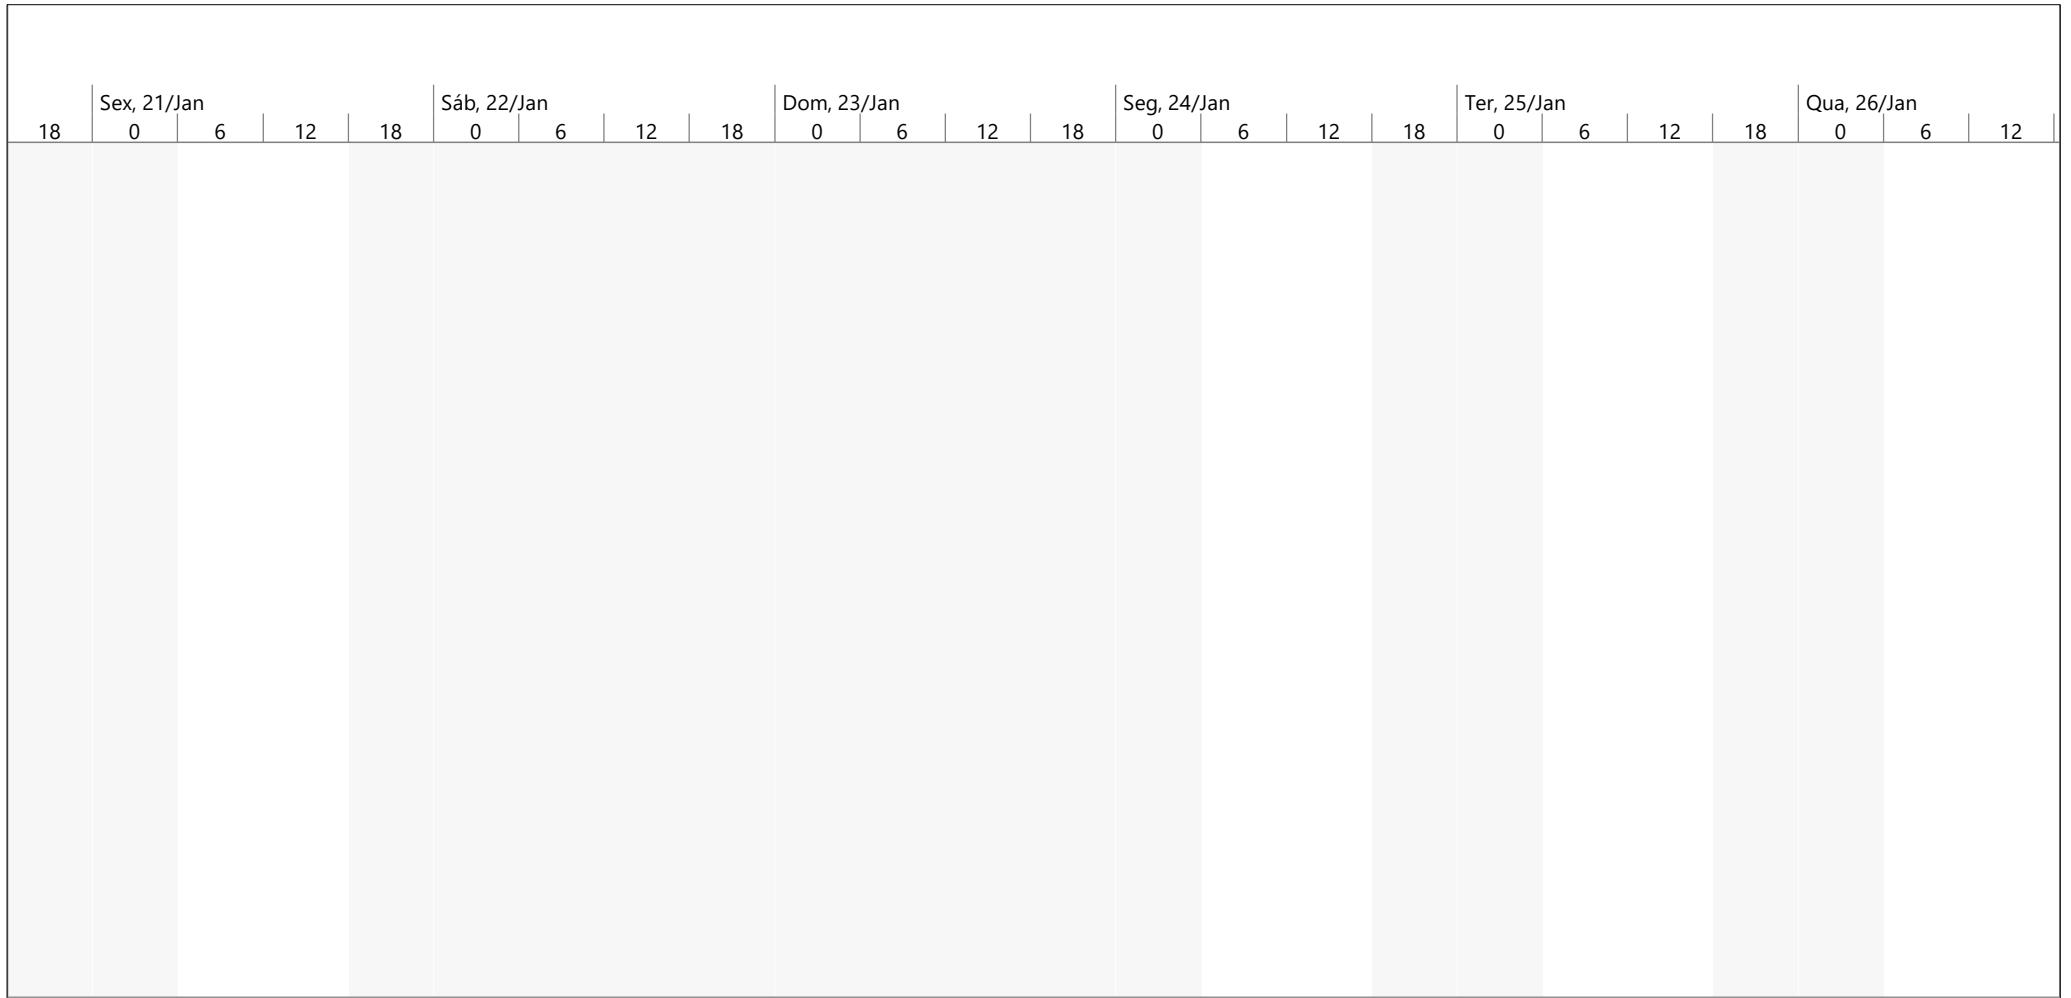


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

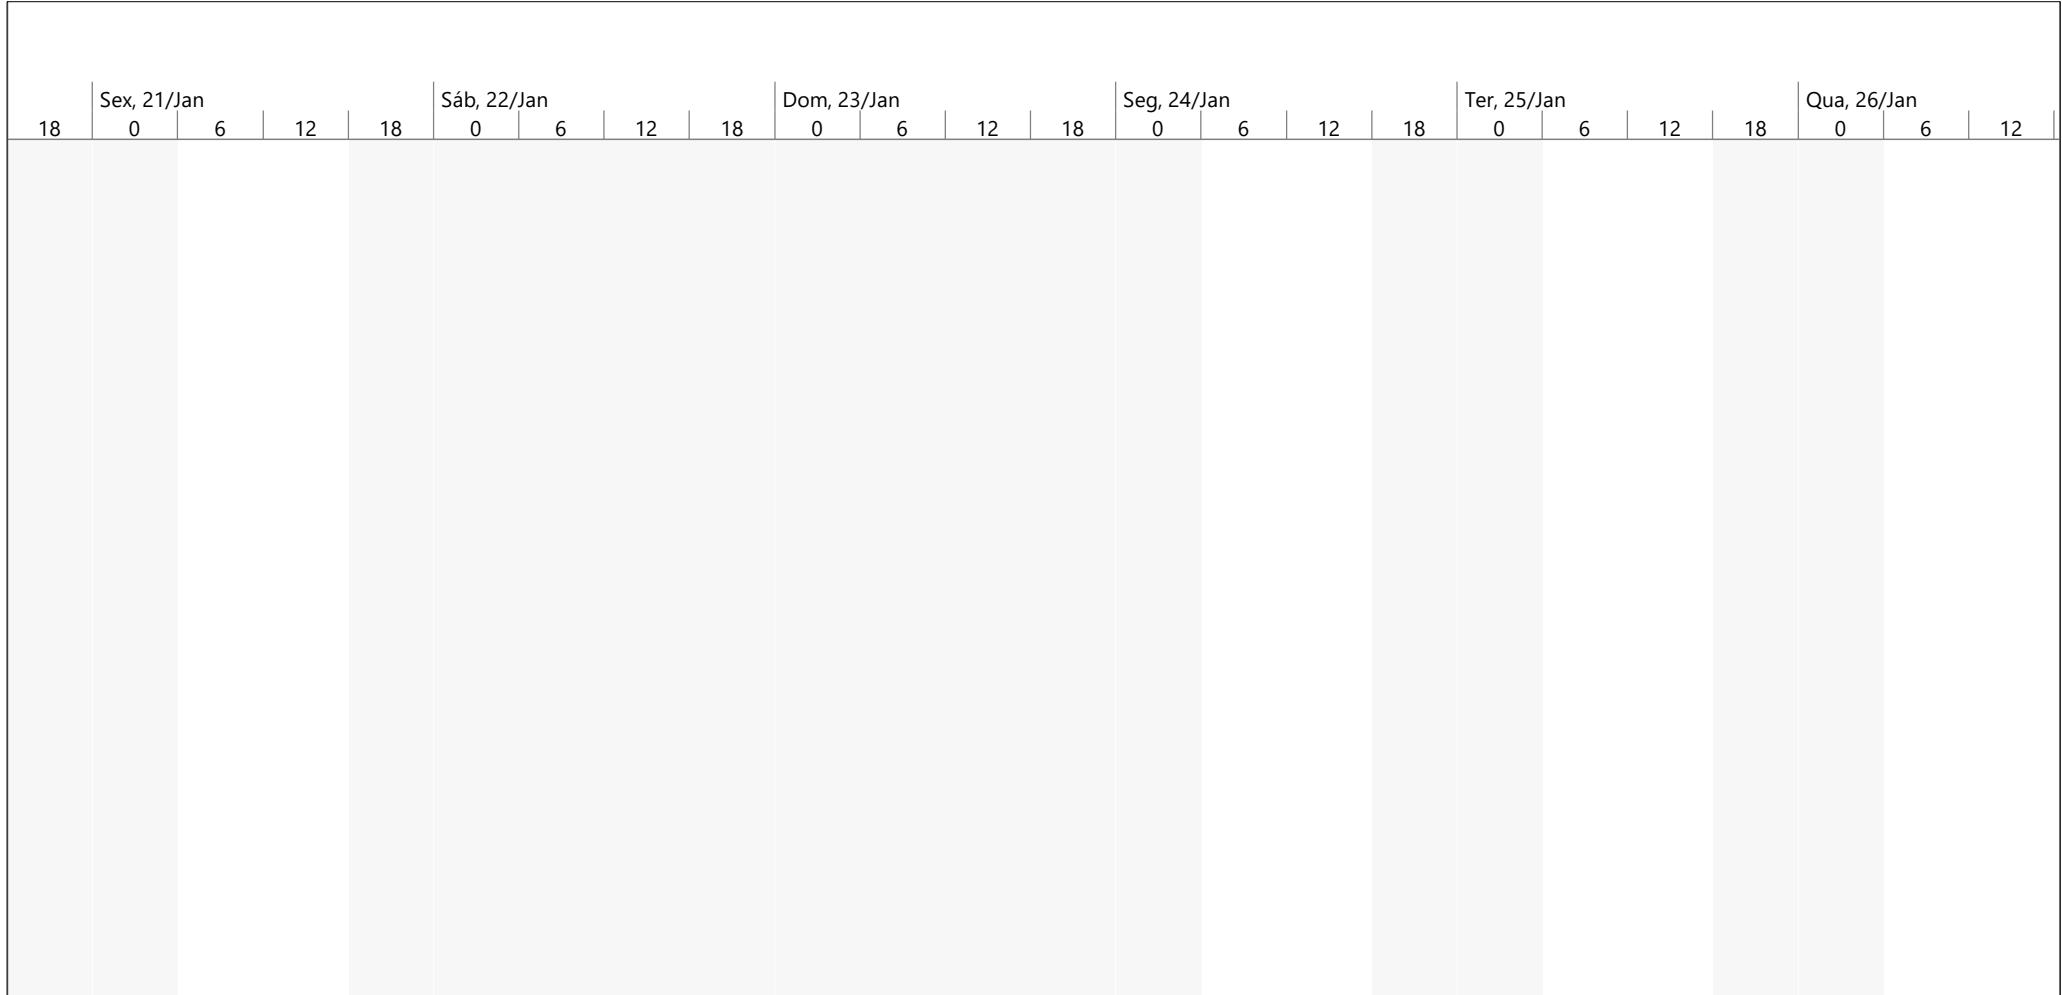


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

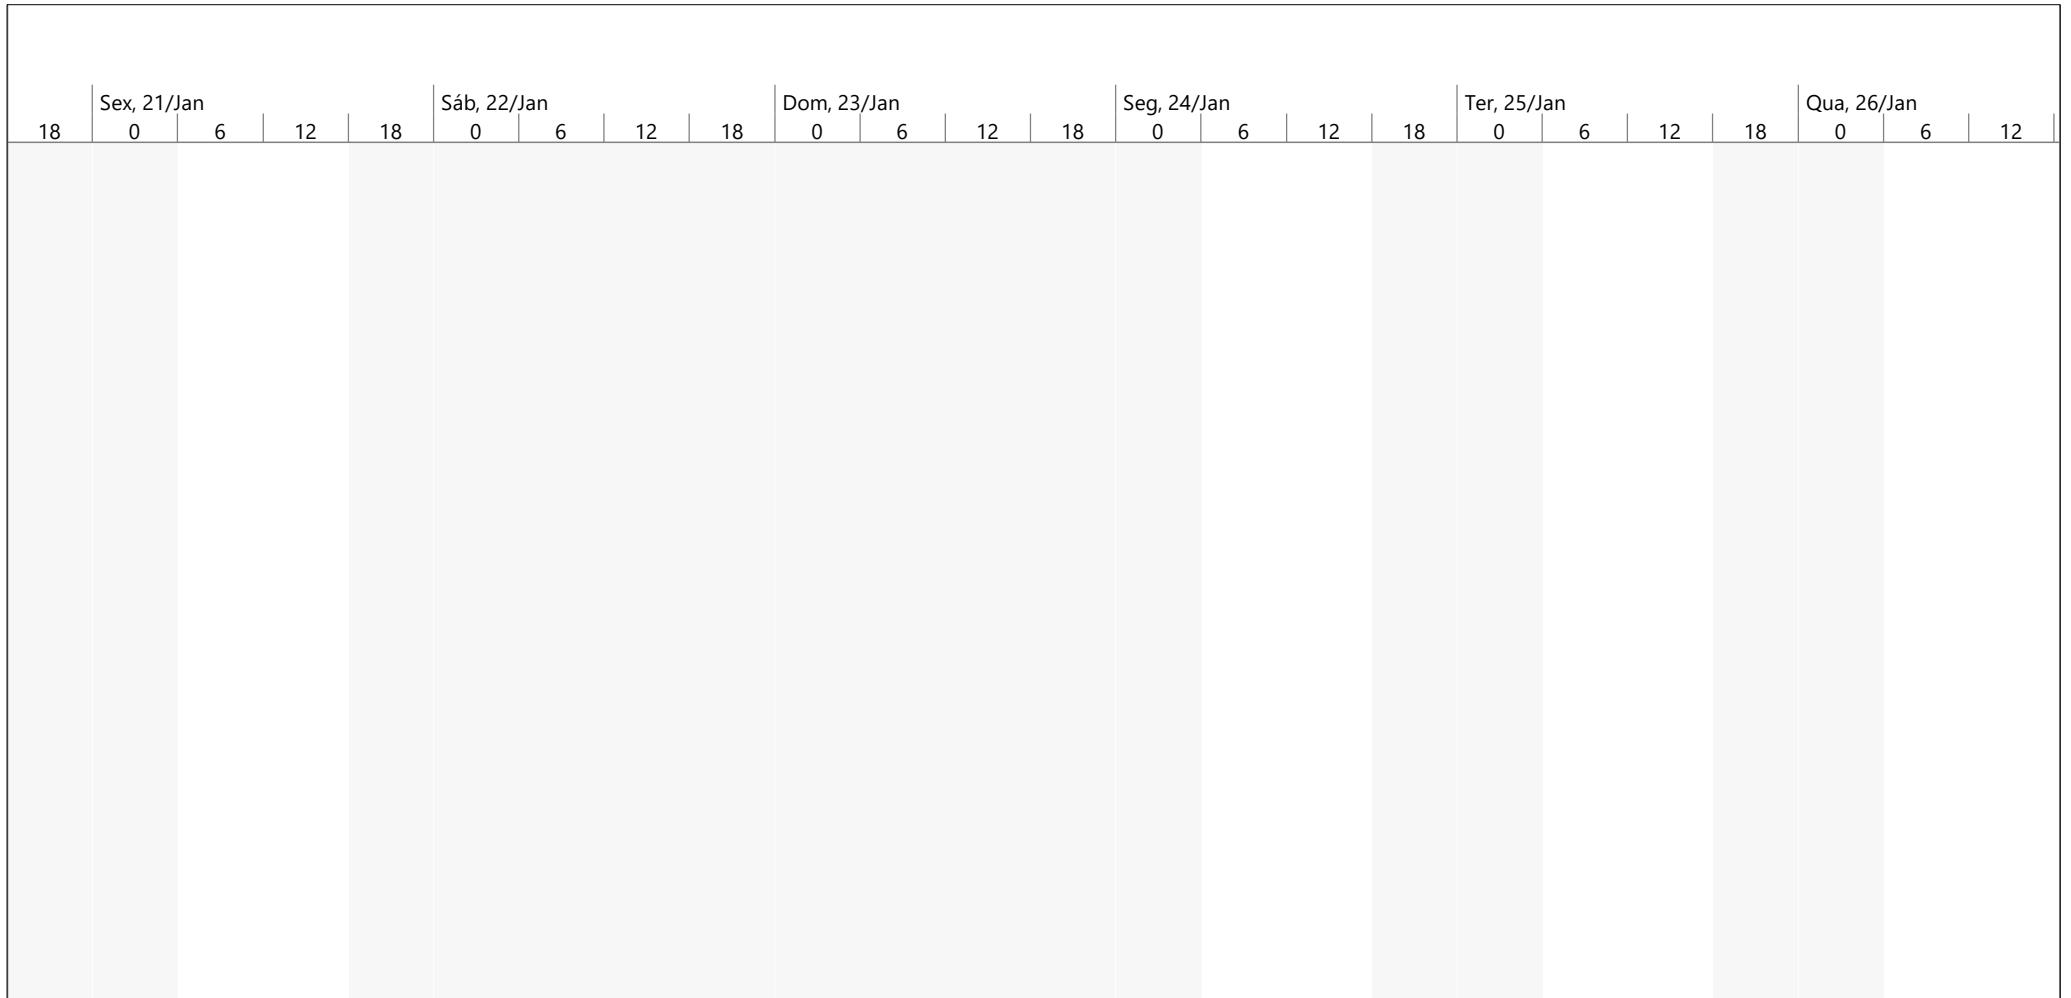

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

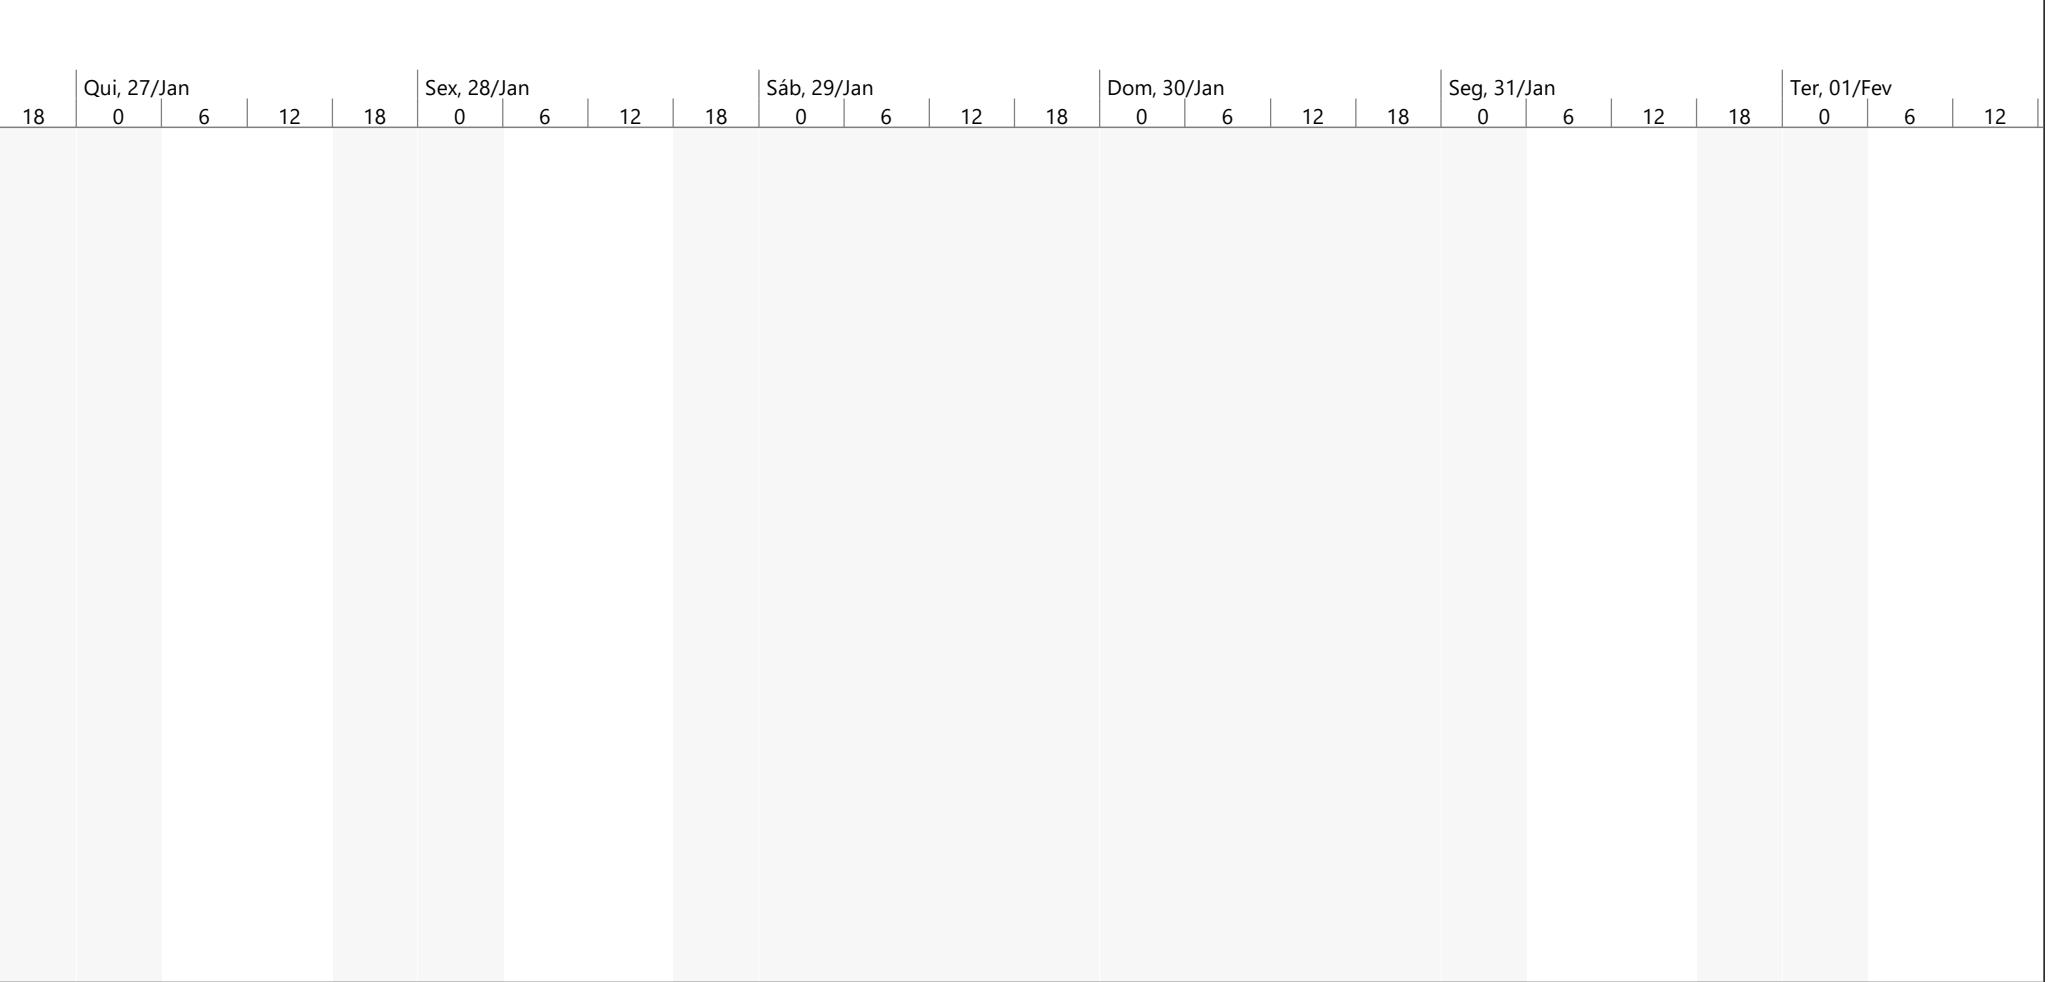


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

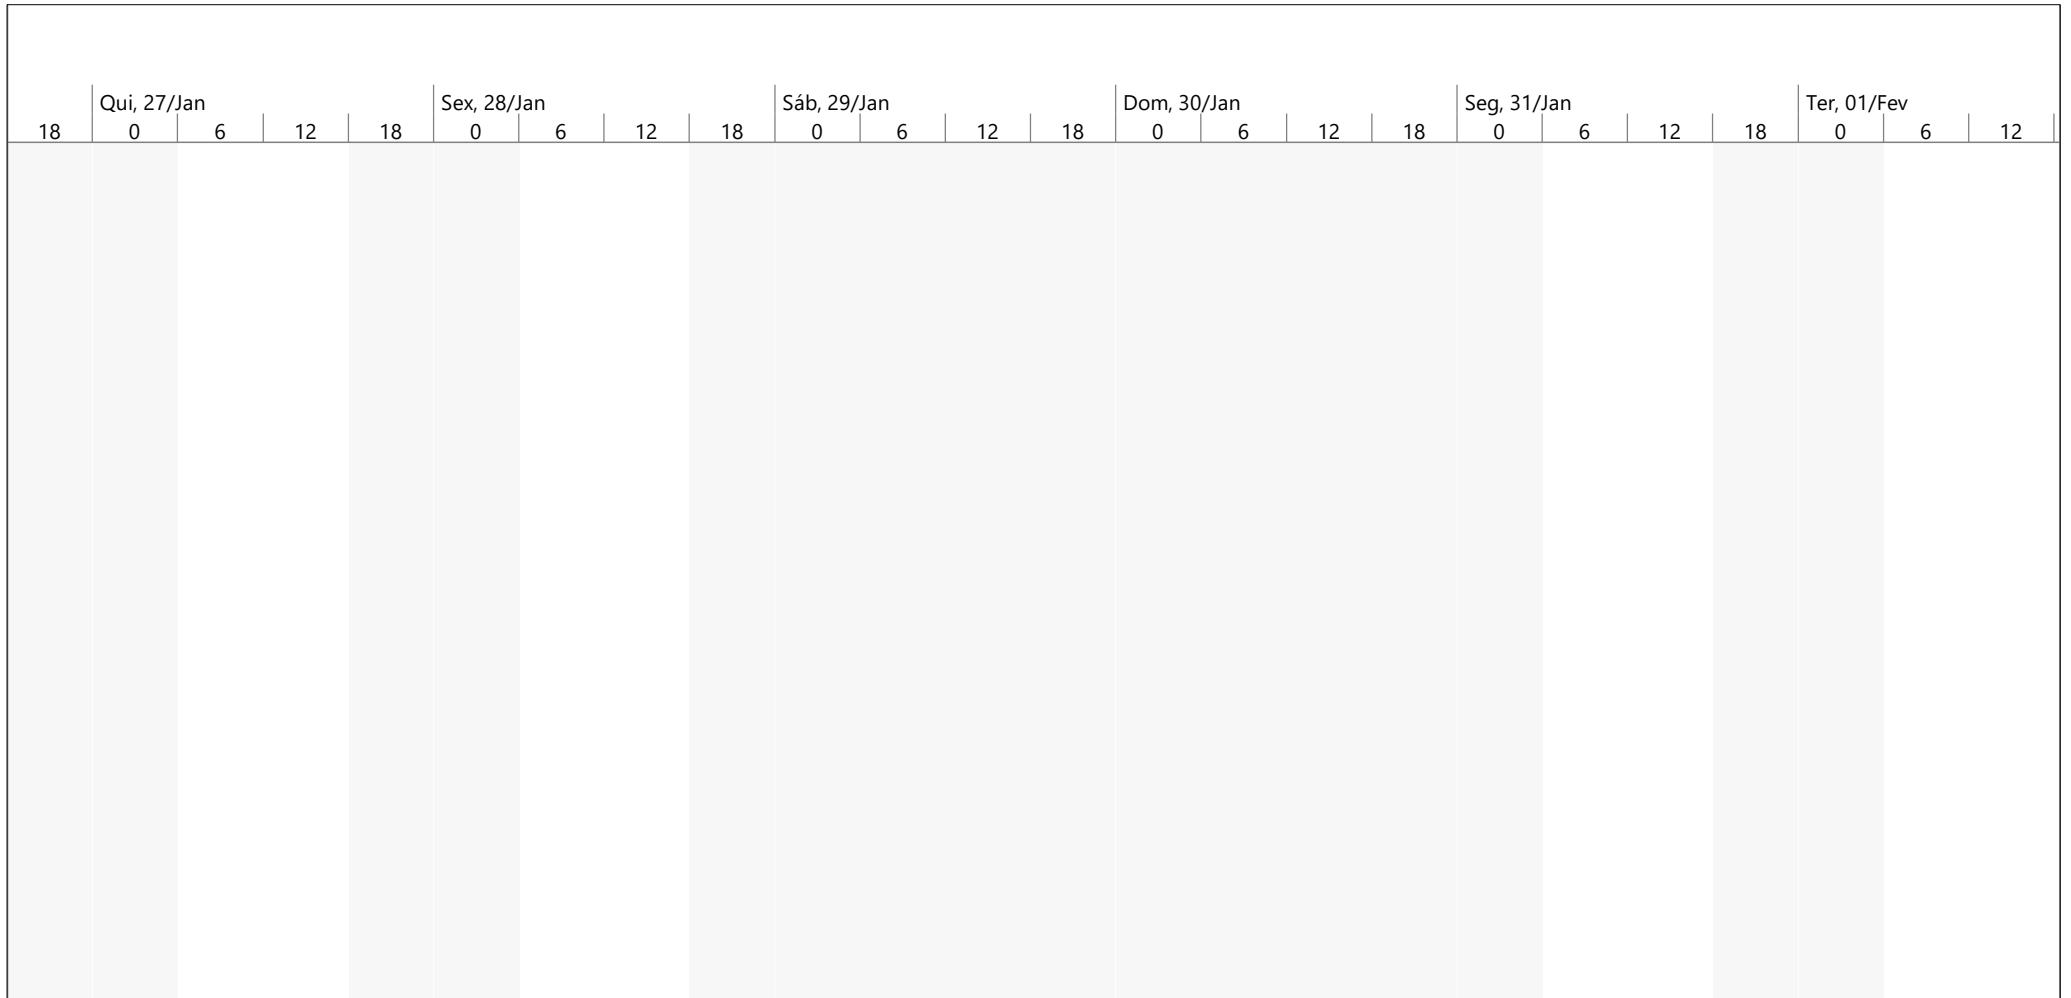

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

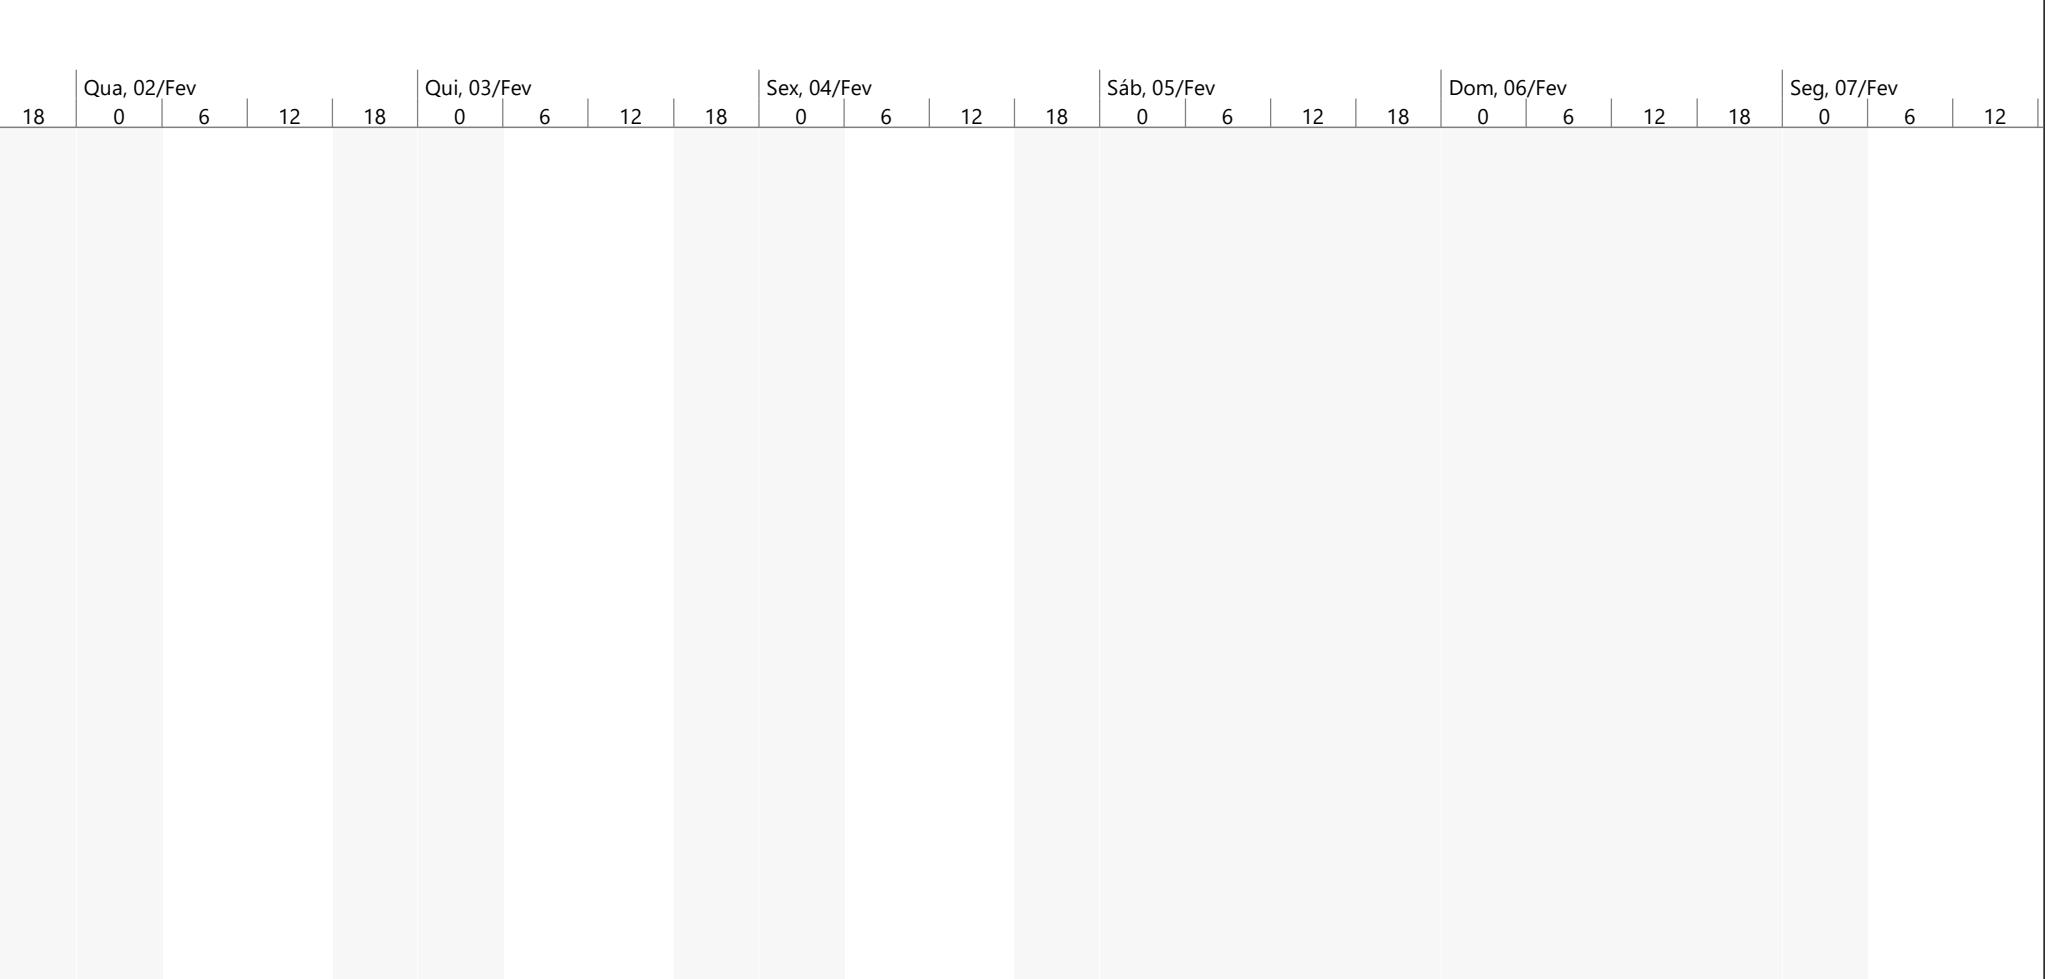


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

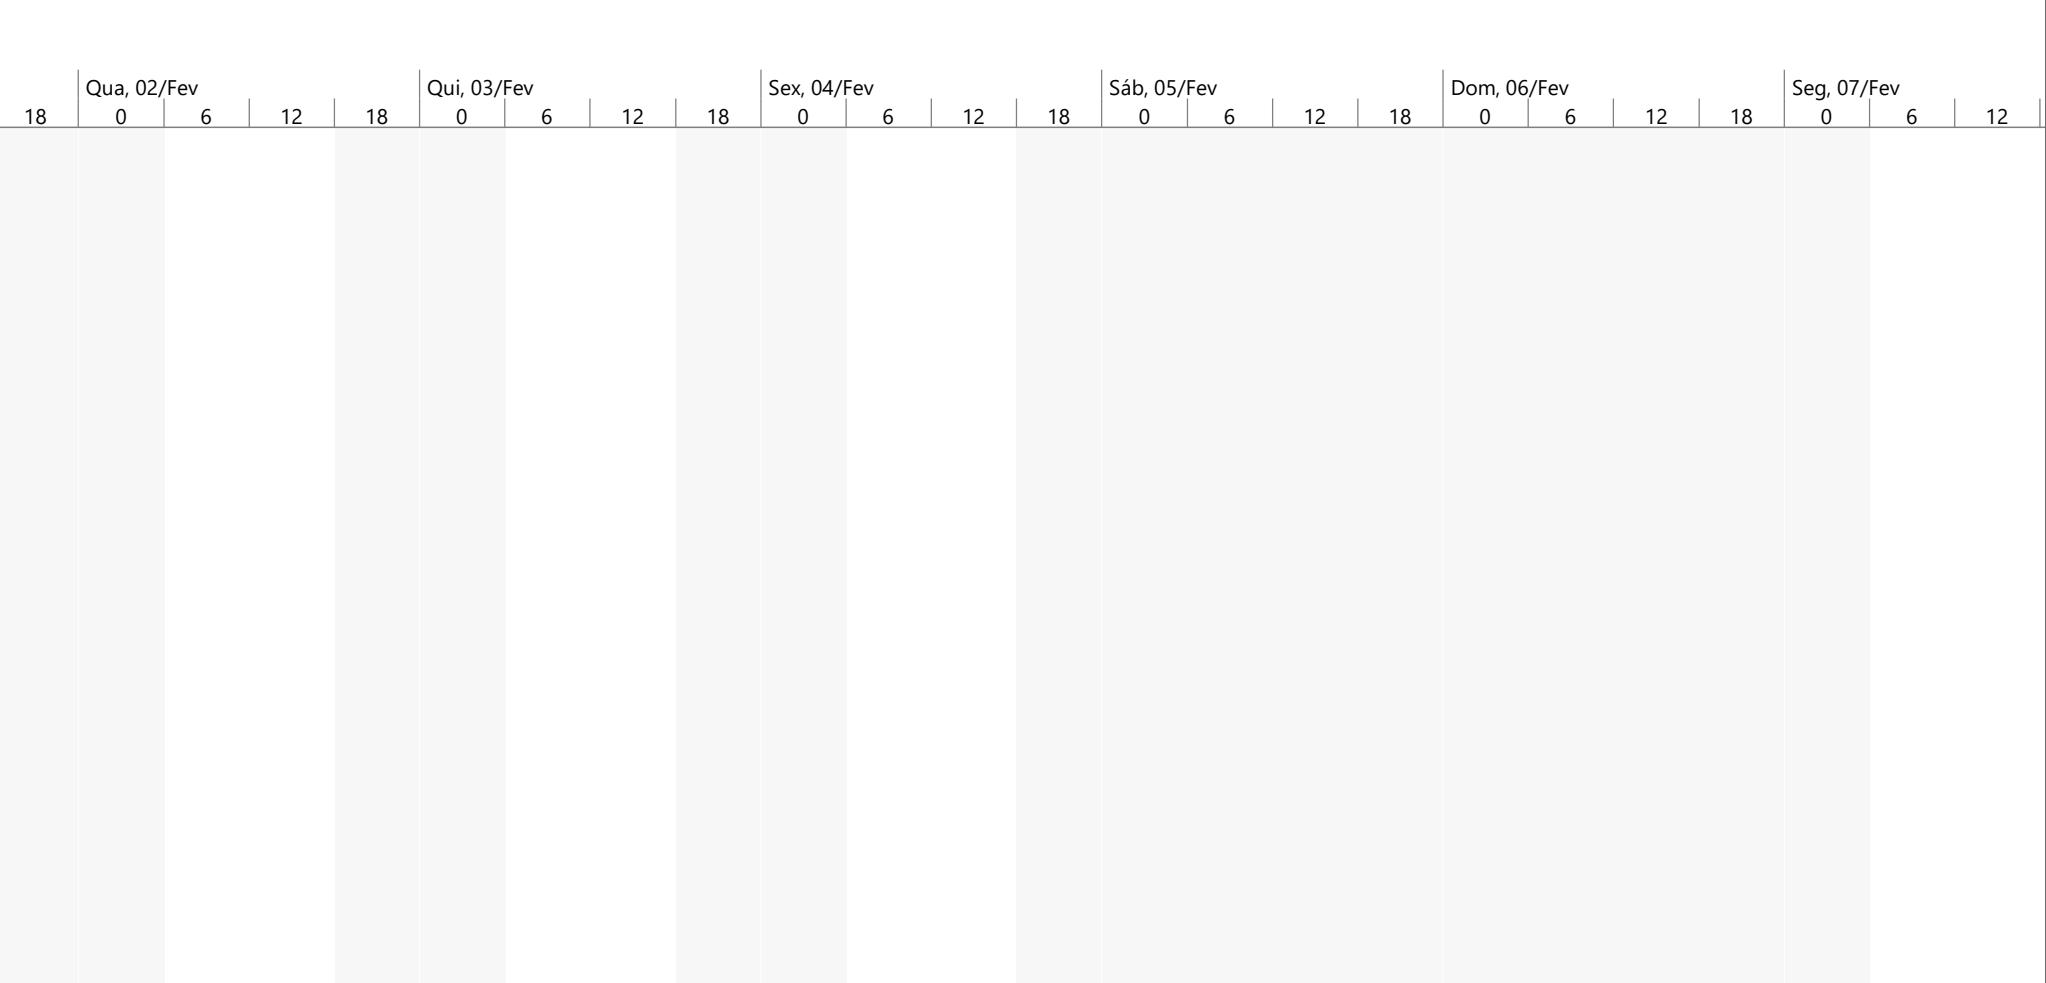


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

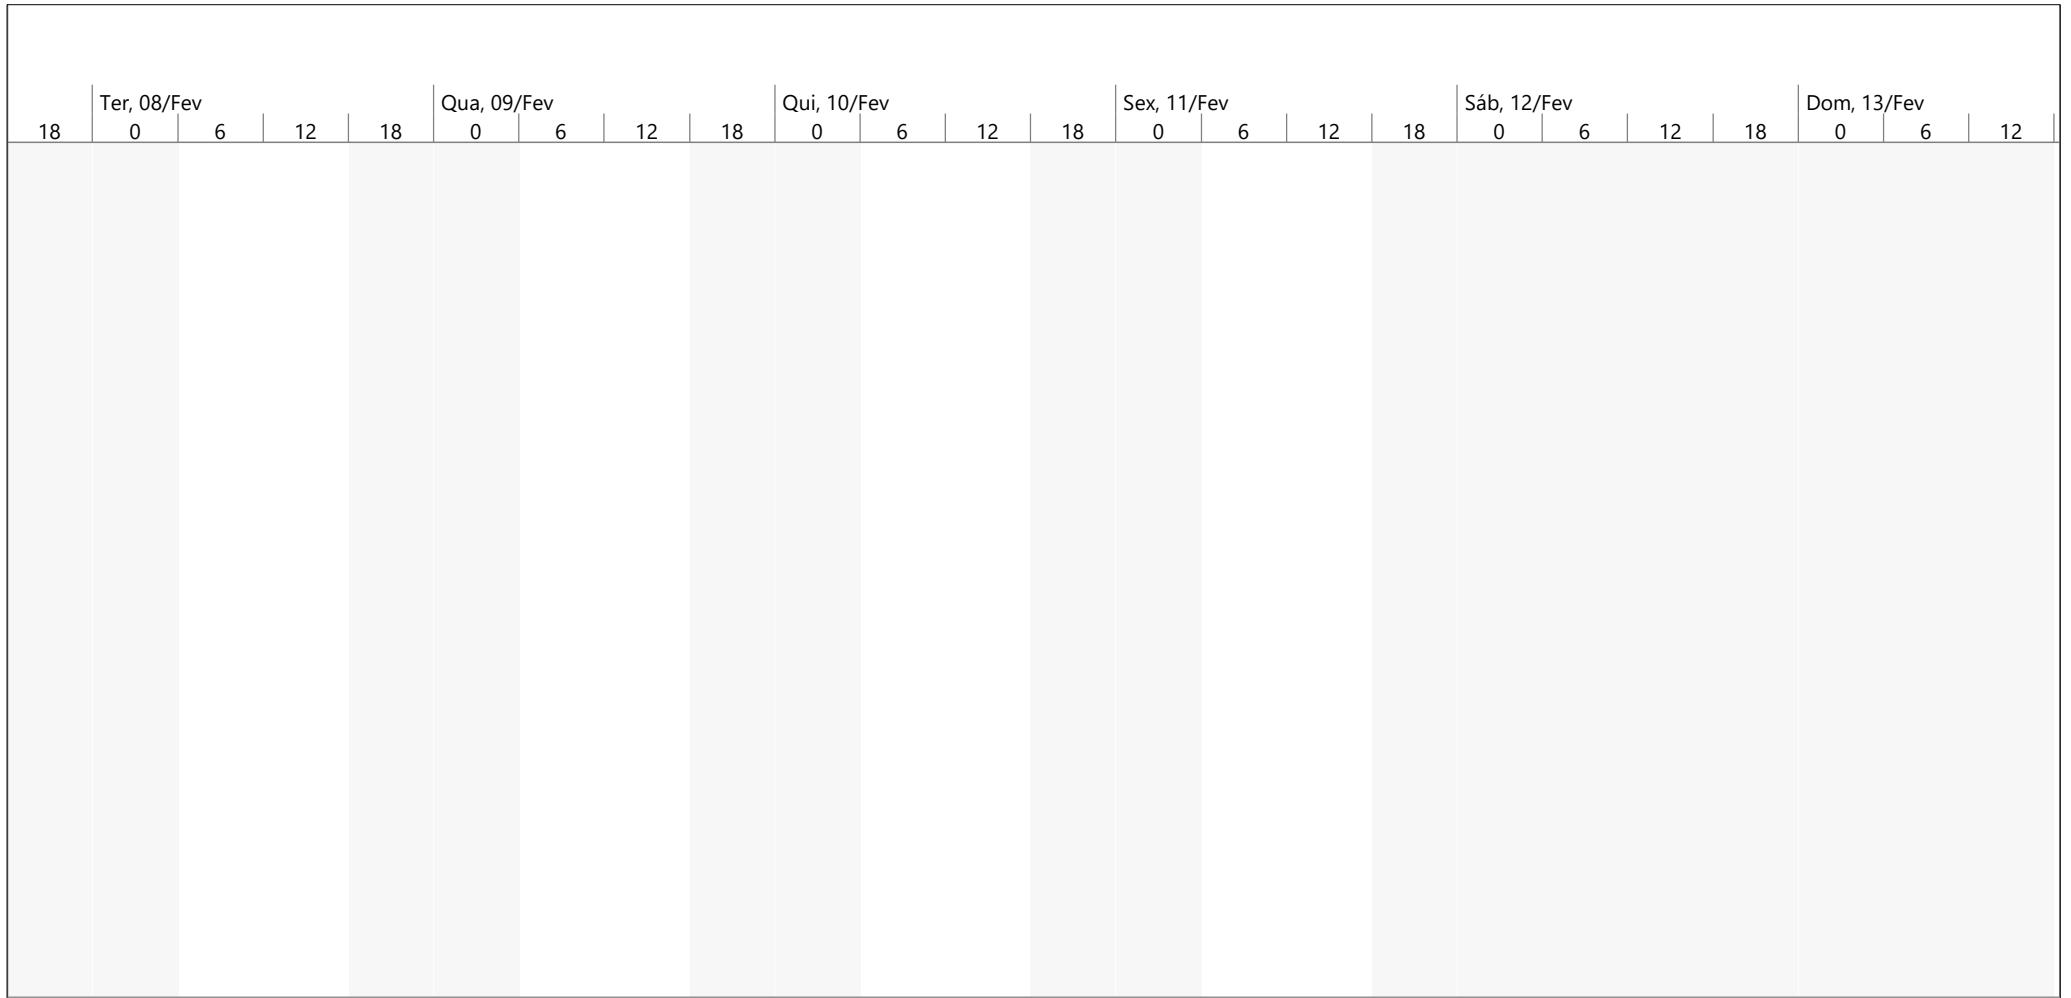


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

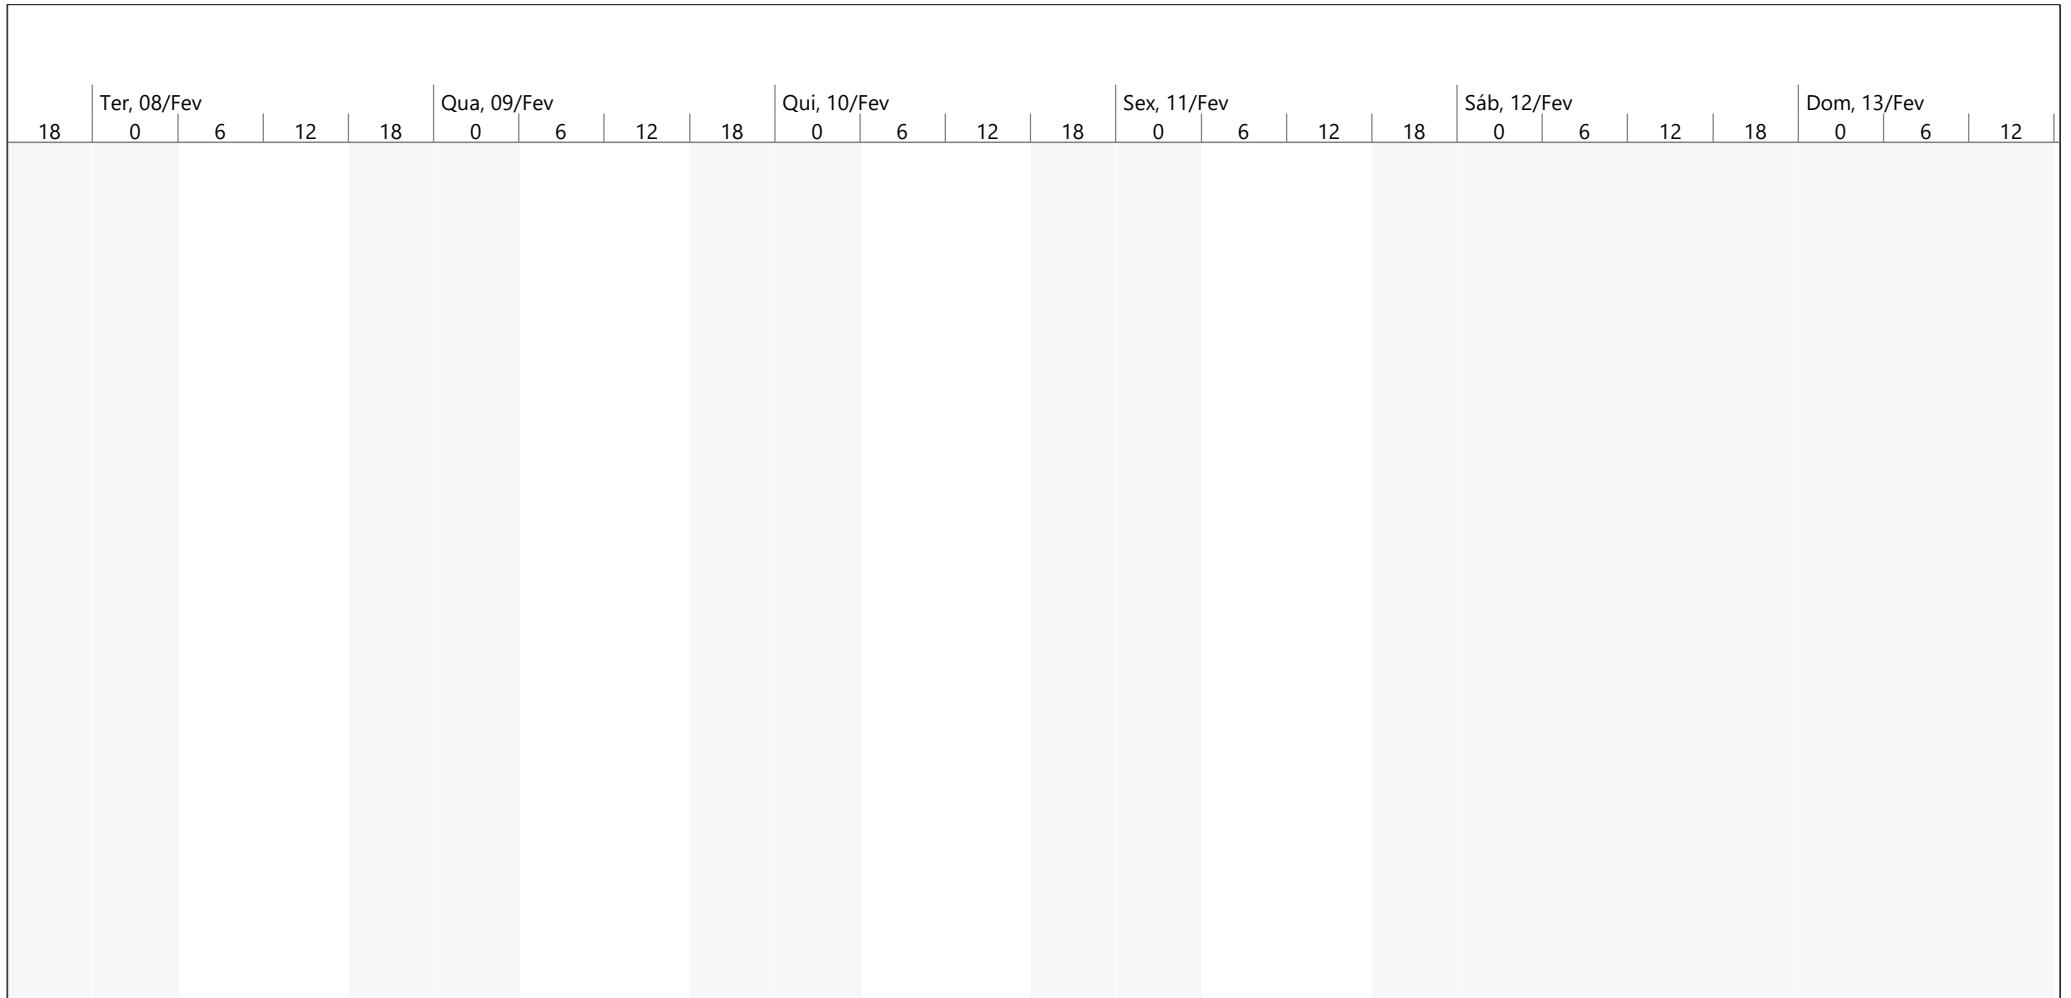


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

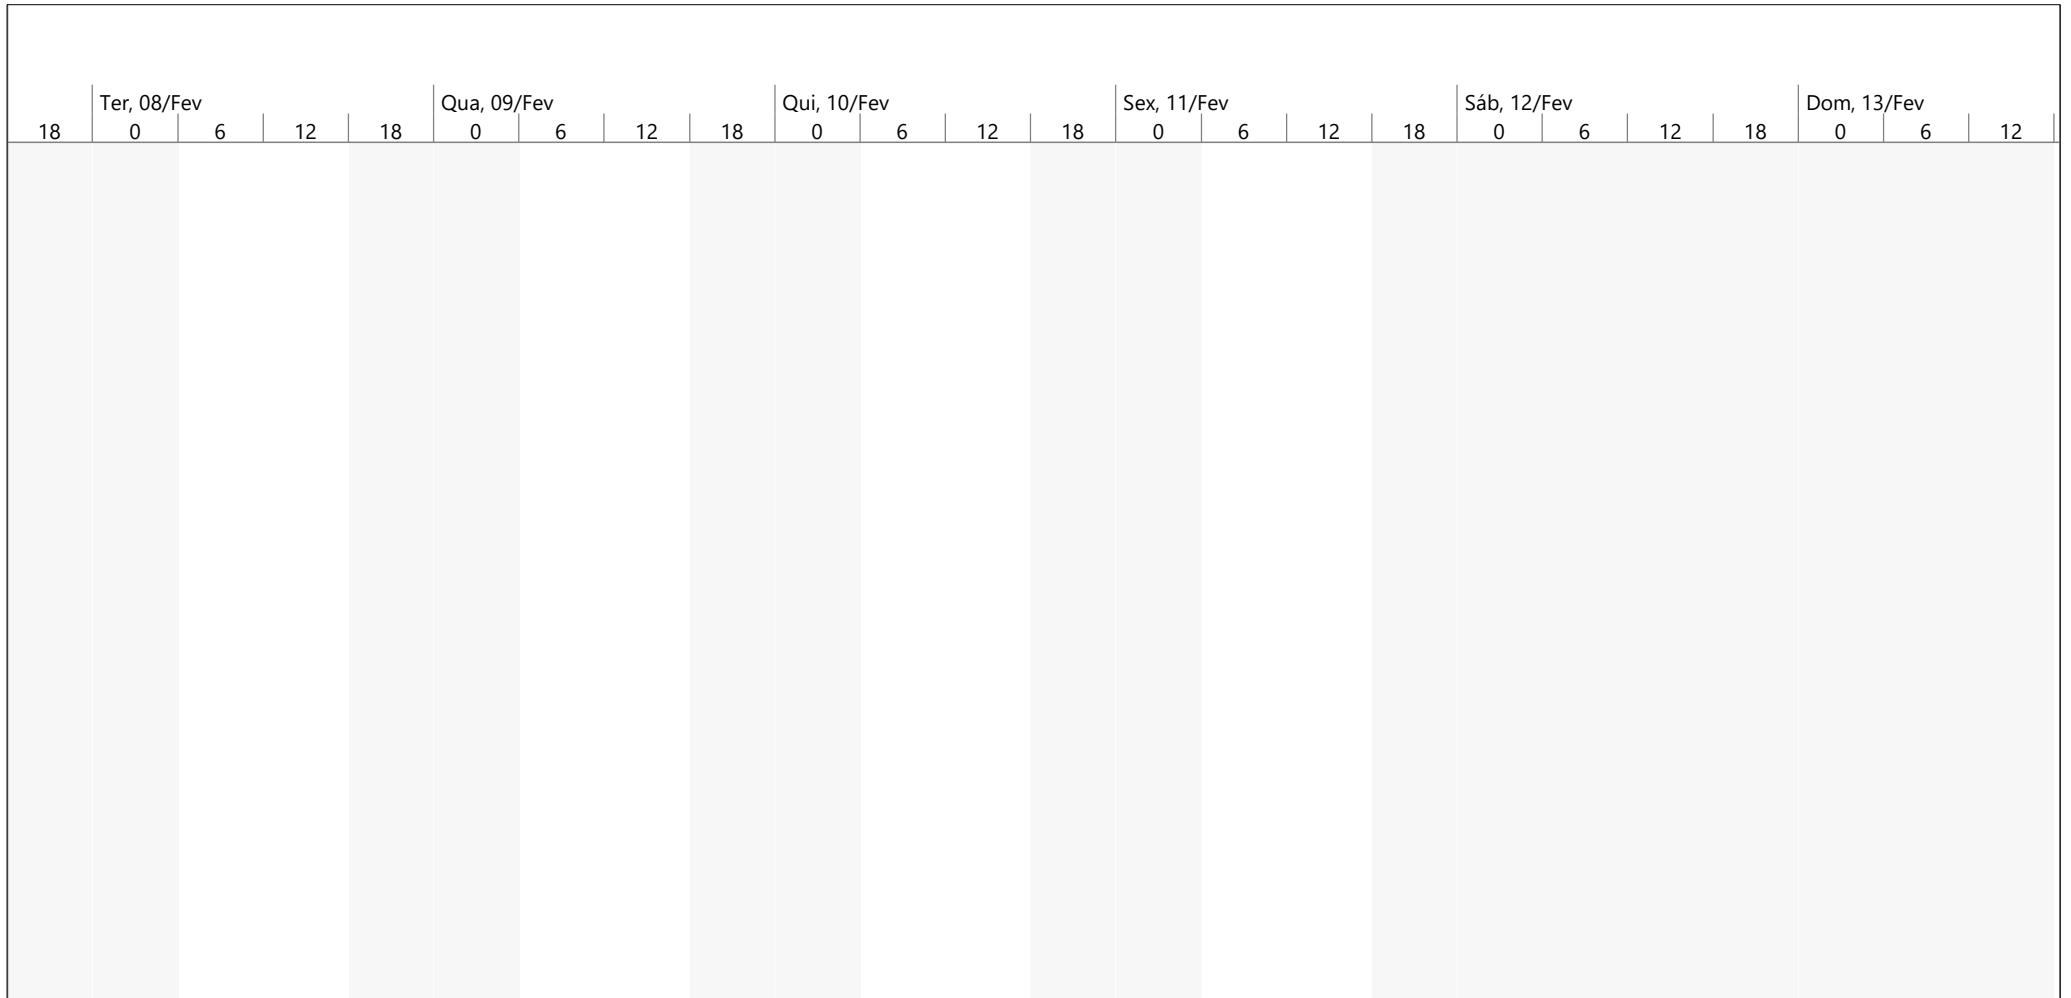


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

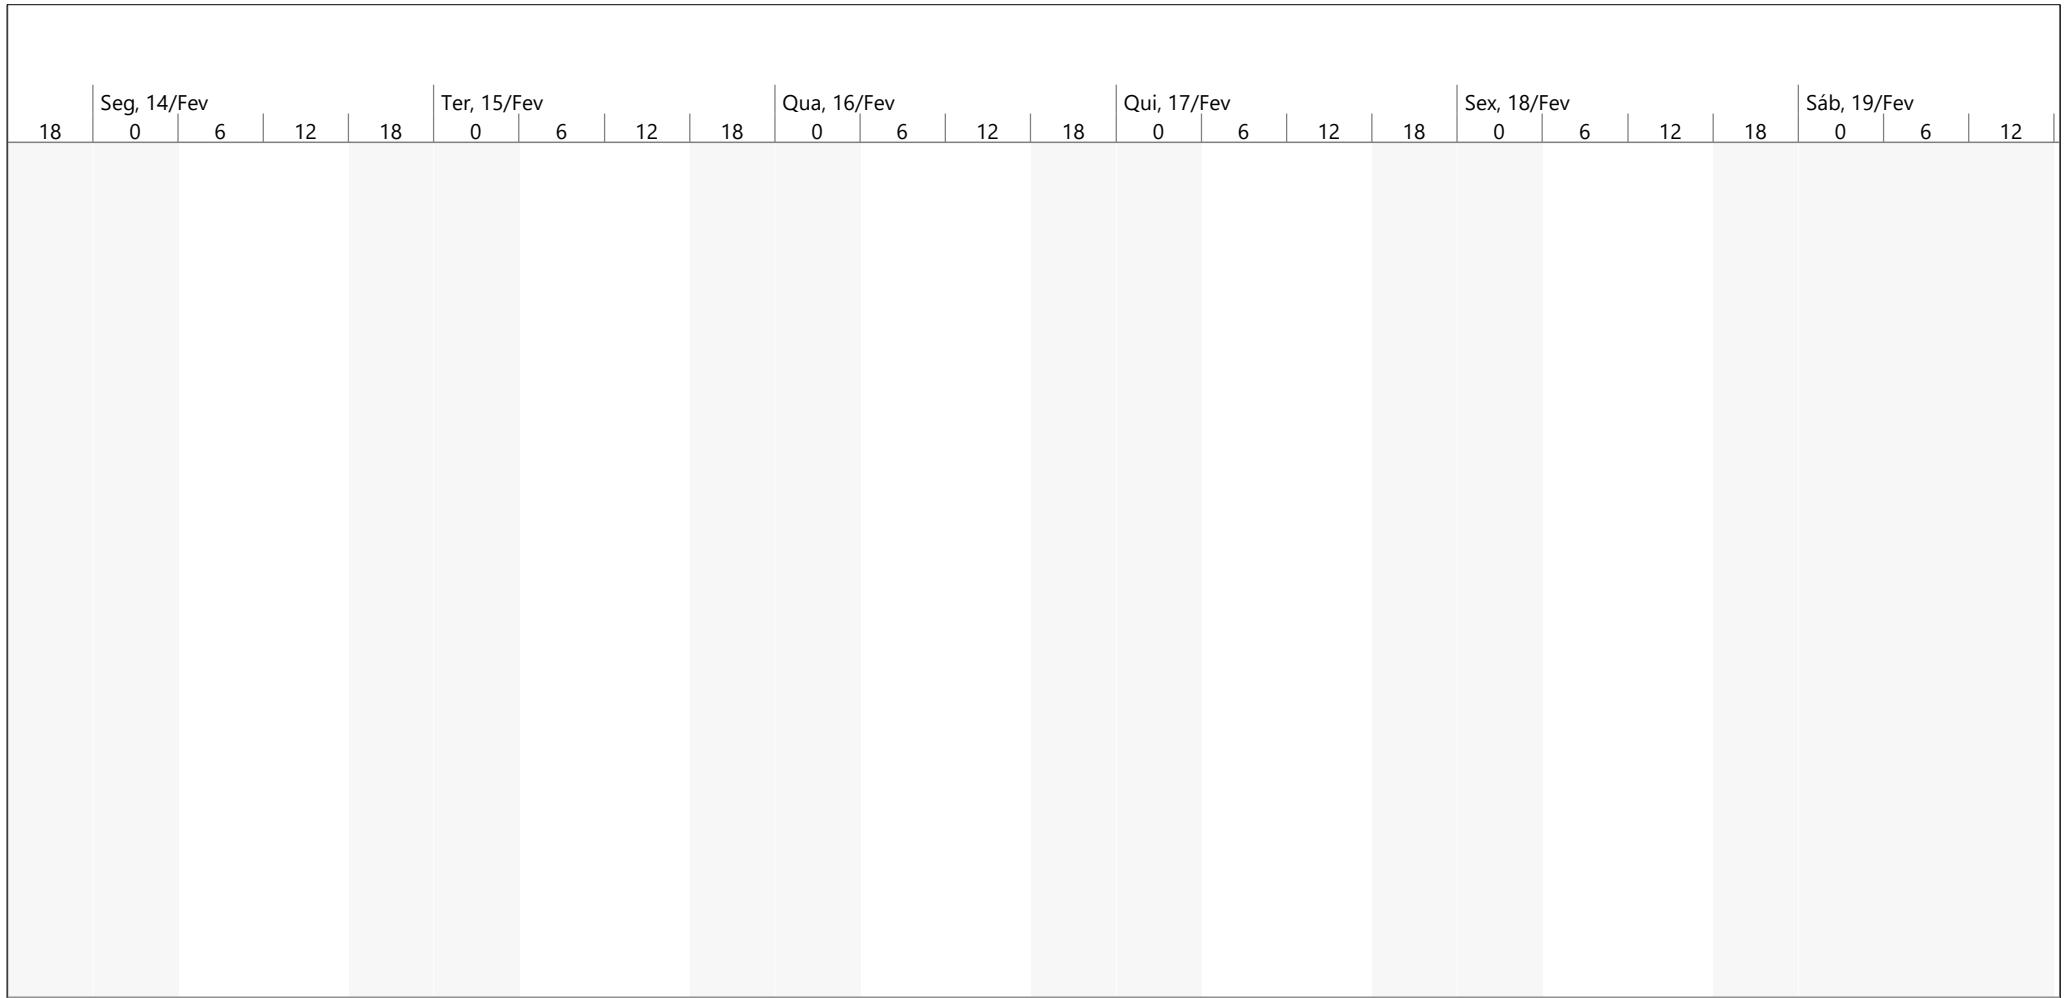



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

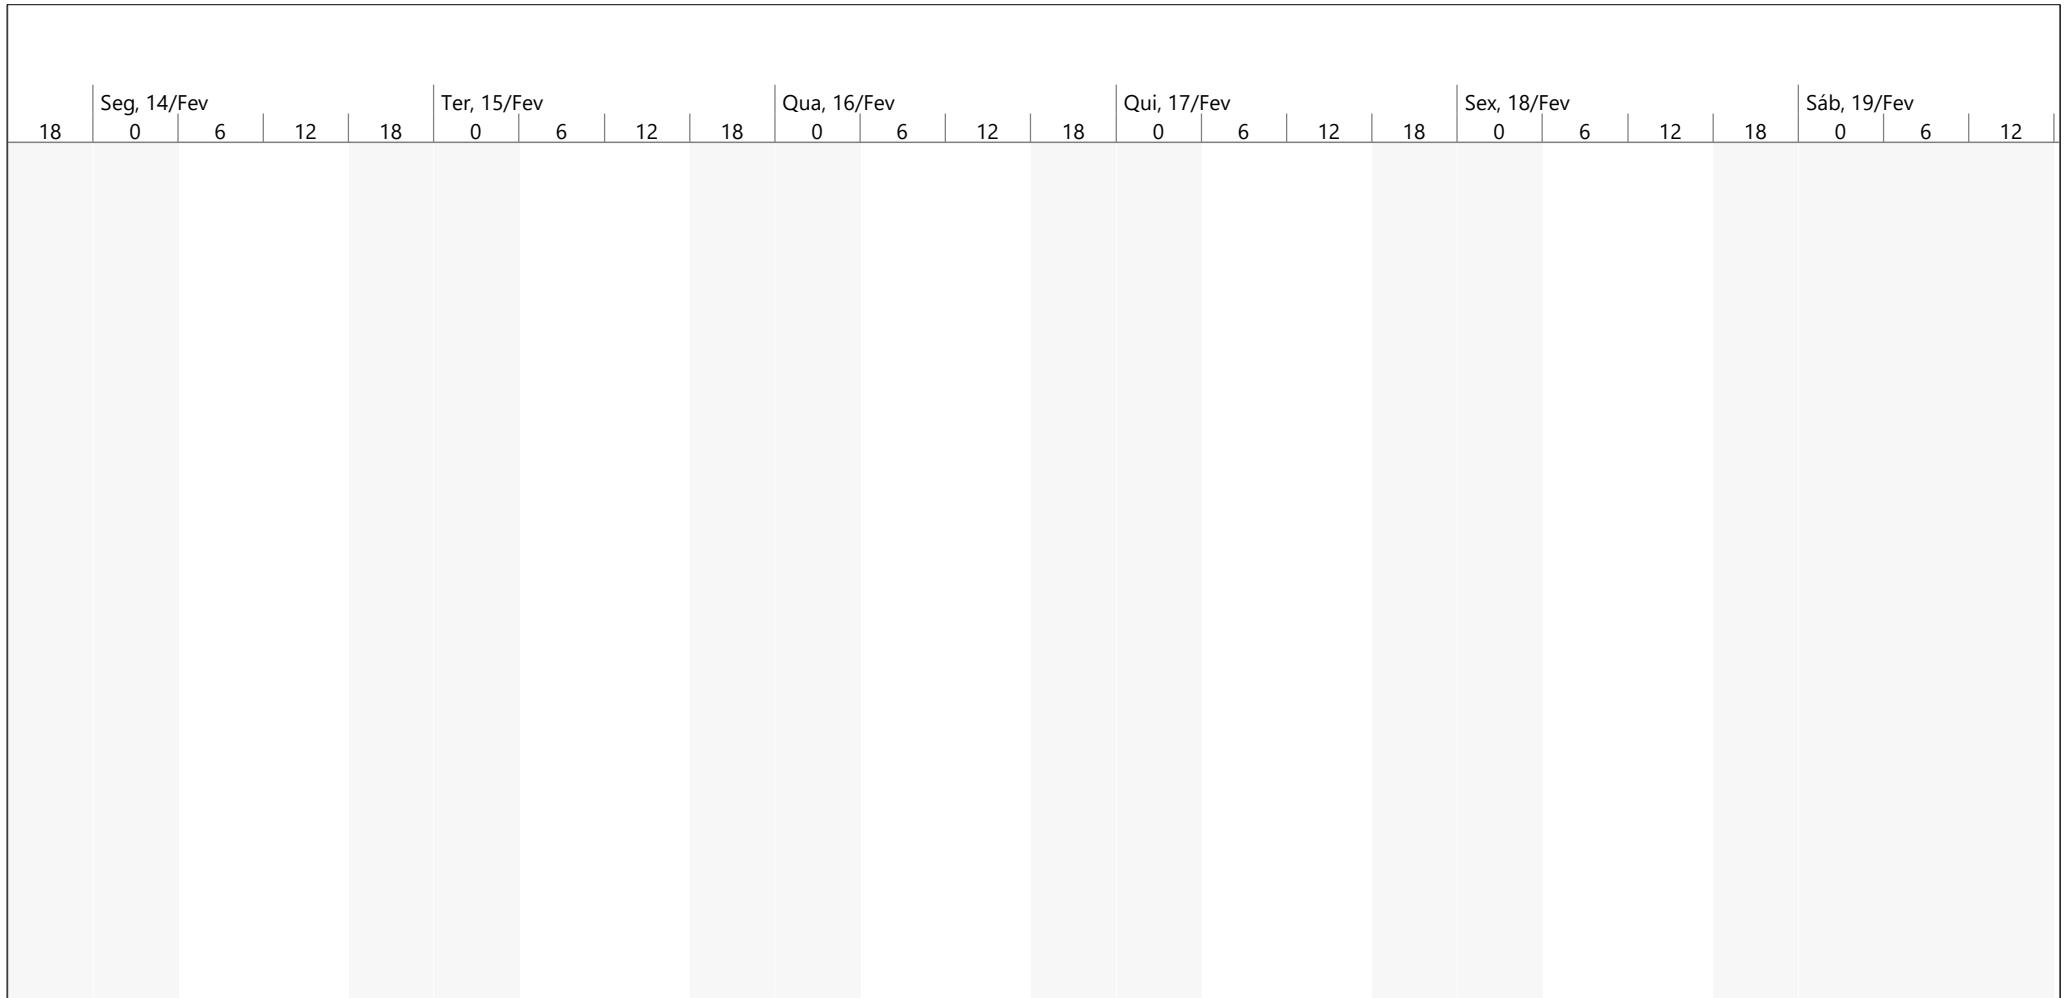

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

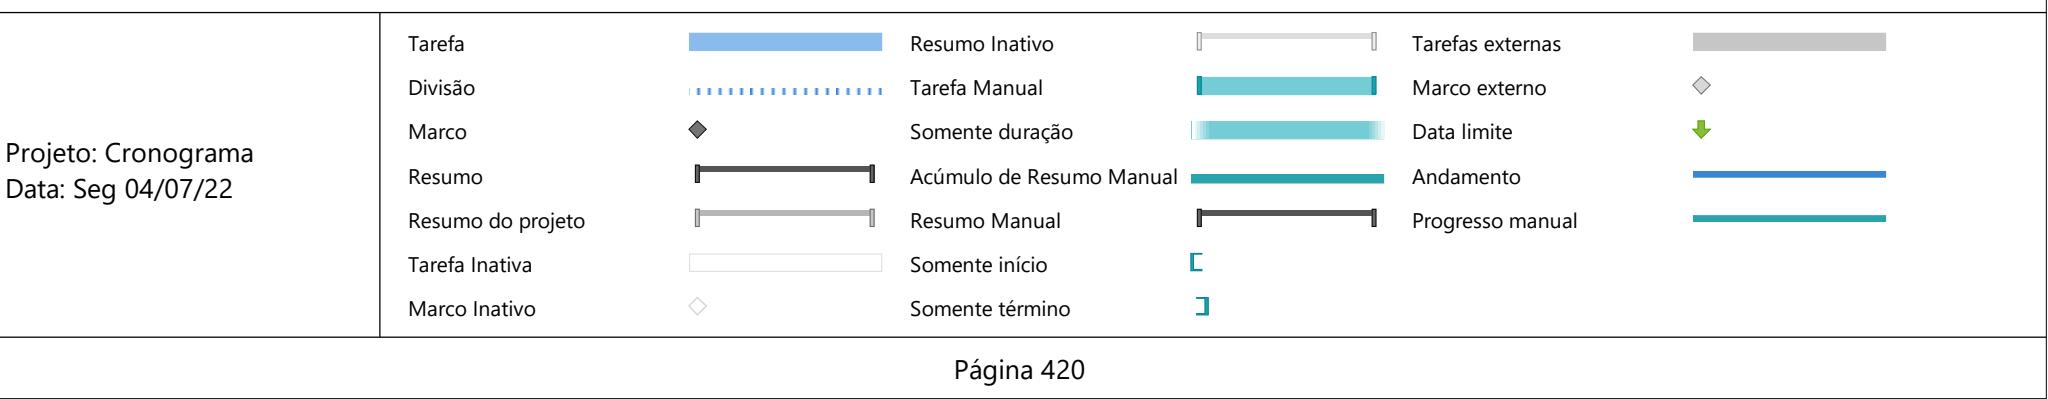





Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	


18	Dom, 20/Fev	0	6	12	18	Seg, 21/Fev	0	6	12	18	Ter, 22/Fev	0	6	12	18	Qua, 23/Fev	0	6	12	18	Qui, 24/Fev	0	6	12	18	Sex, 25/Fev	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

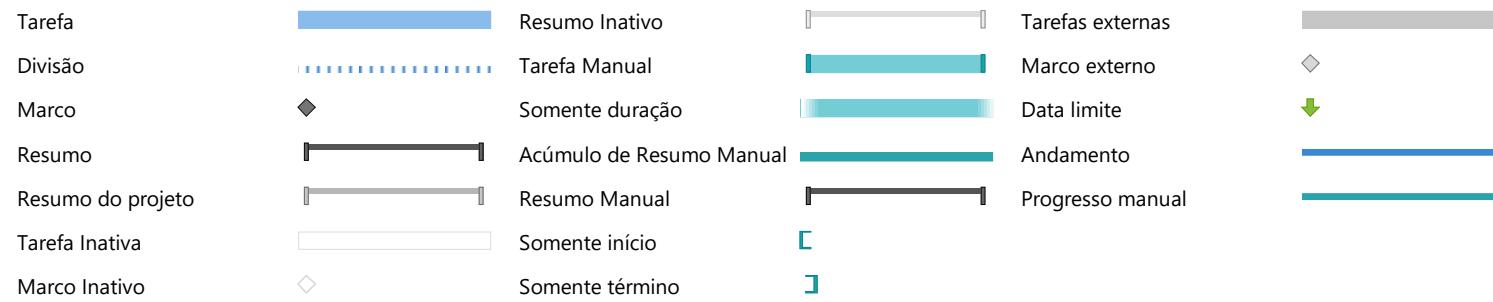


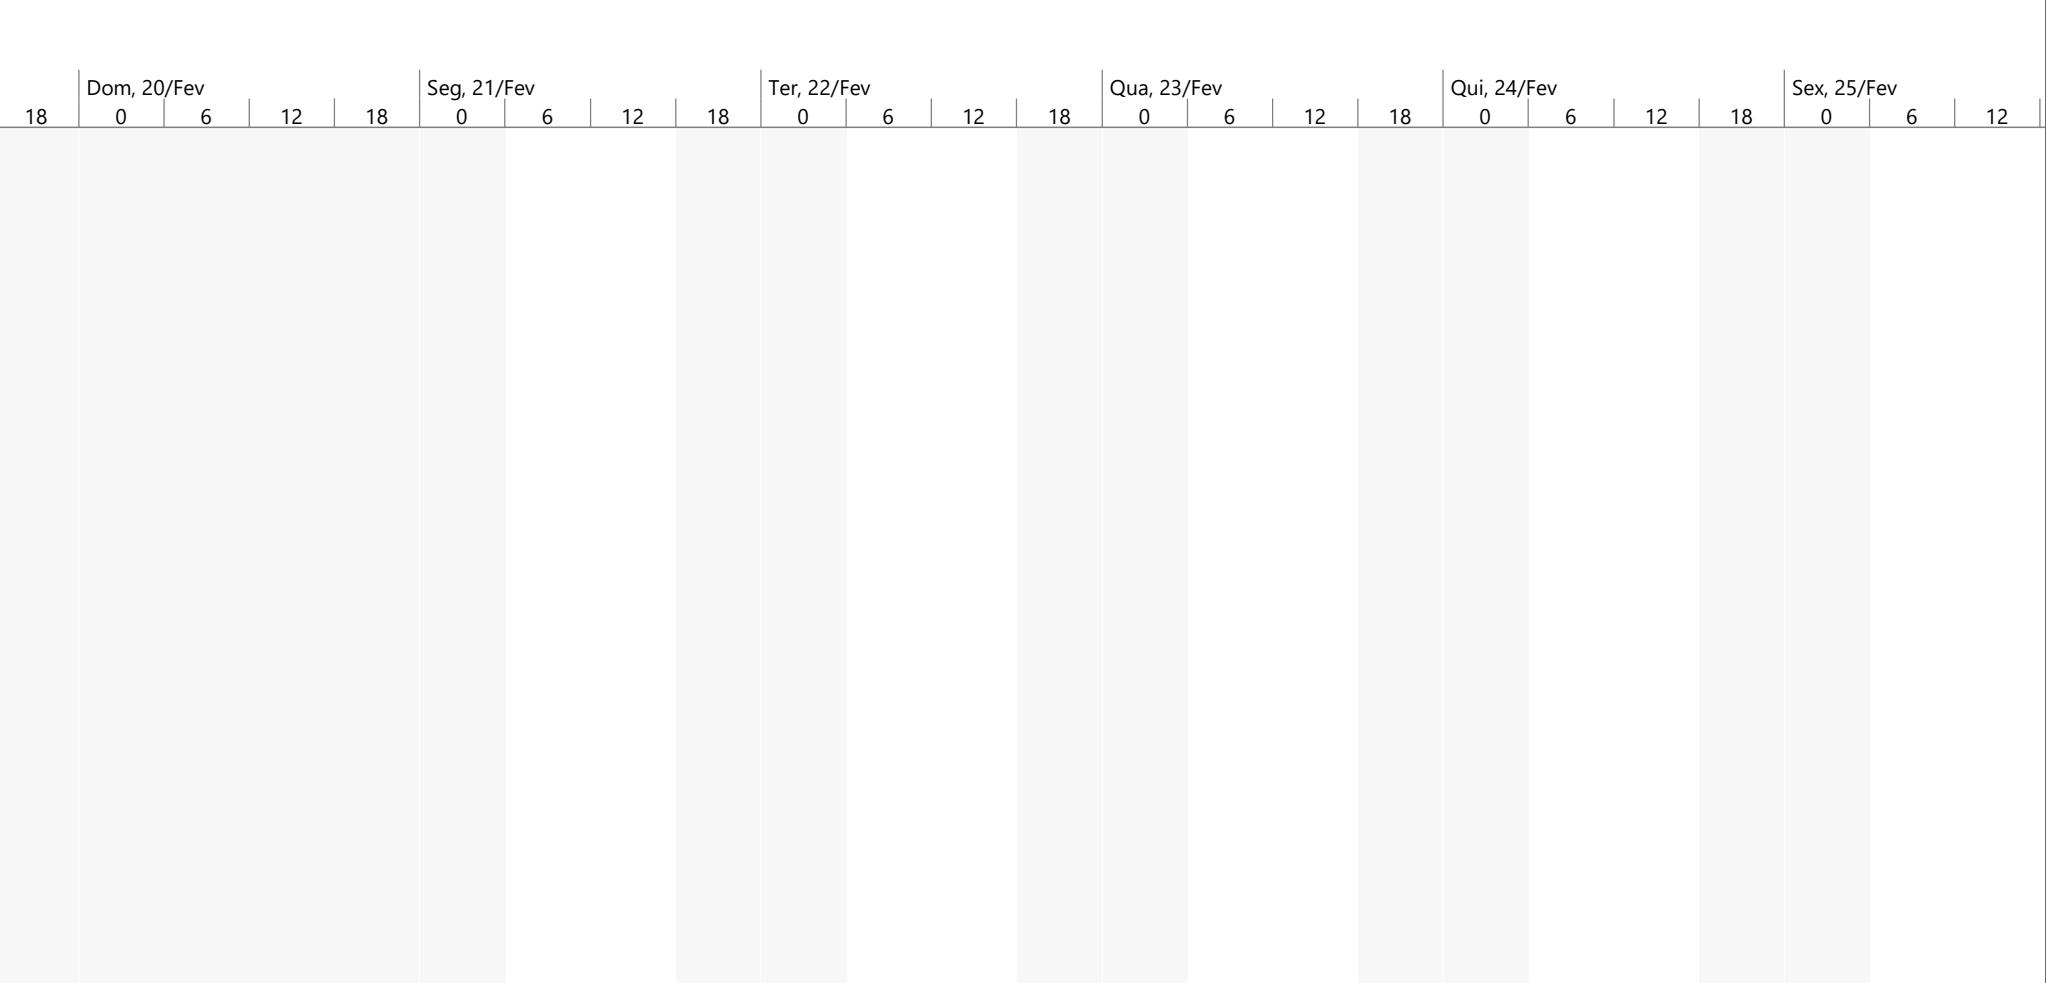


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

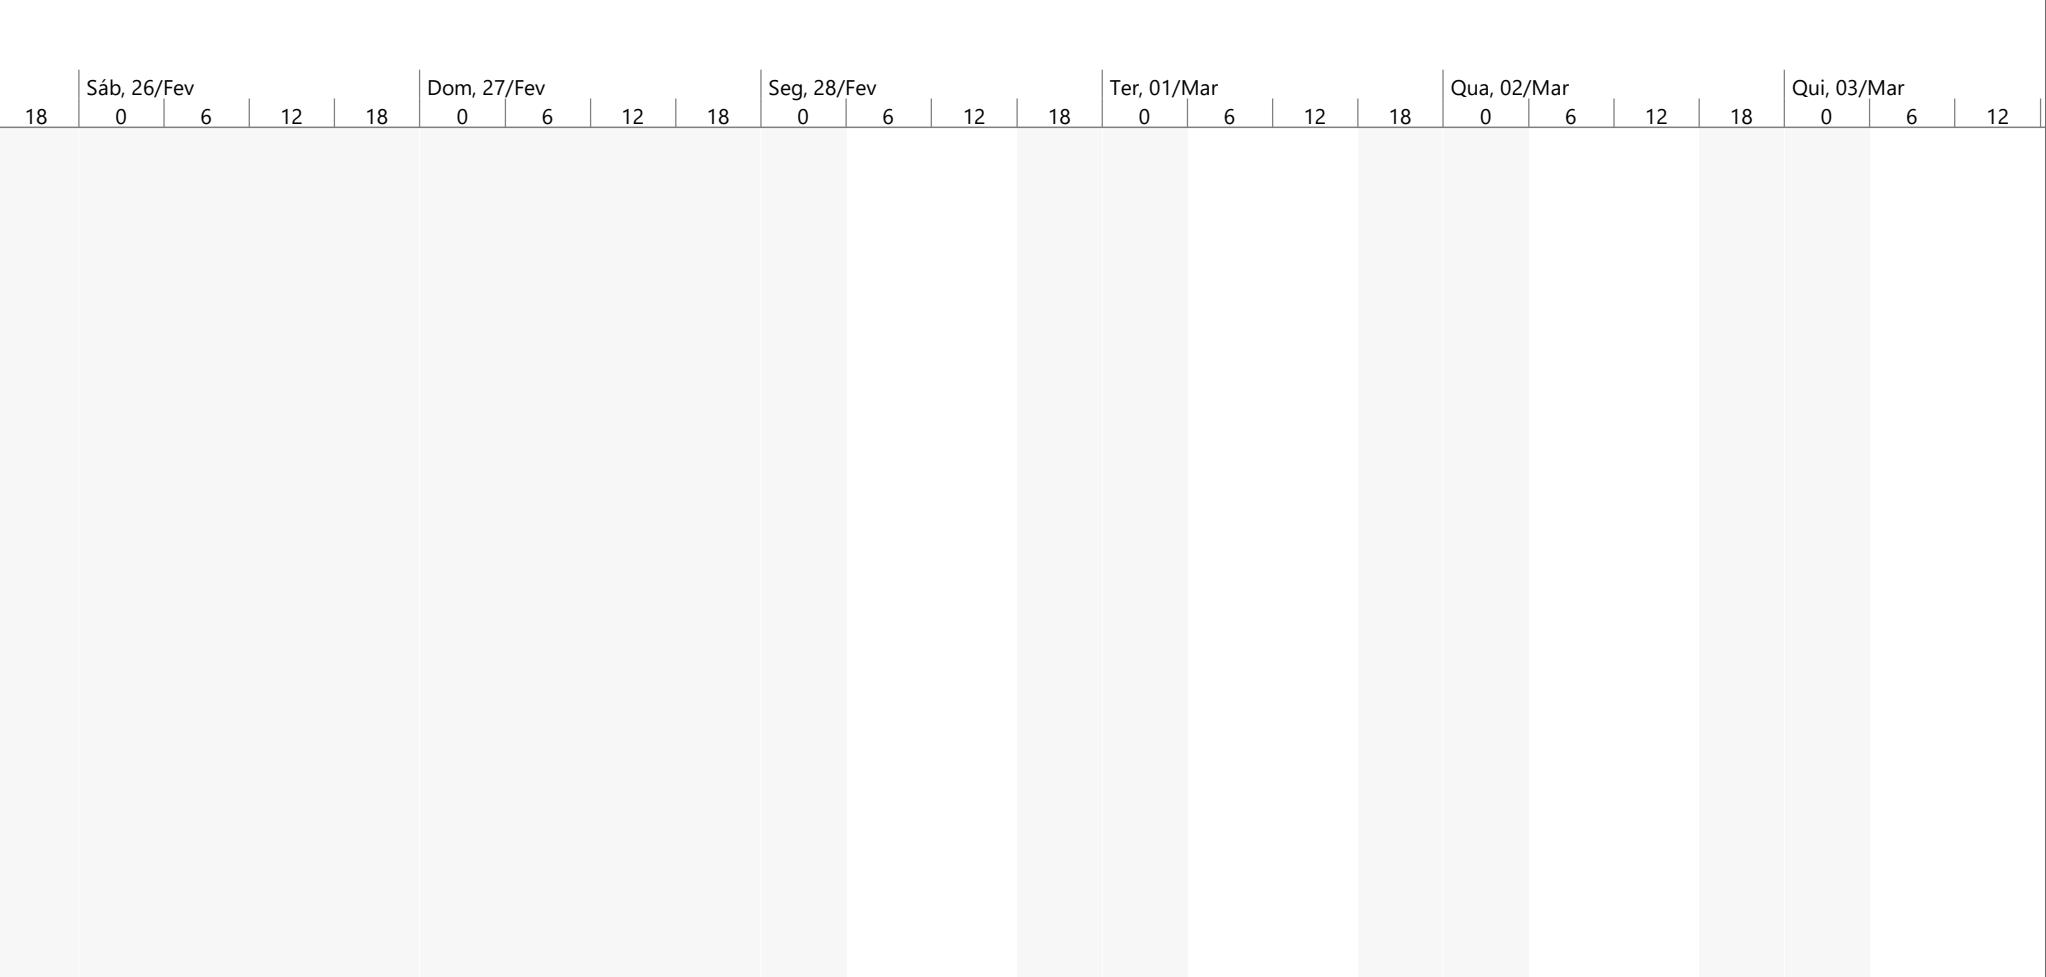


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

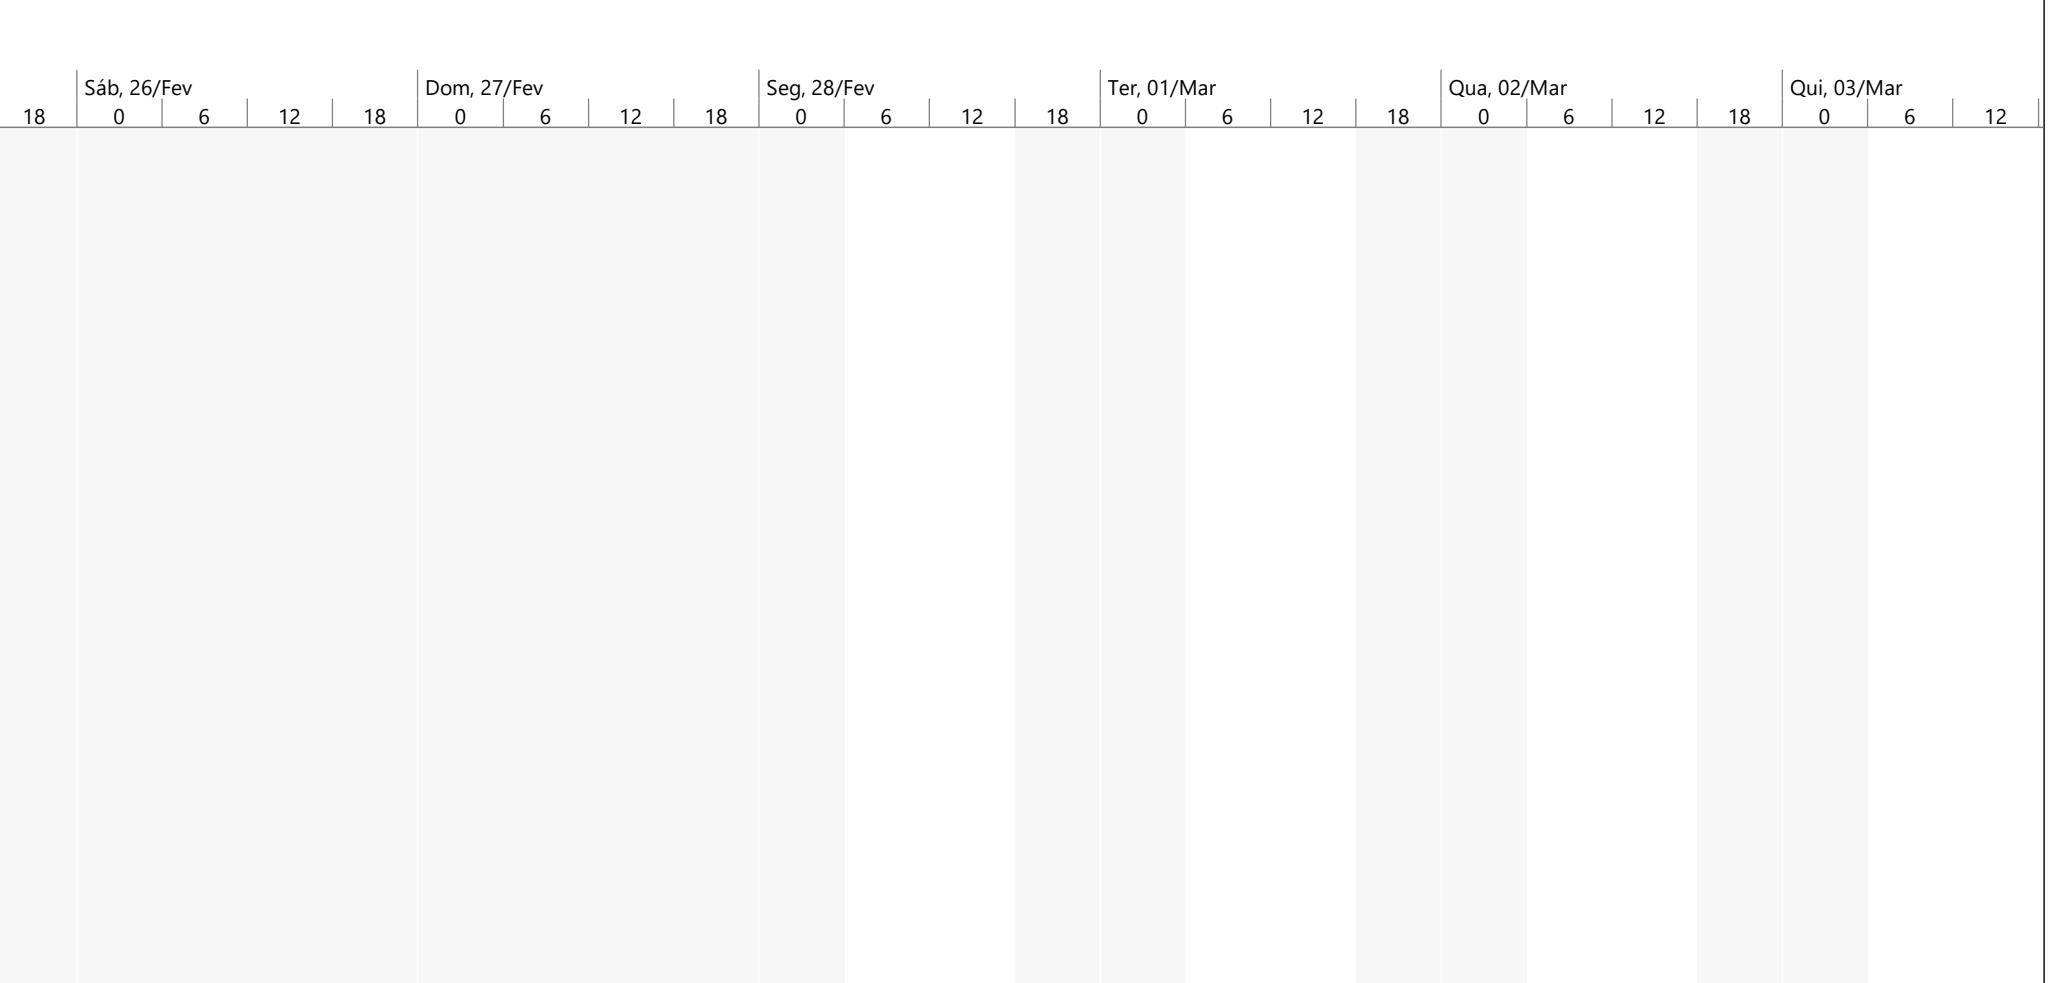


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

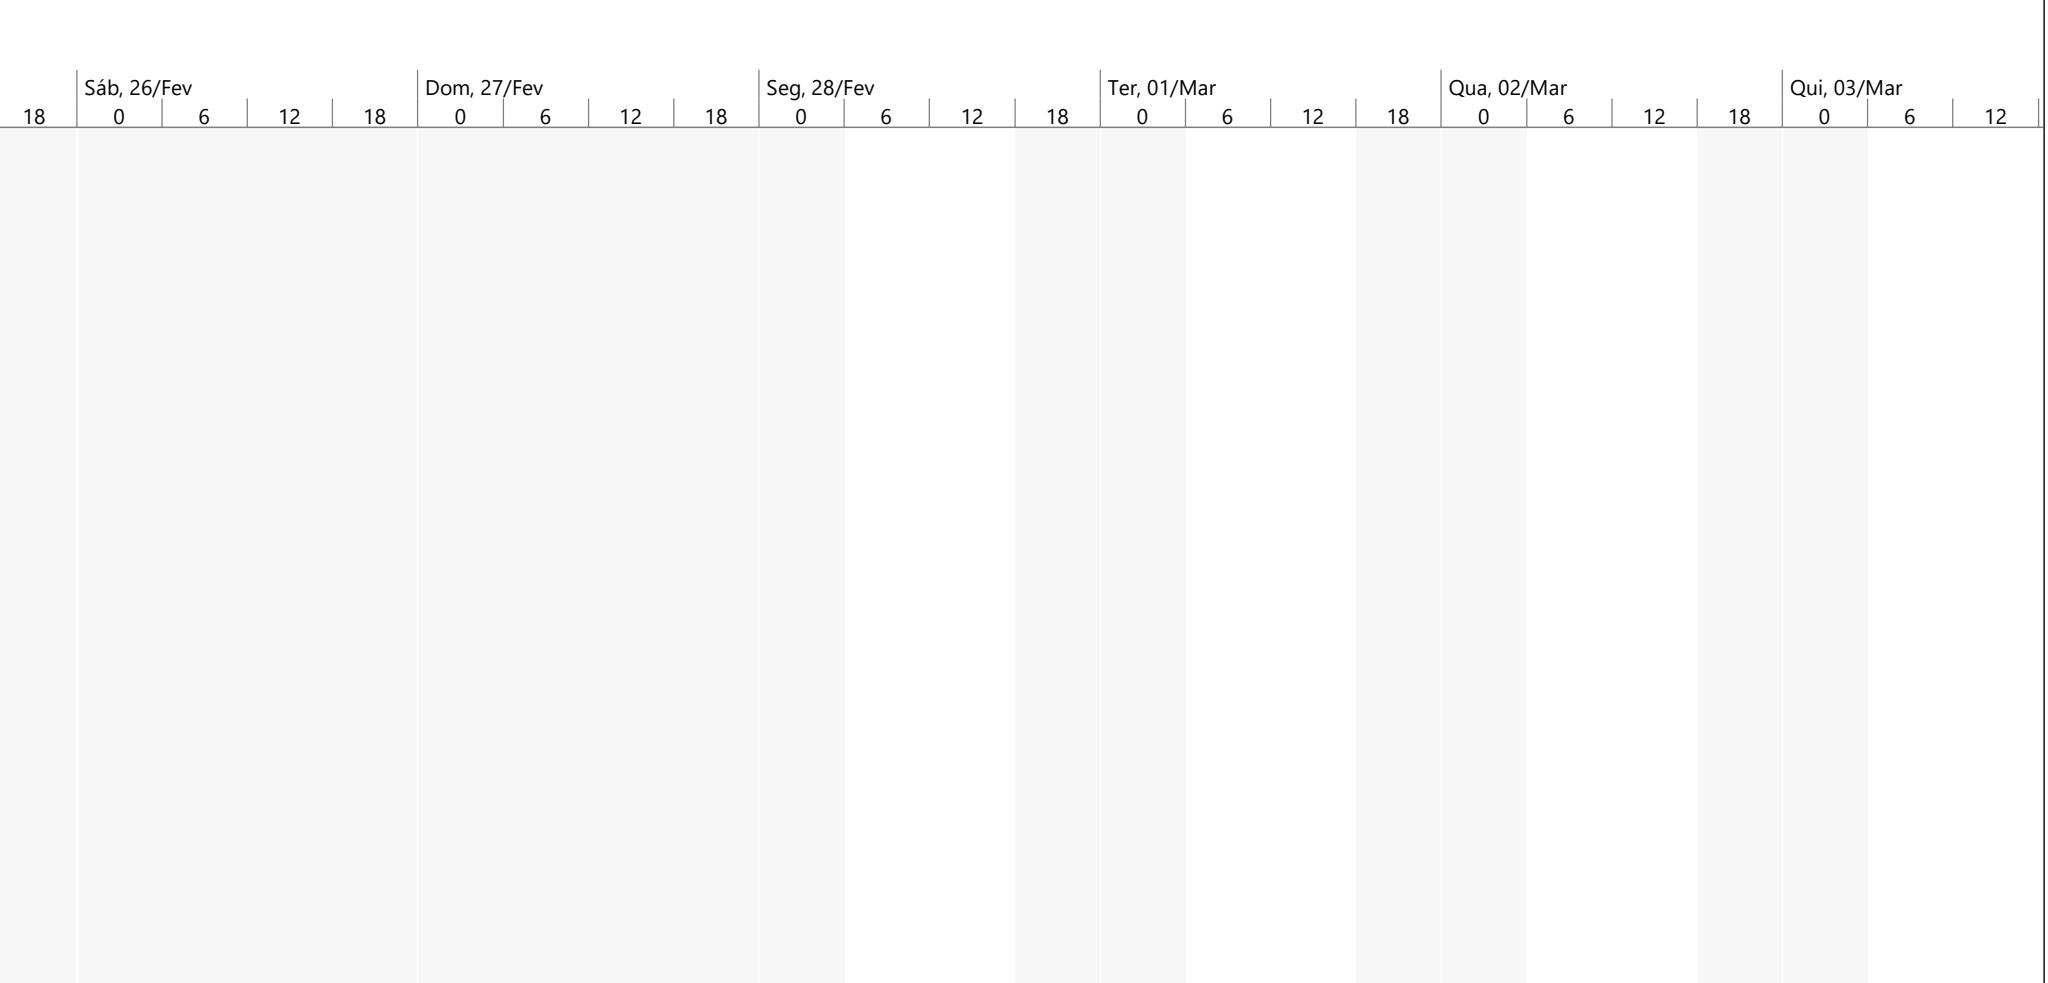


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

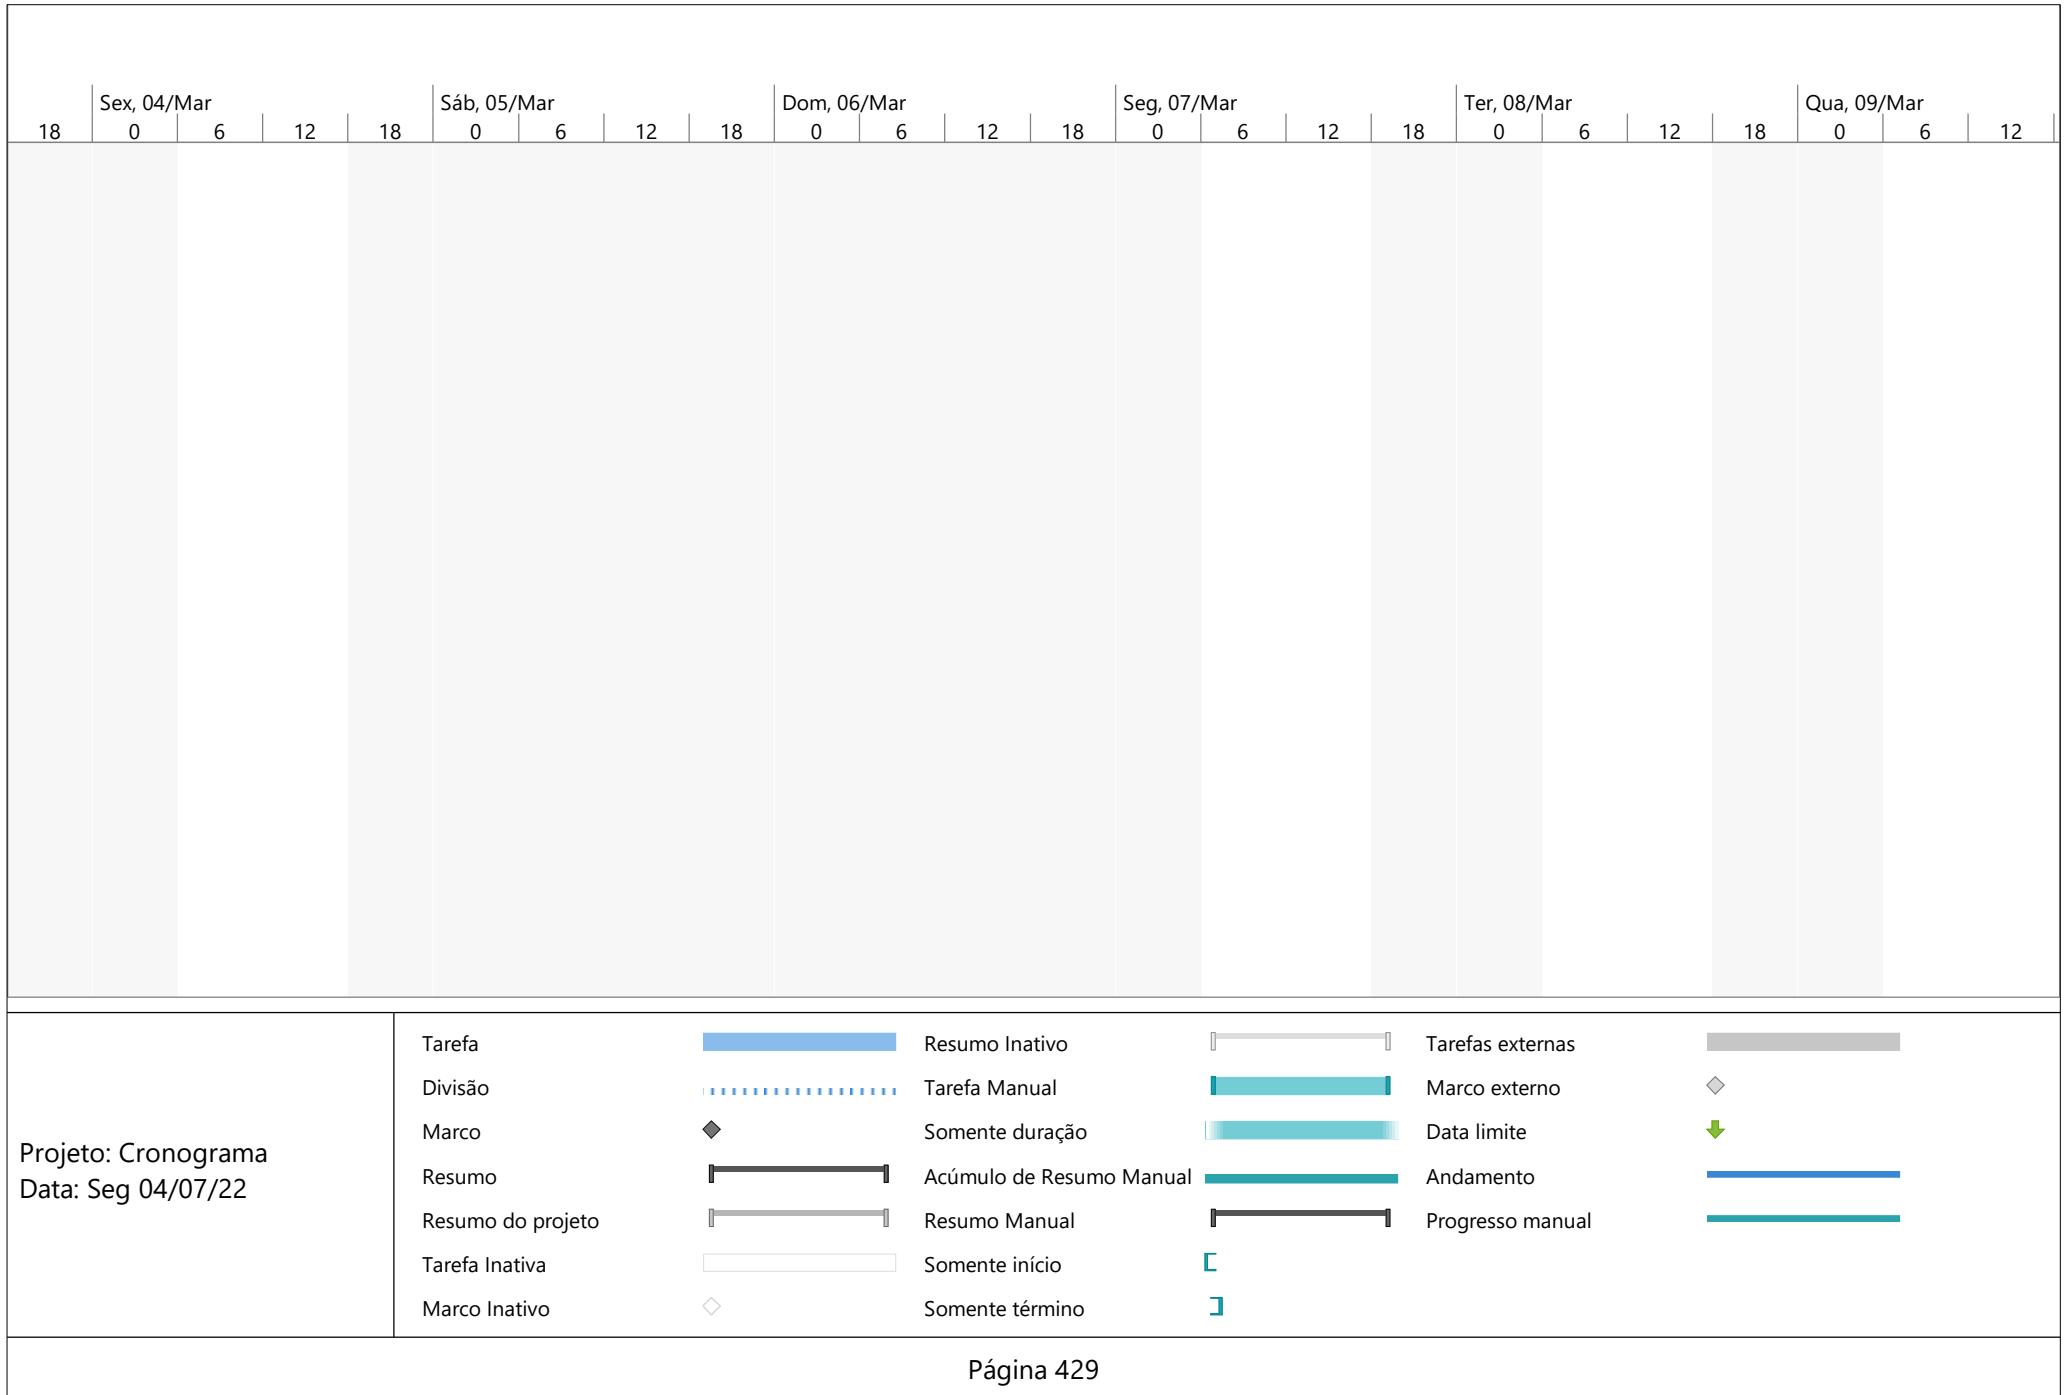


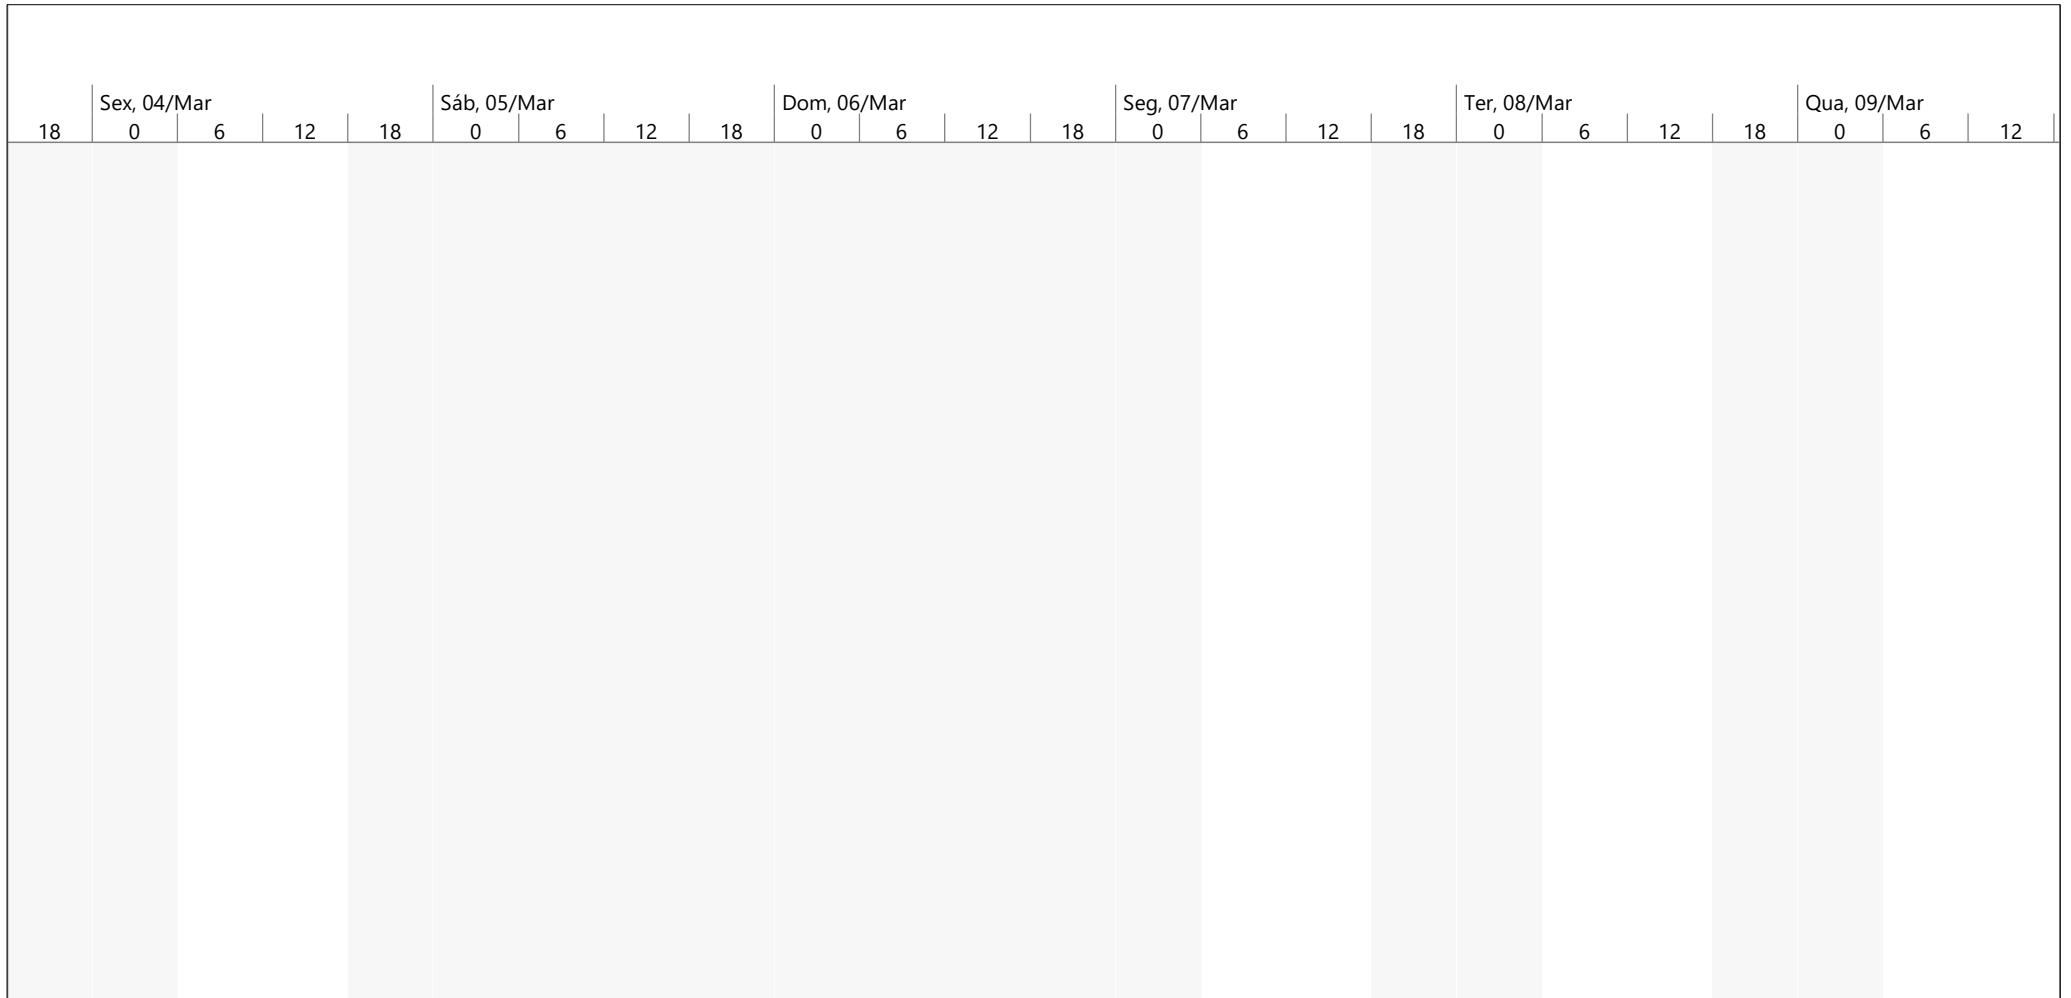


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

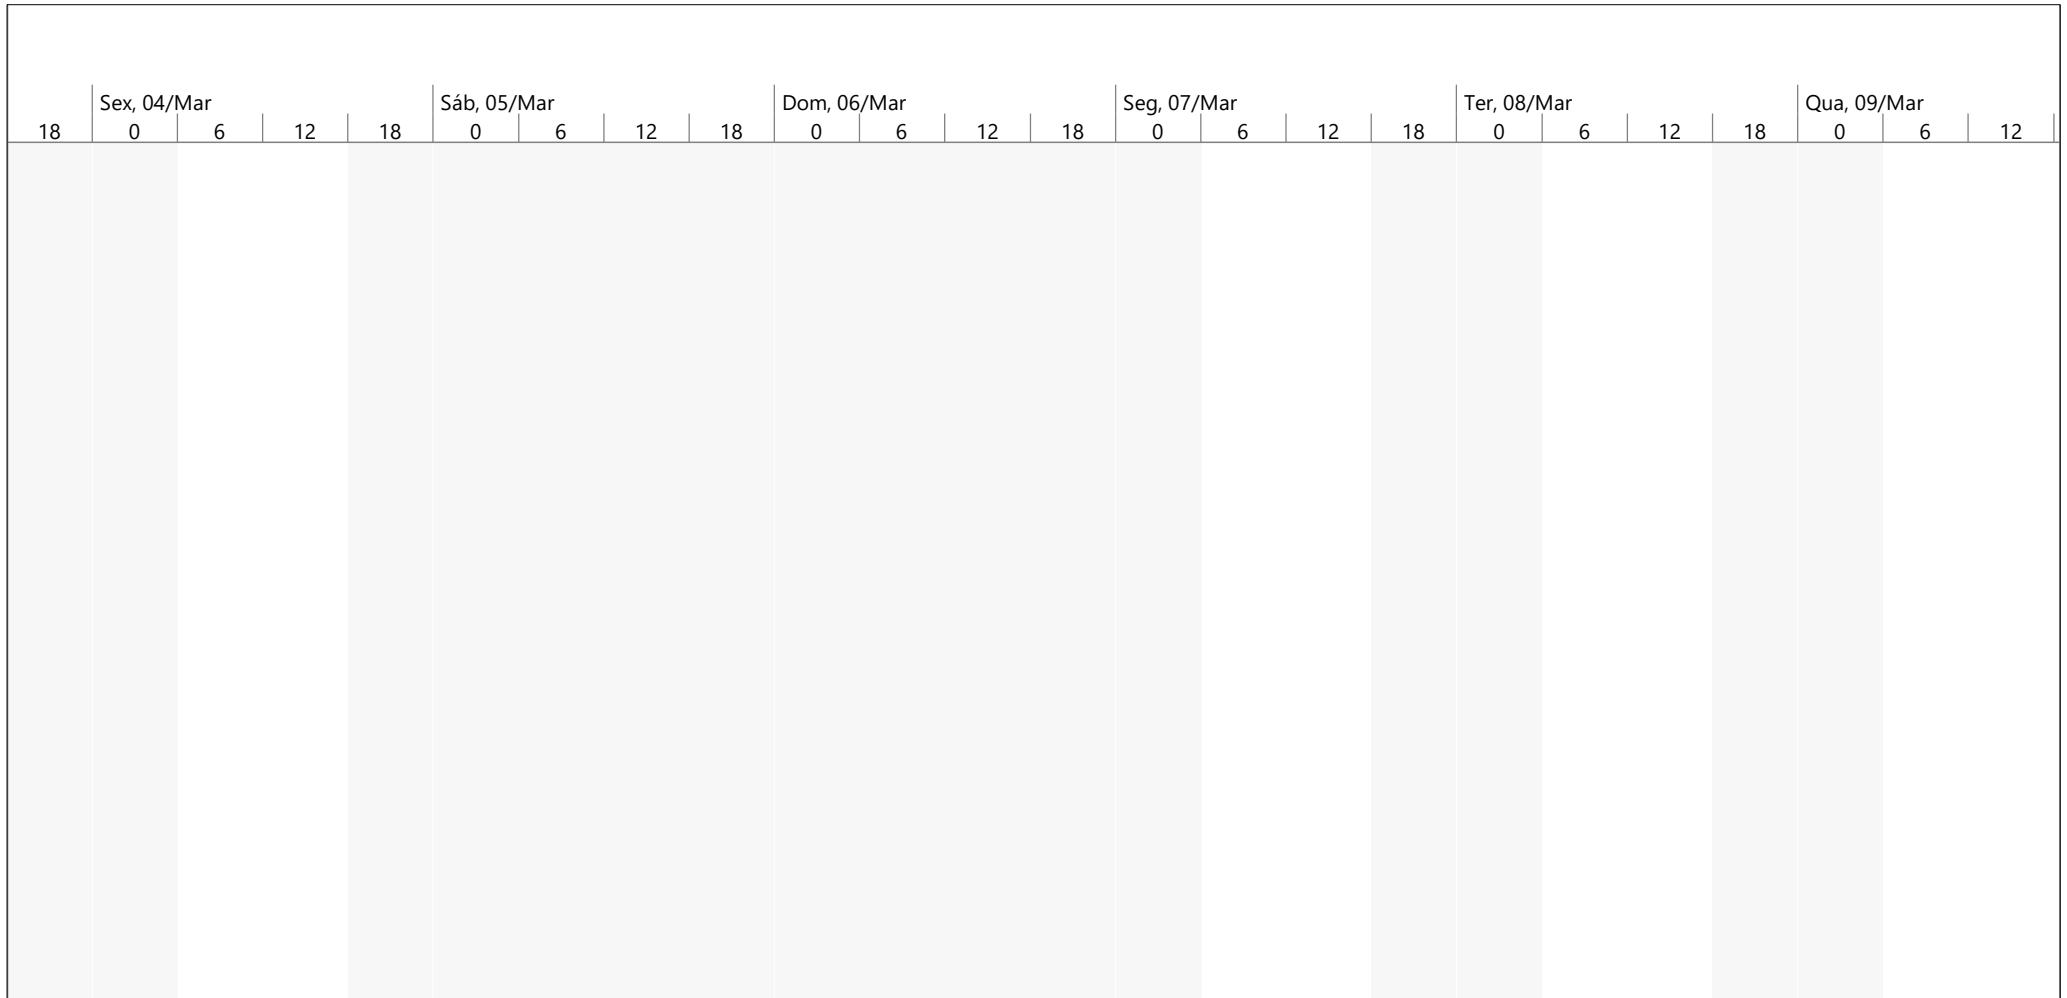


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

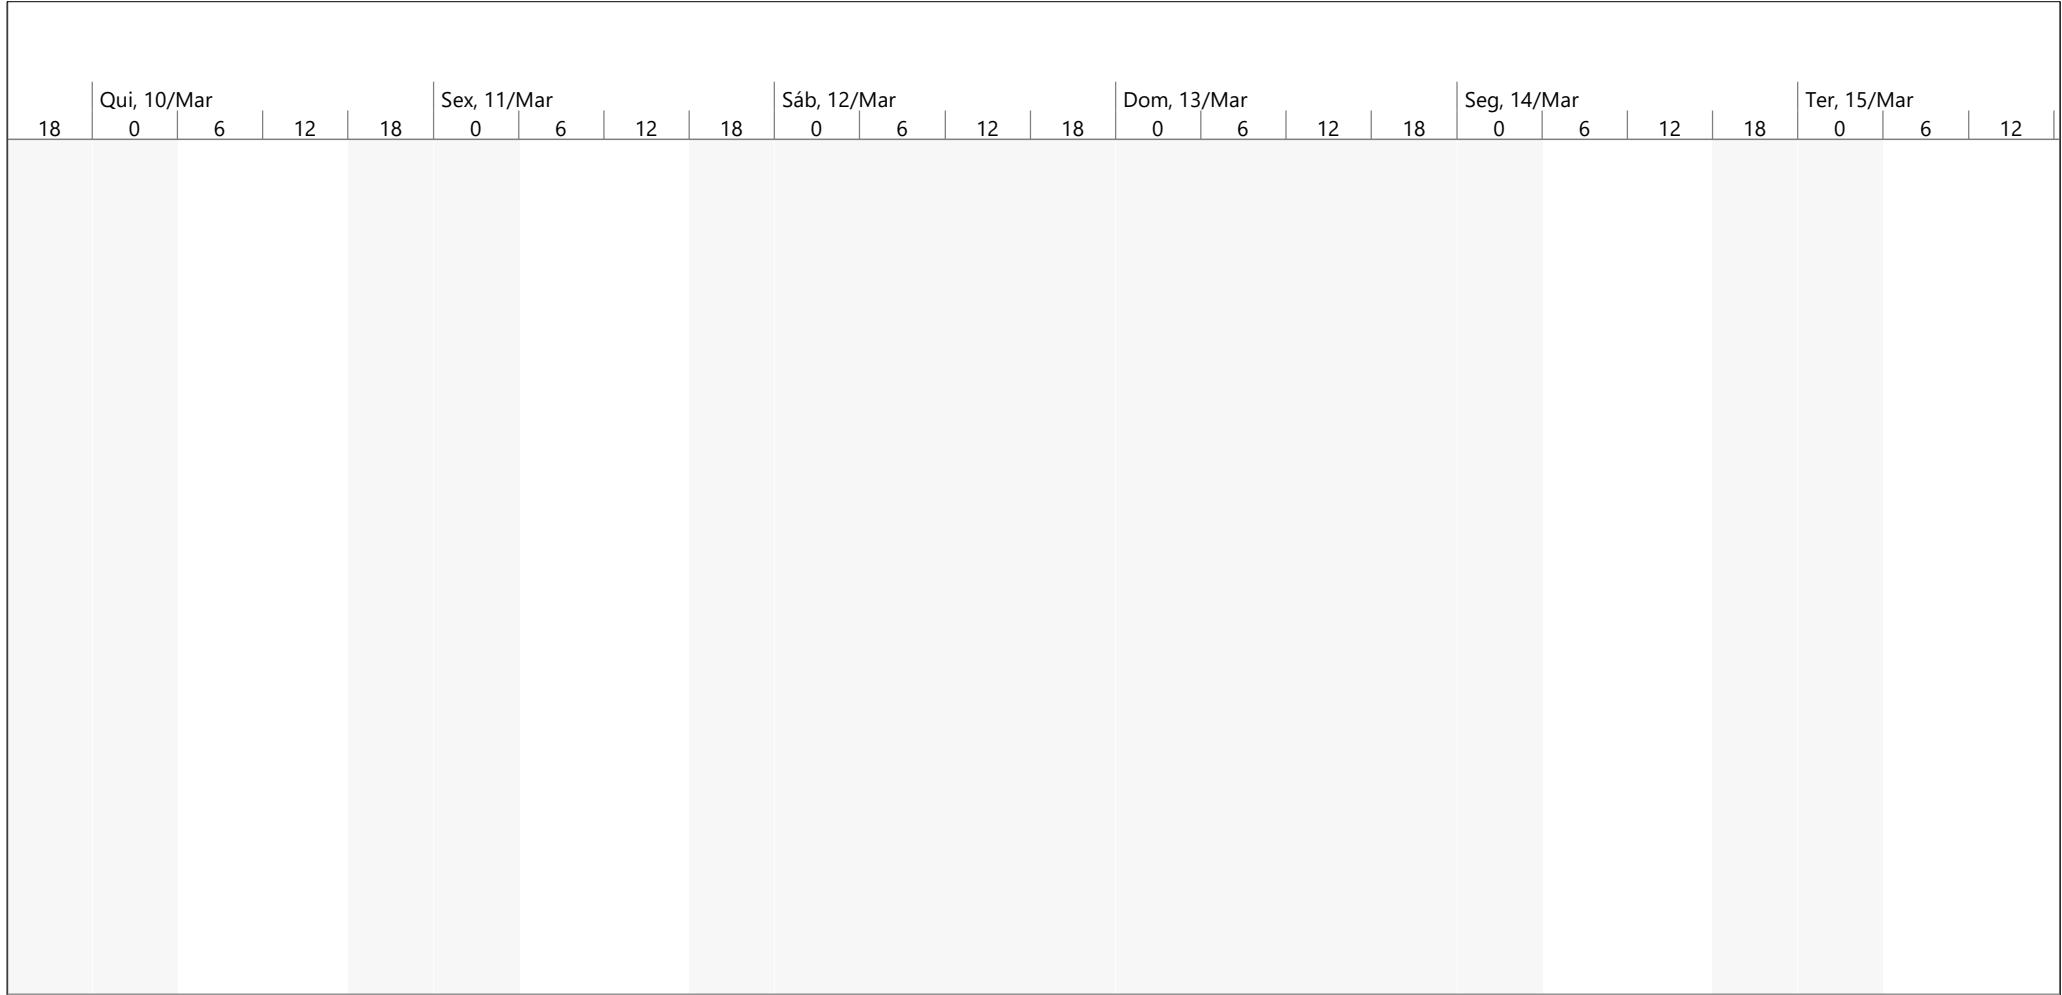


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

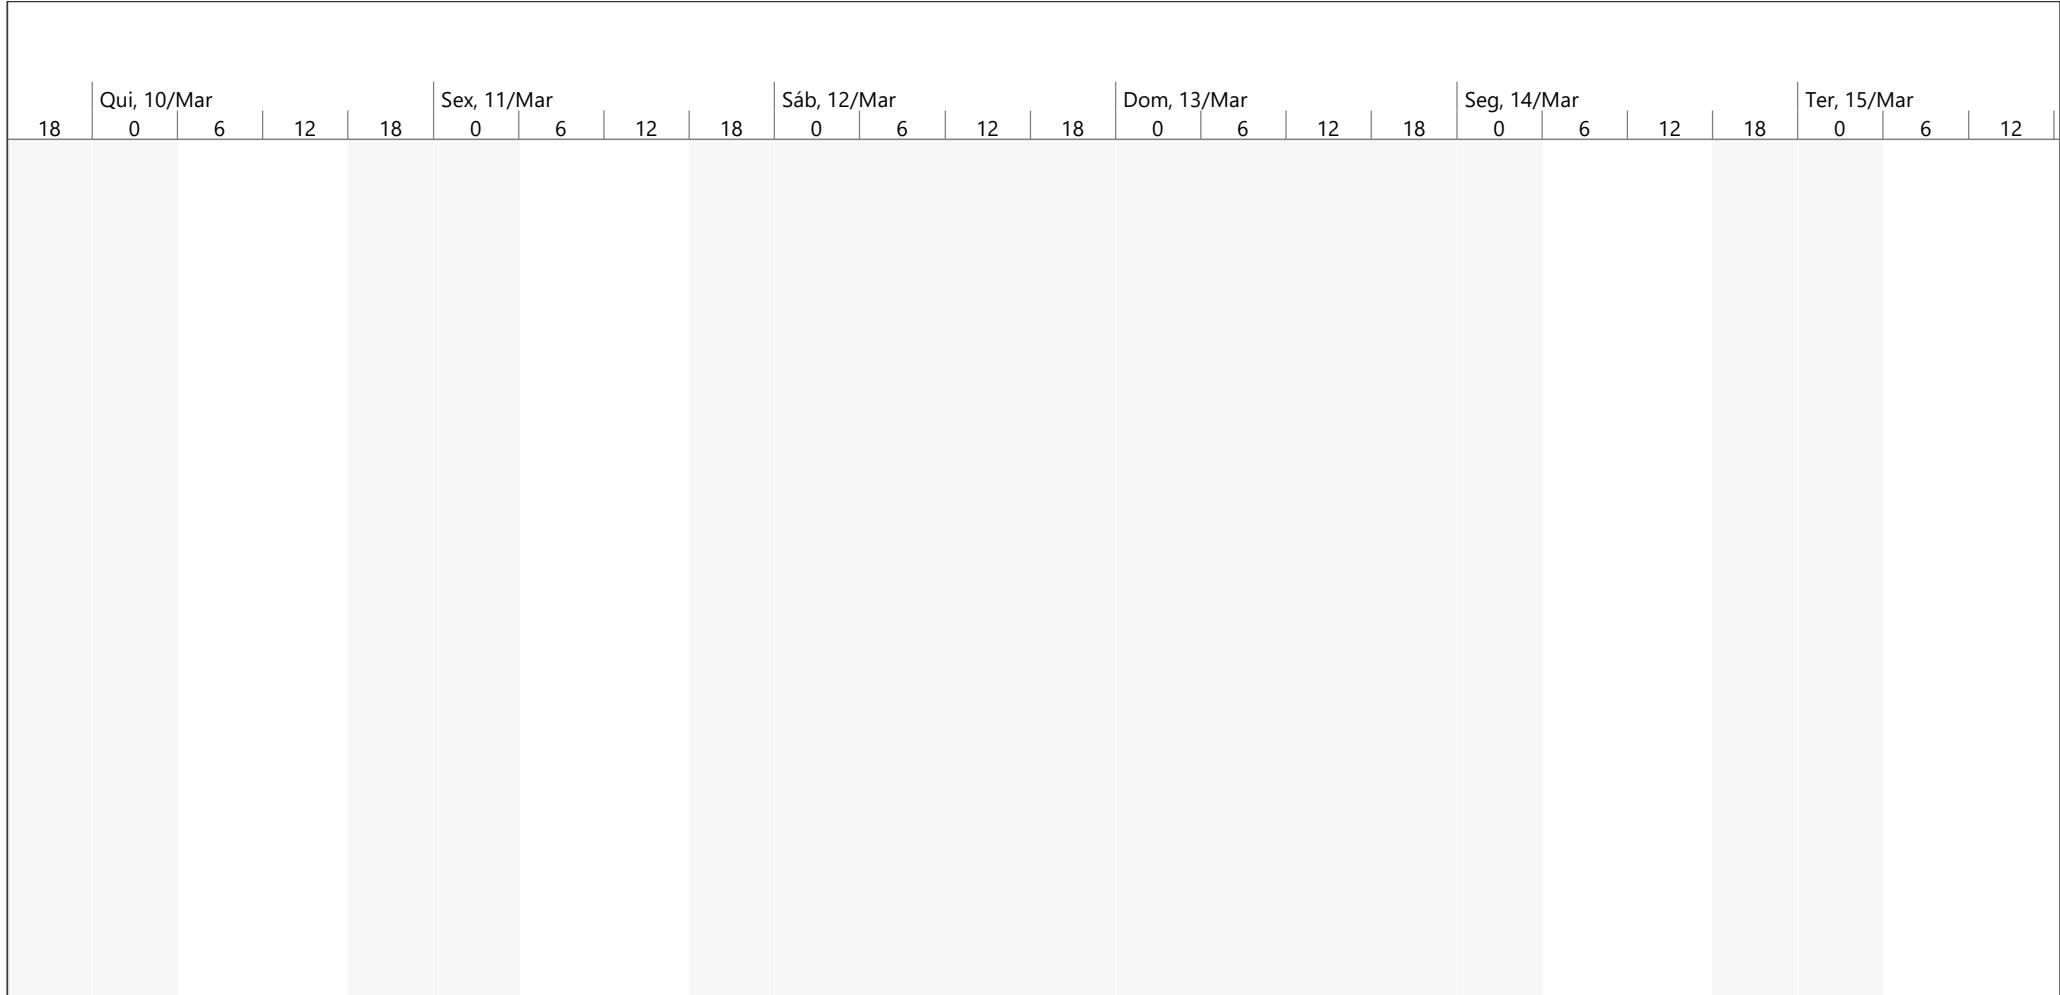


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

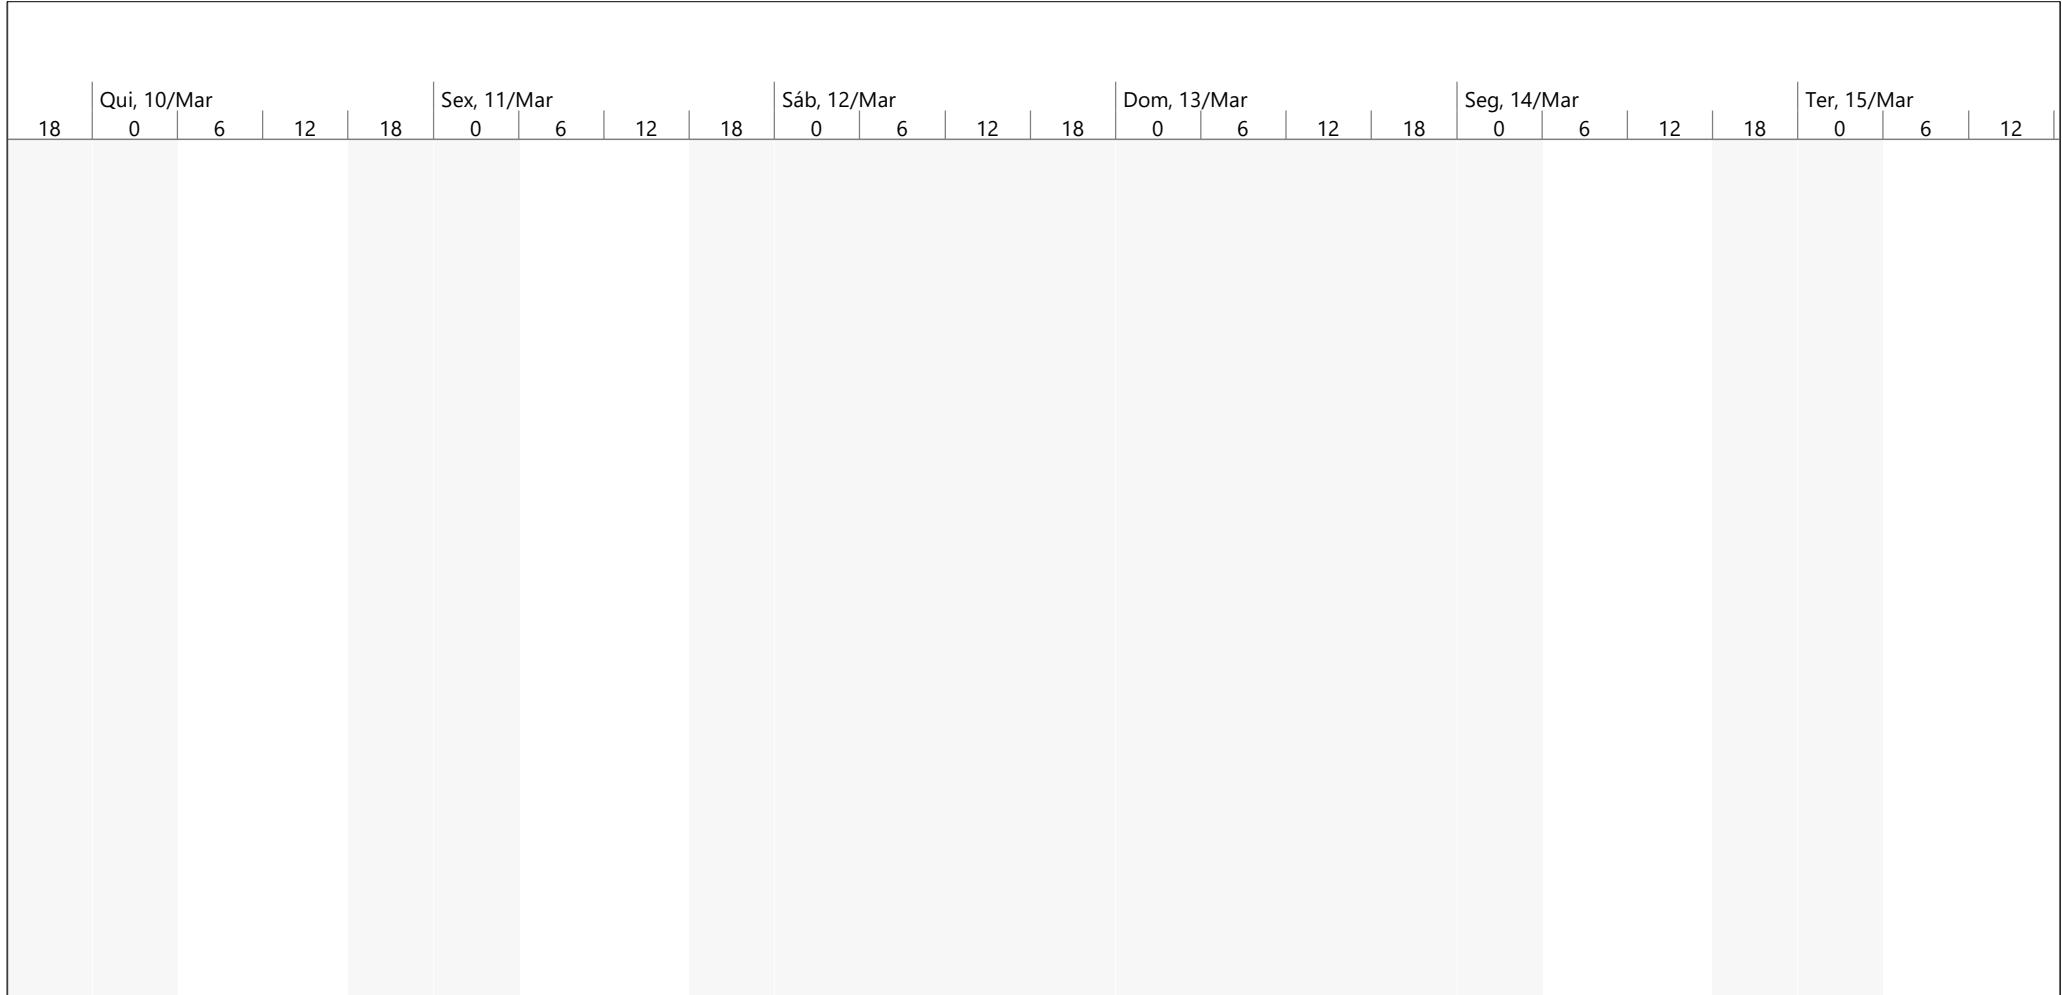

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

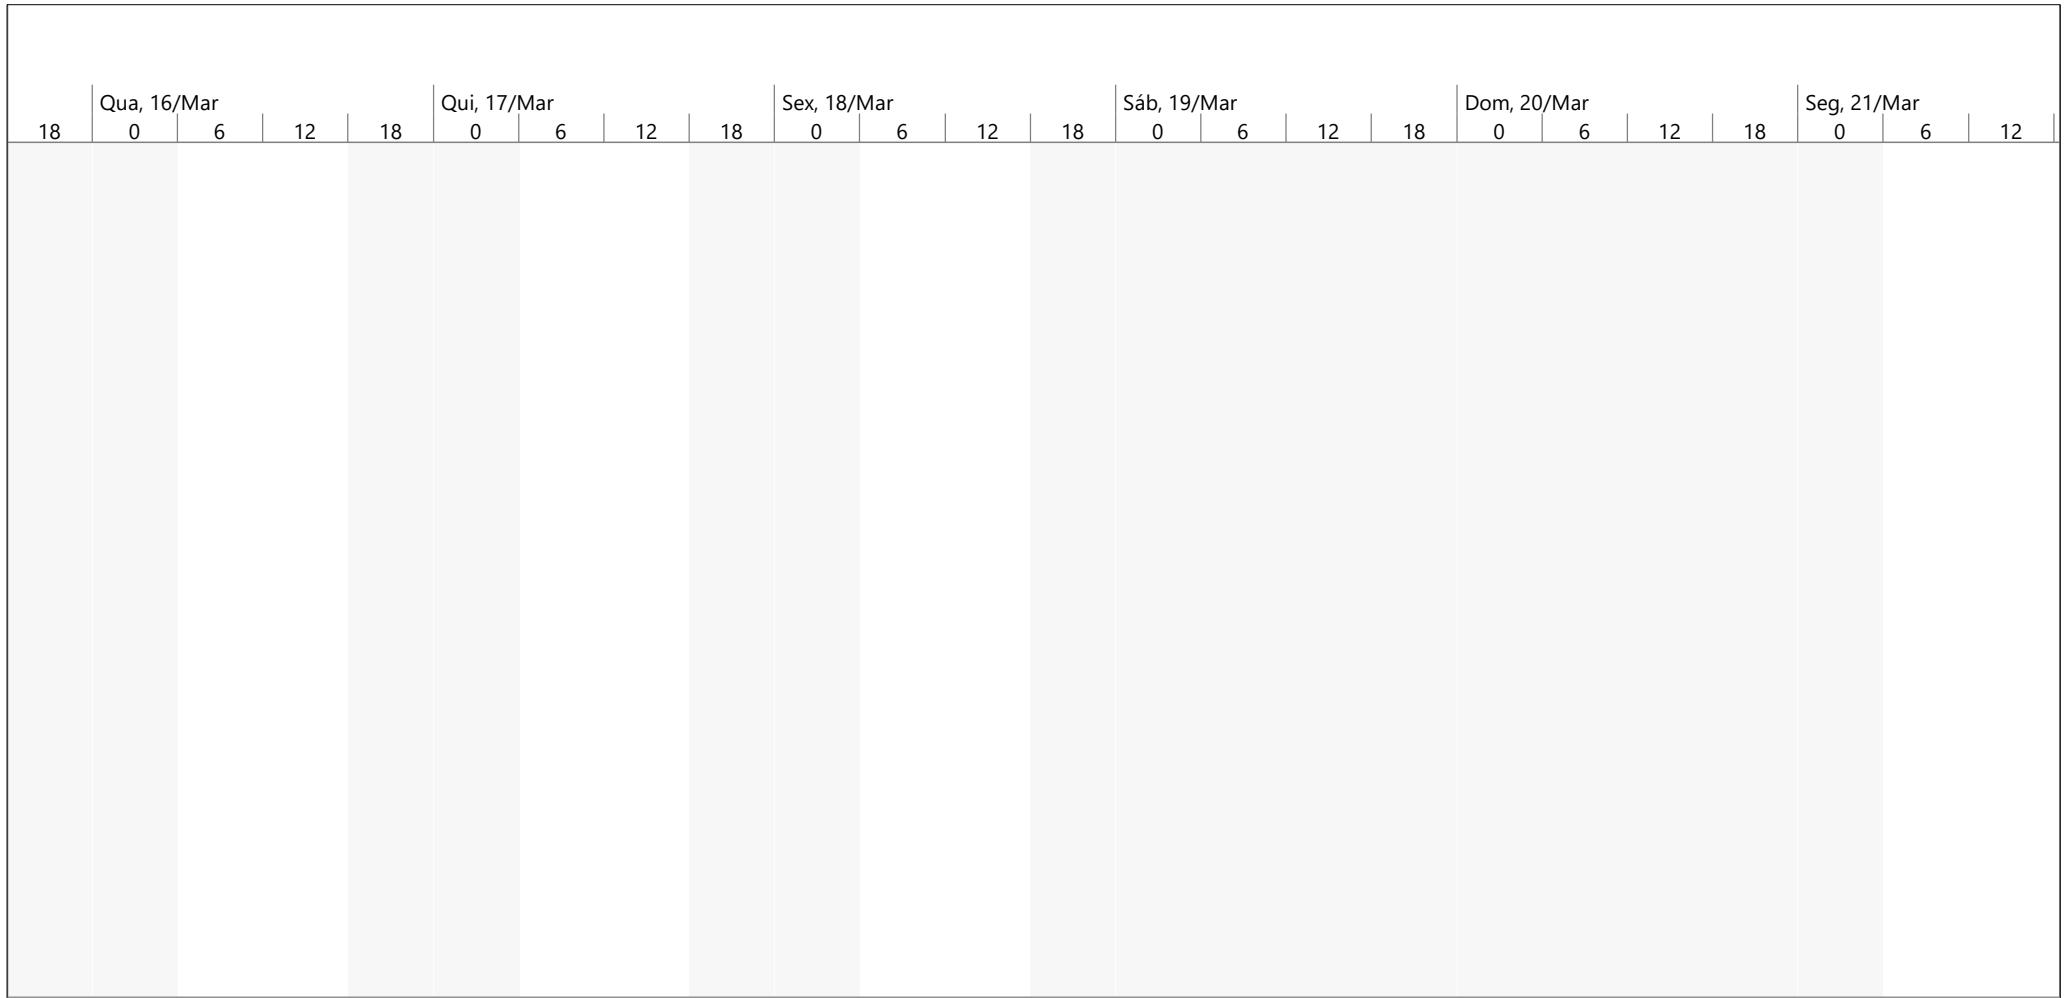


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

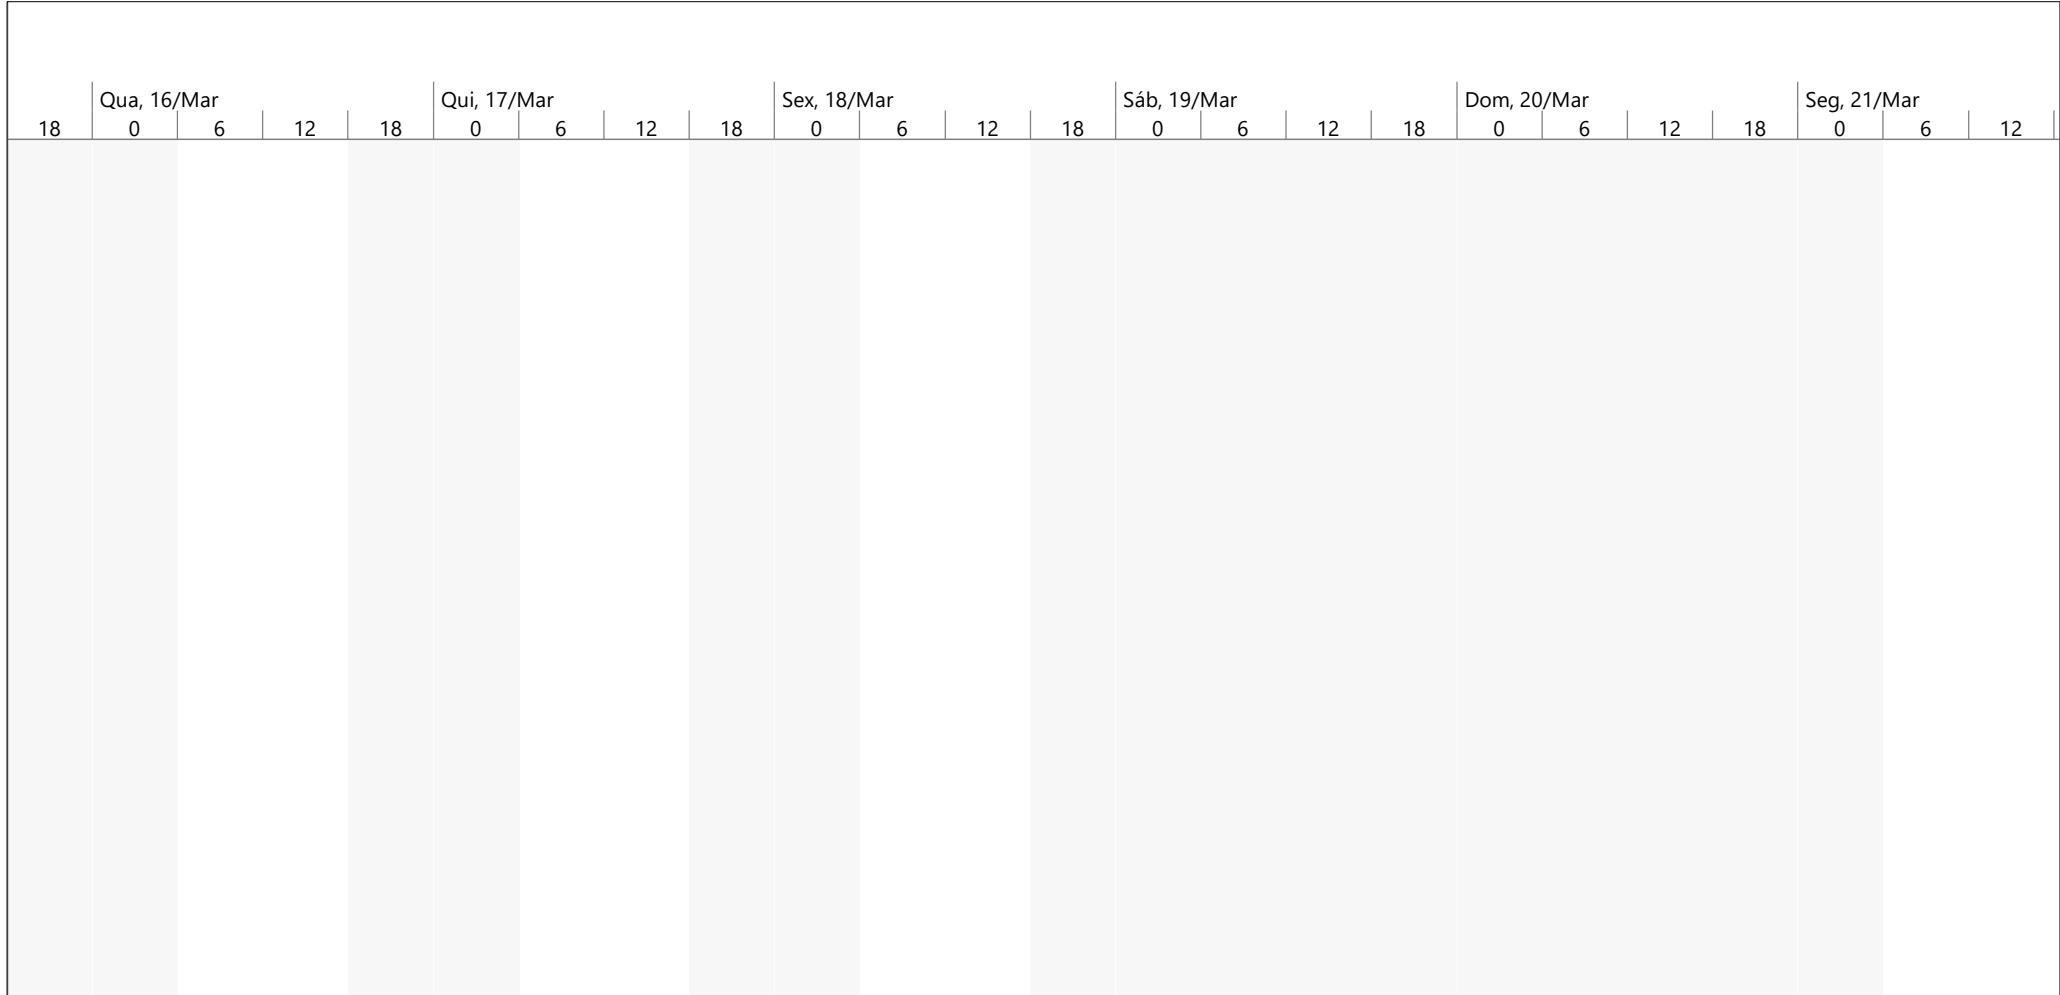


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

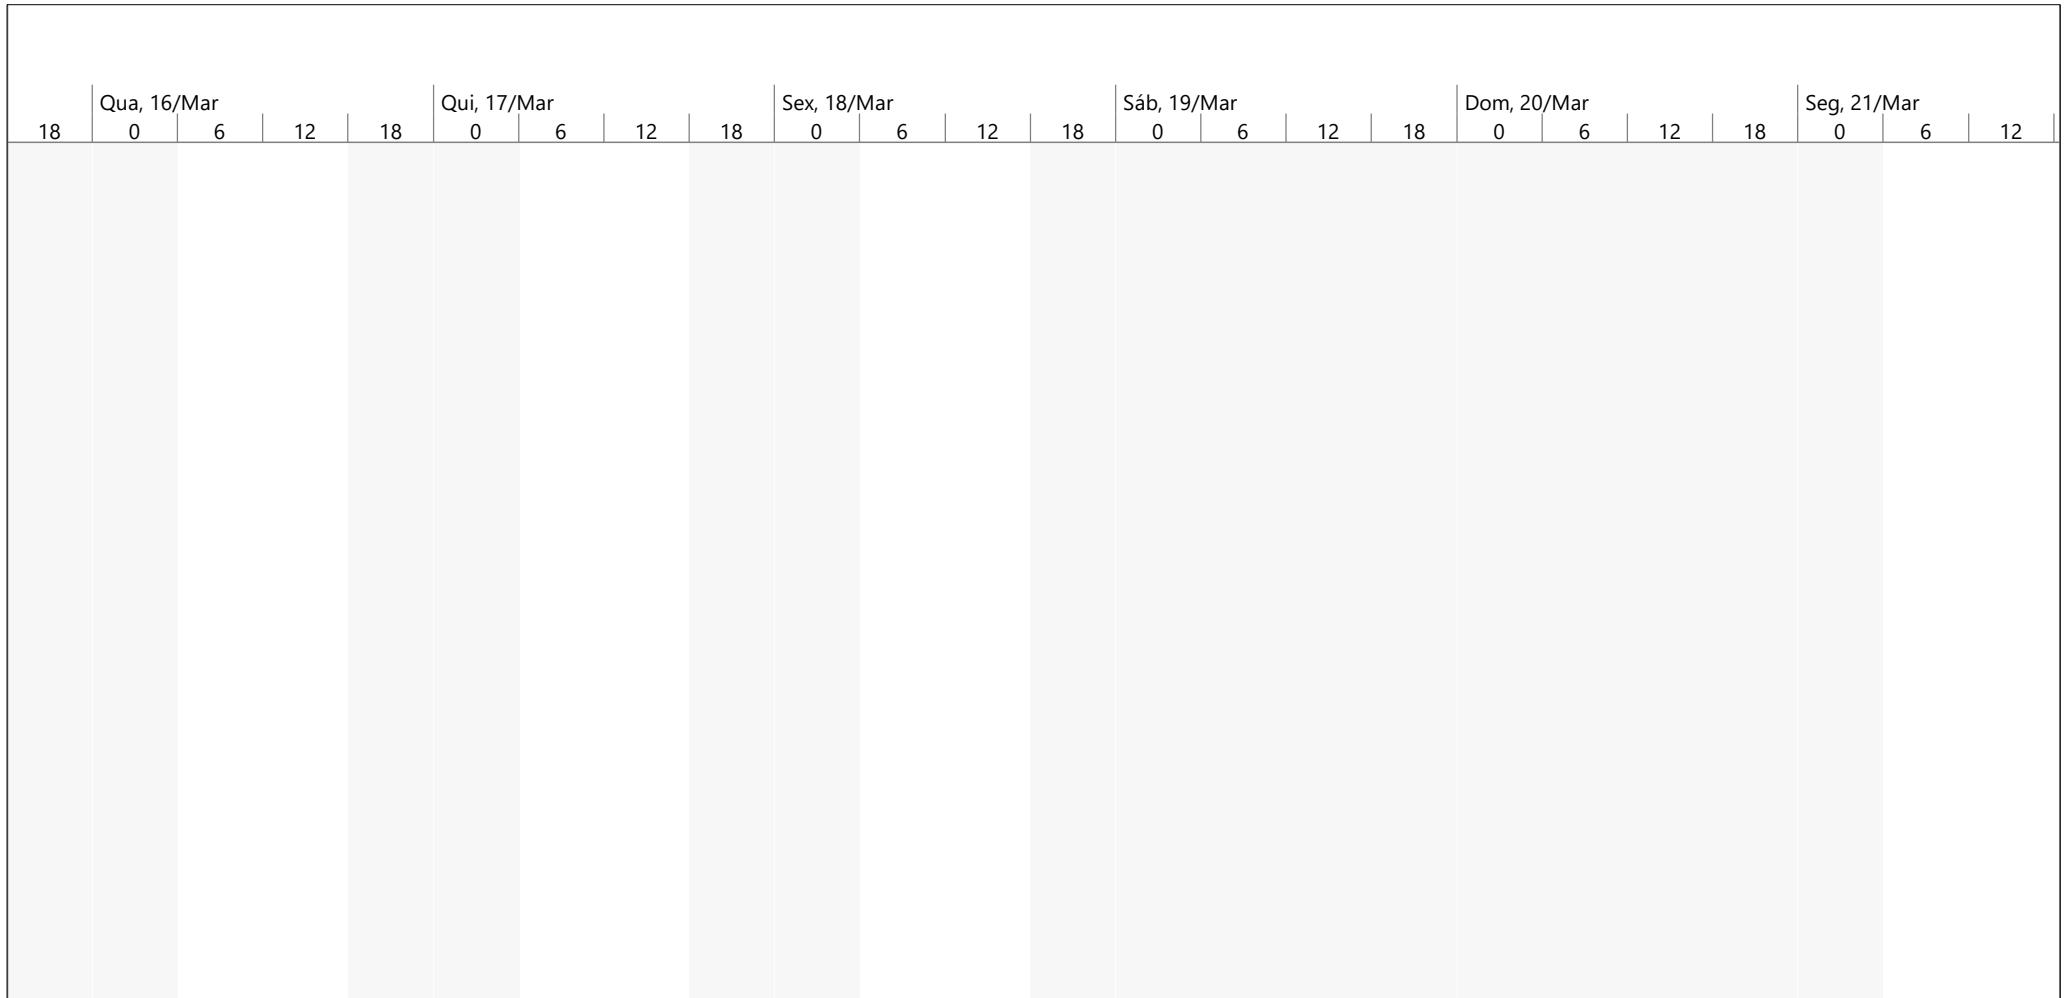


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

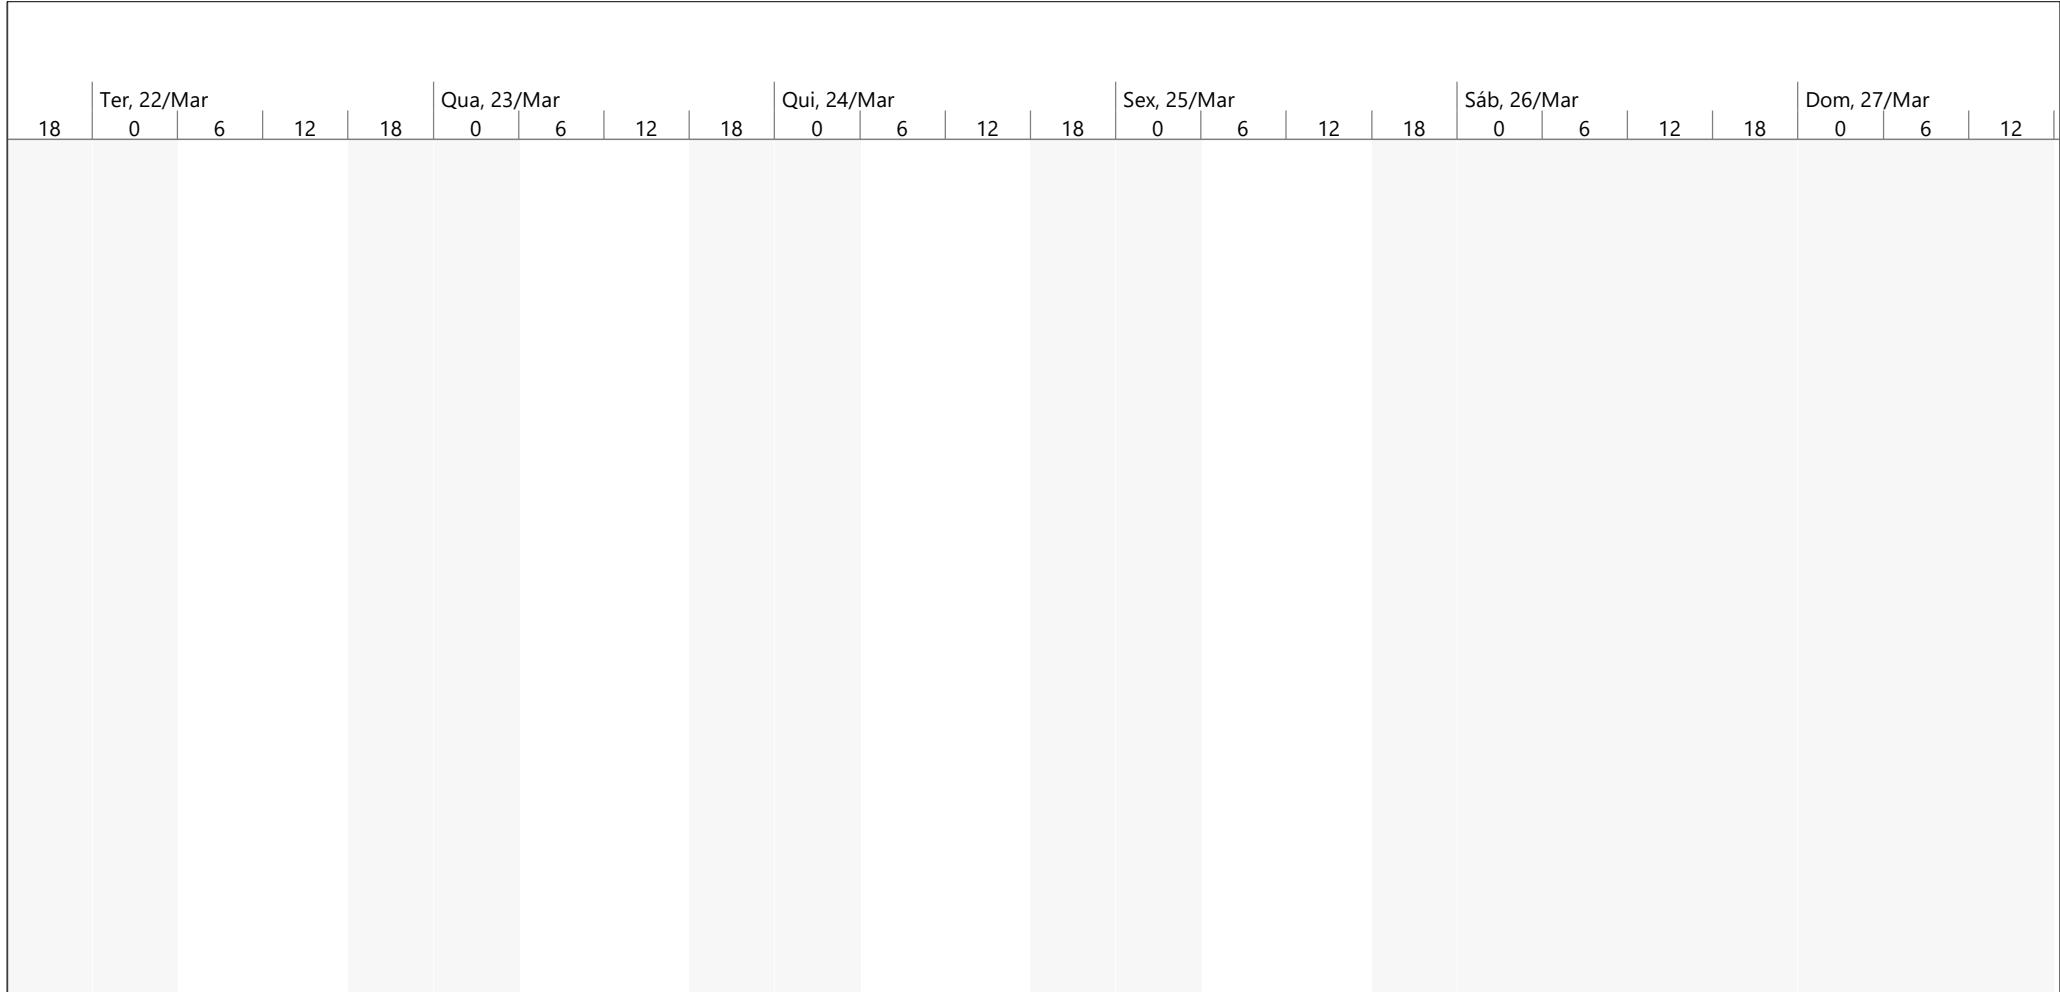



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

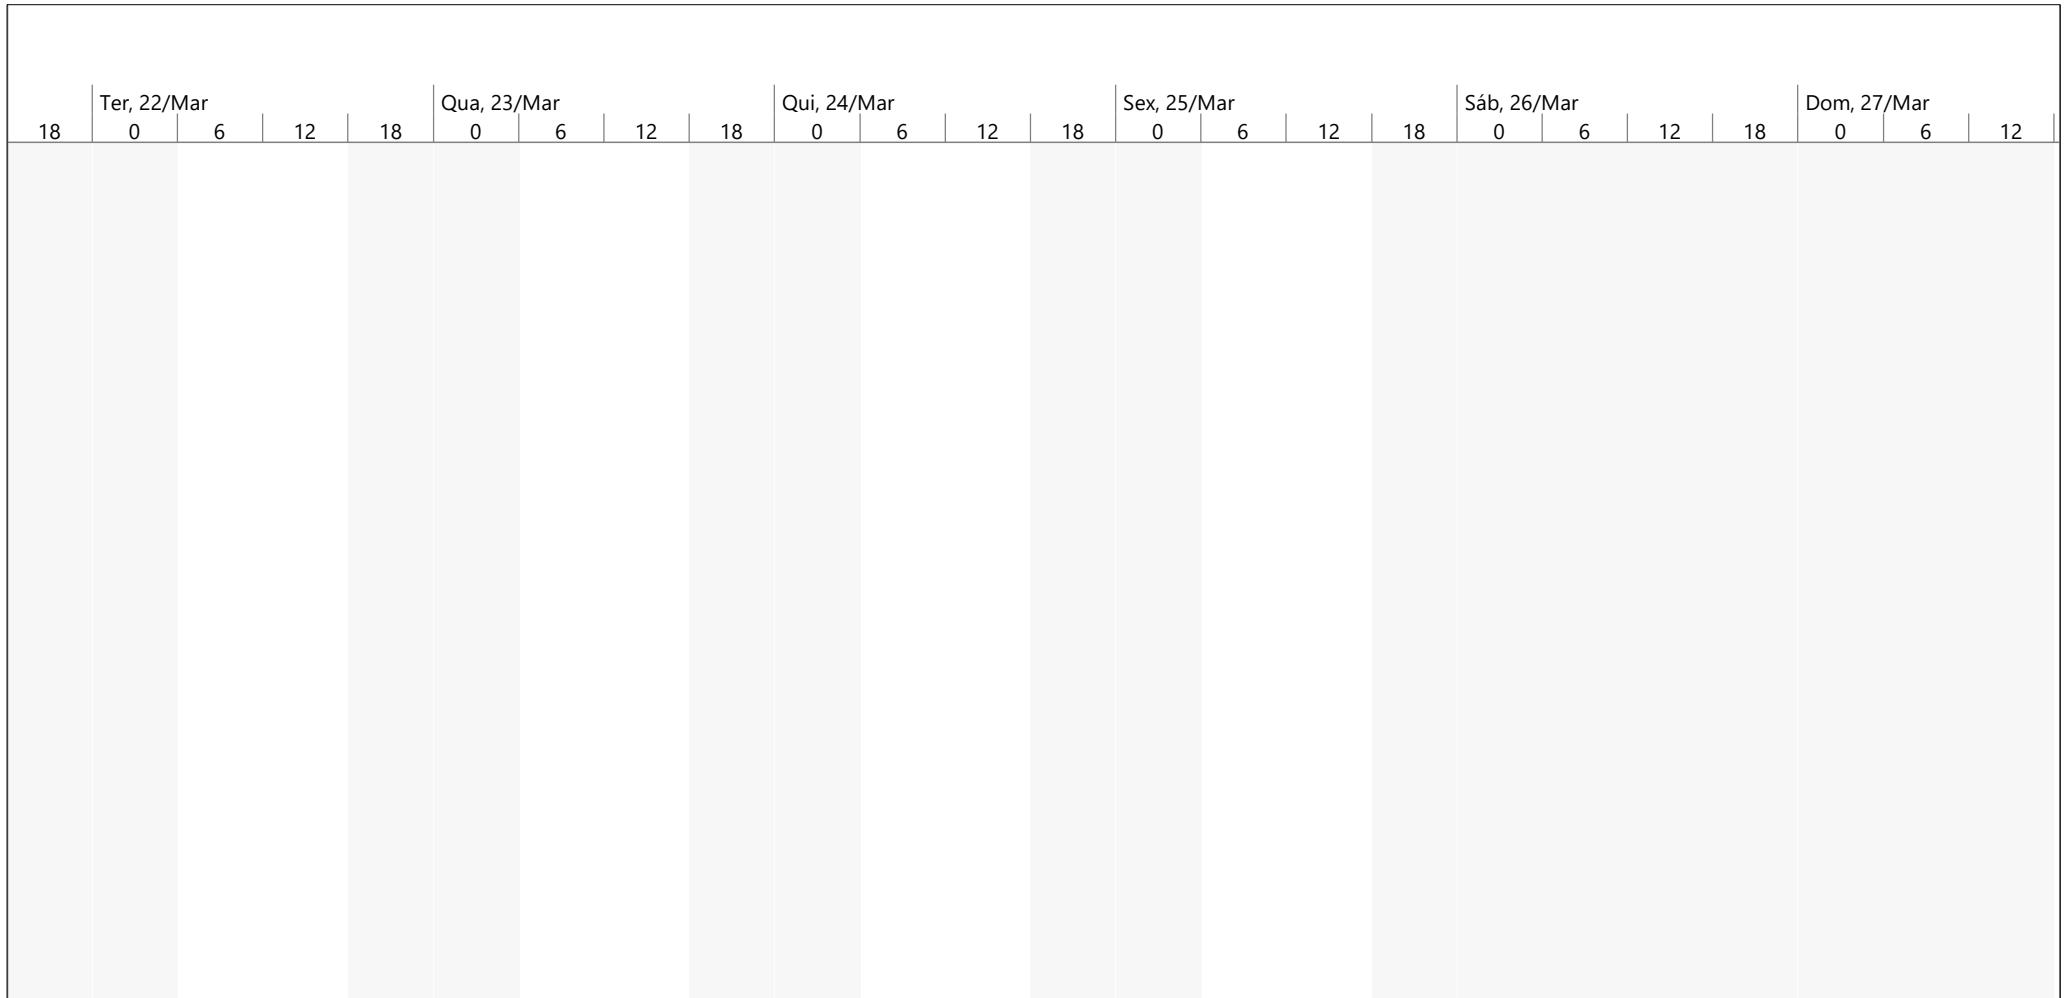

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

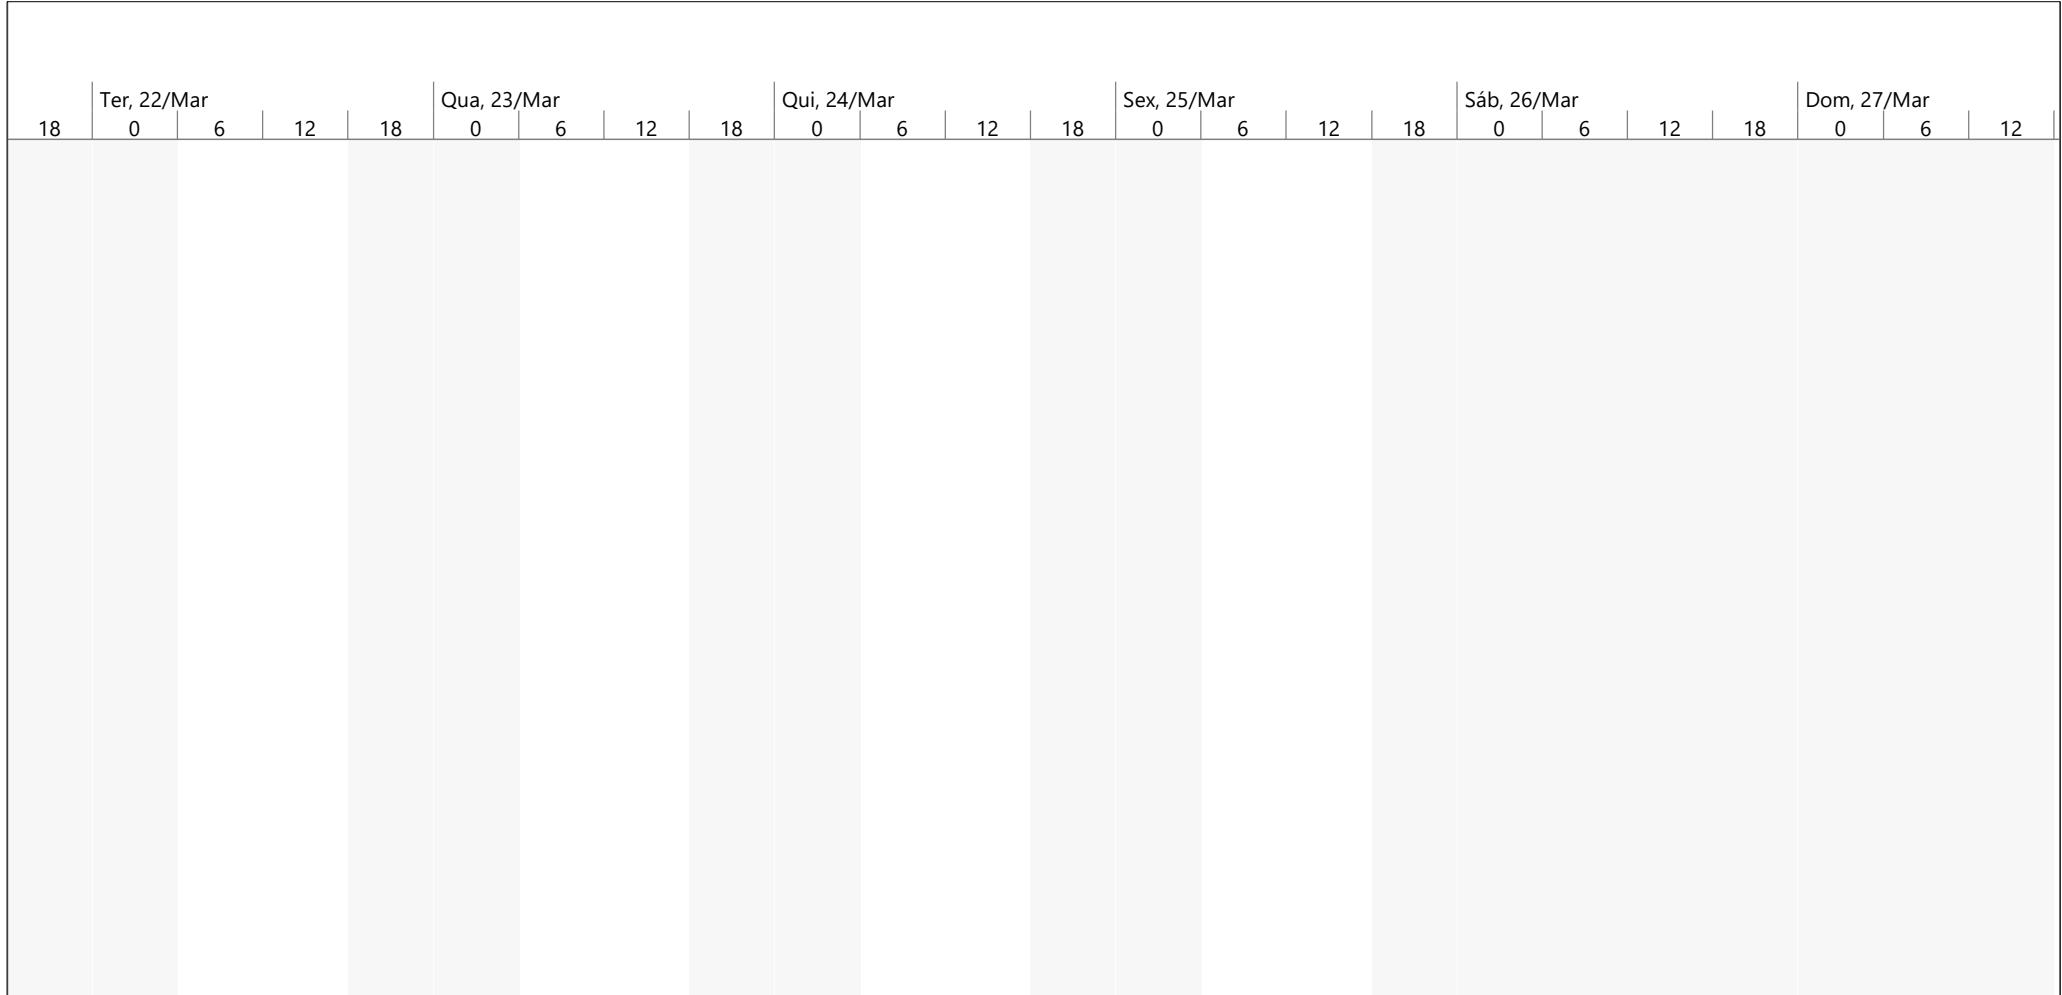


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

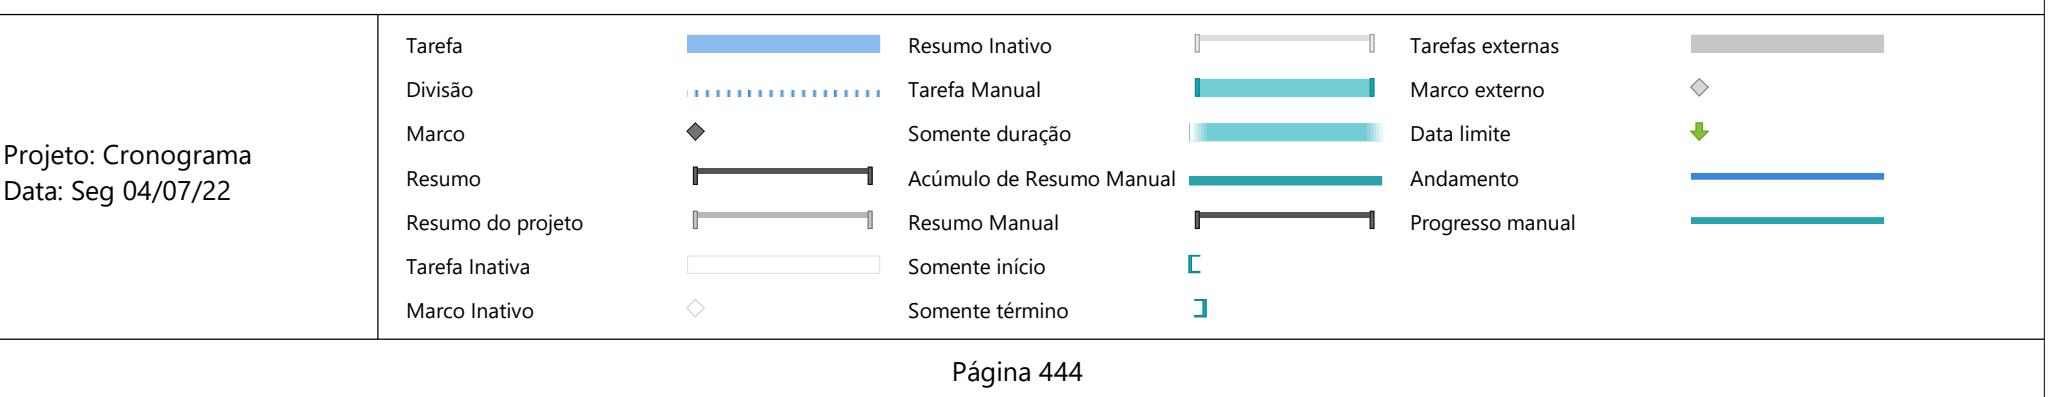




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22



Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

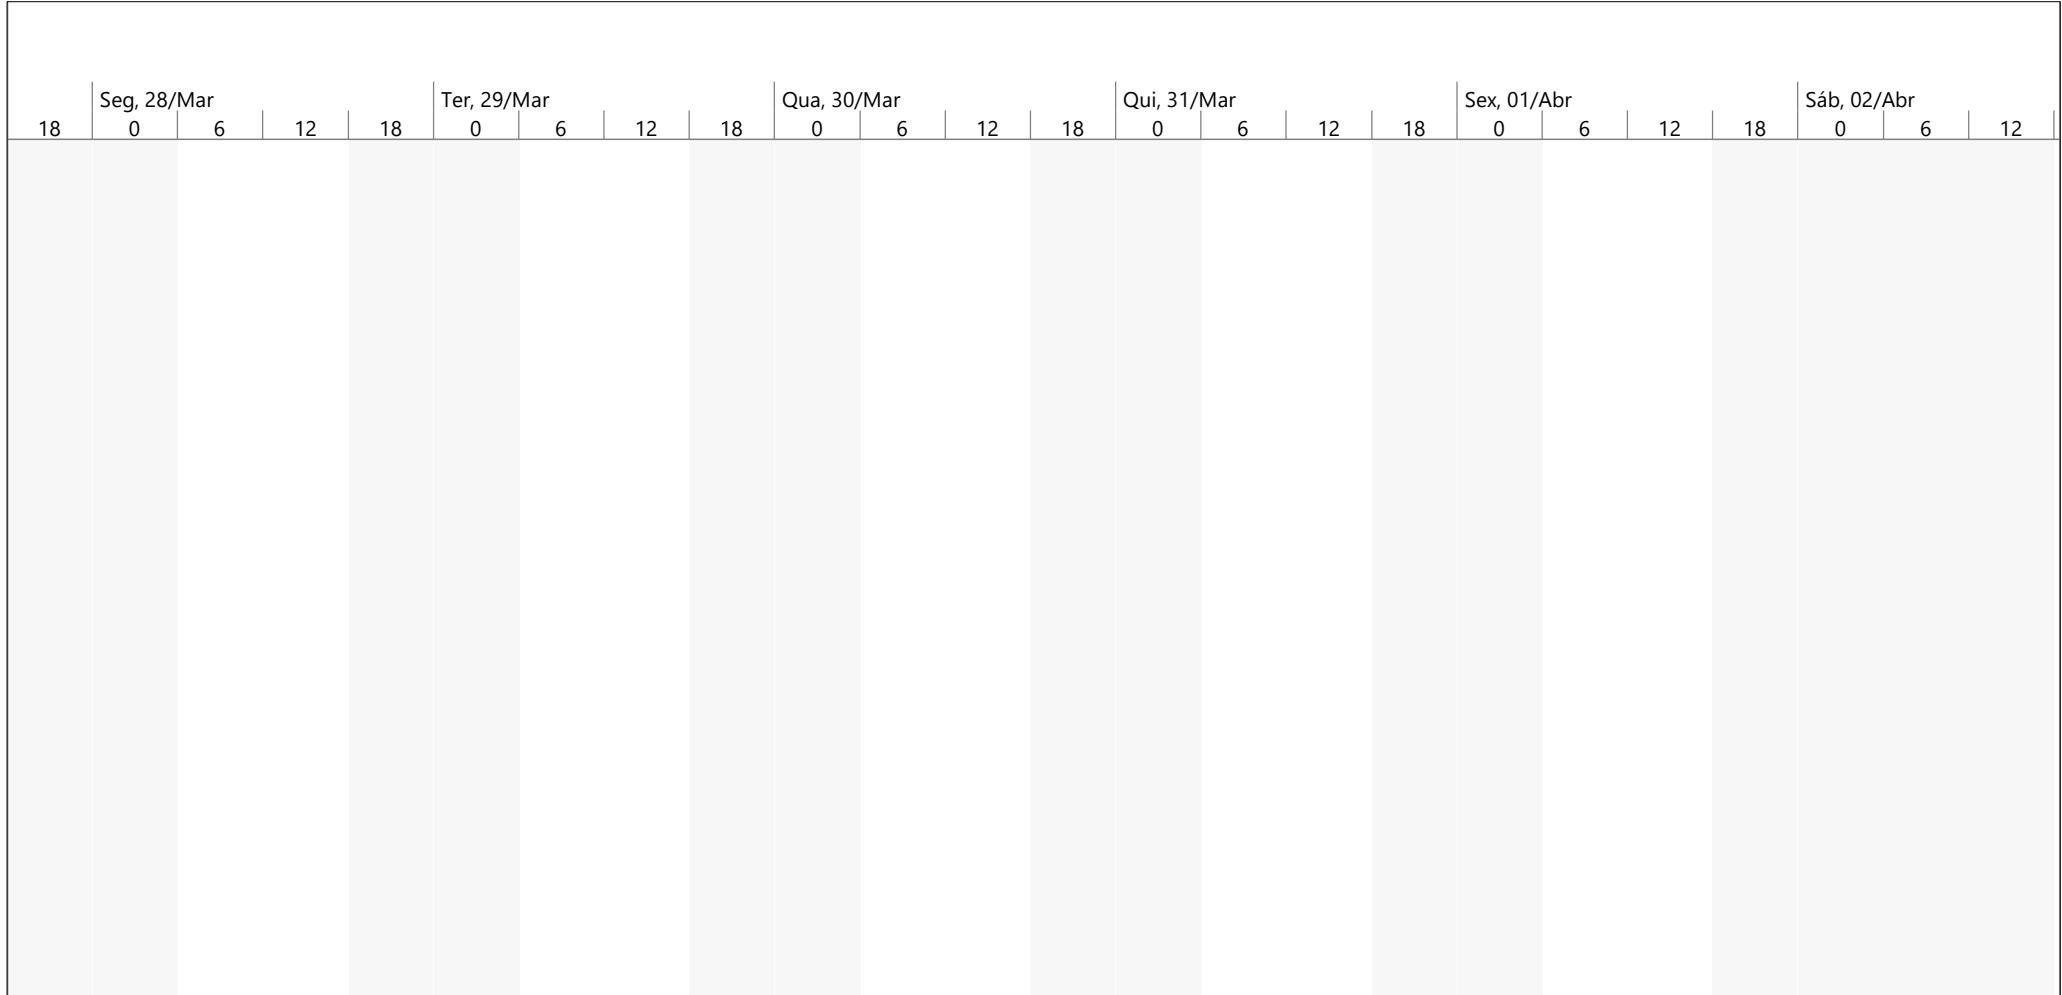


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

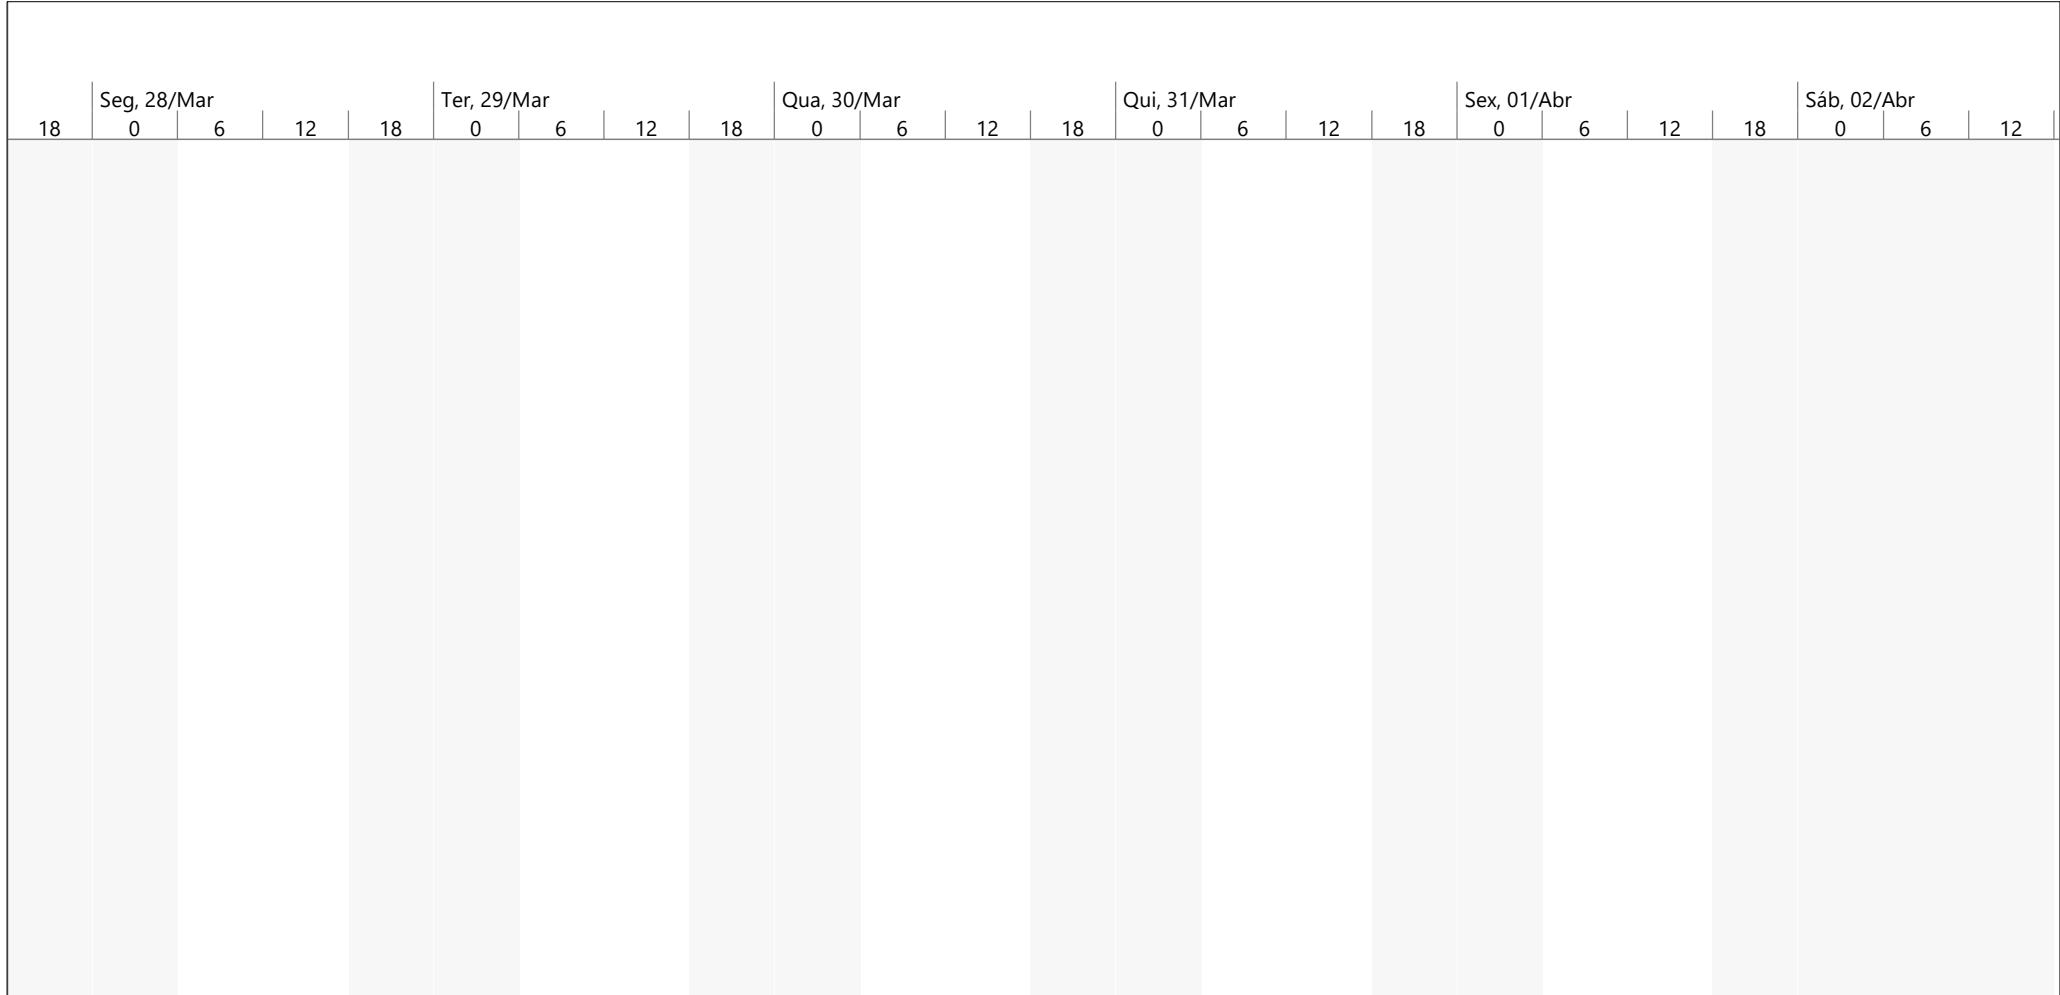


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

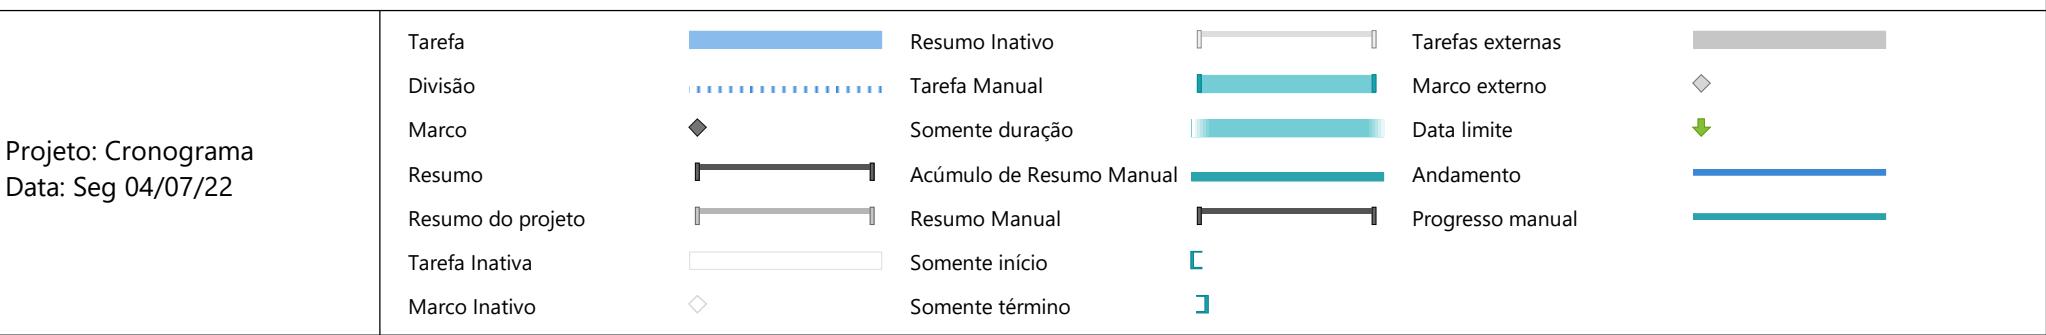


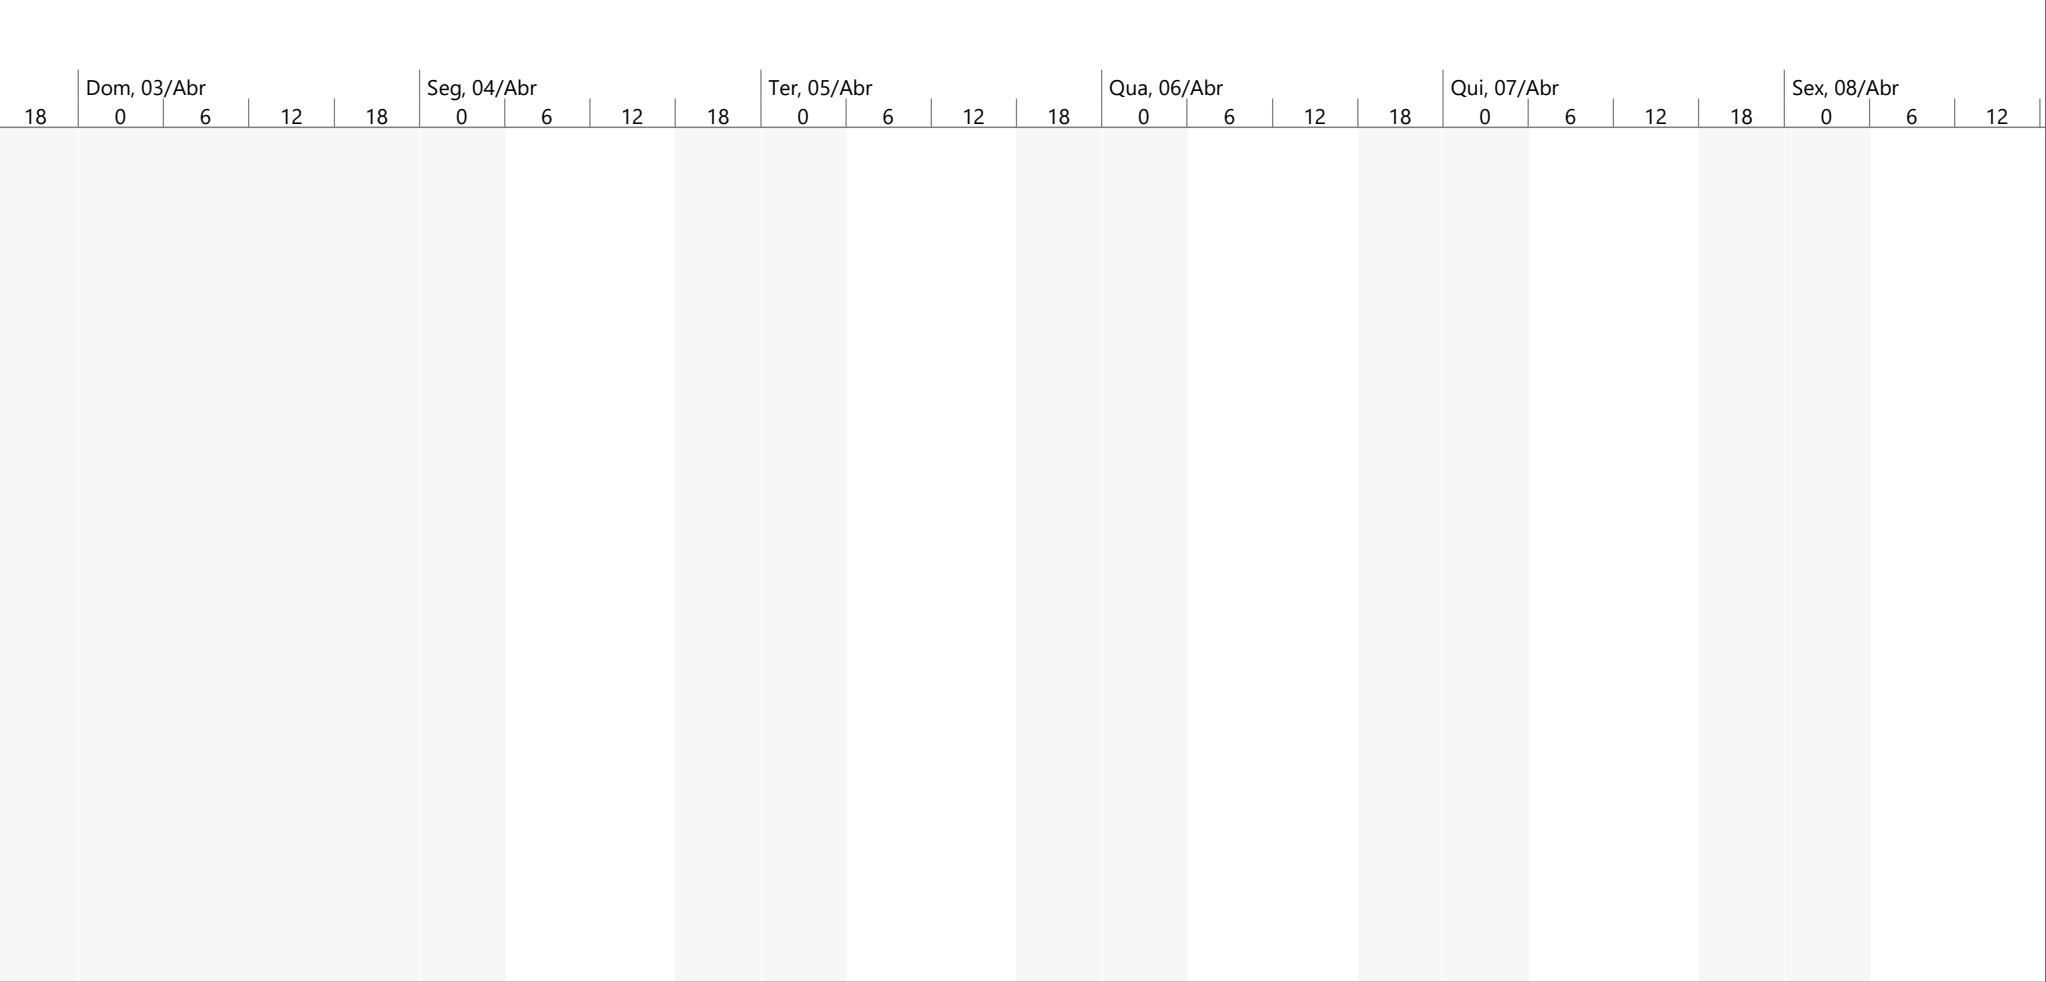


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

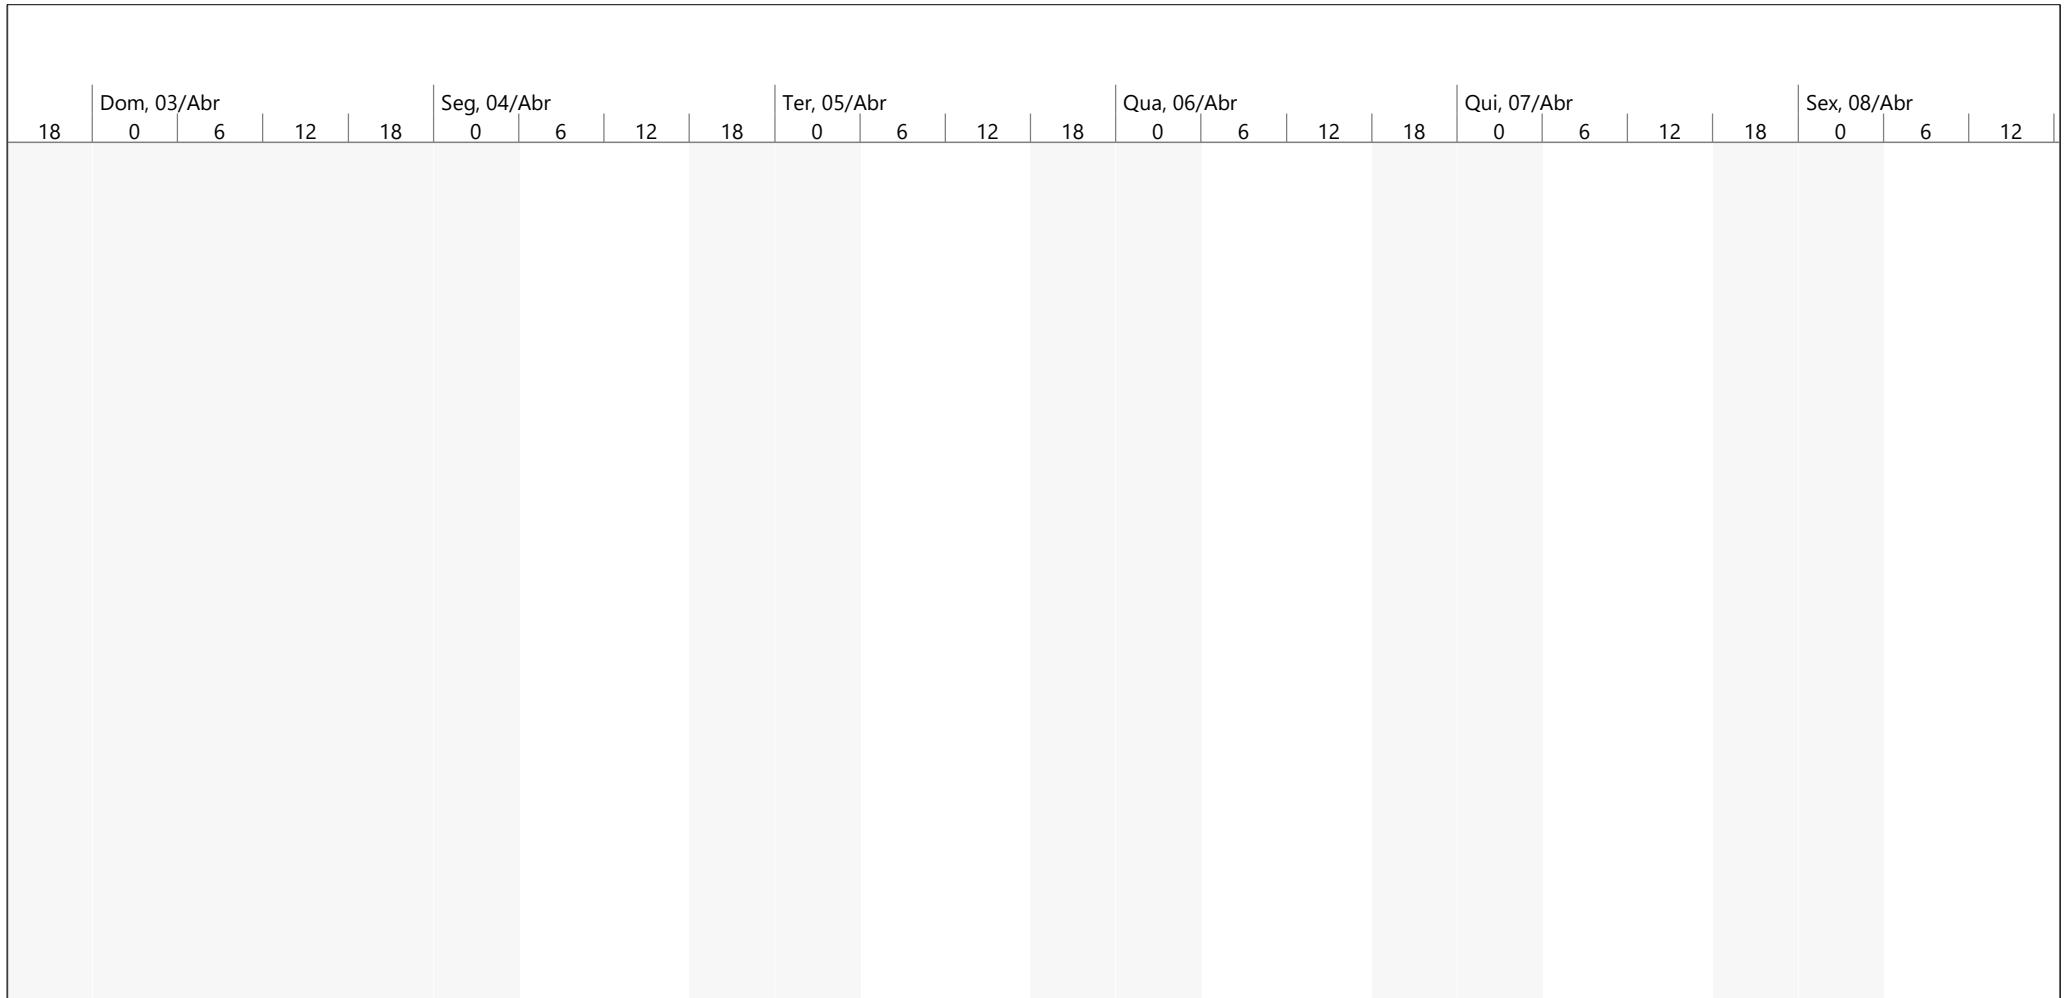


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

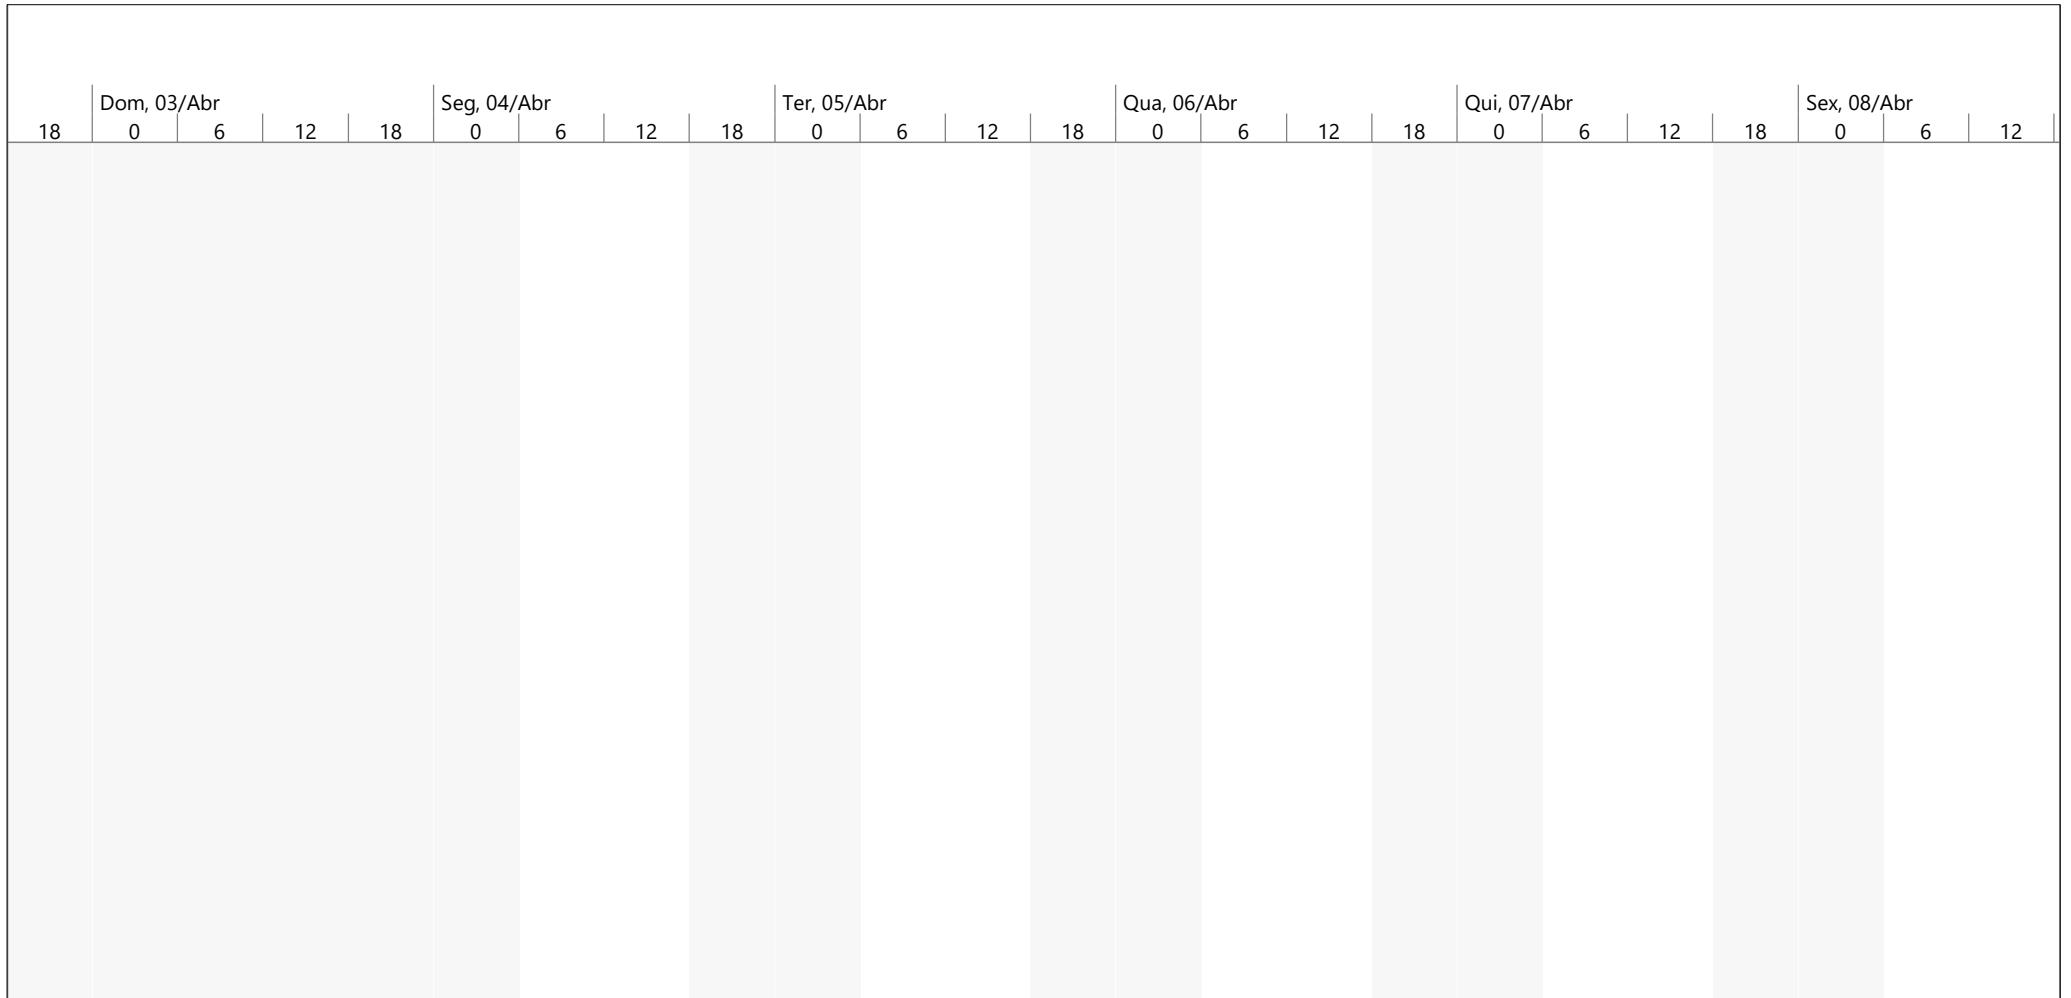


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

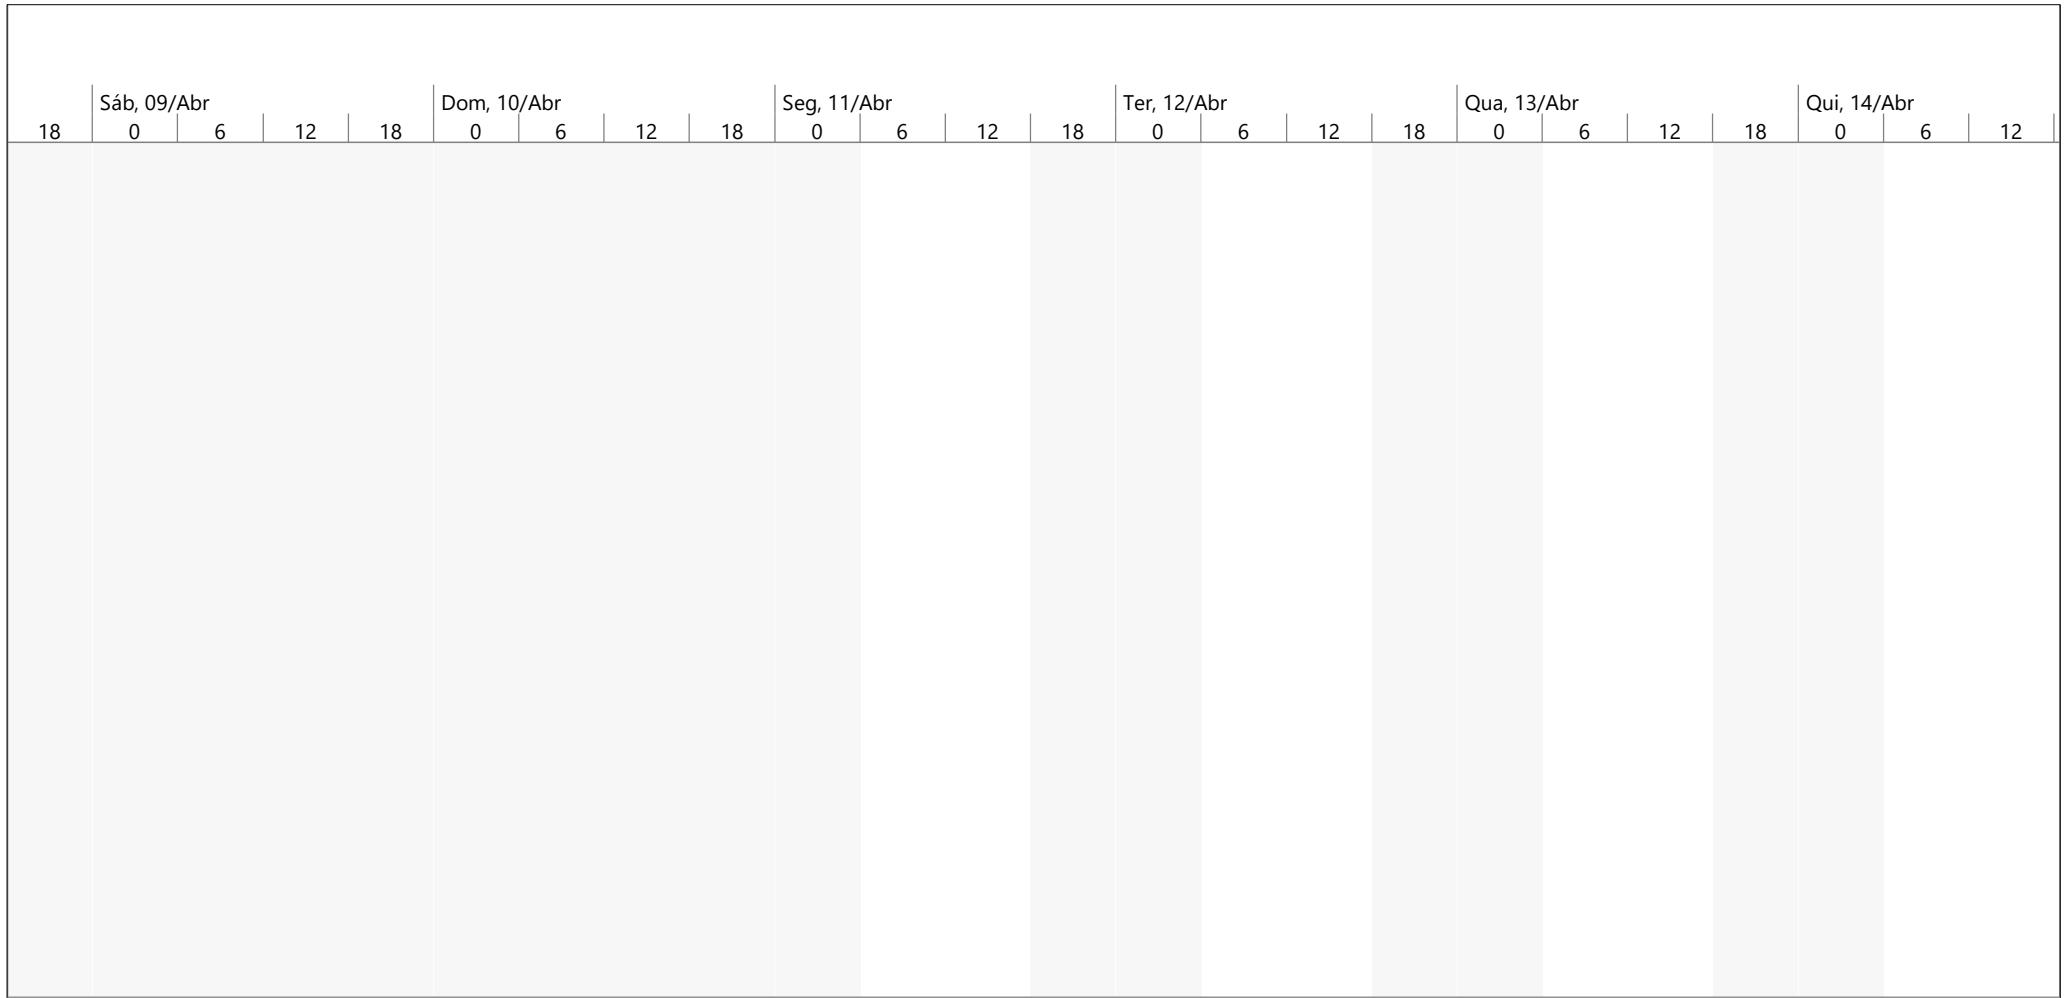


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

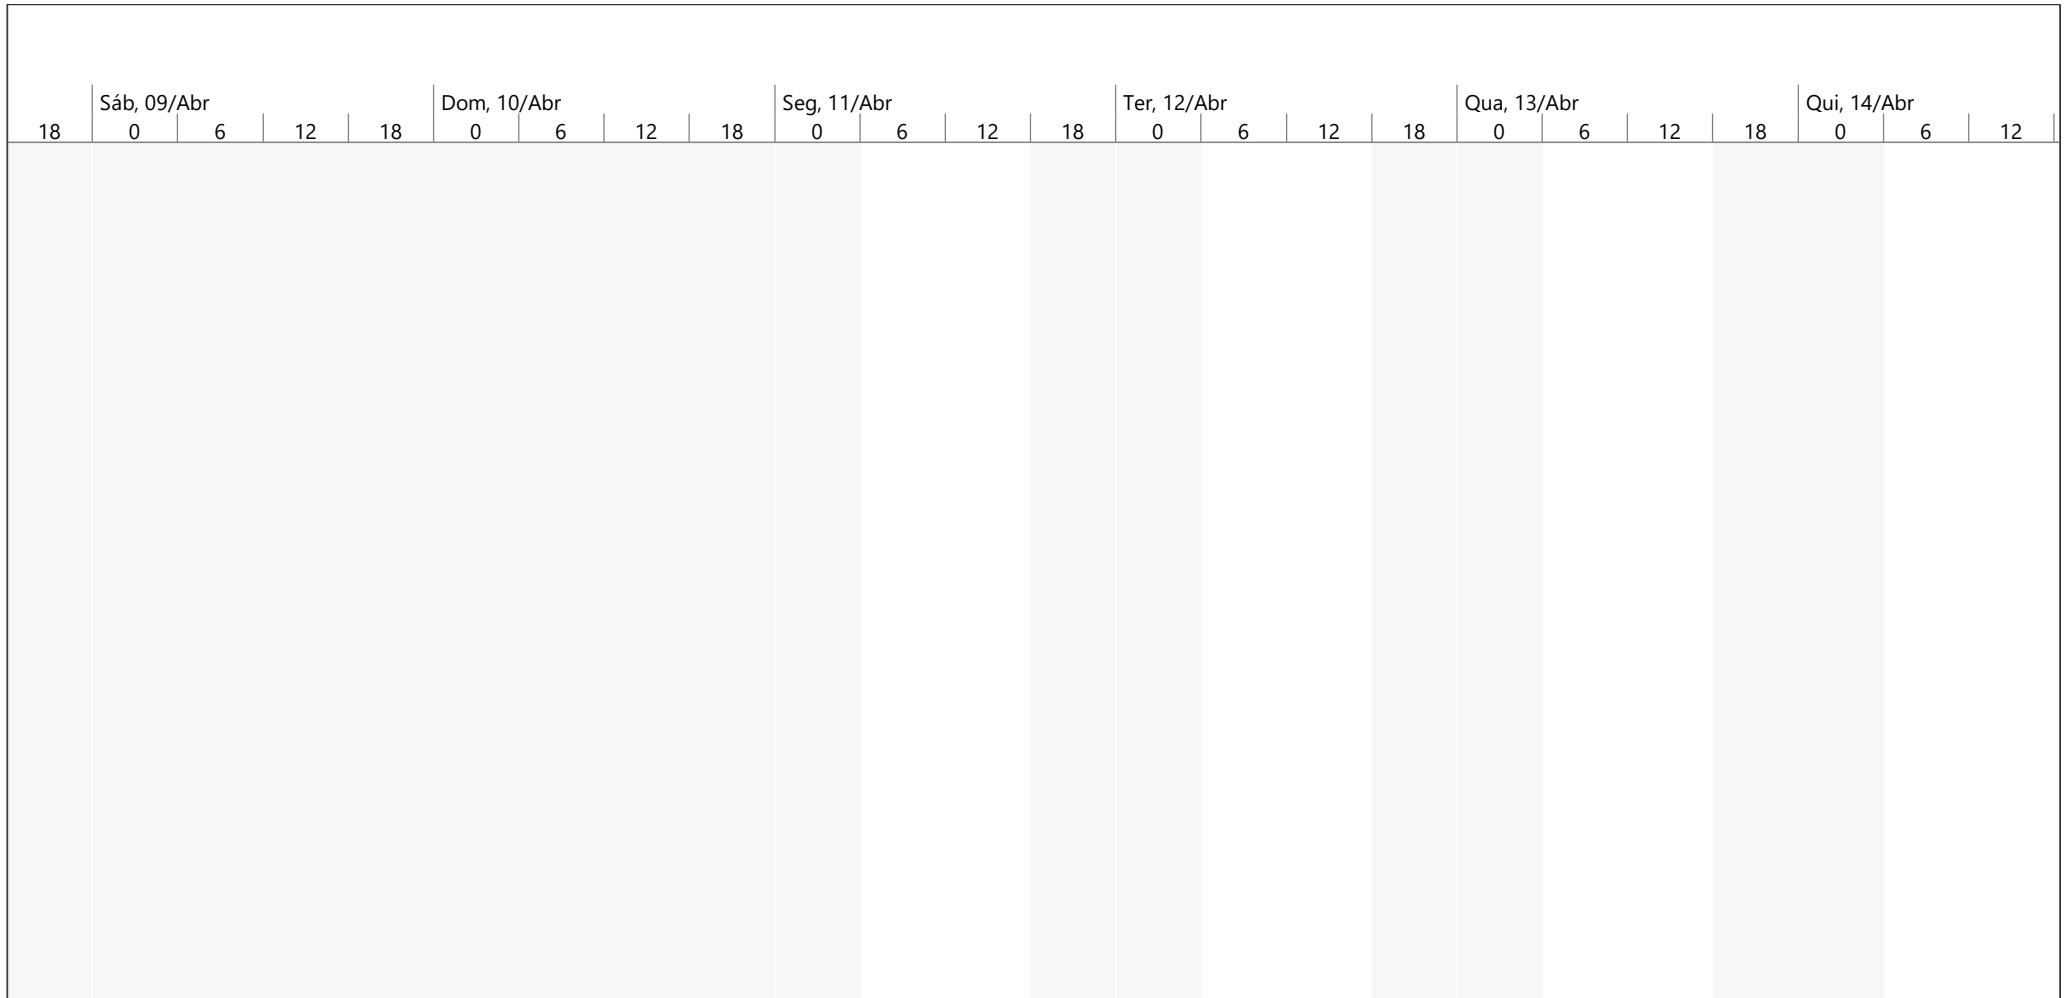


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

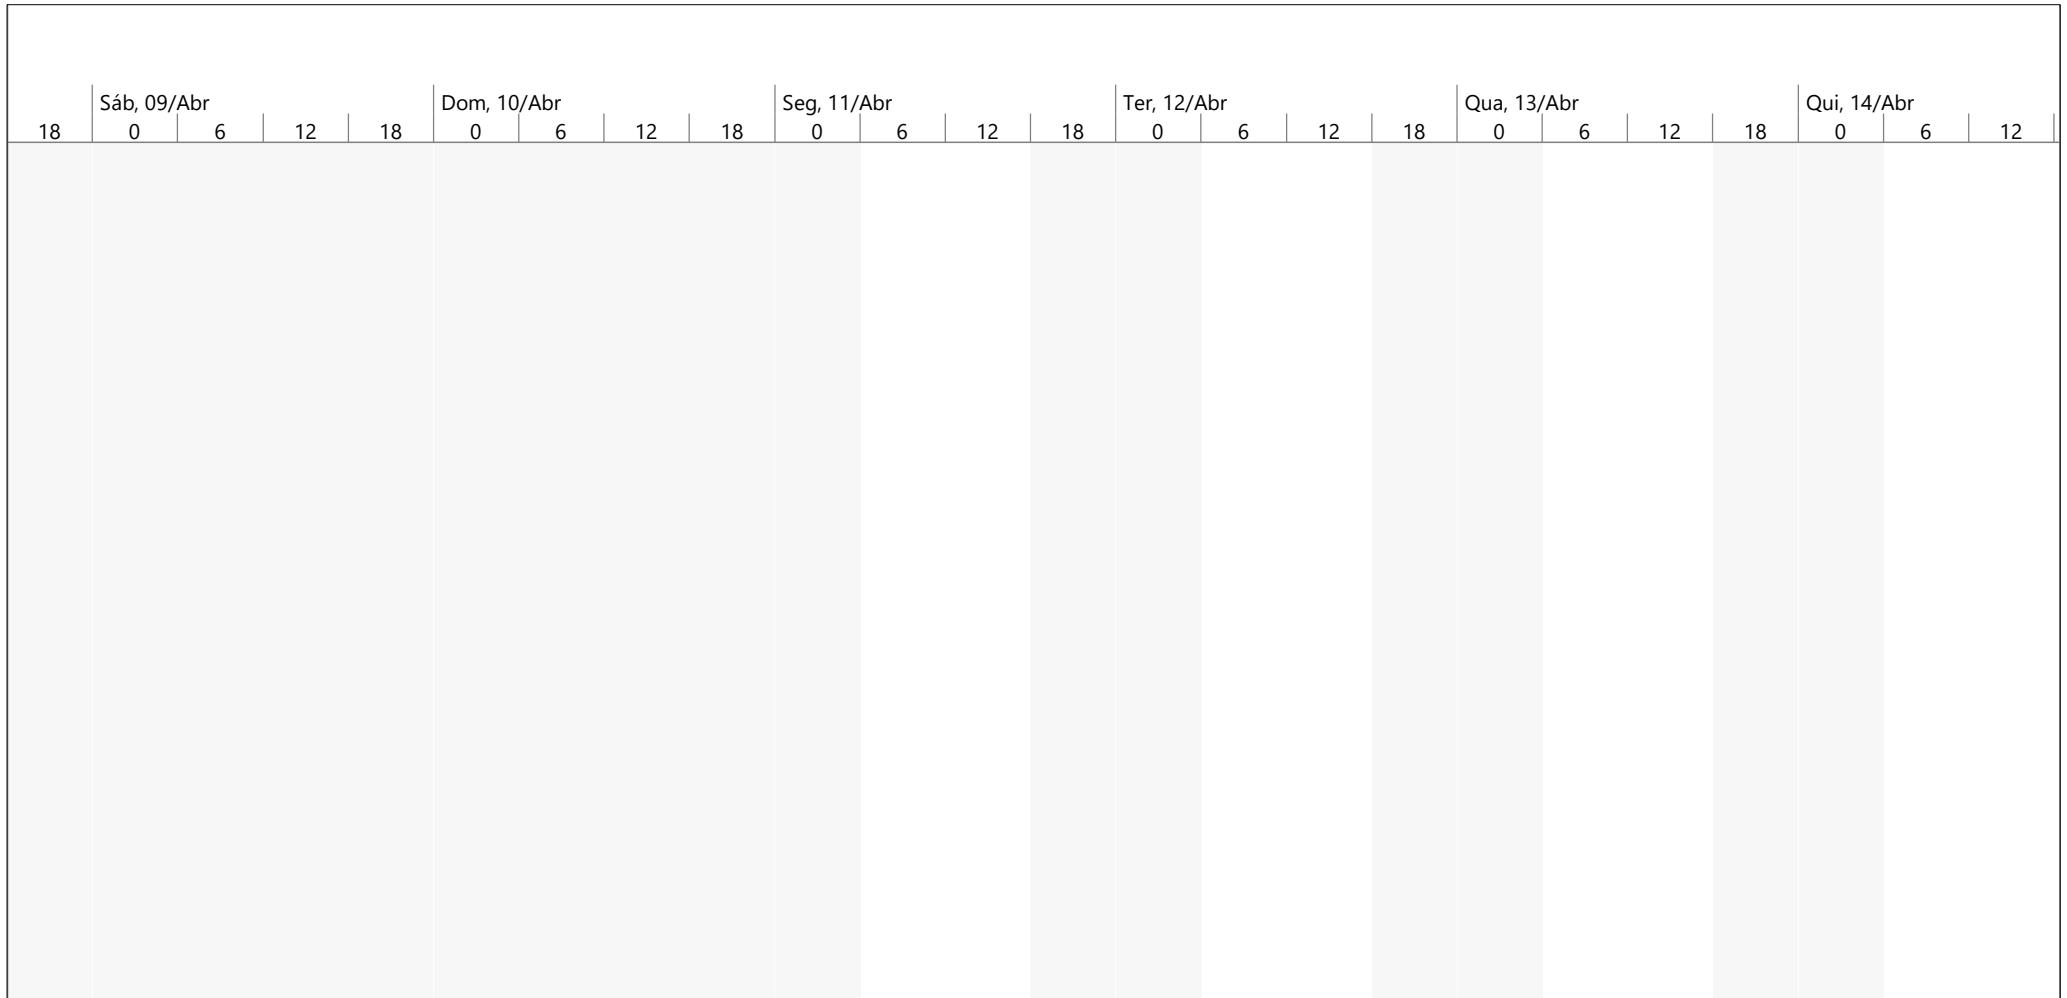


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

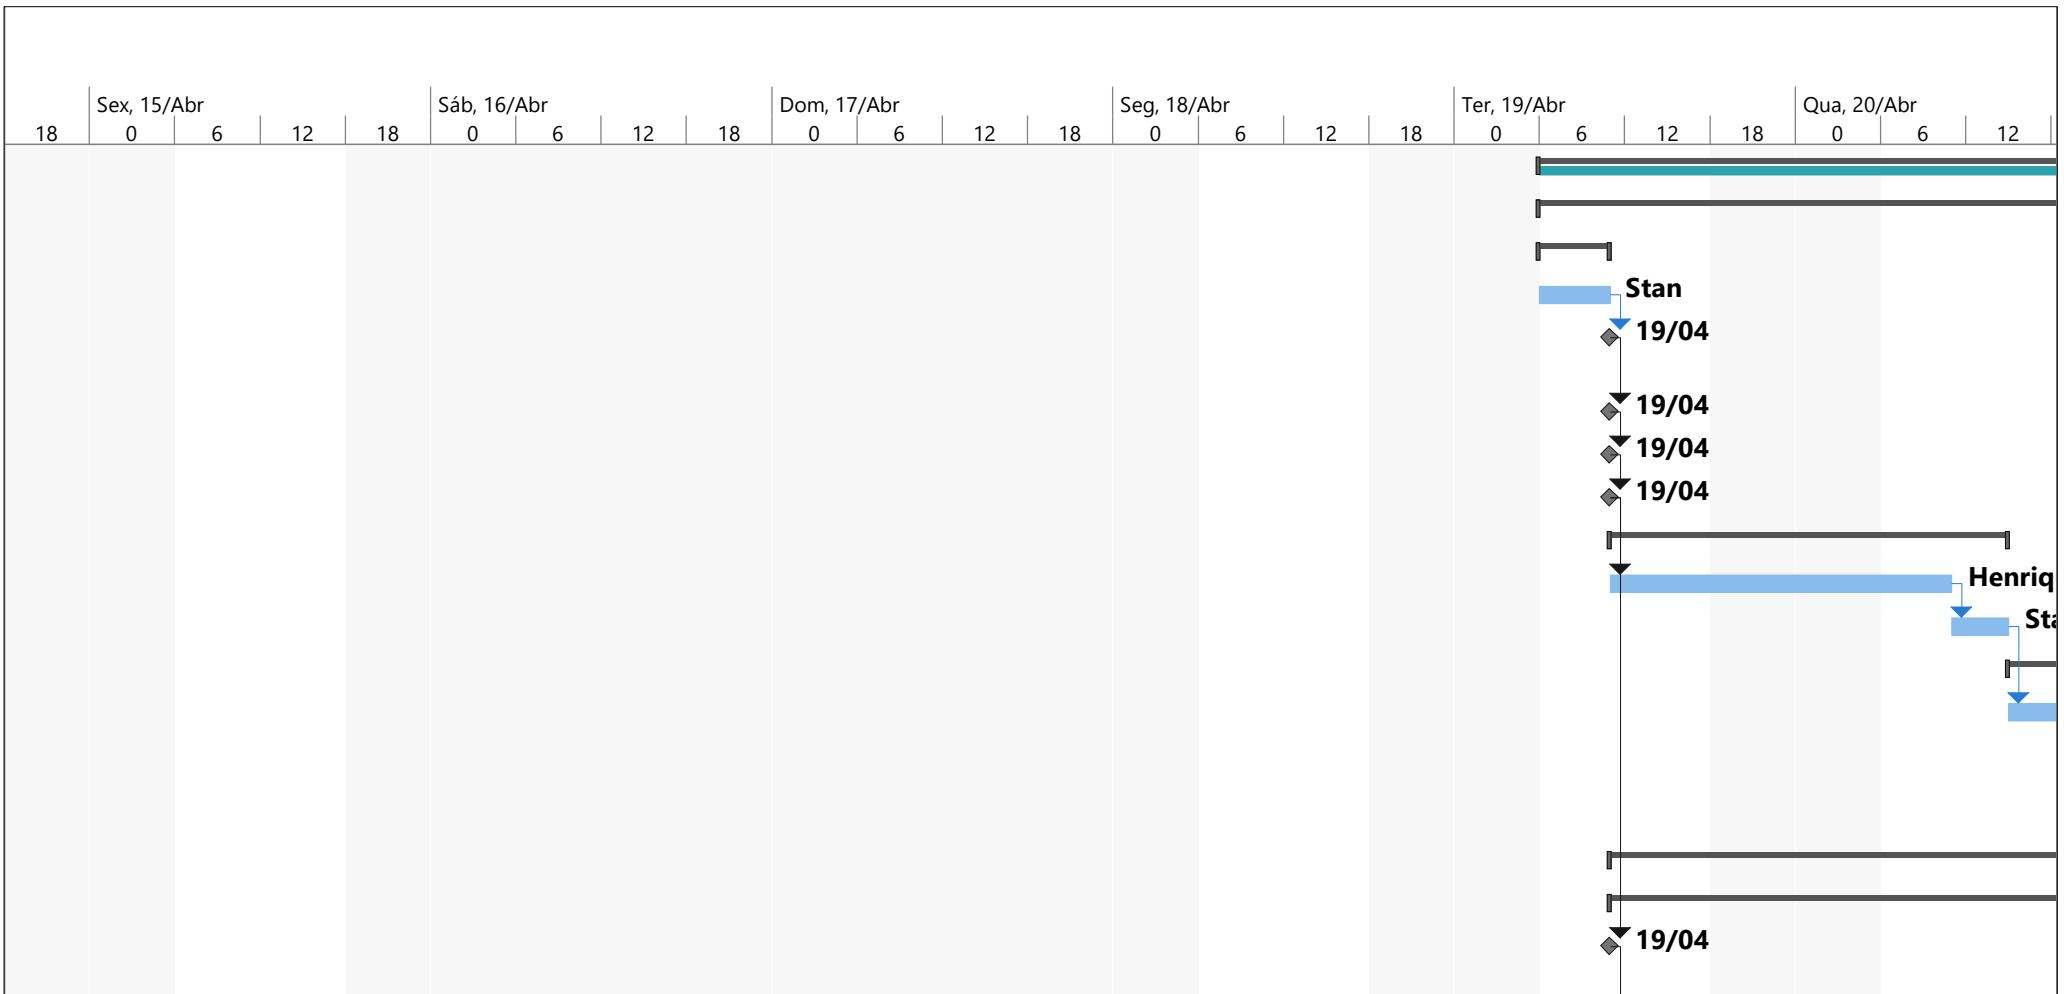

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

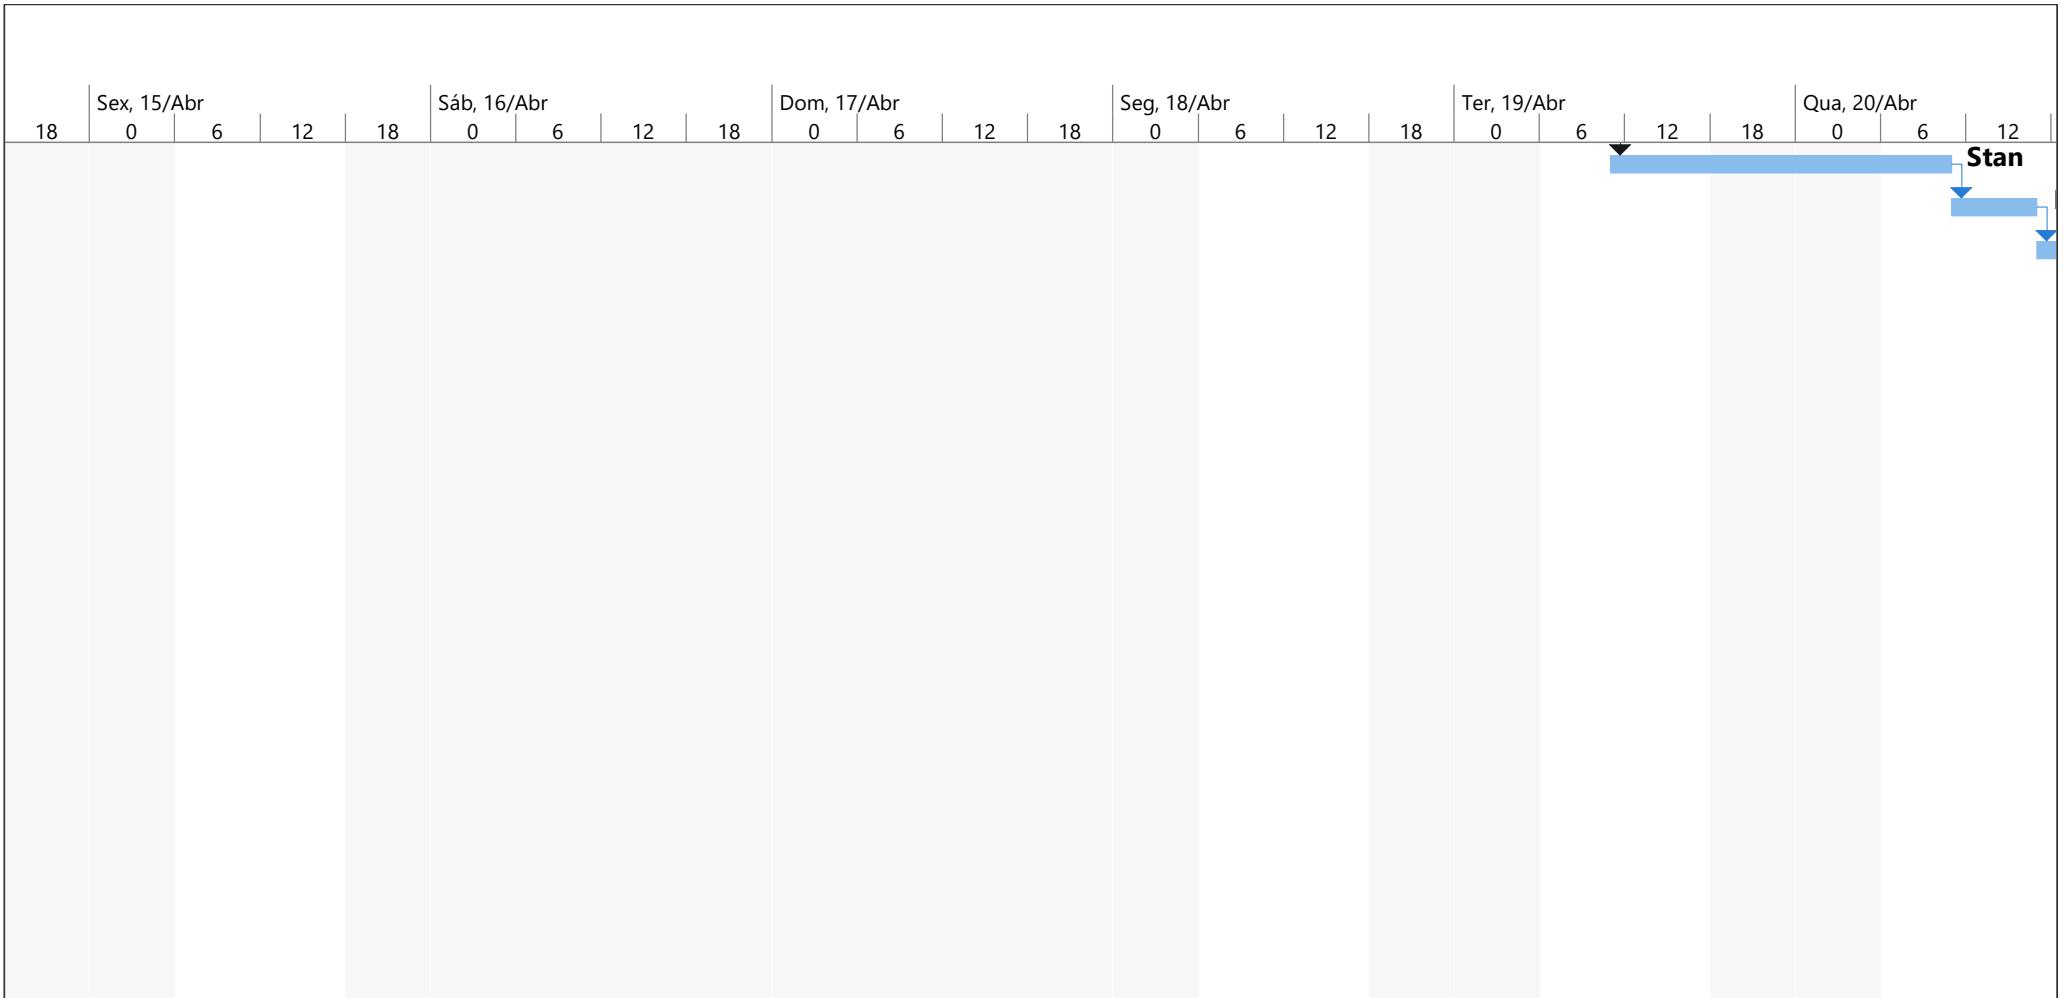


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

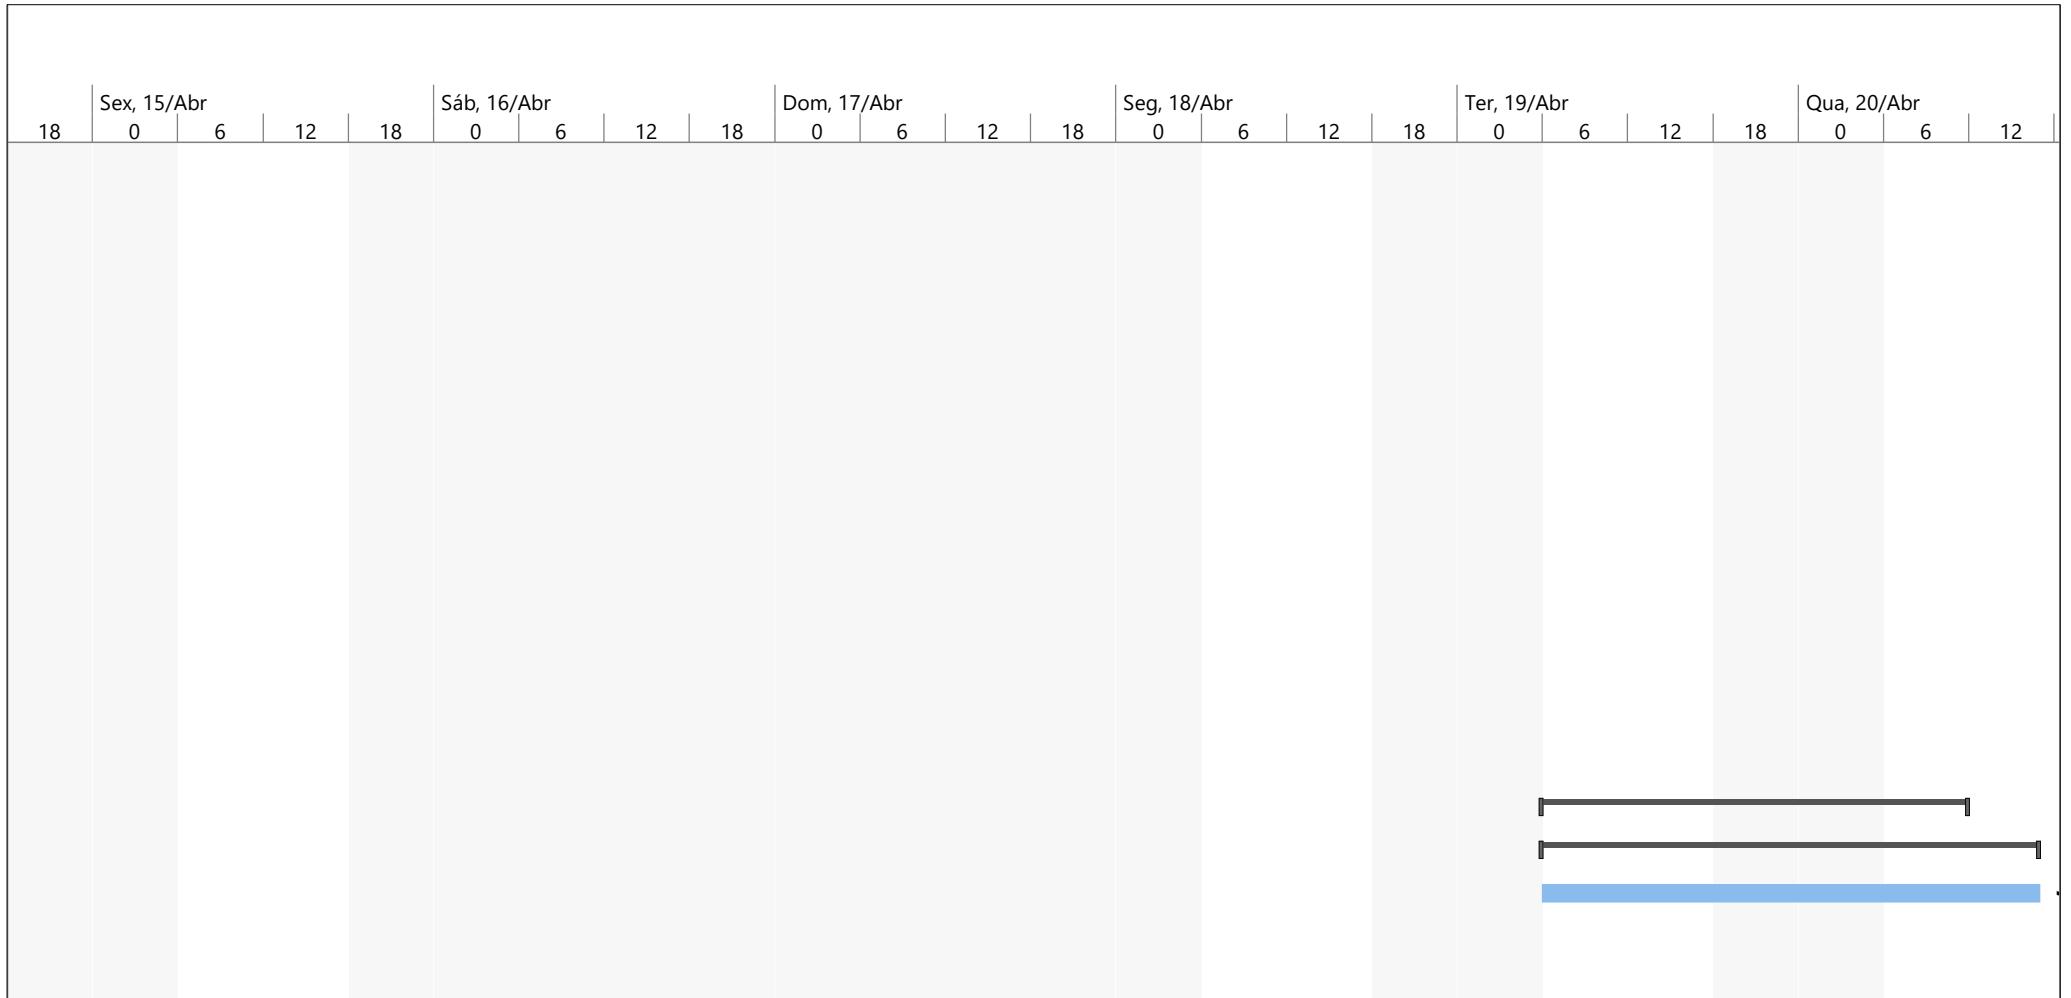



Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

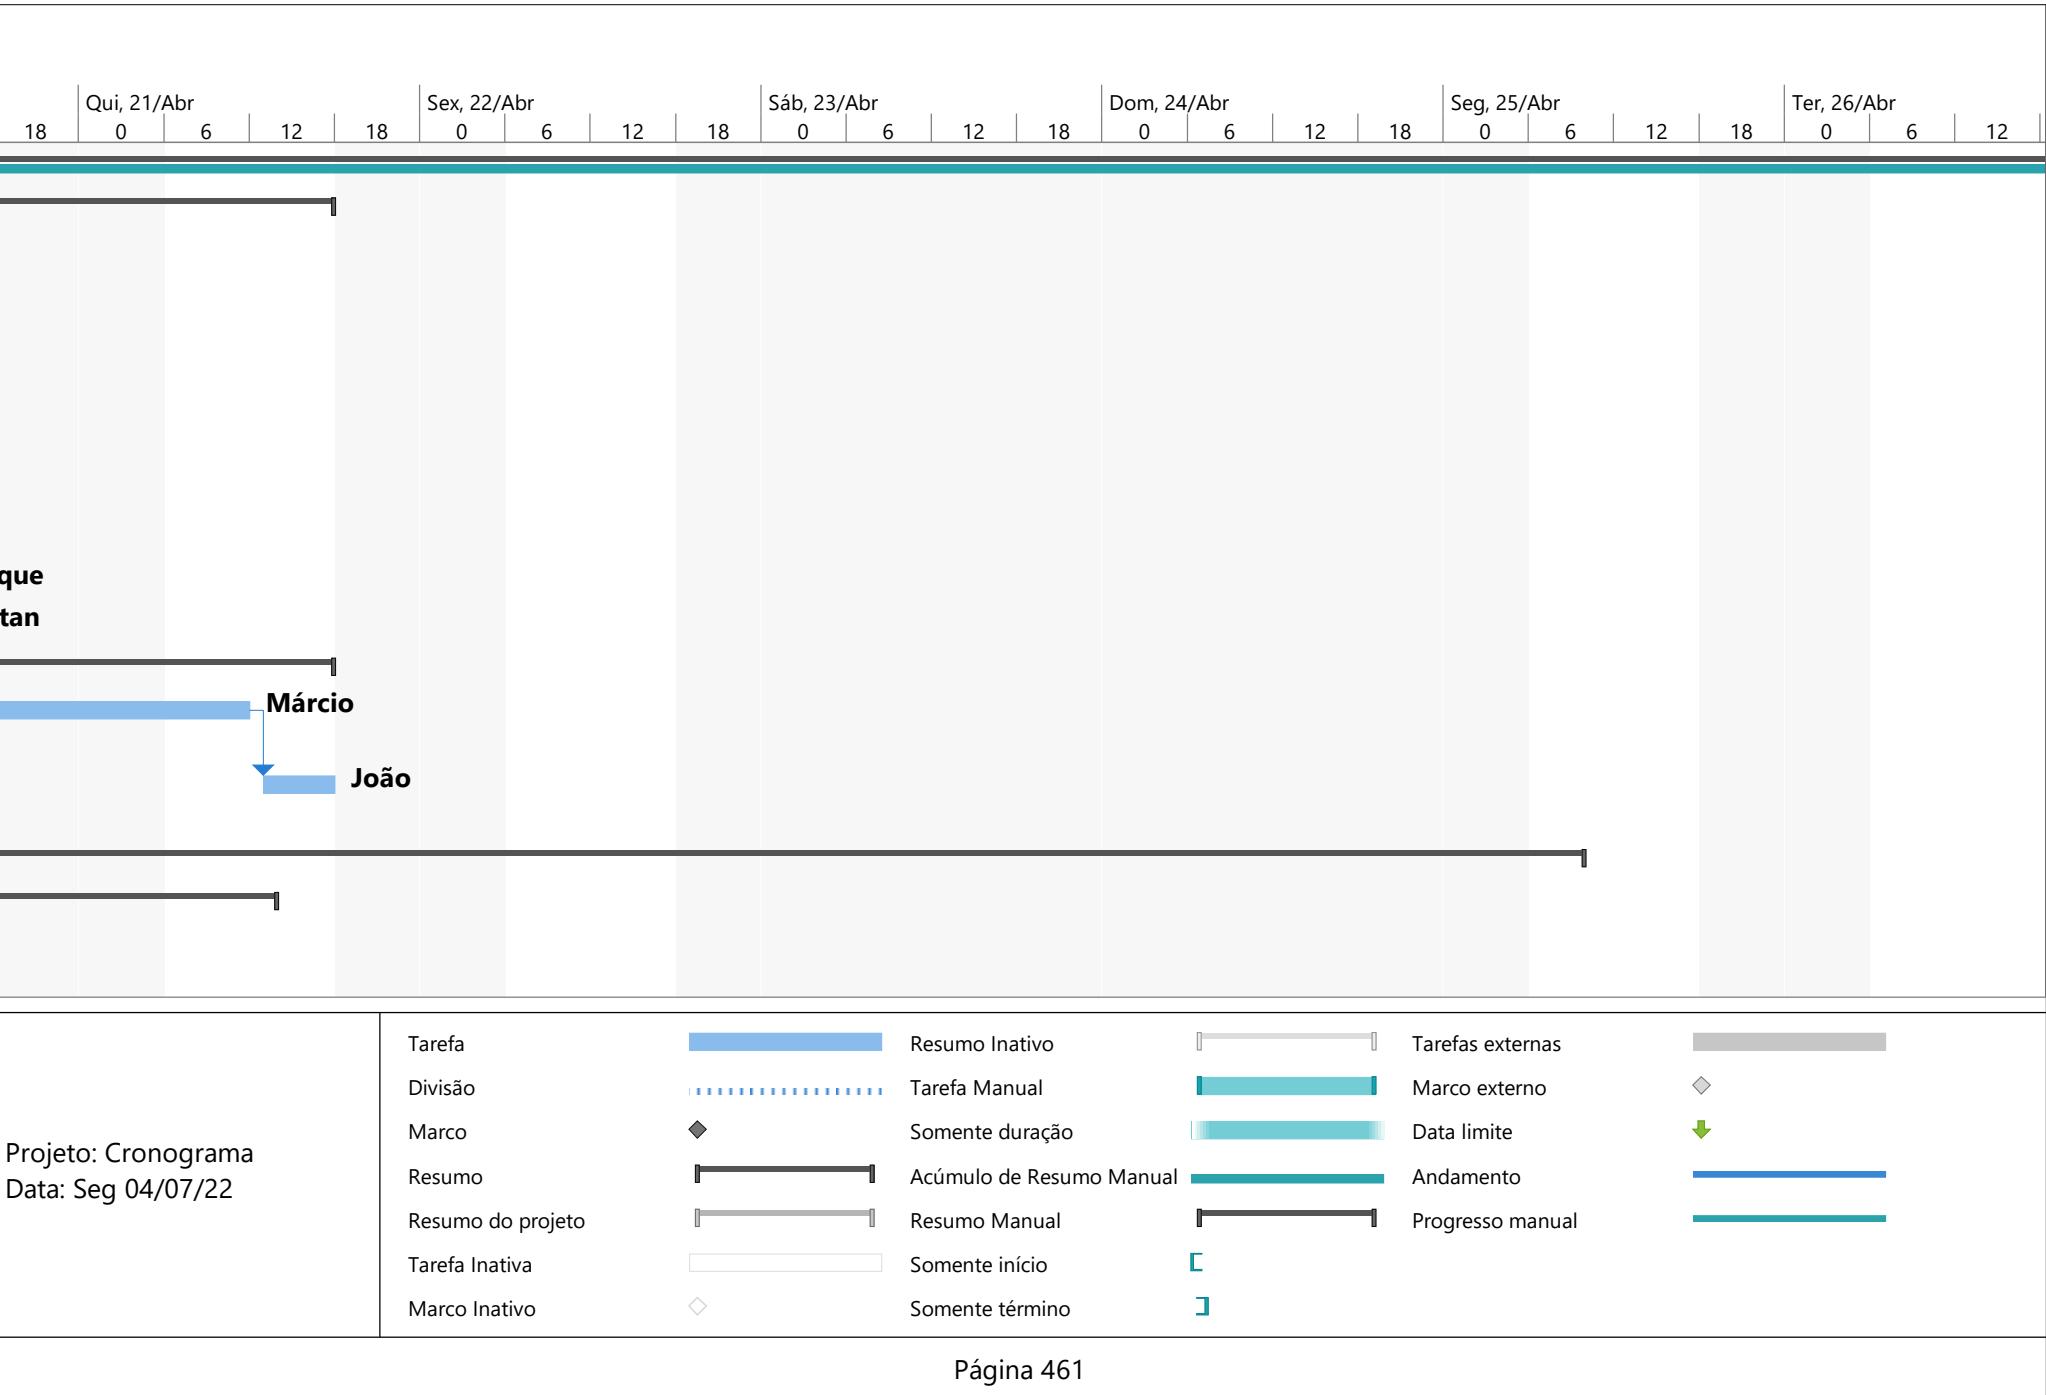

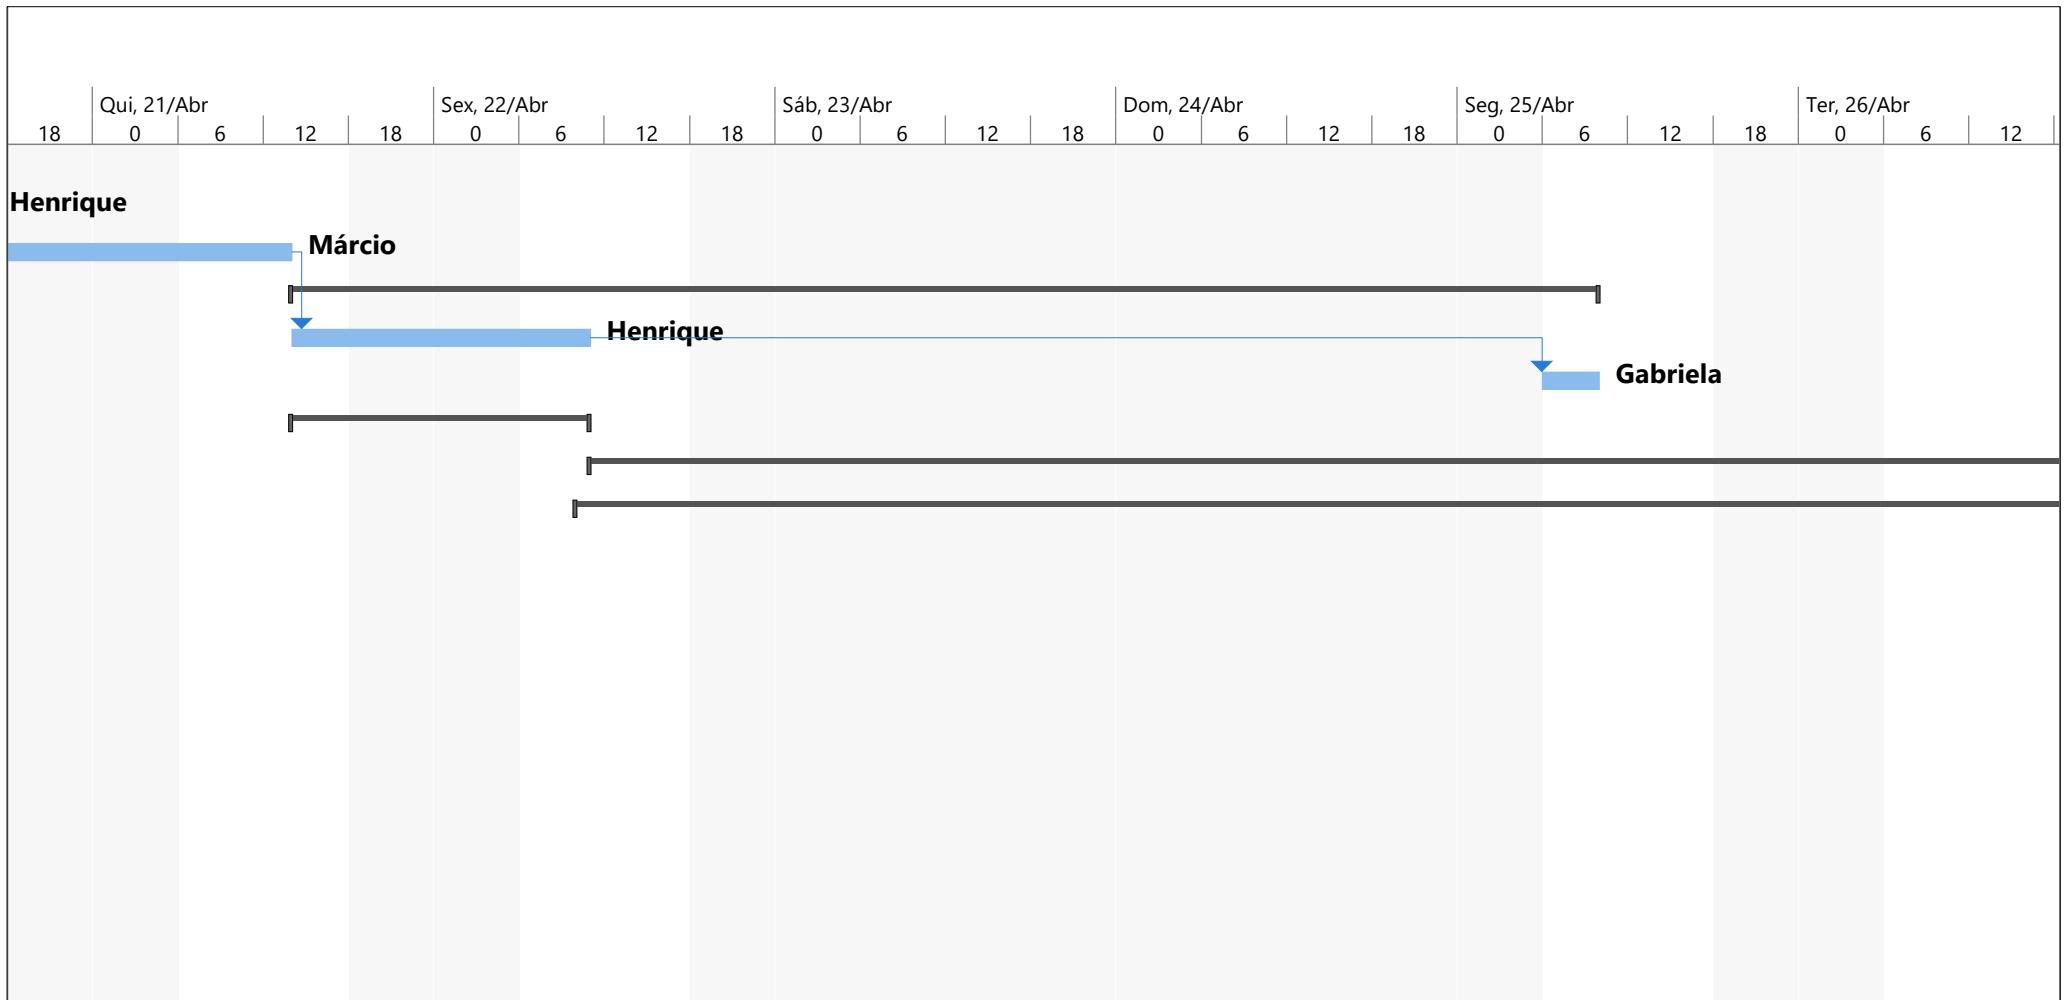

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			


18	Qui, 21/Abr	0	6	12	18	Sex, 22/Abr	0	6	12	18	Sáb, 23/Abr	0	6	12	18	Dom, 24/Abr	0	6	12	18	Seg, 25/Abr	0	6	12	18	Ter, 26/Abr	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Henrique


João

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

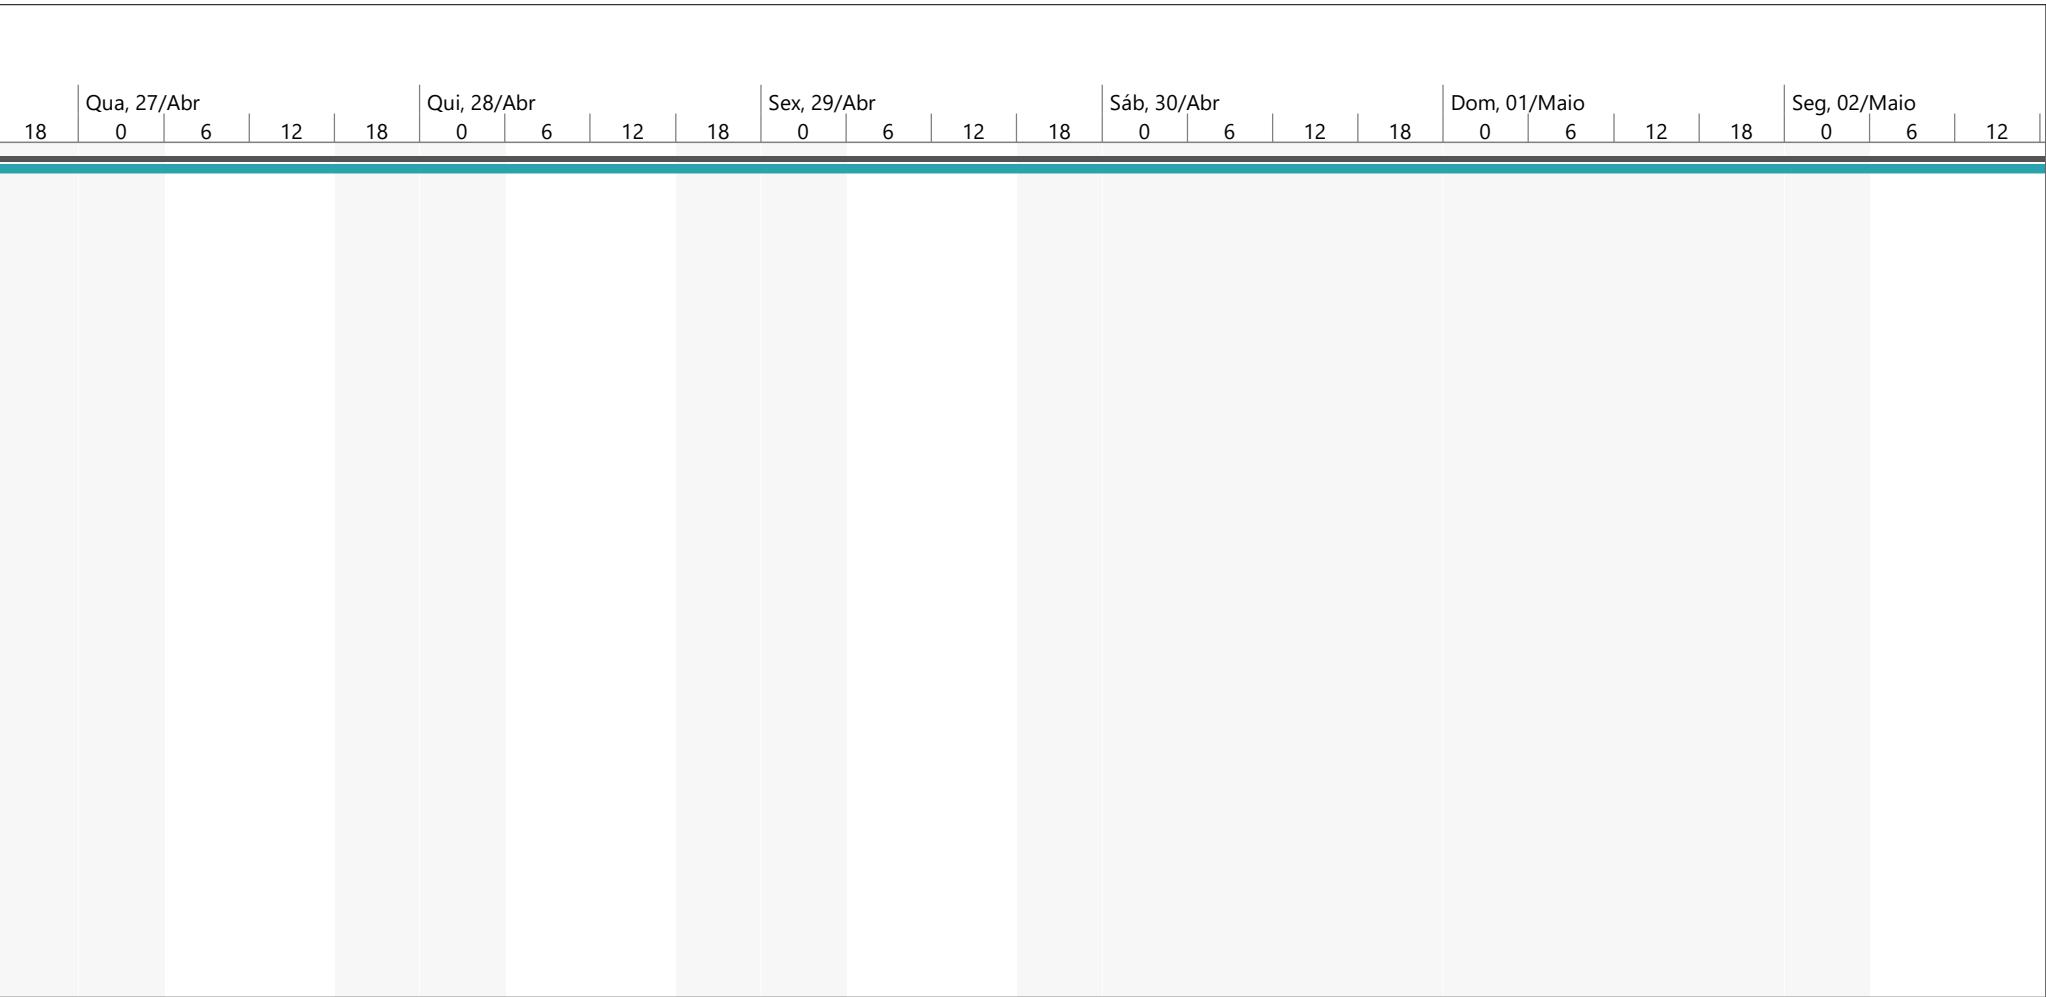


<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

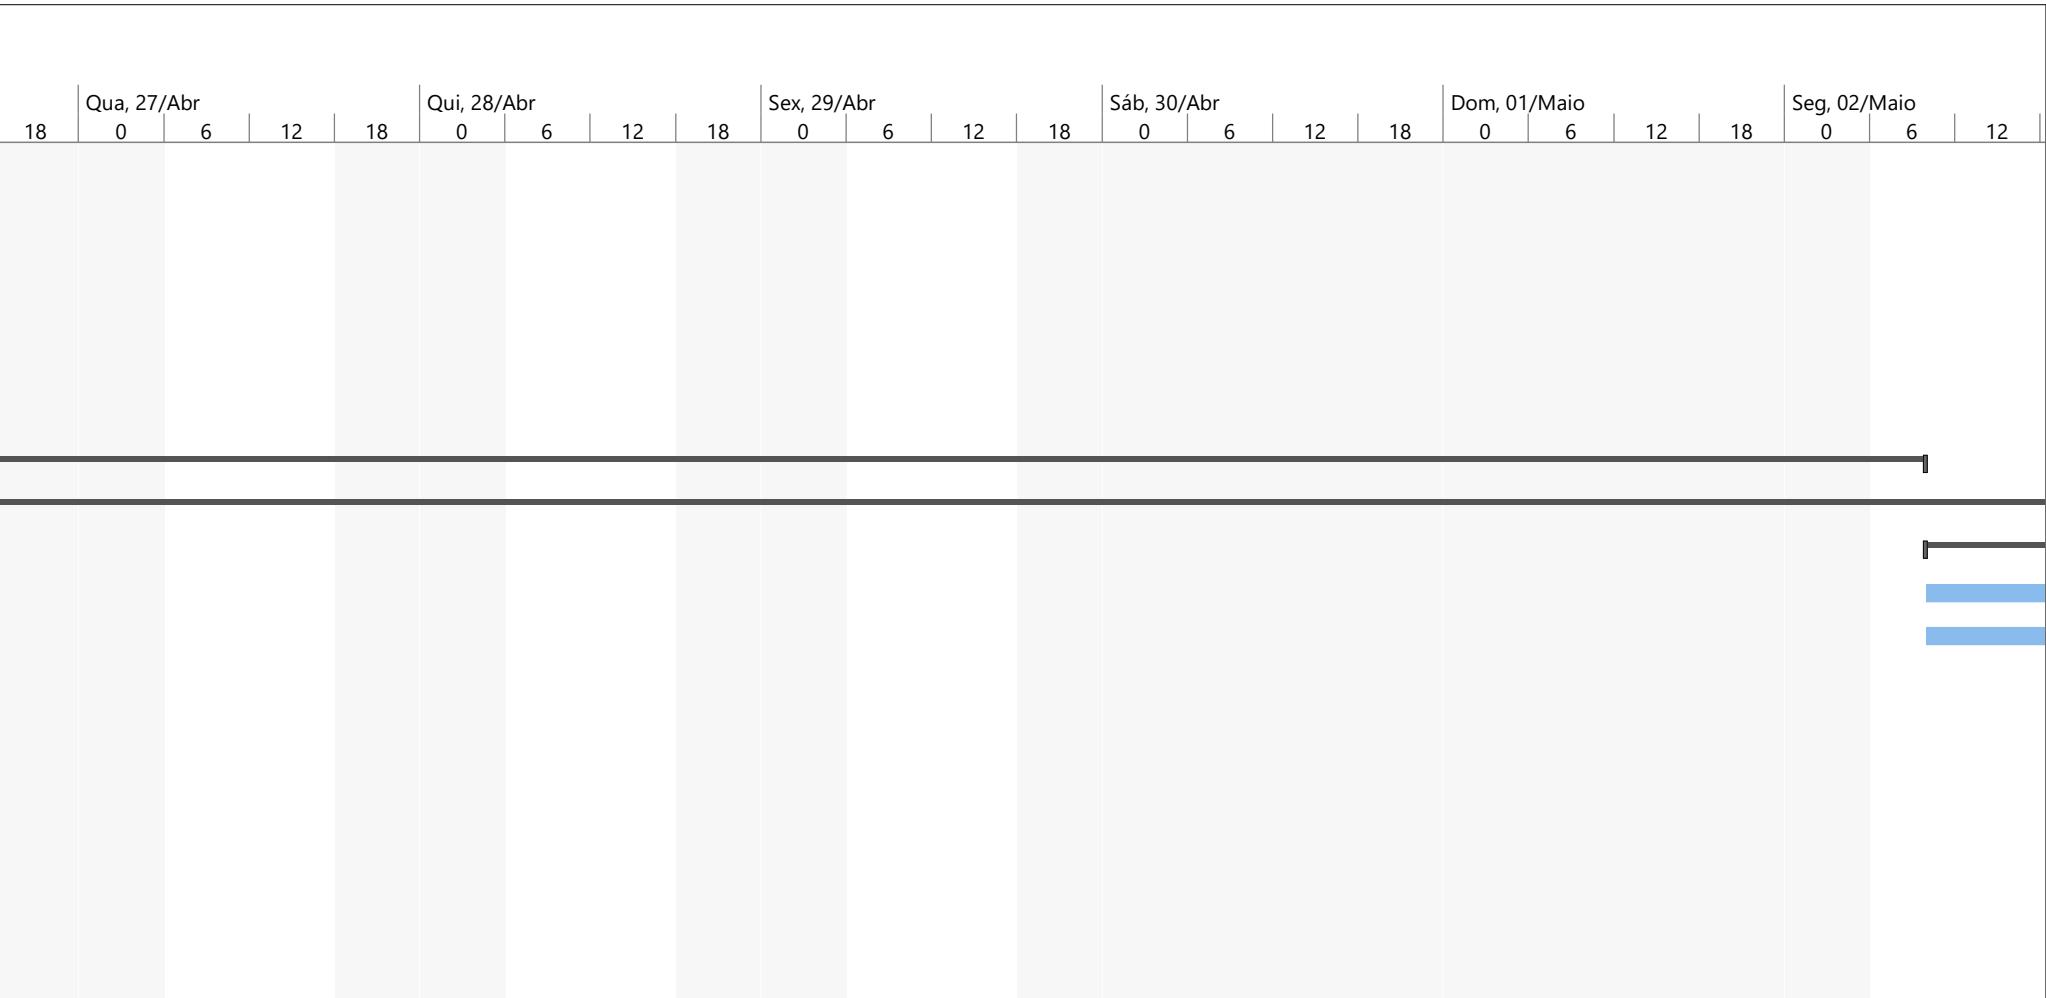


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

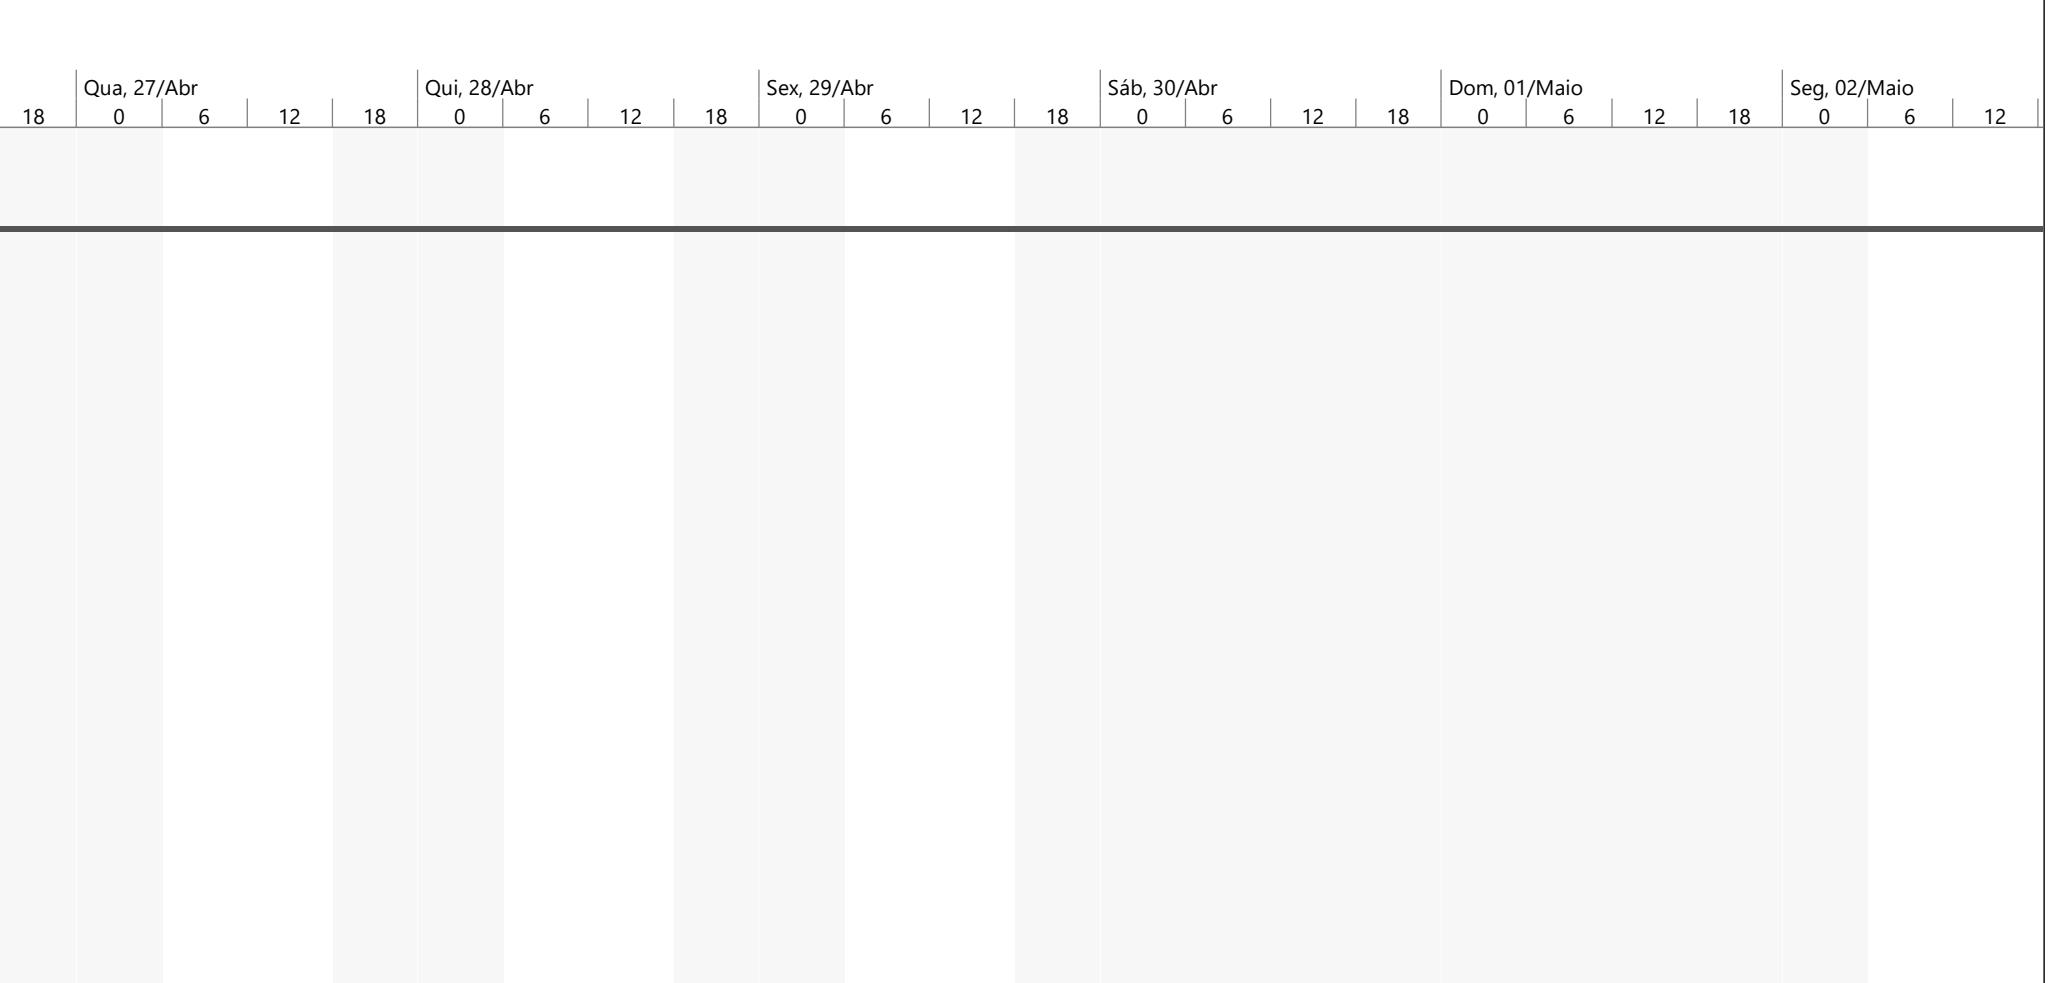


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

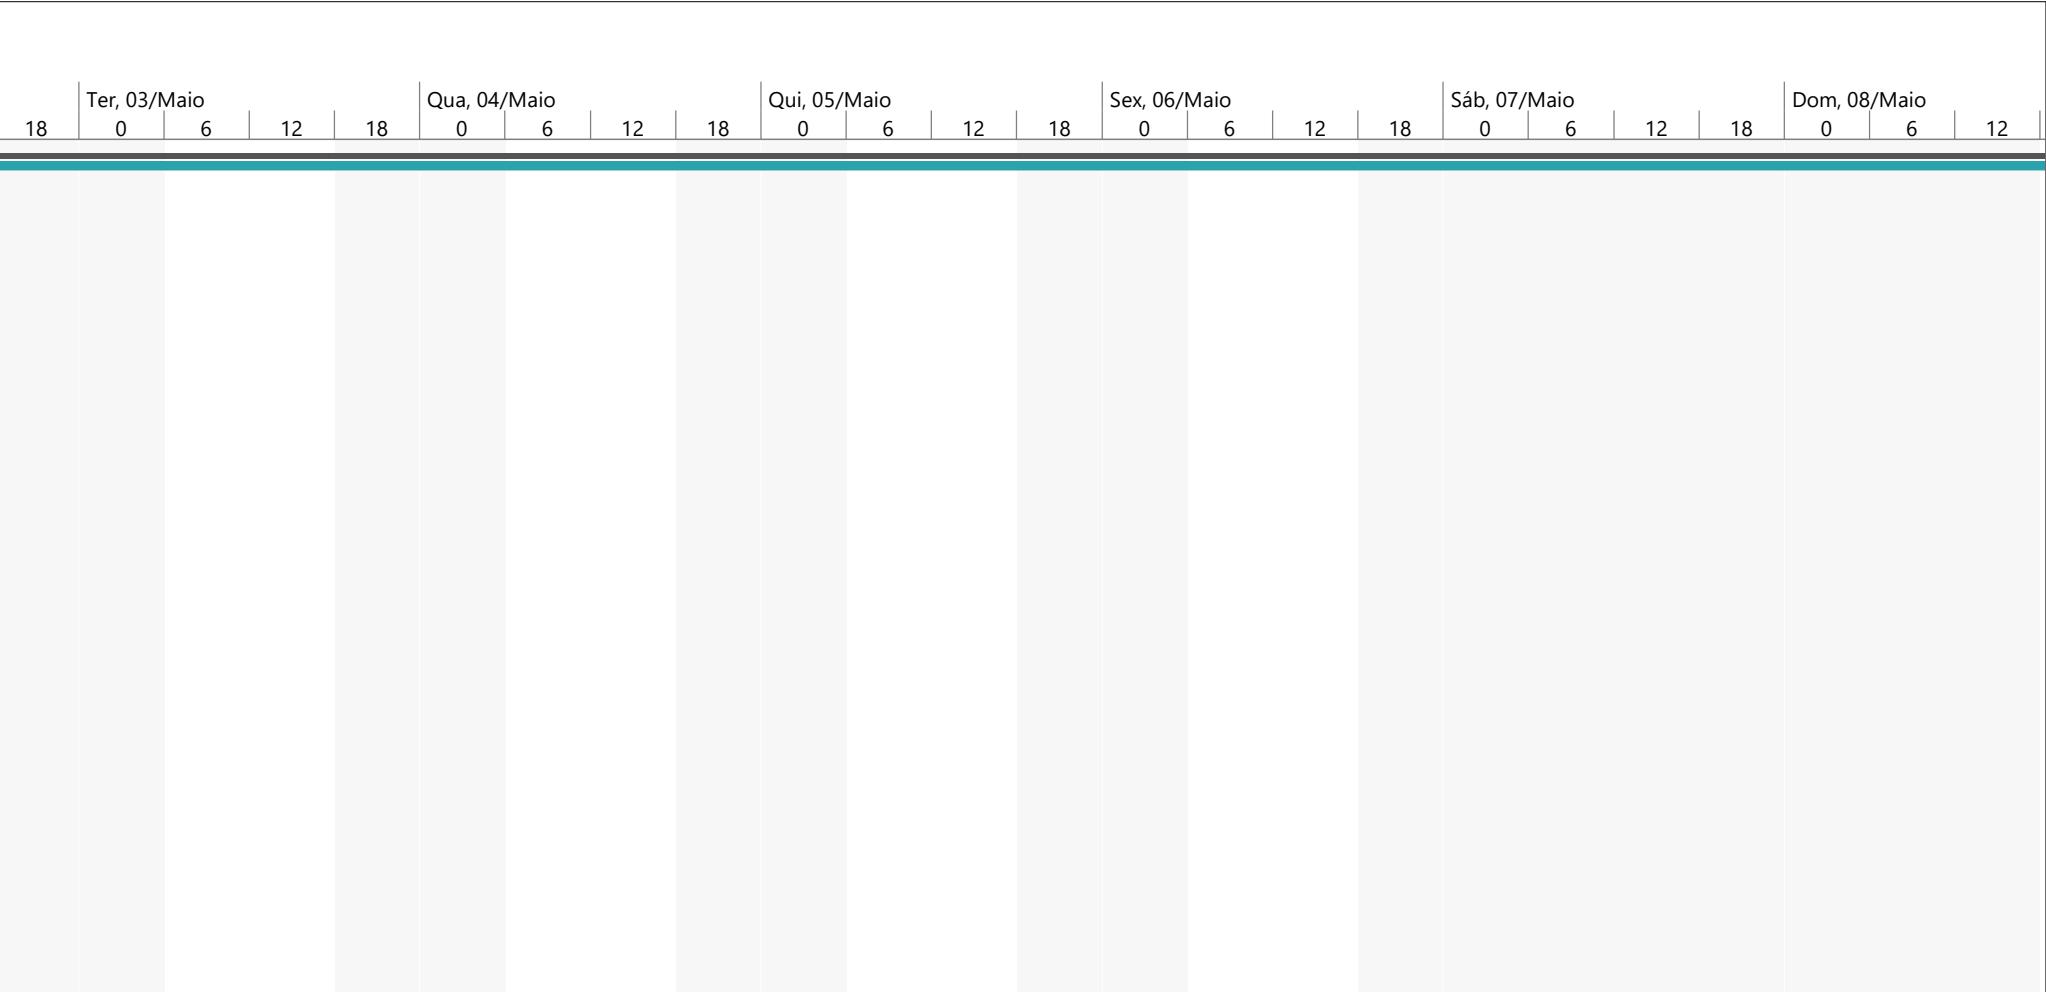


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

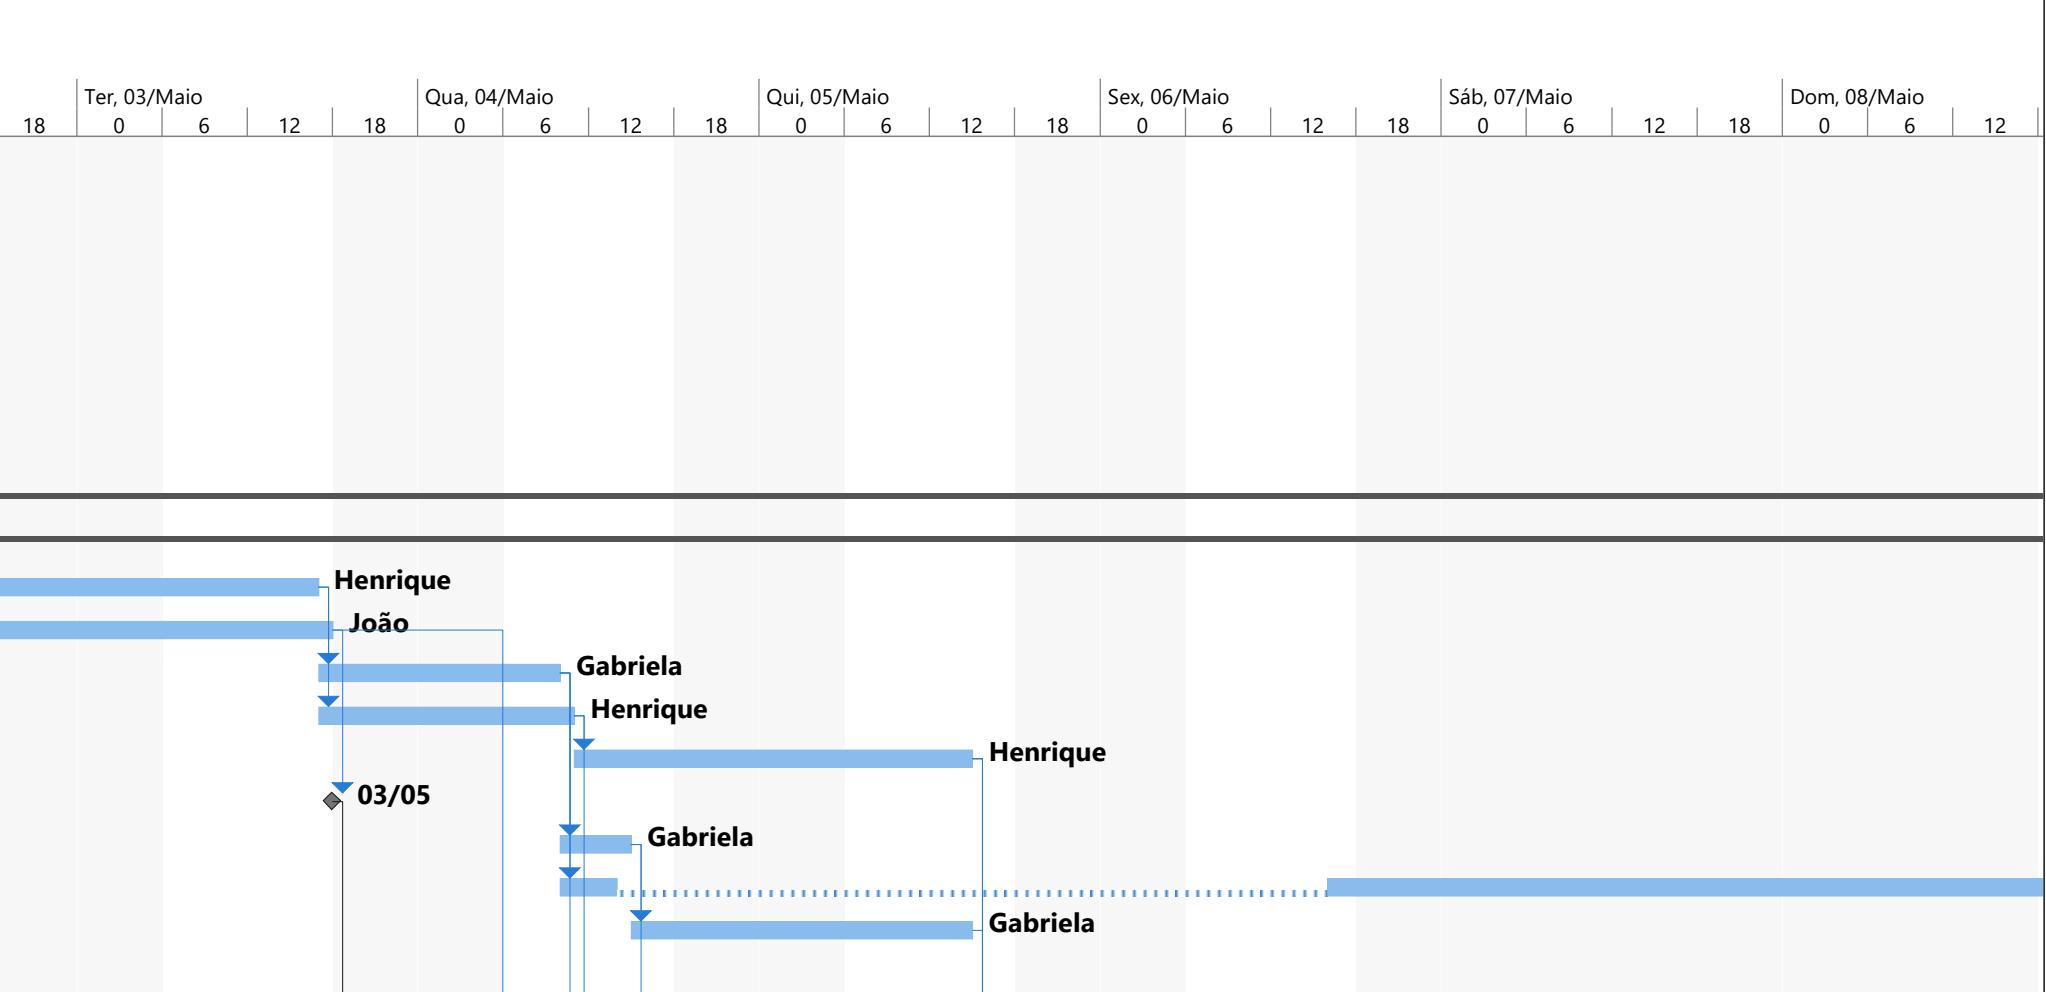



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

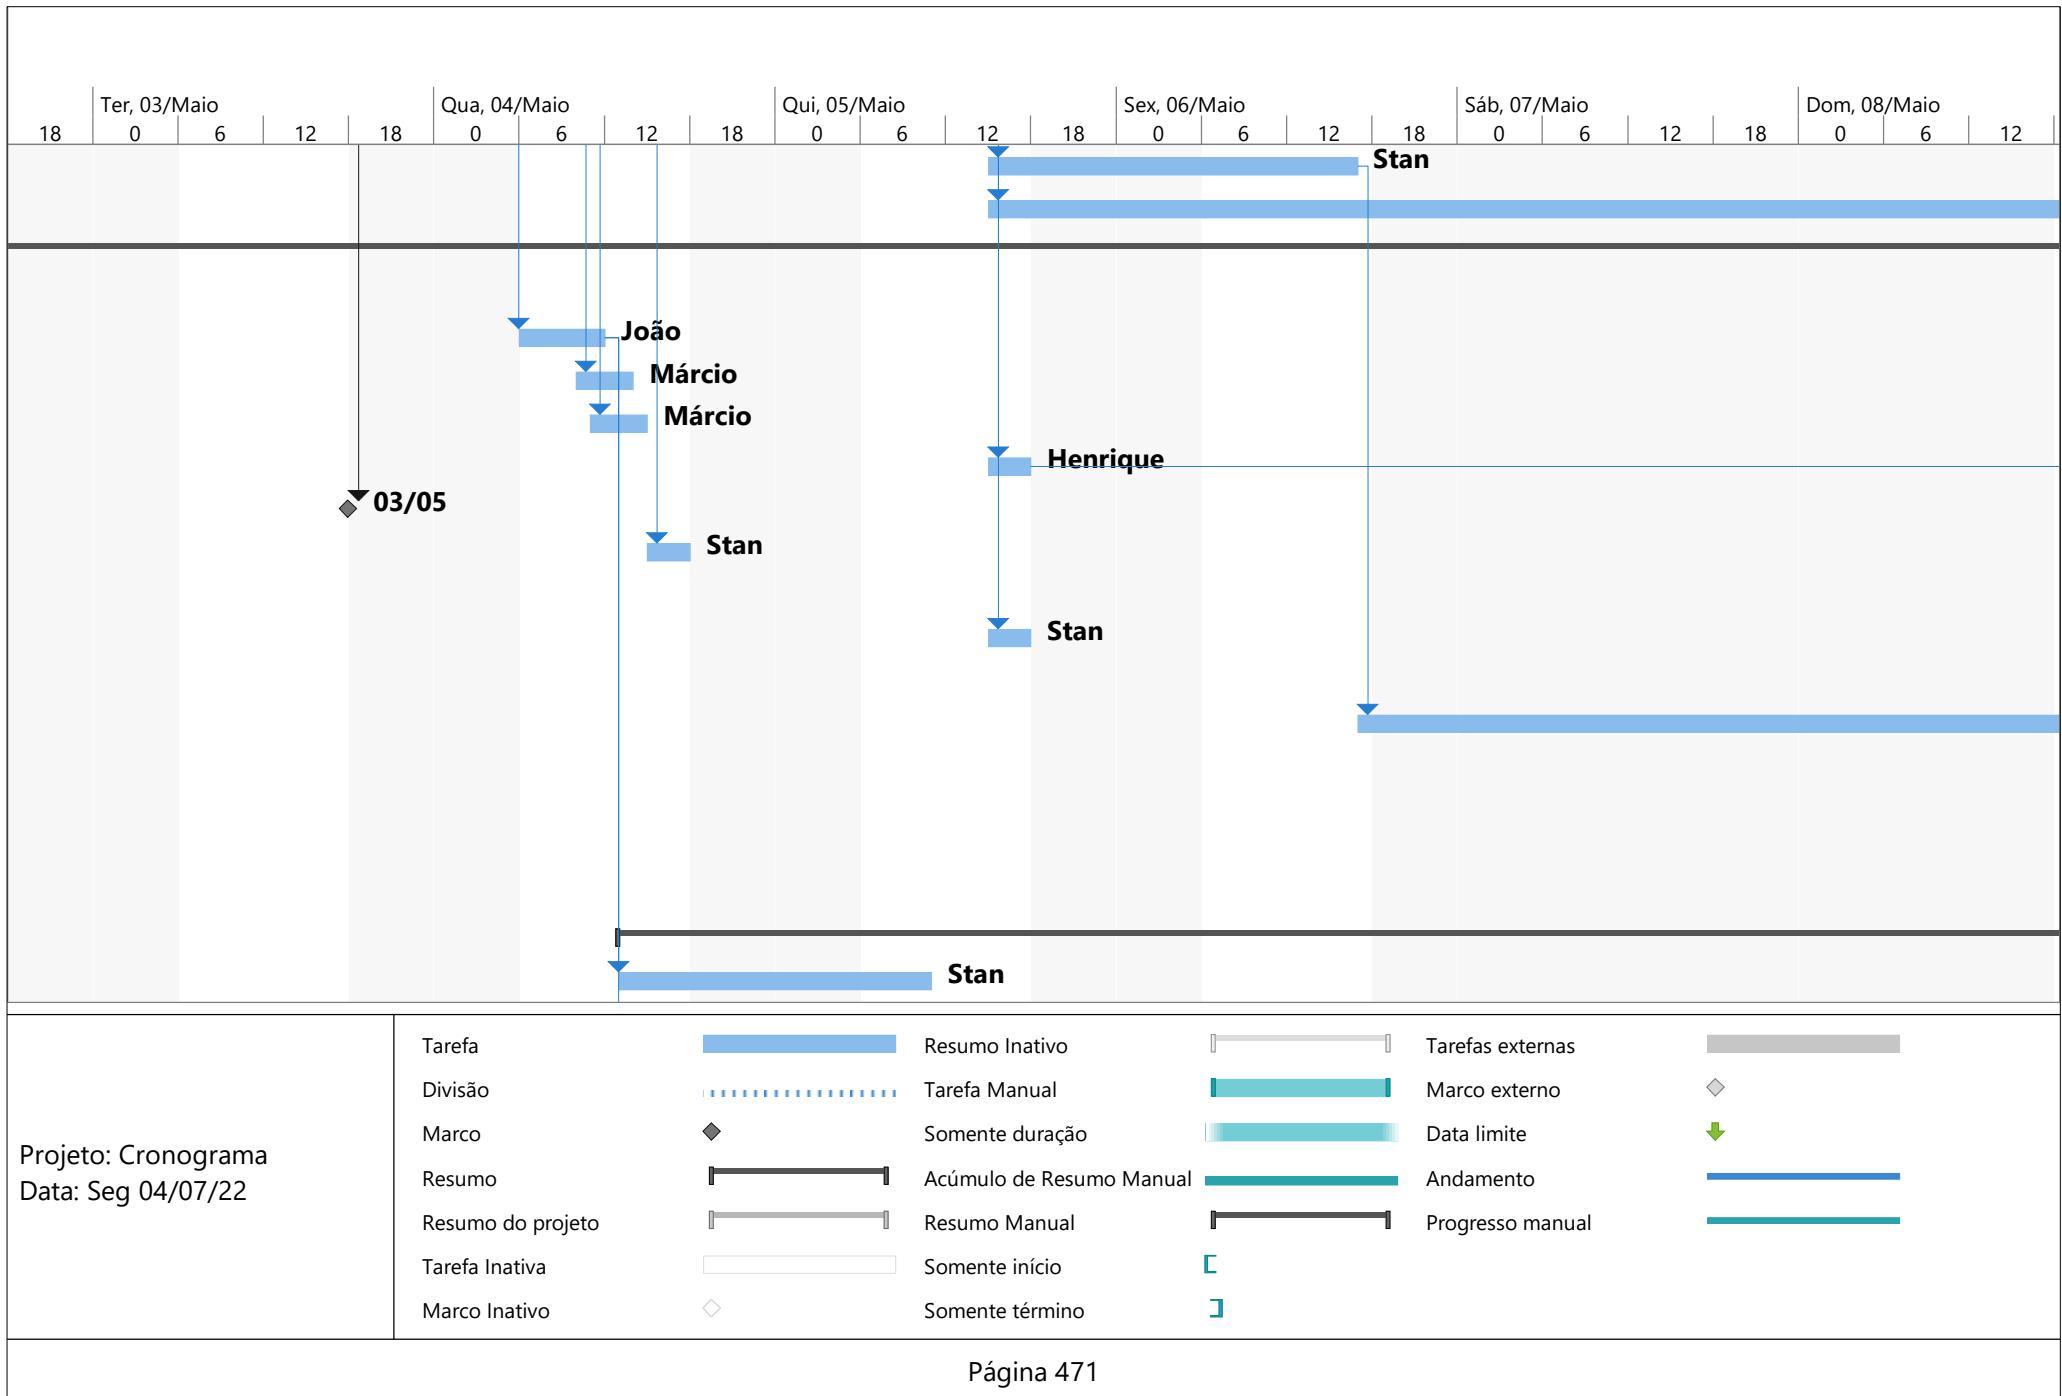

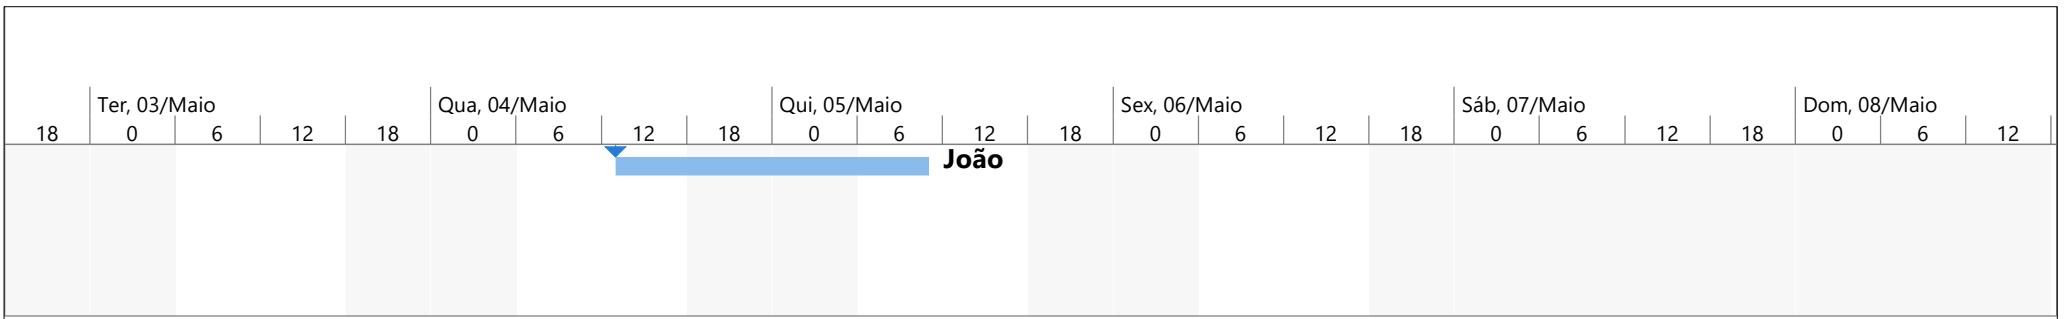

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

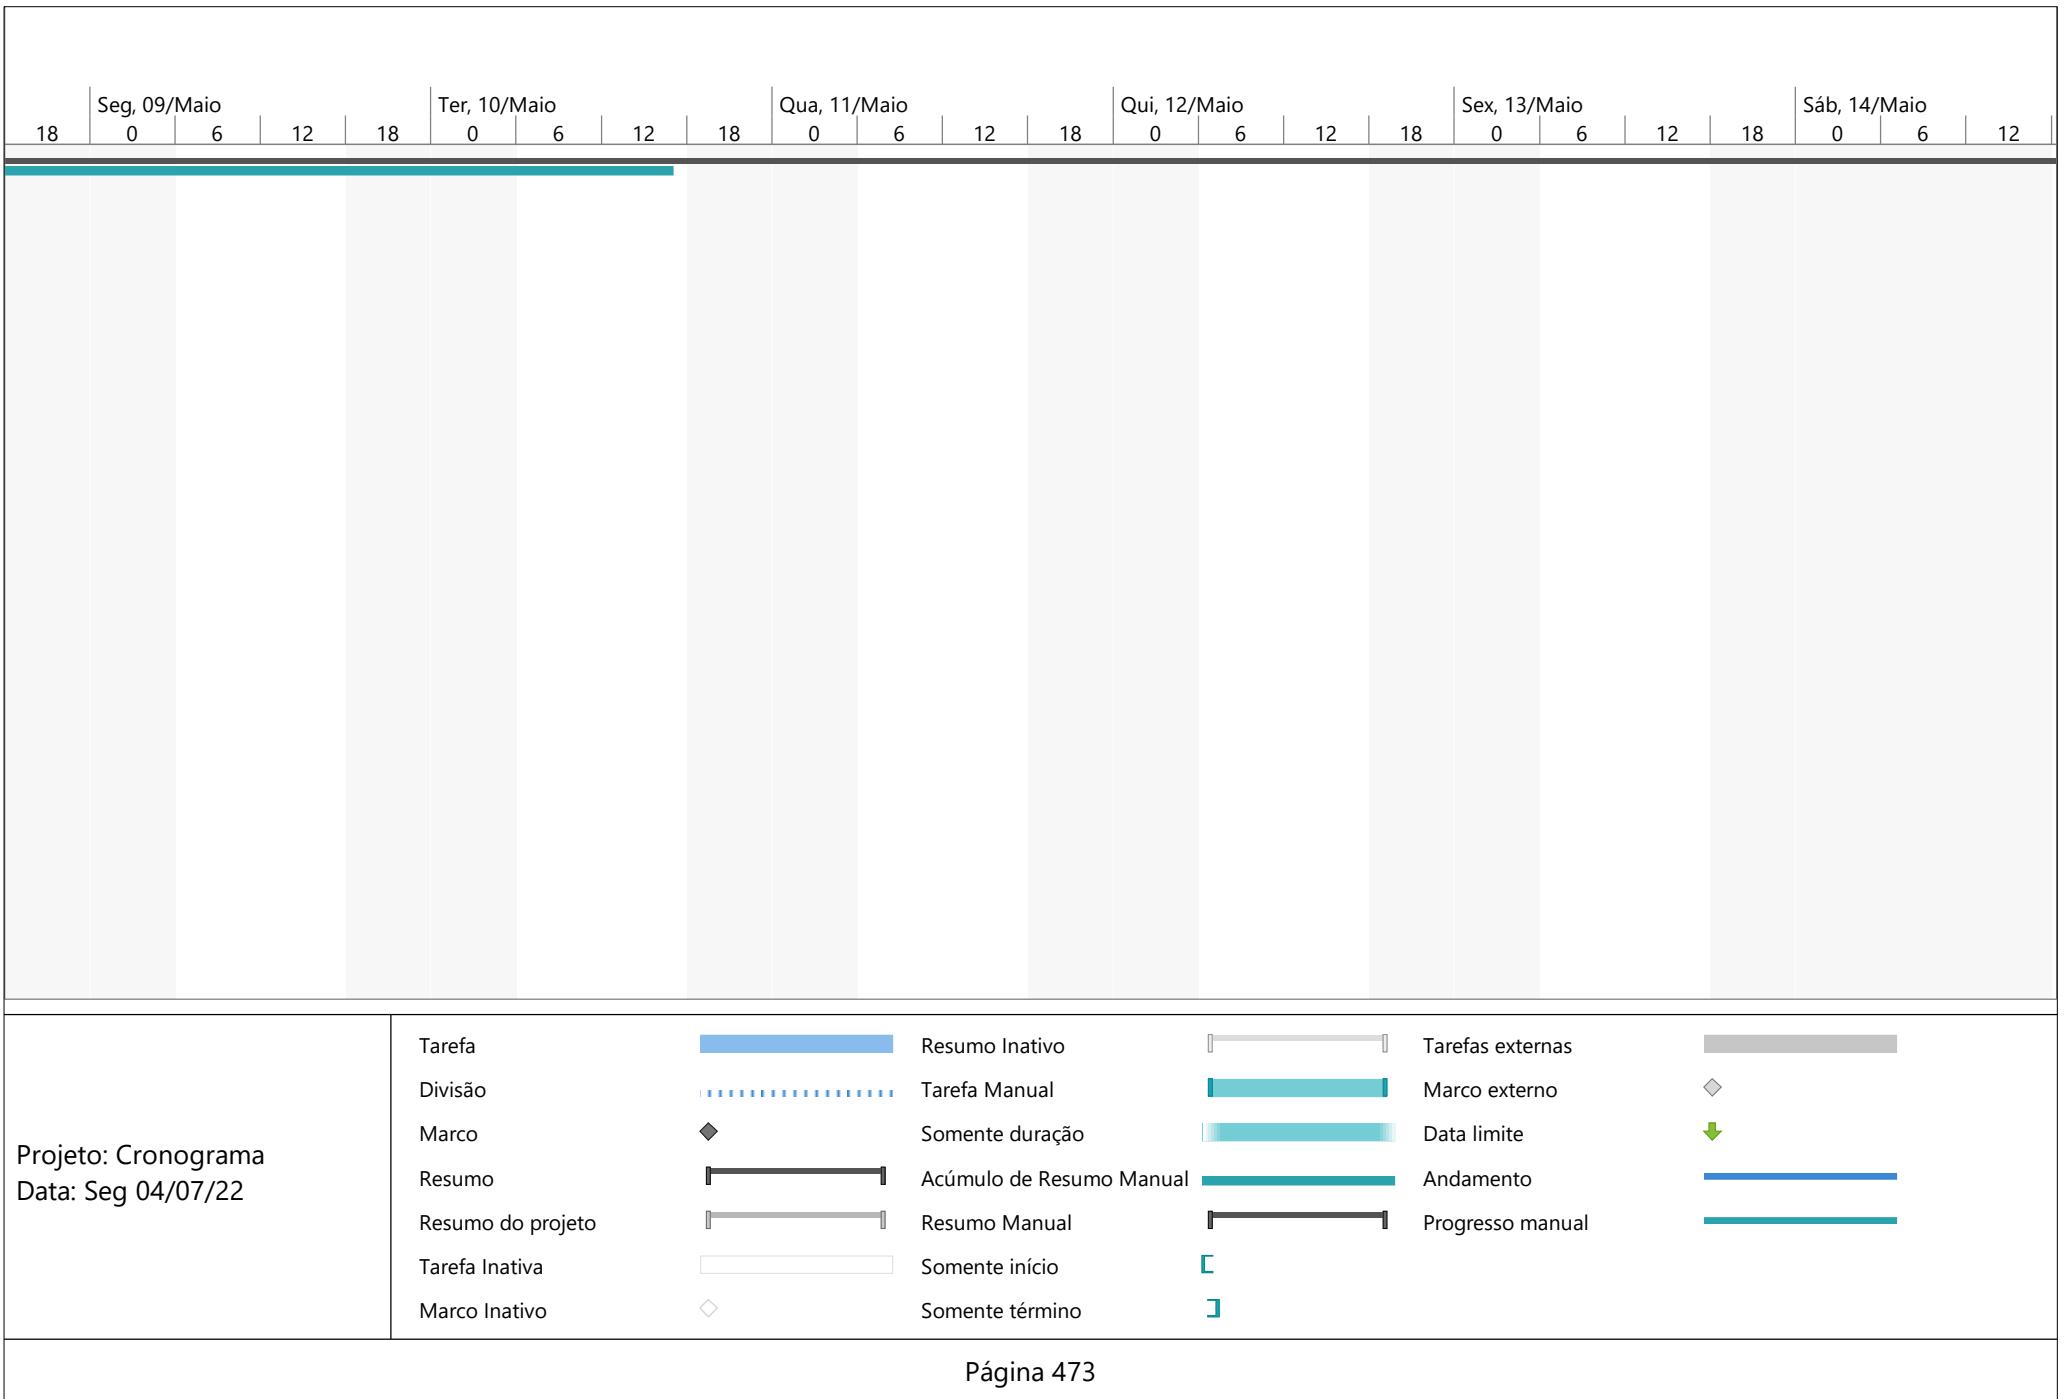


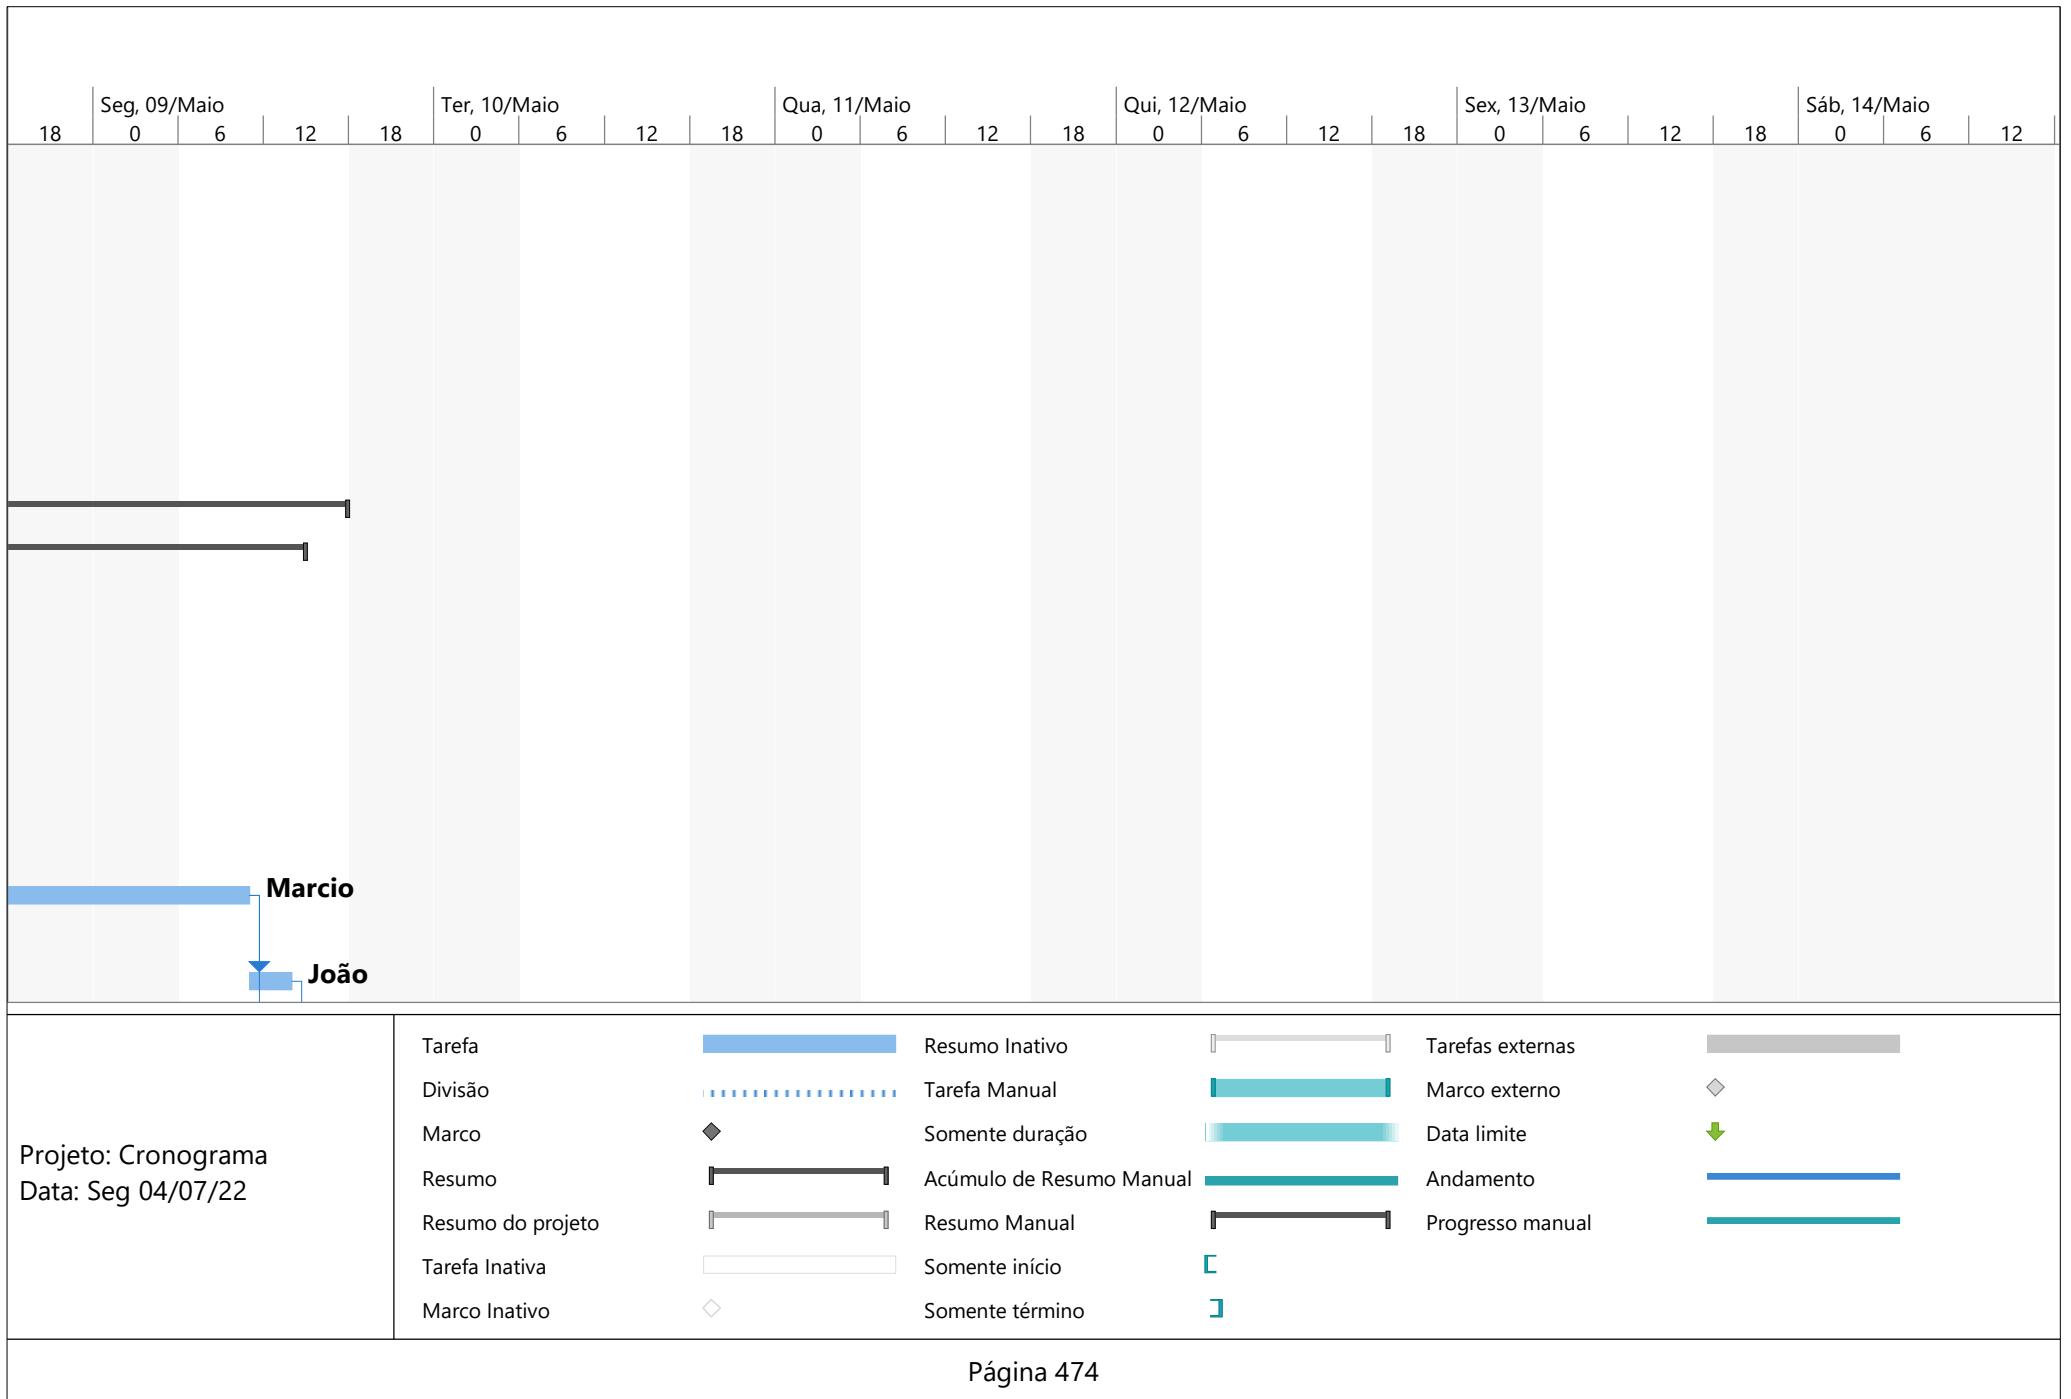




Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

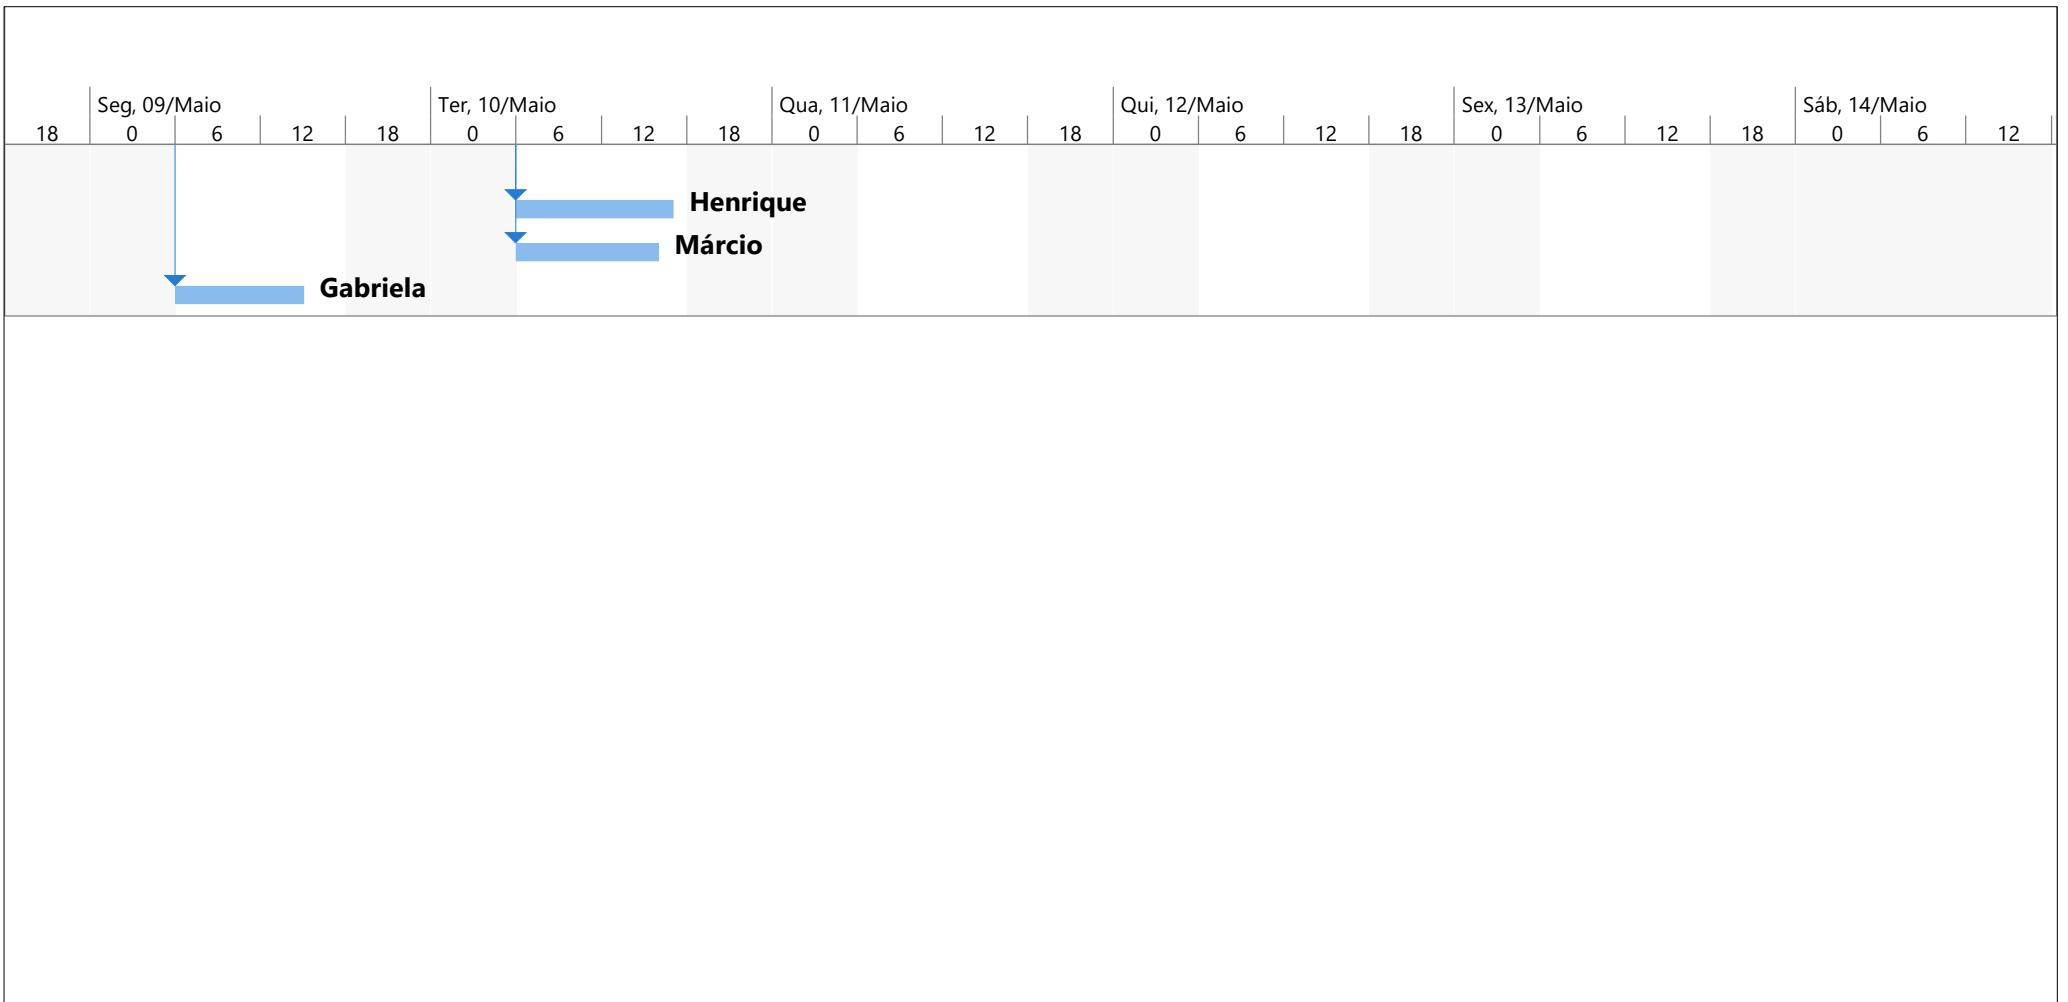



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

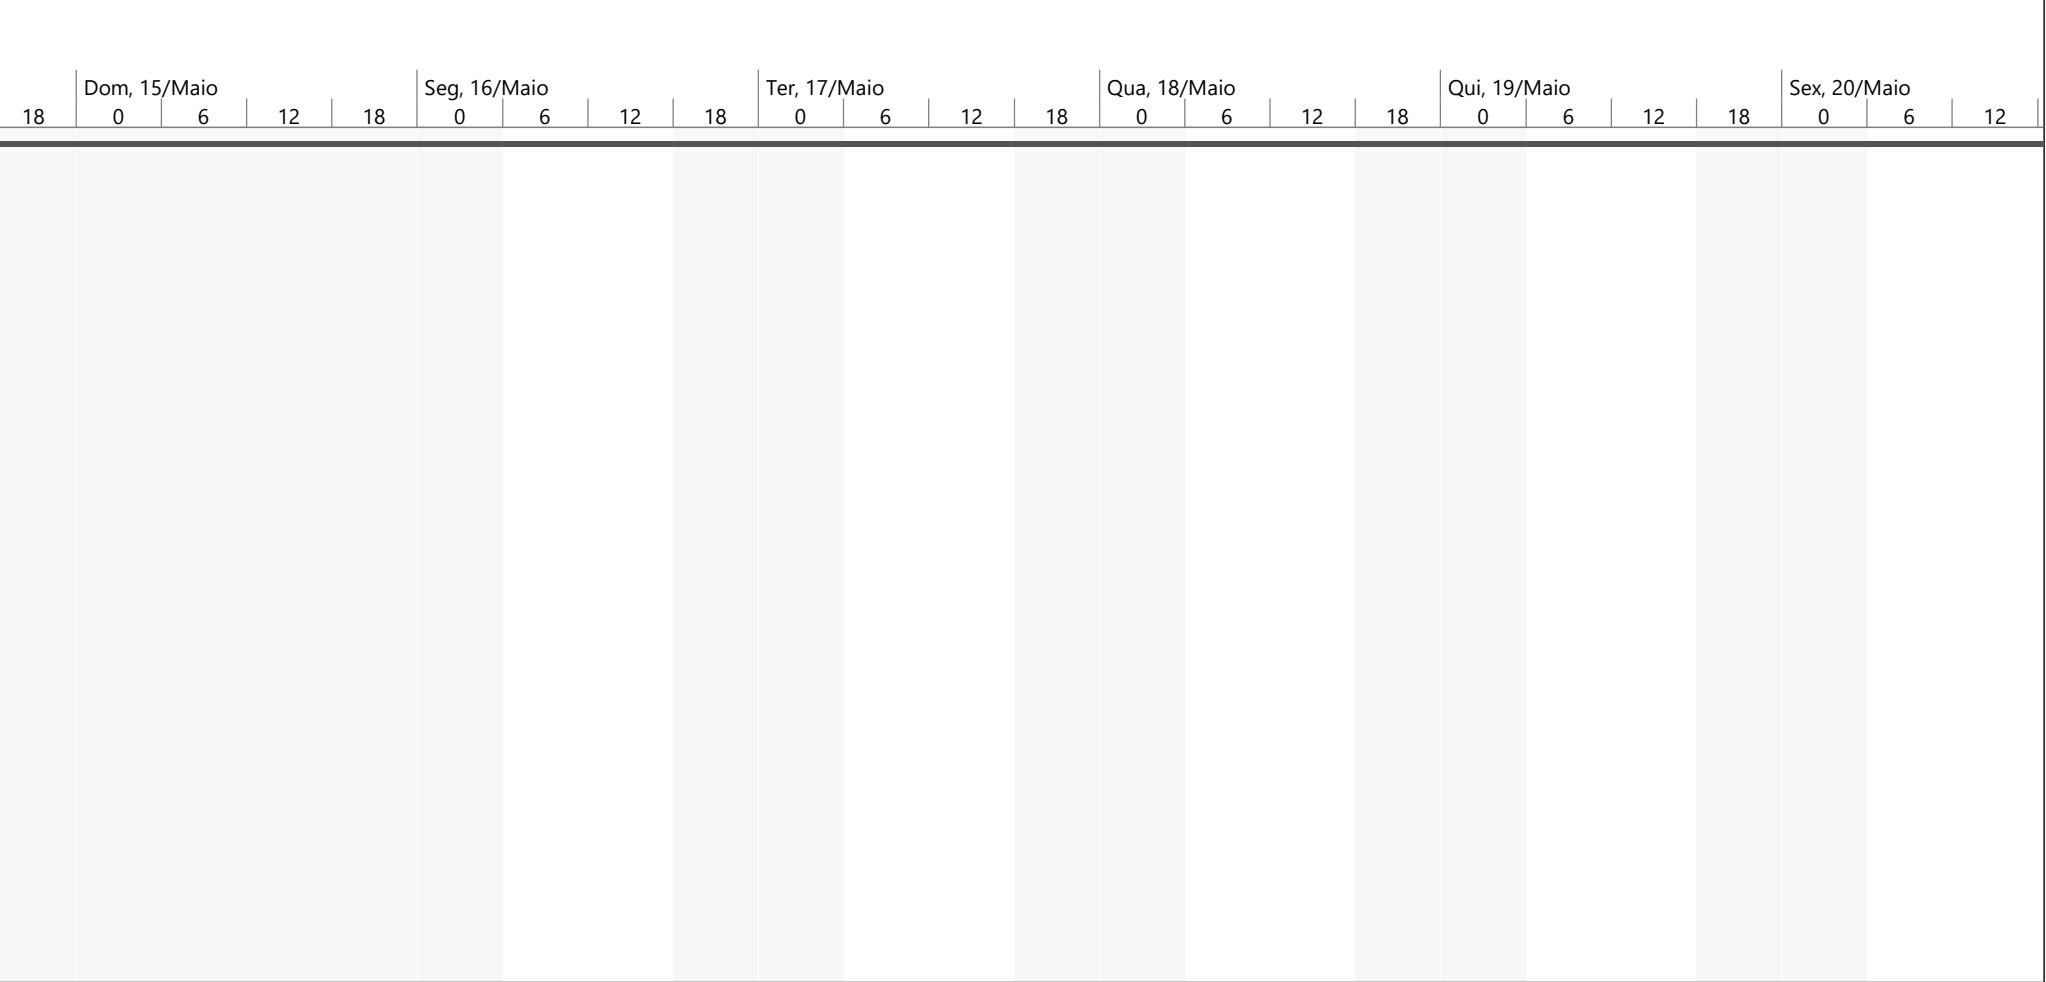


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

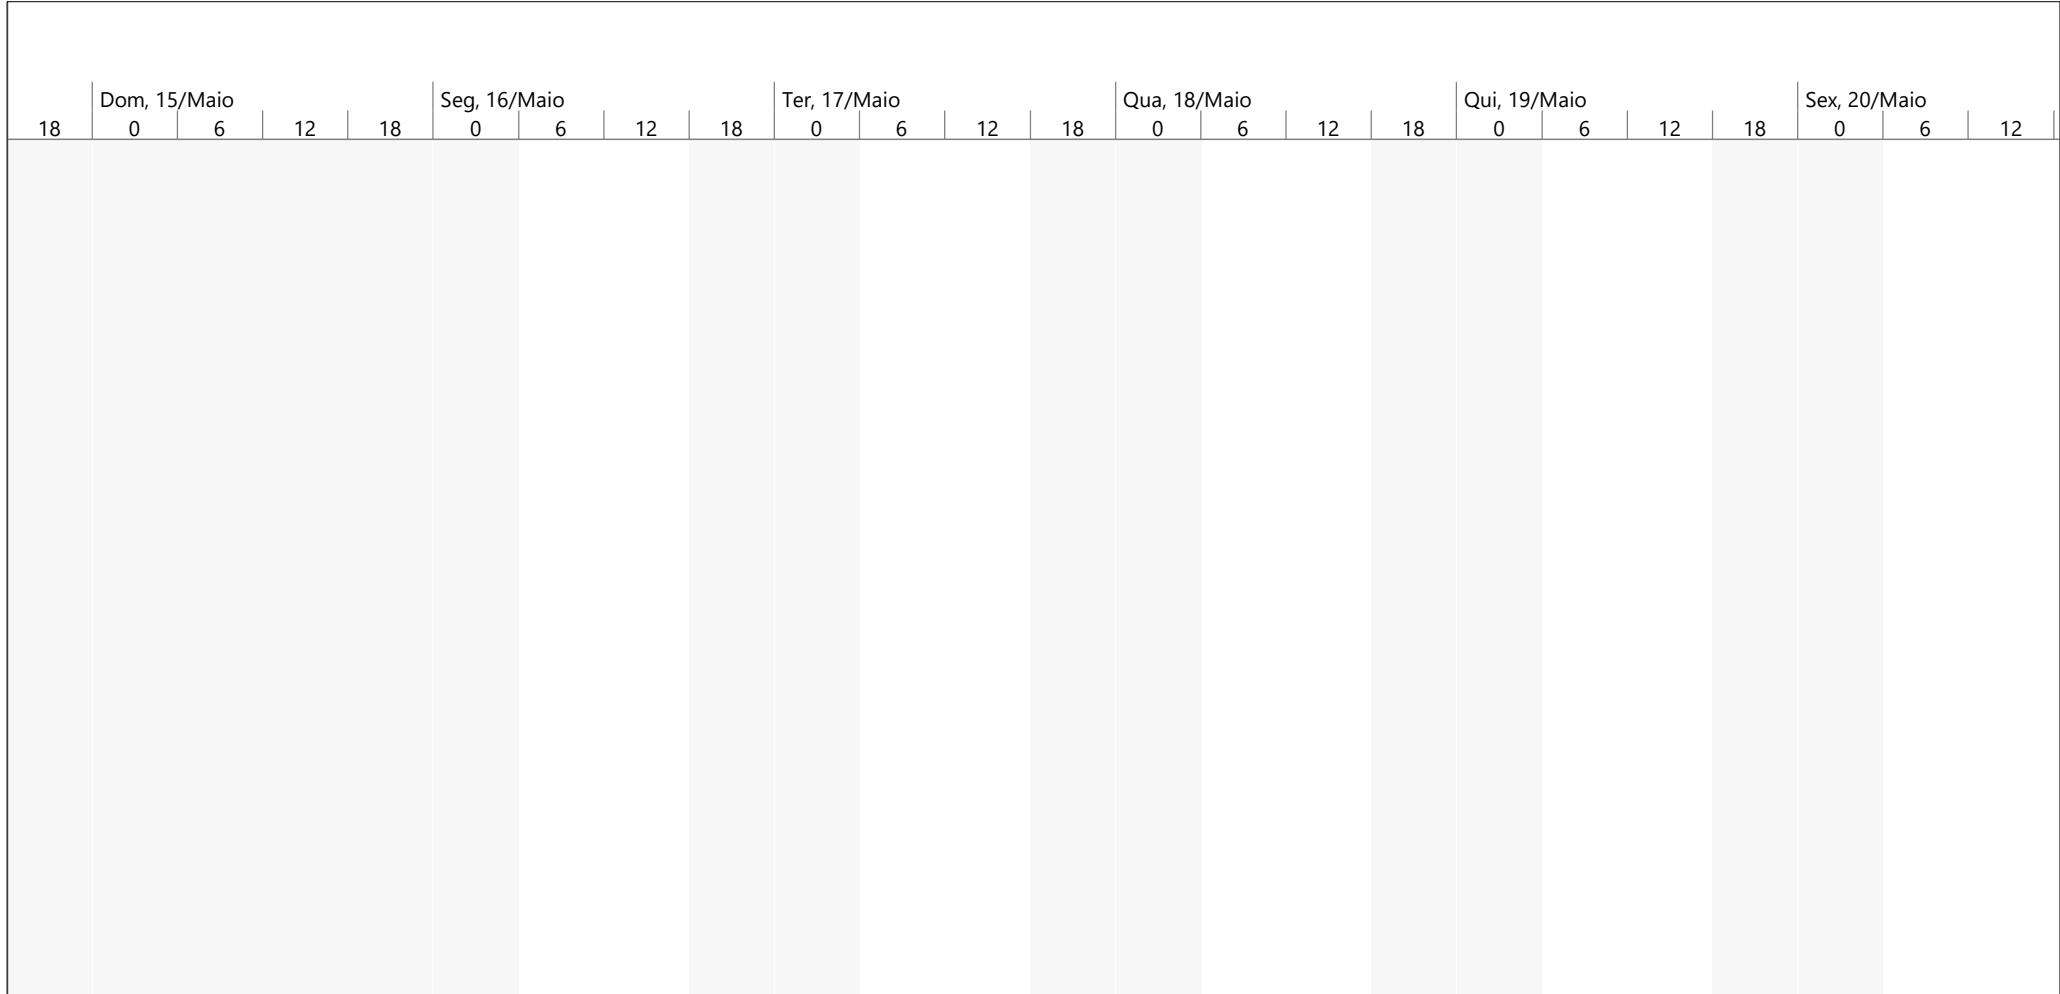





Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	◆ Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	◇ Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

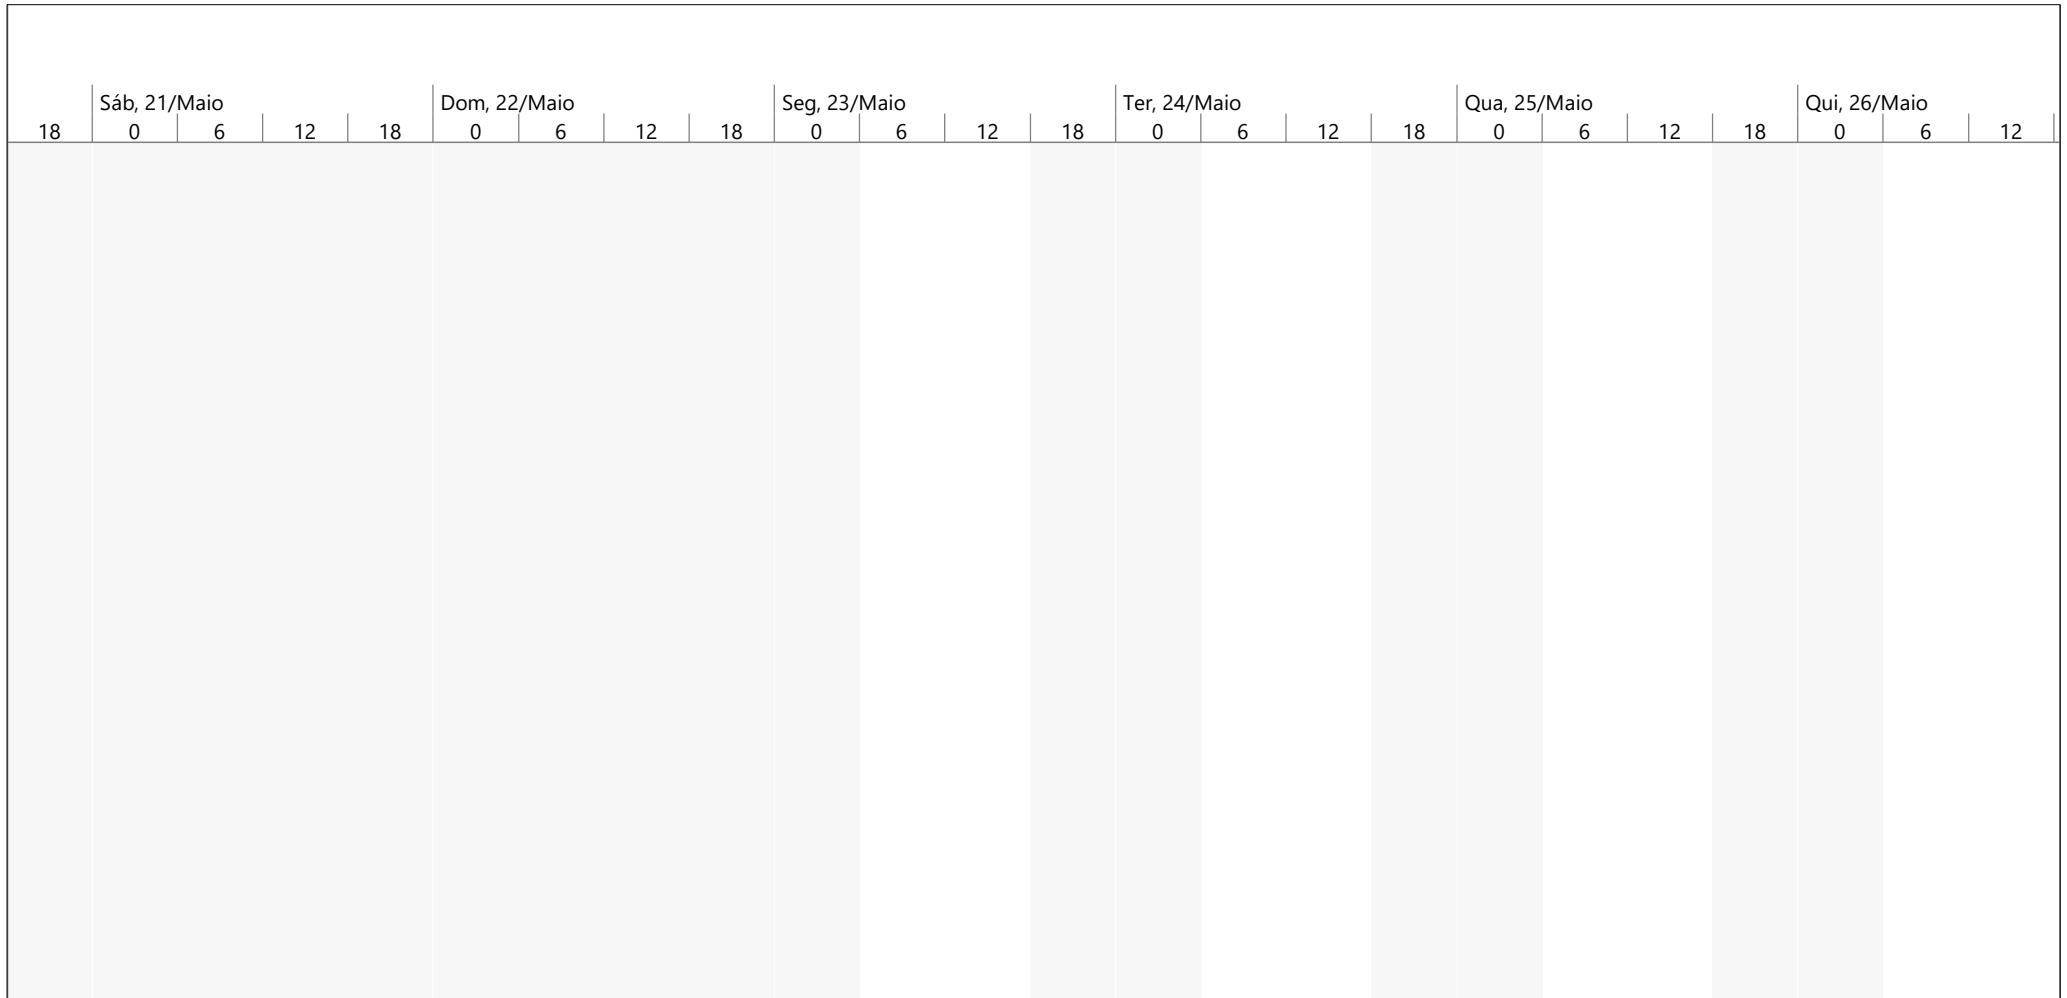

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	◆ Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	◇ Somente término	

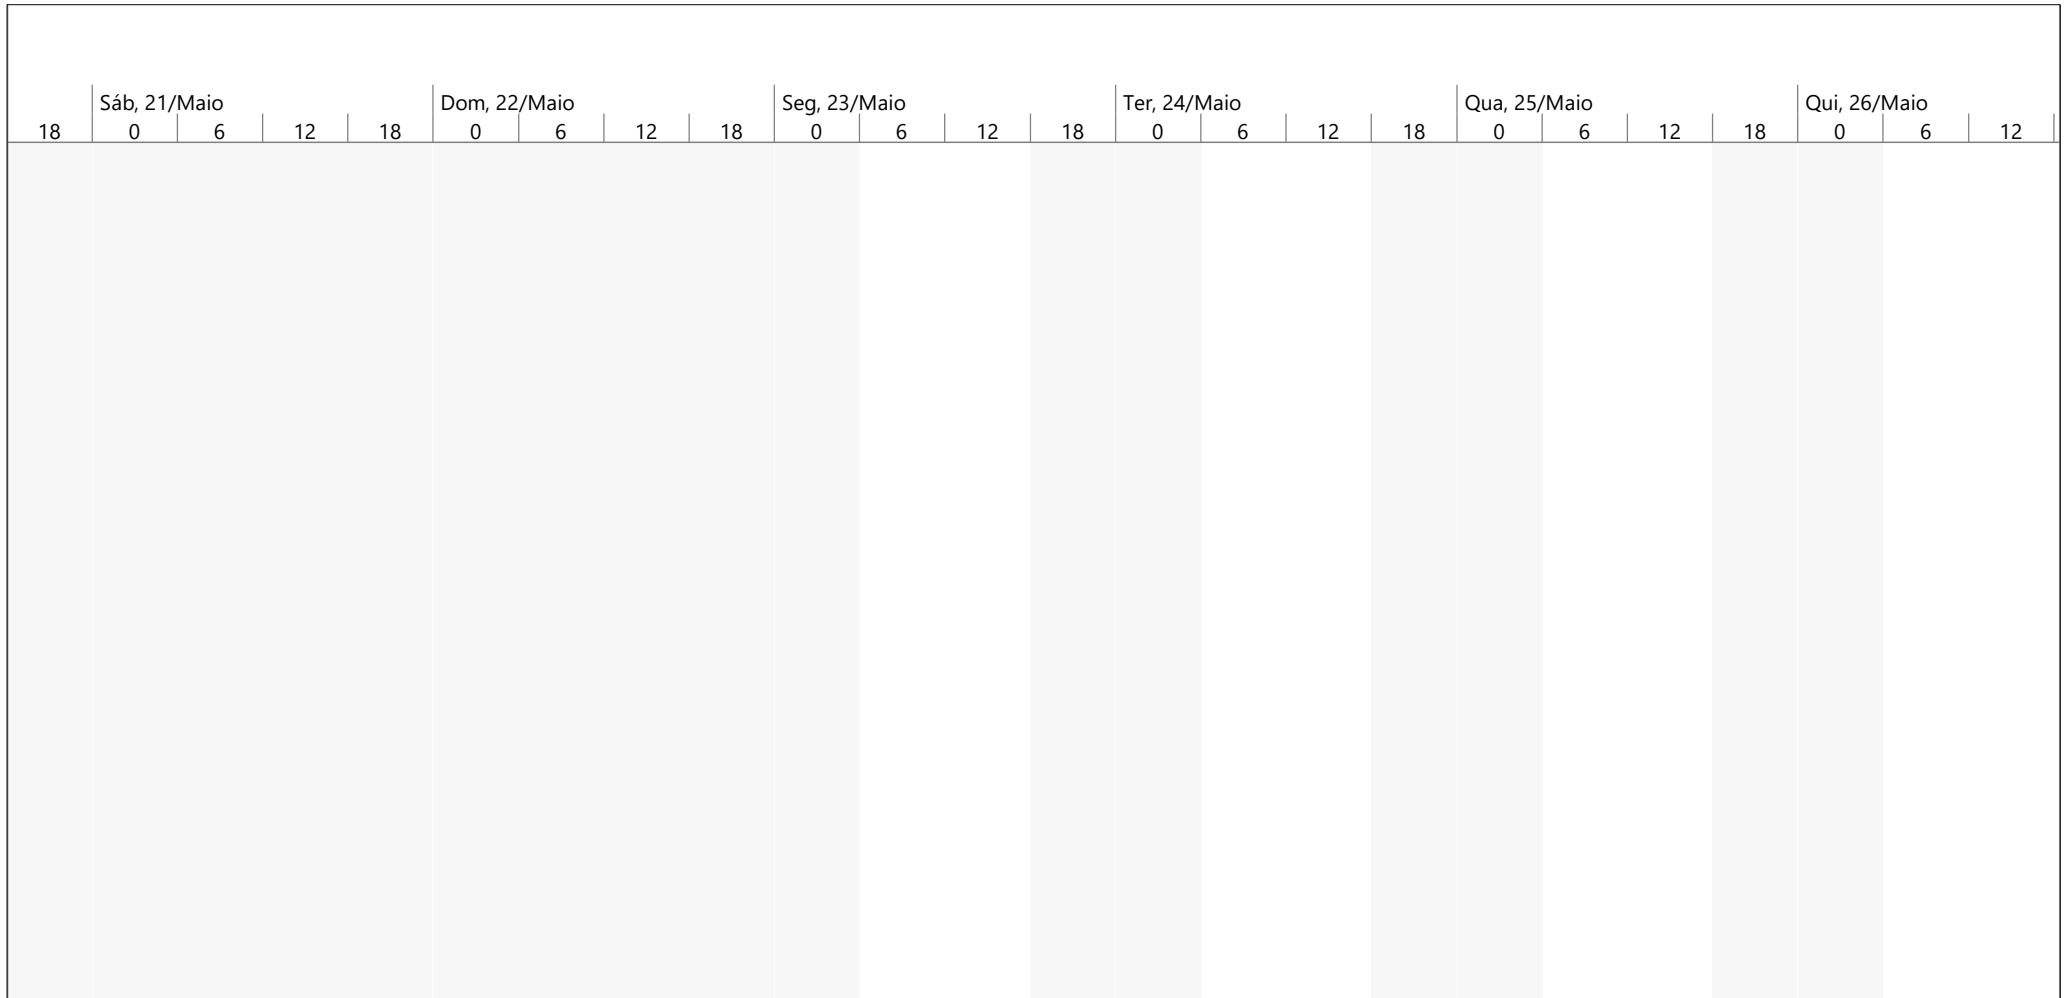


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	





Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

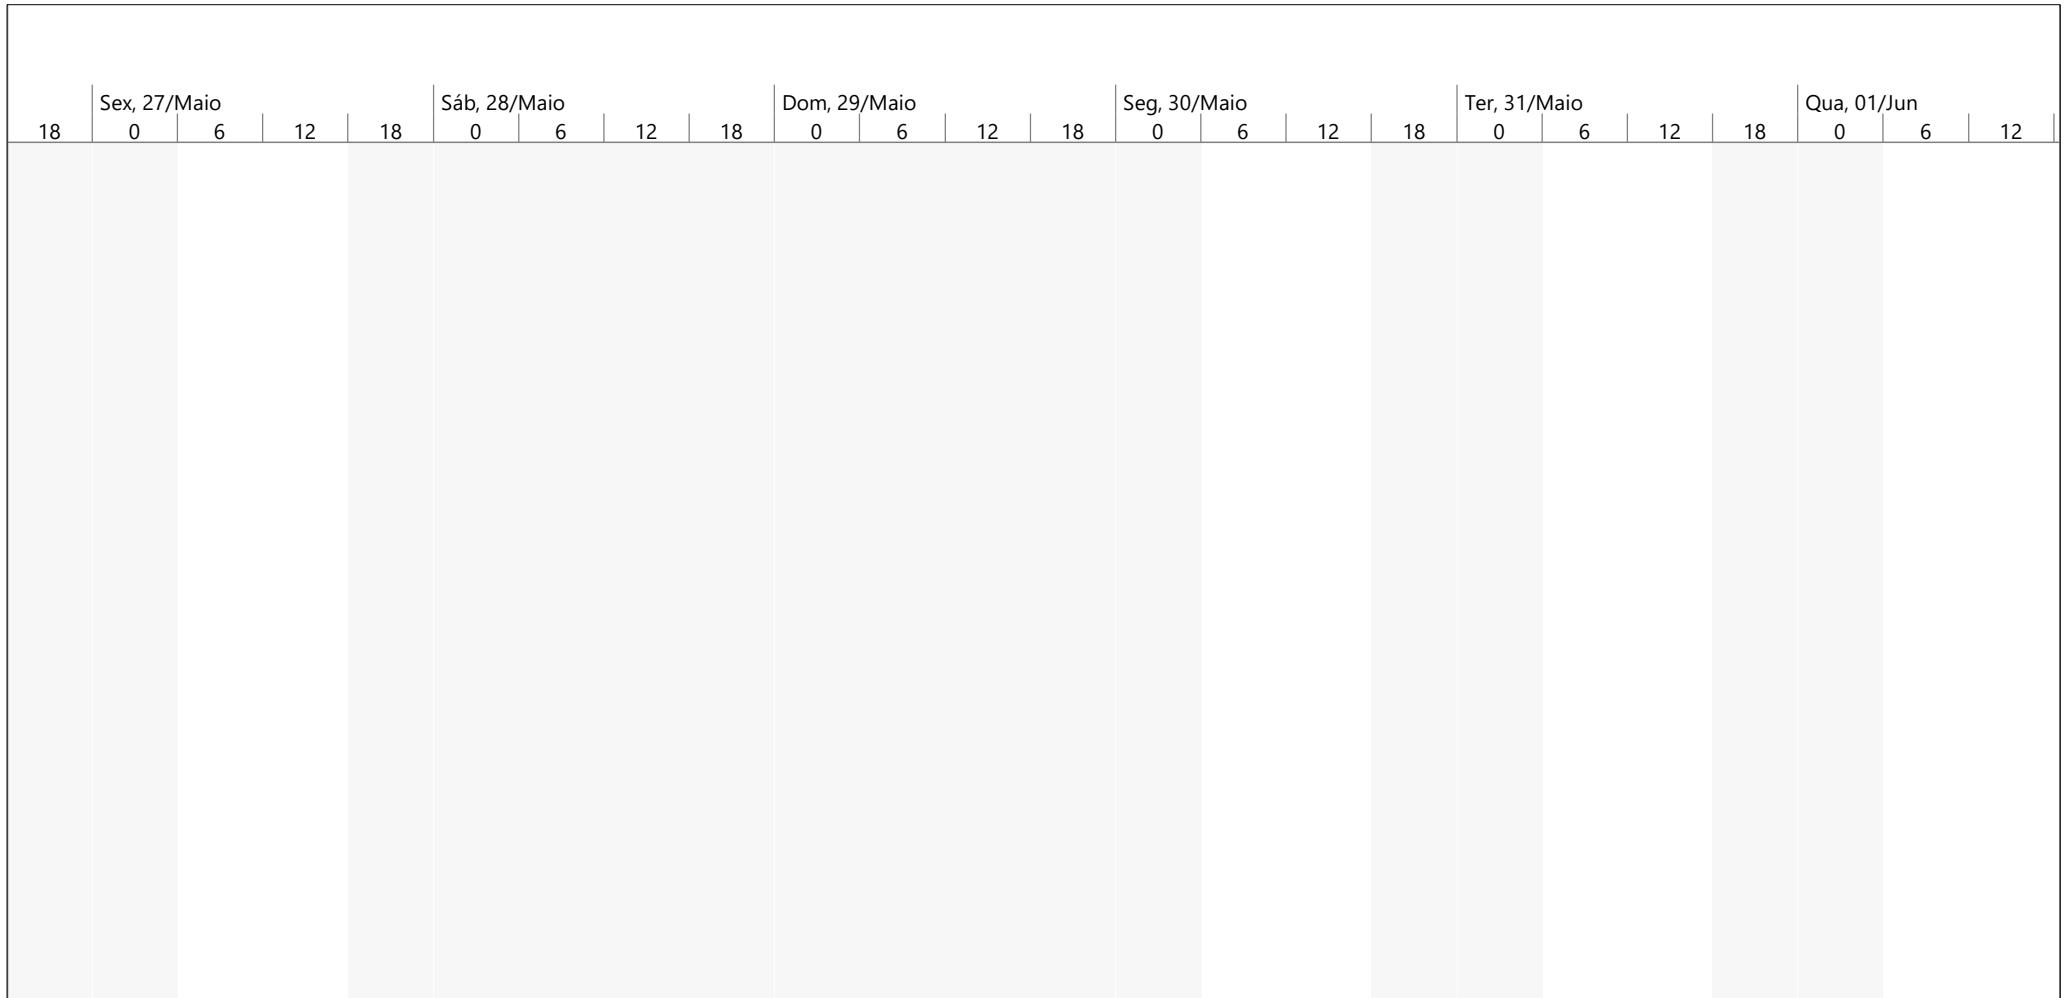

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

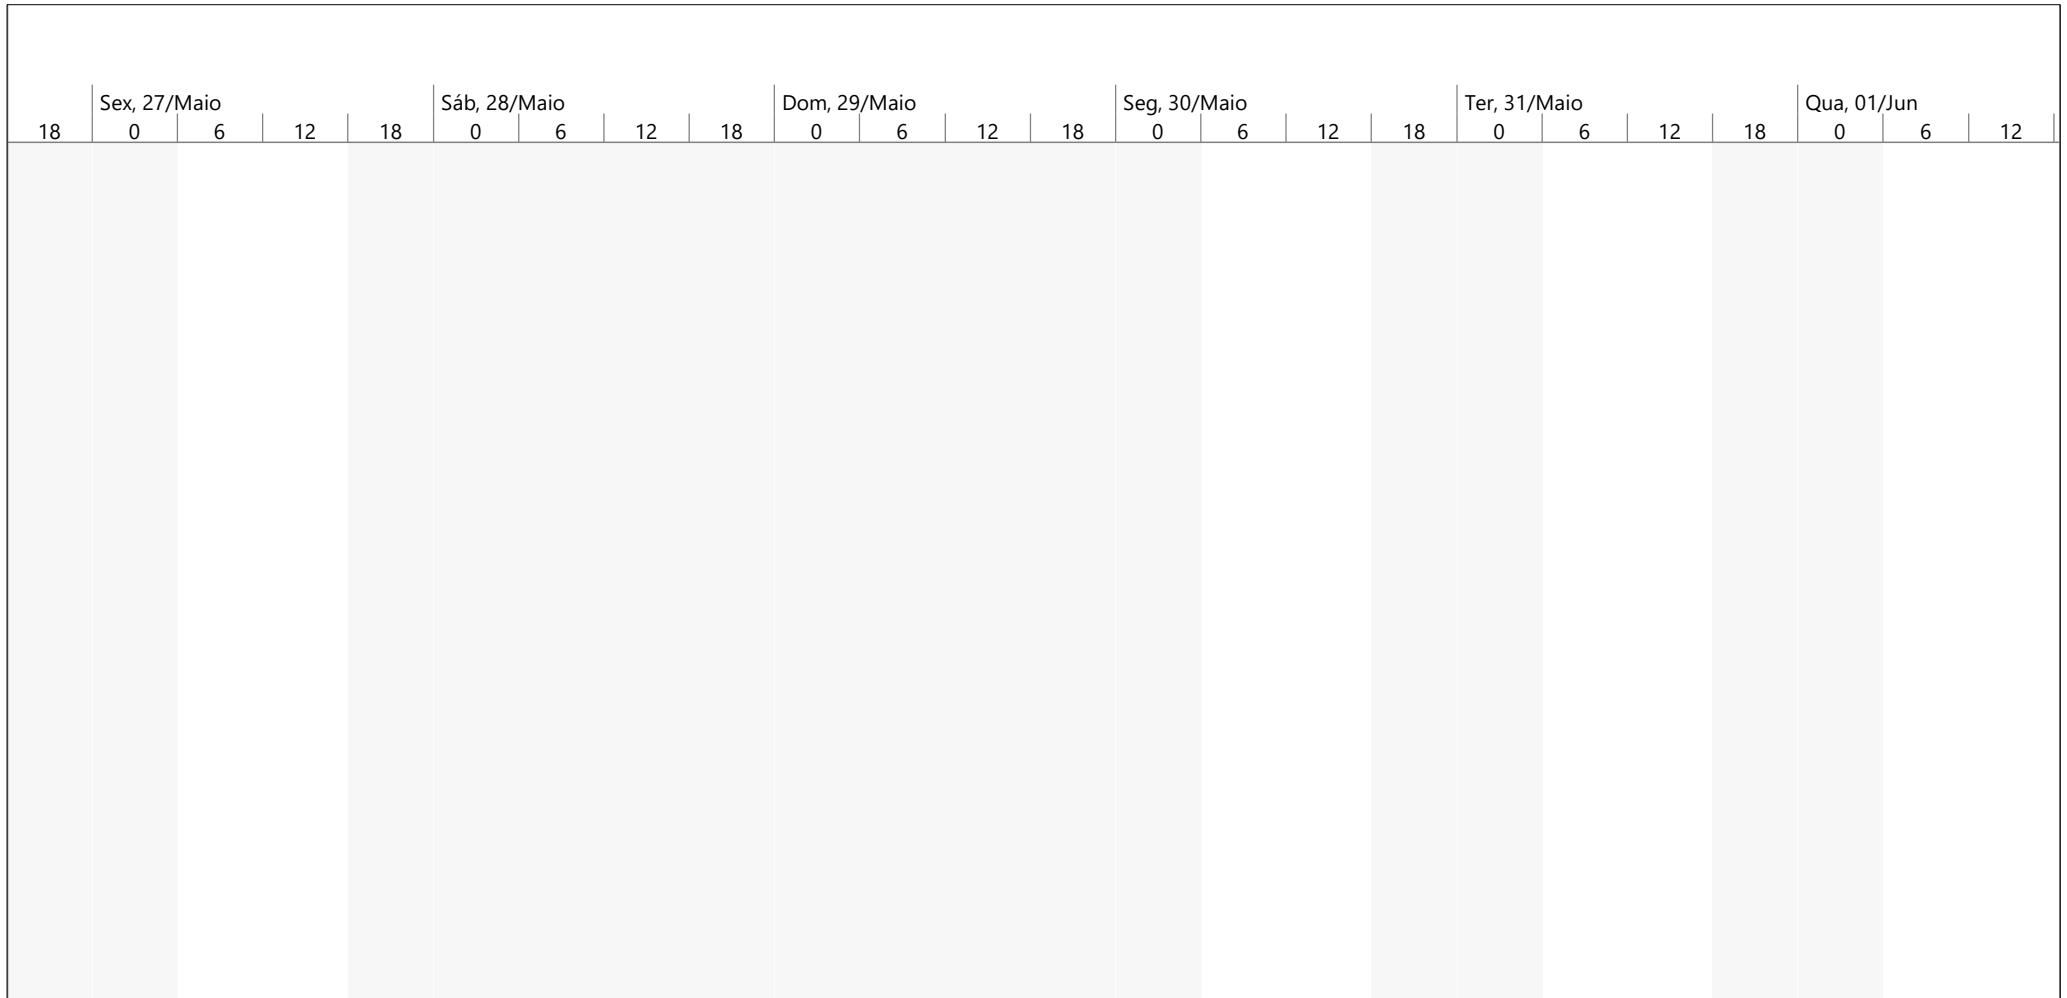


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	






Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

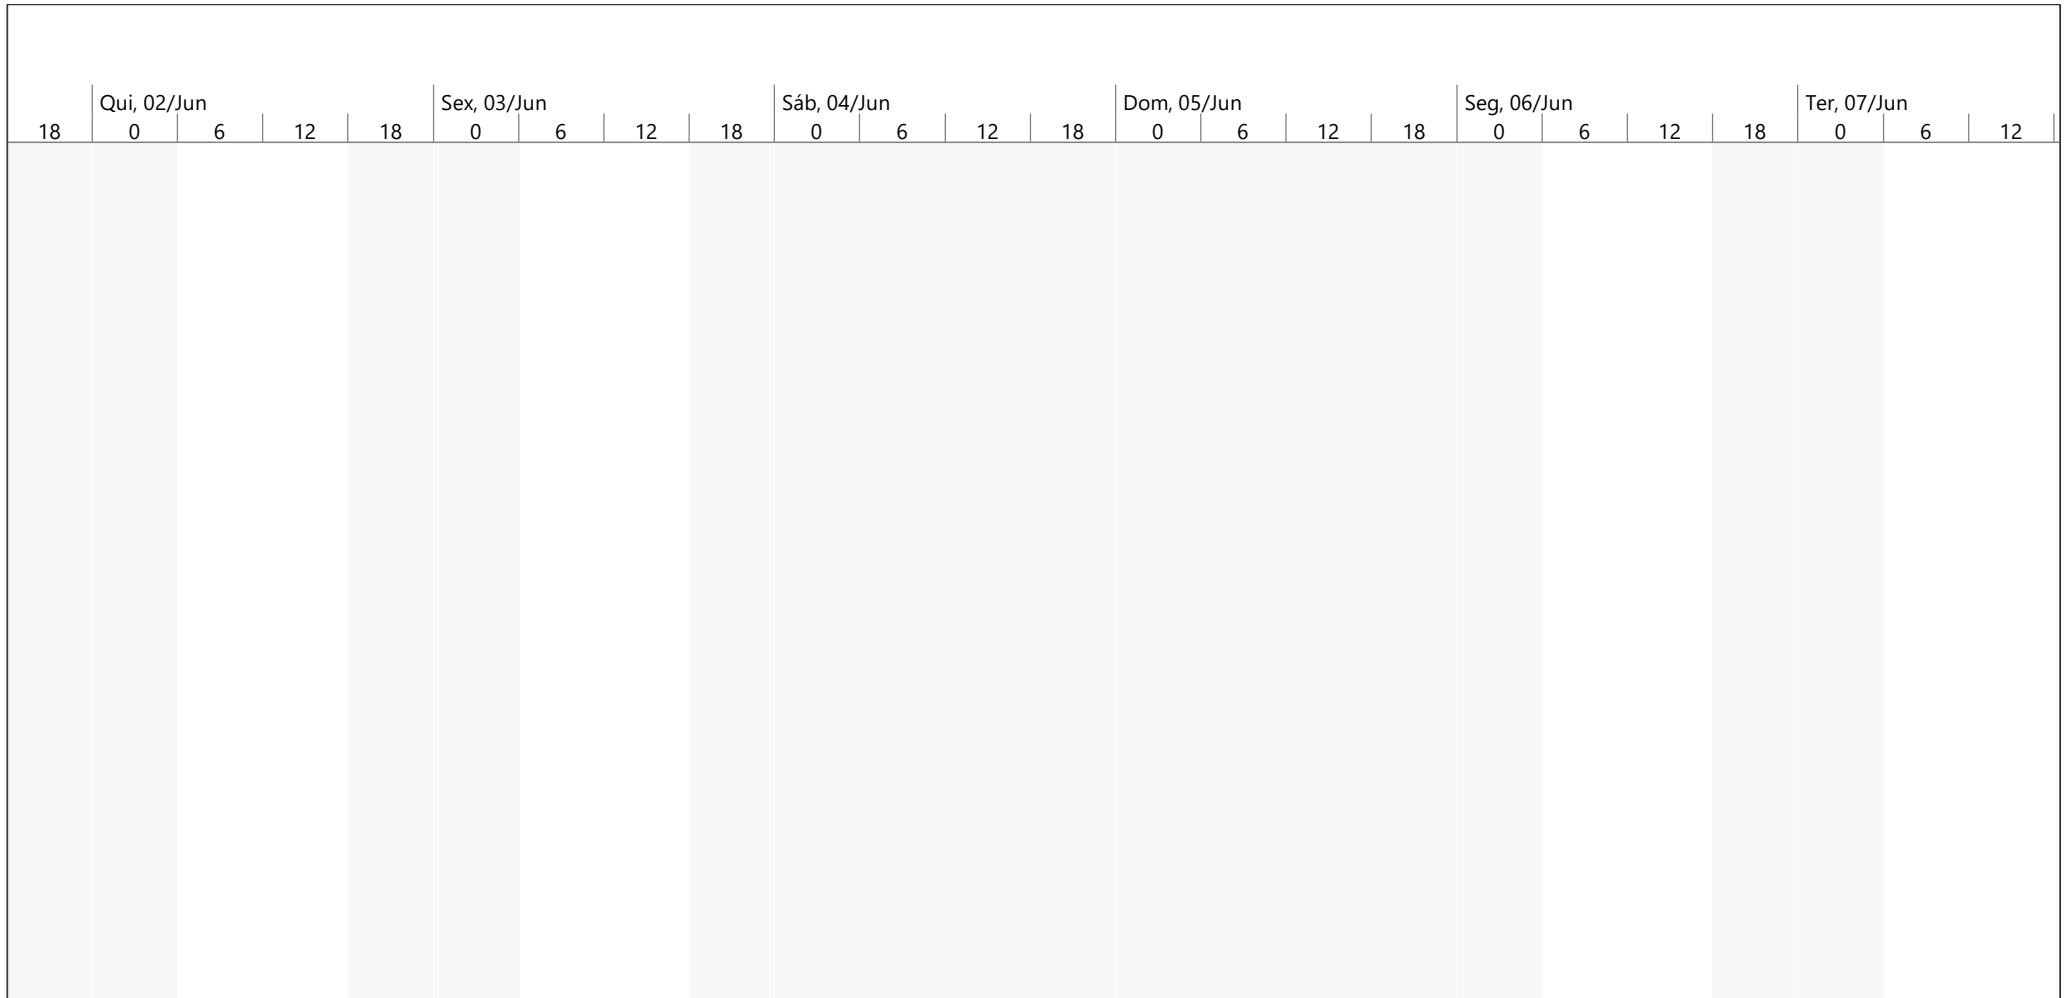


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

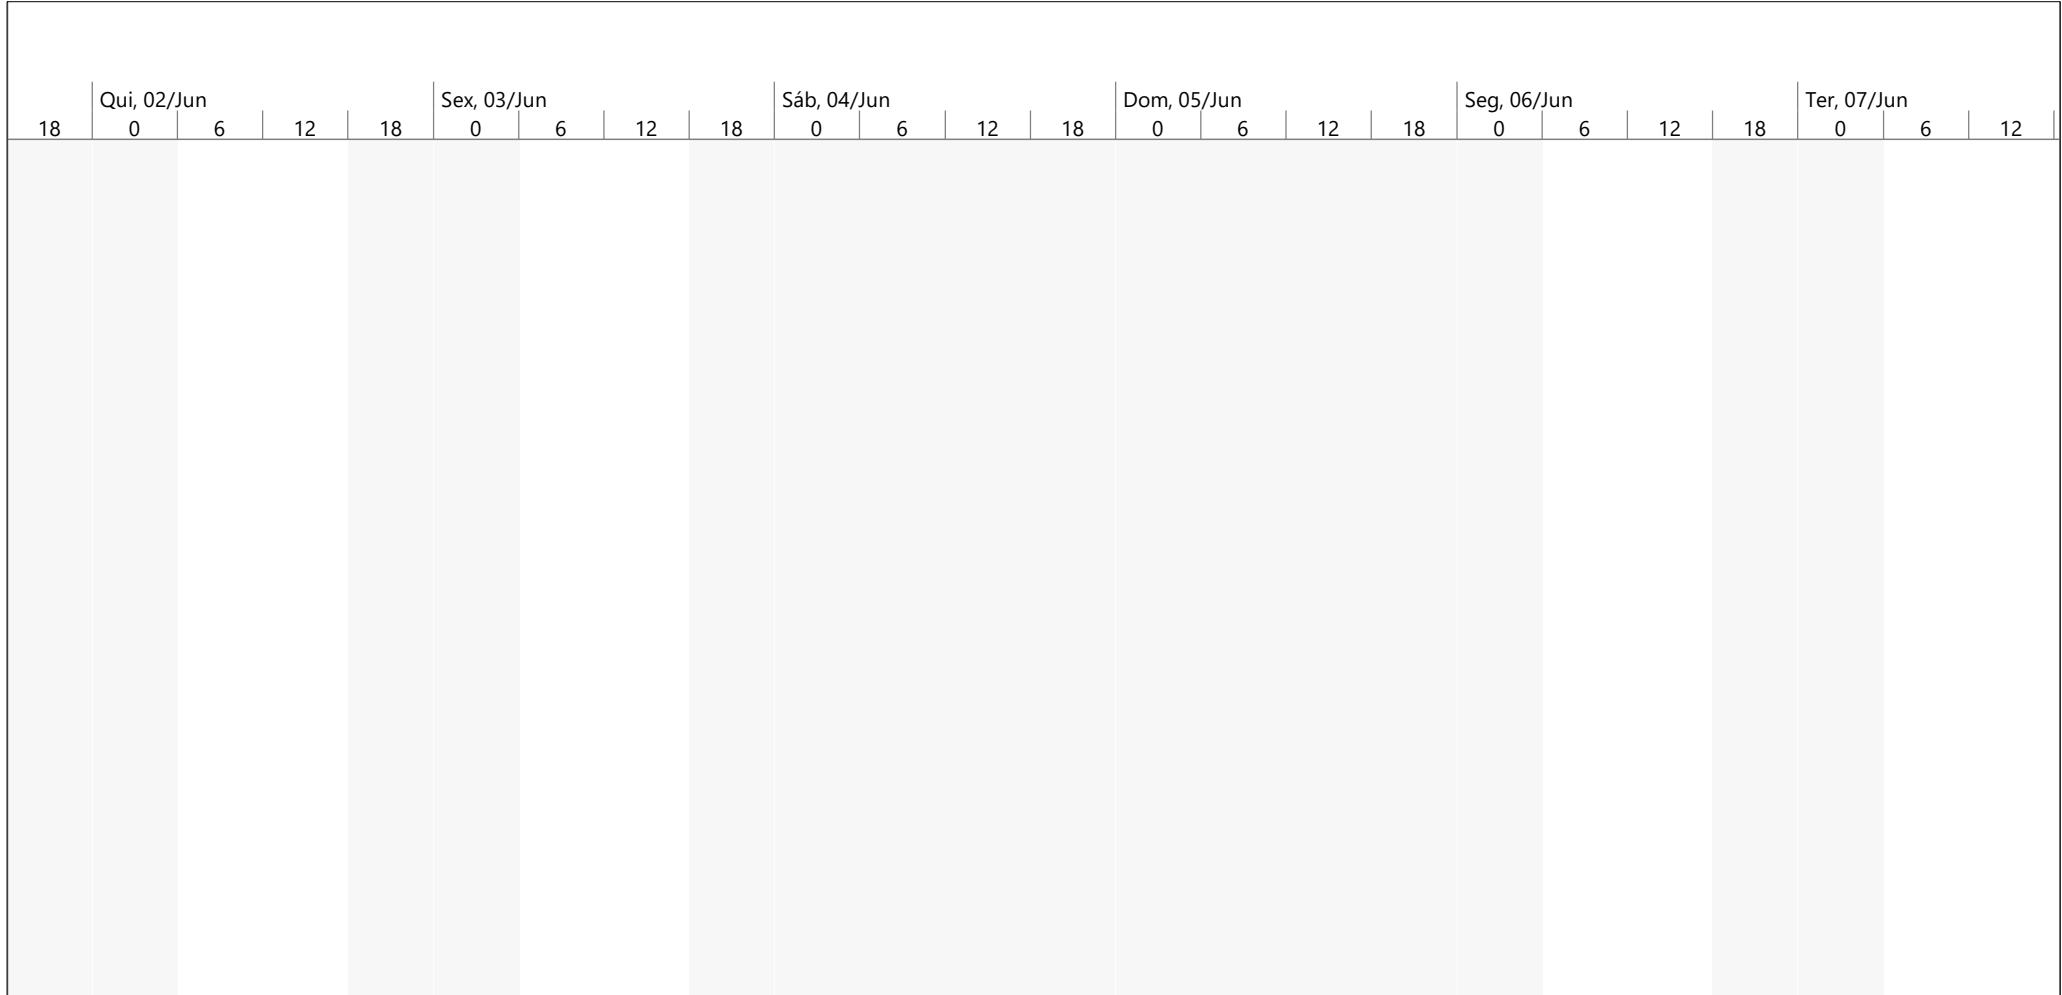


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

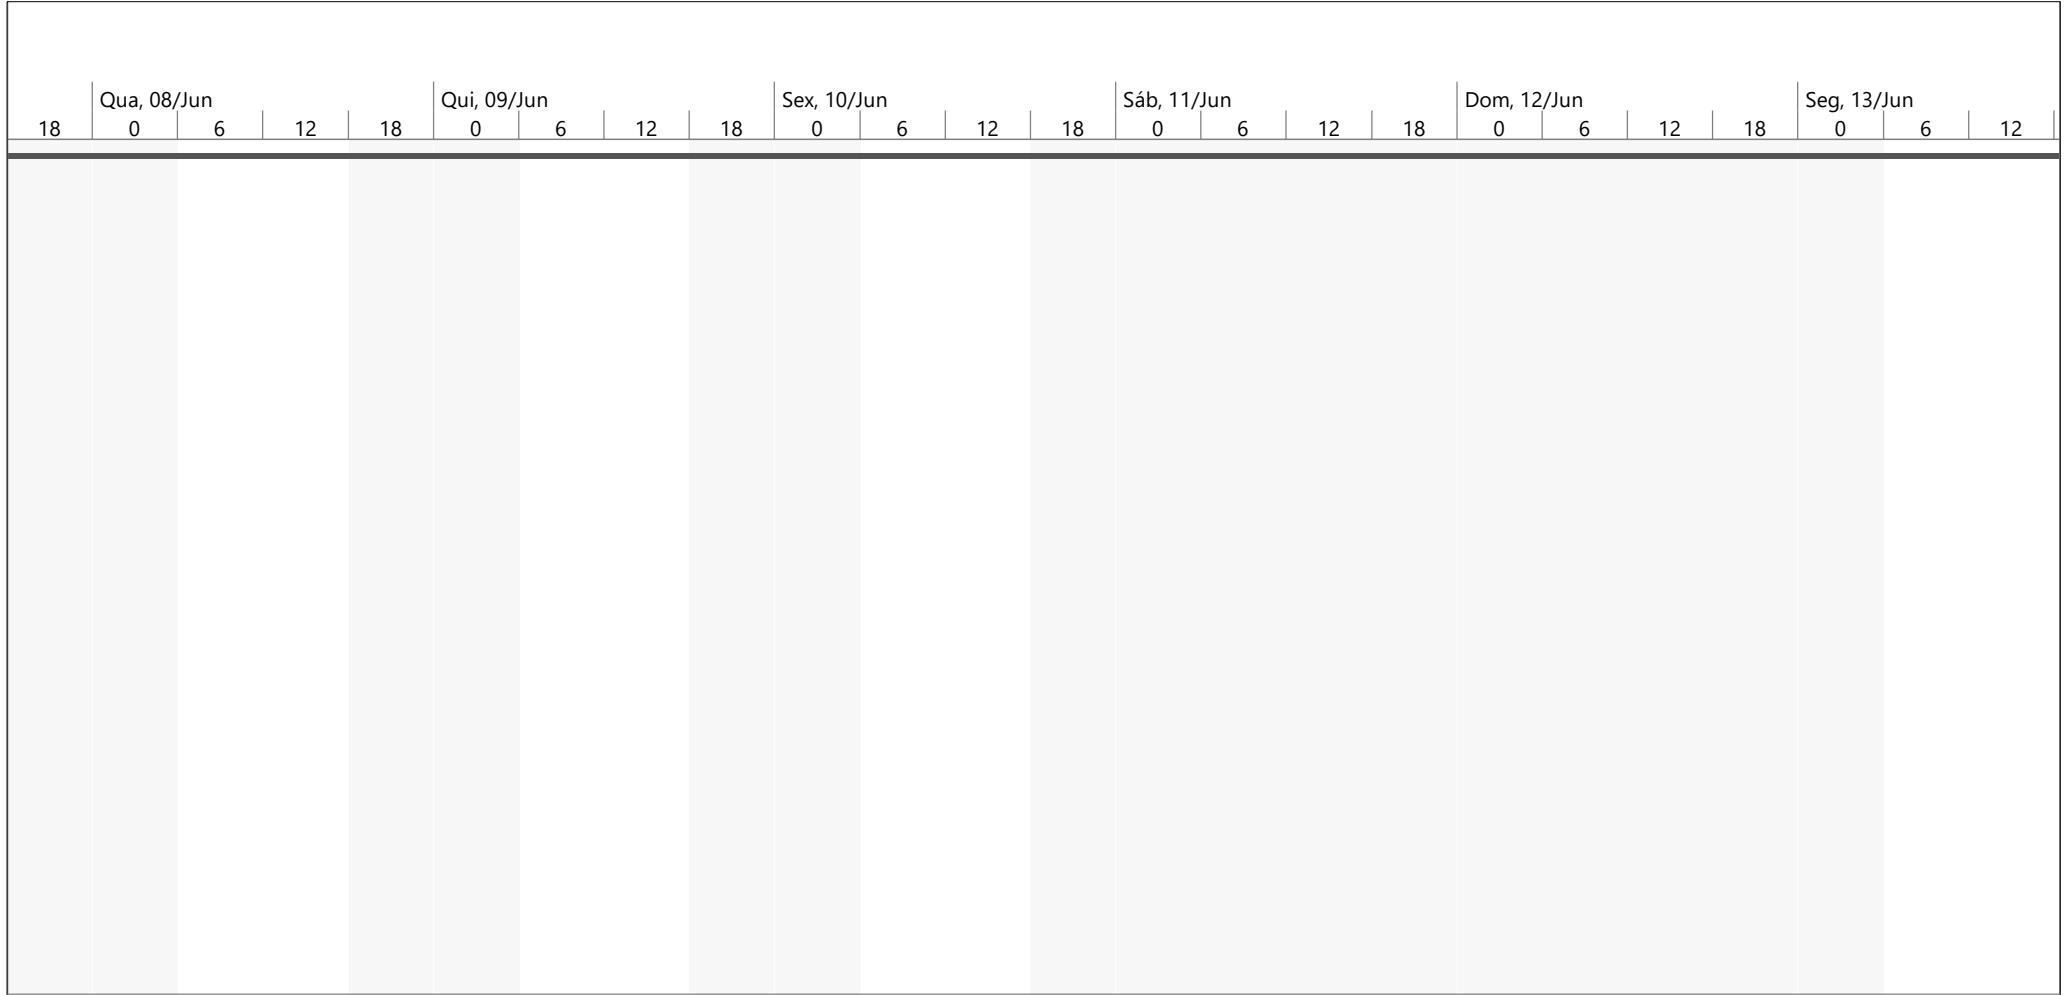


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

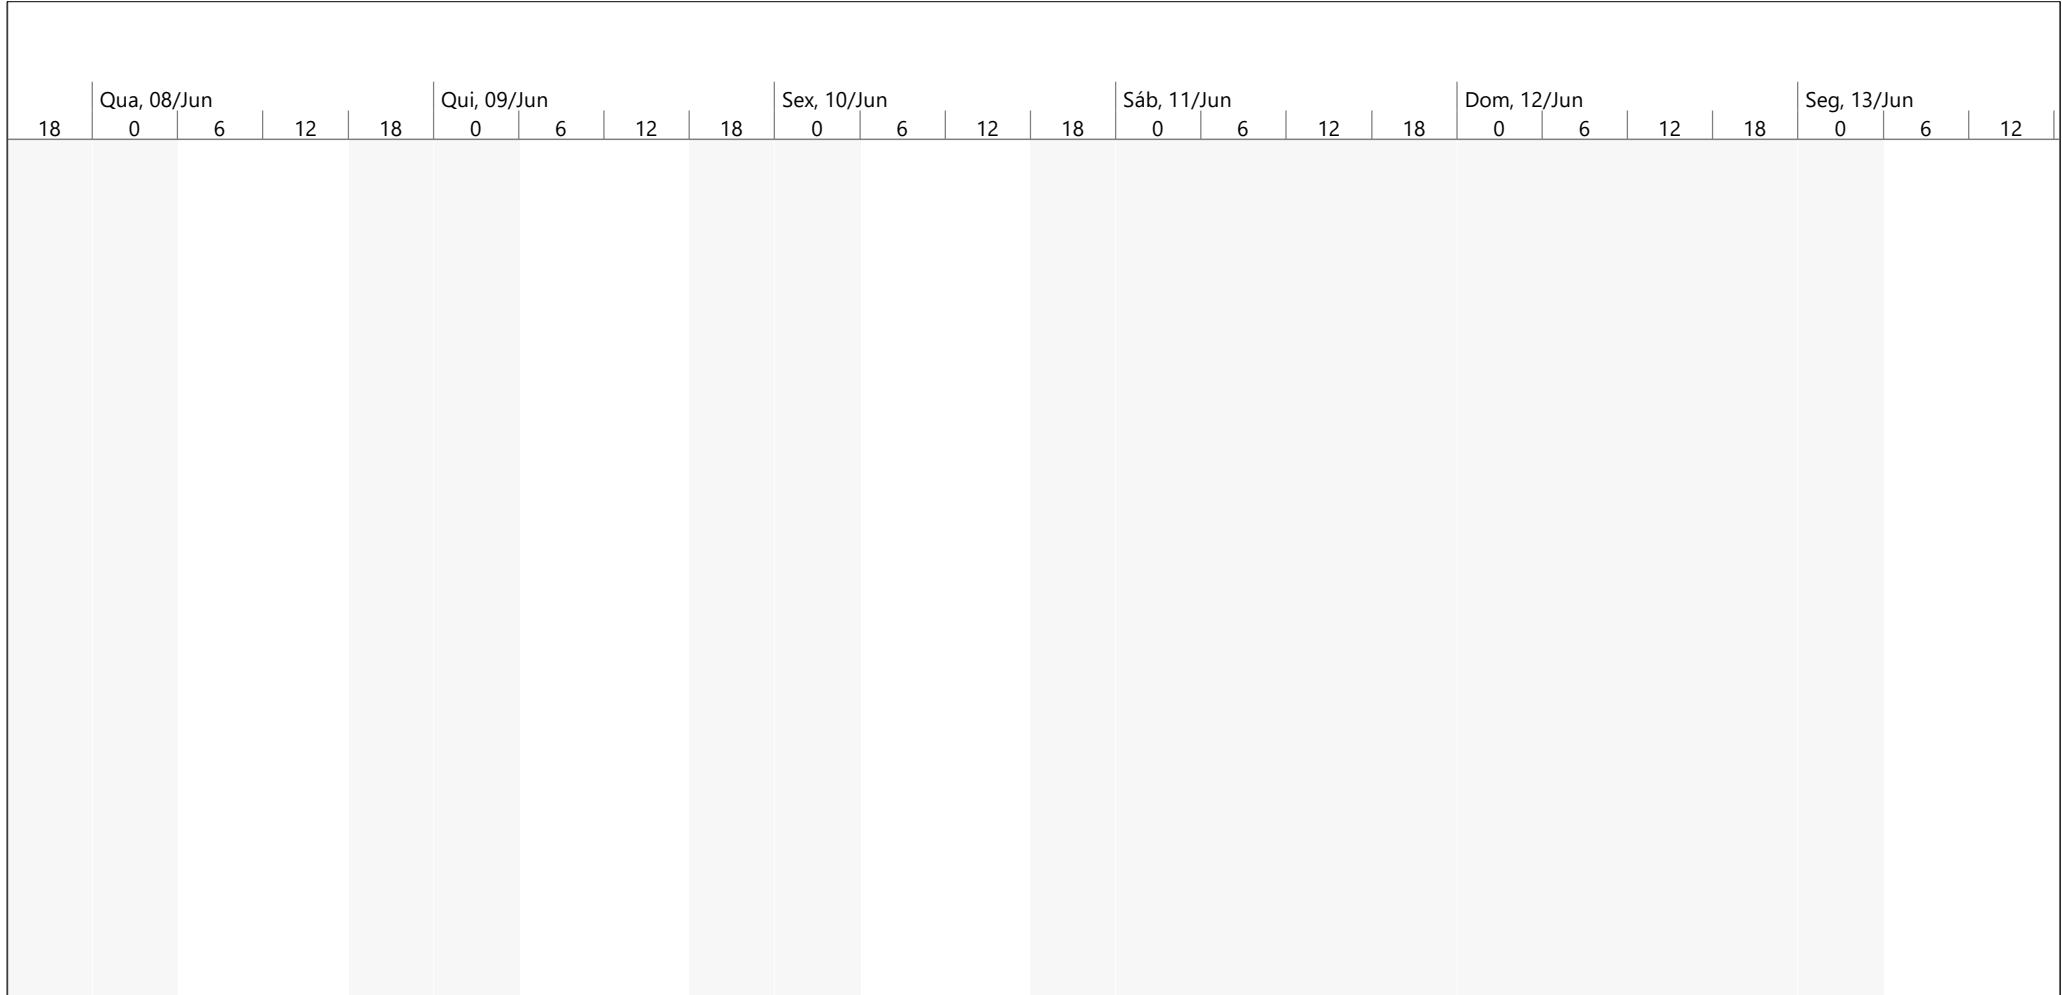


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

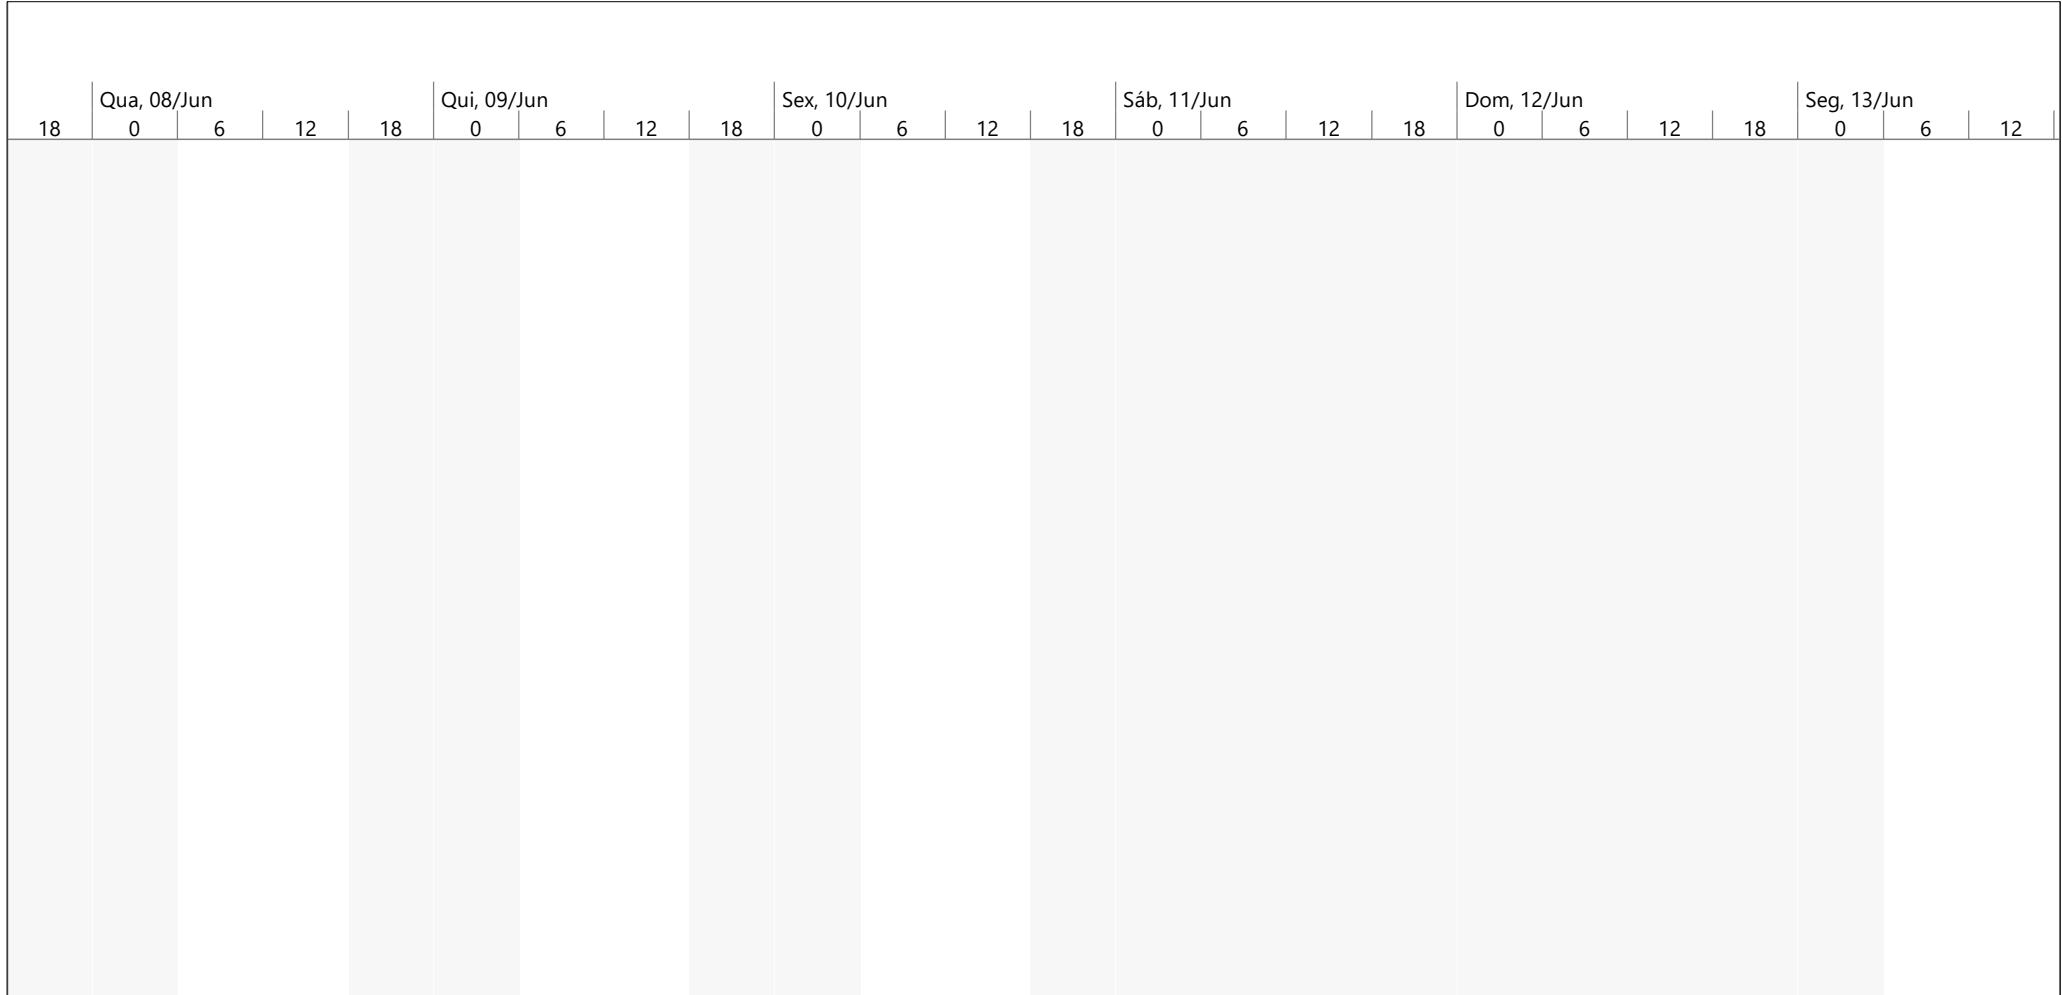


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

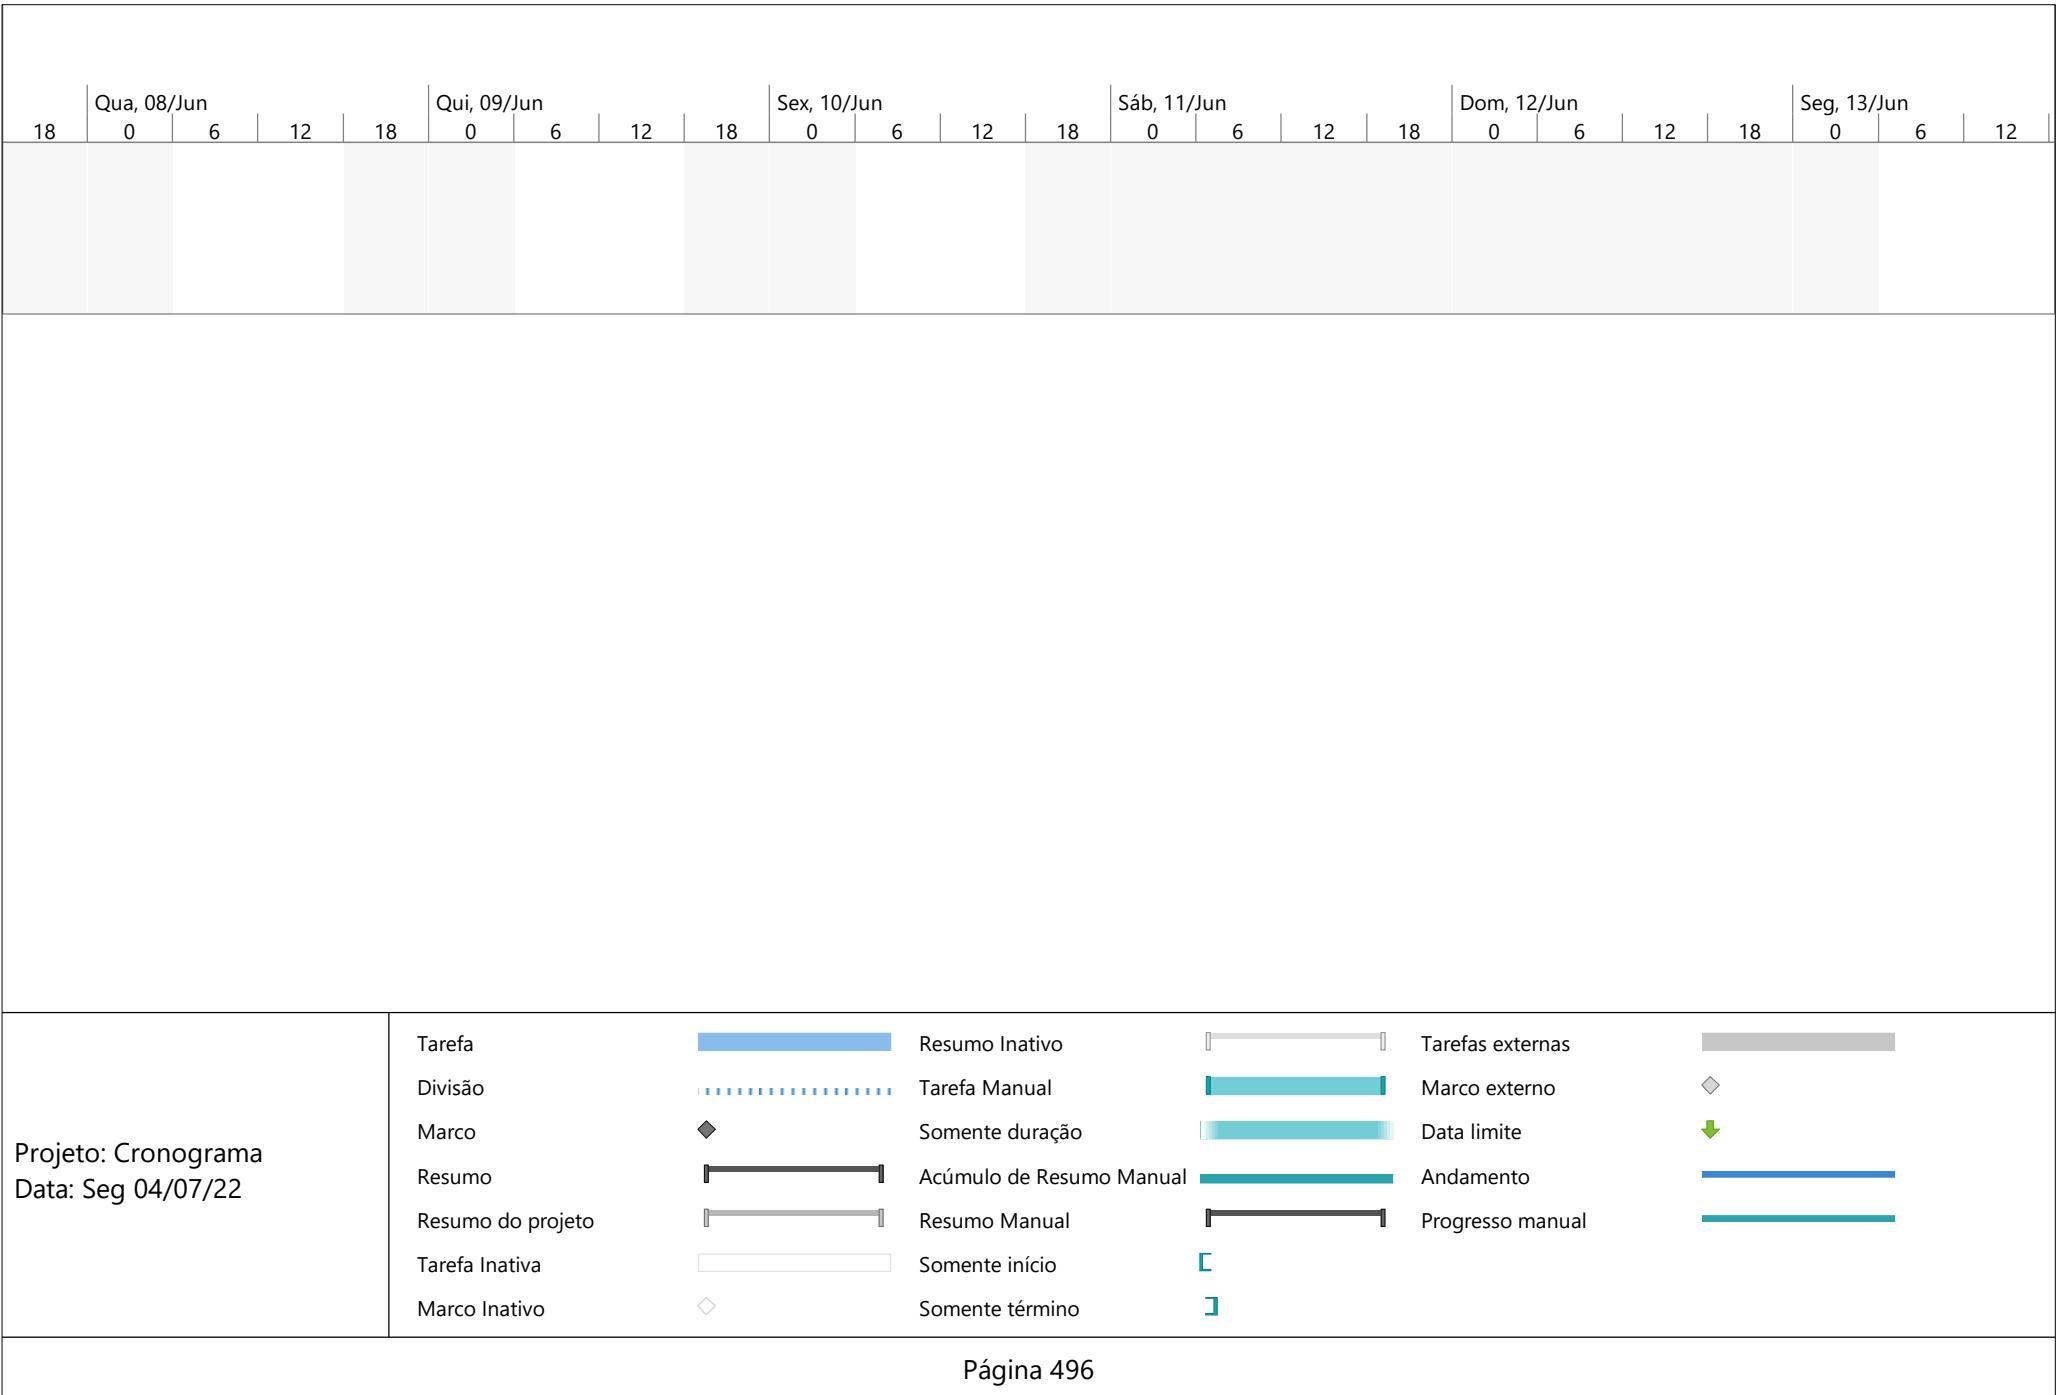

18	Ter, 14/Jun	0	6	12	18	Qua, 15/Jun	0	6	12	18	Qui, 16/Jun	0	6	12	18	Sex, 17/Jun	0	6	12	18	Sáb, 18/Jun	0	6	12	18	Dom, 19/Jun	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22






Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

18	Seg, 20/Jun	0	6	12	18	Ter, 21/Jun	0	6	12	18	Qua, 22/Jun	0	6	12	18	Qui, 23/Jun	0	6	12	18	Sex, 24/Jun	0	6	12	18	Sáb, 25/Jun	0	6	12
----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----	----	-------------	---	---	----

Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22

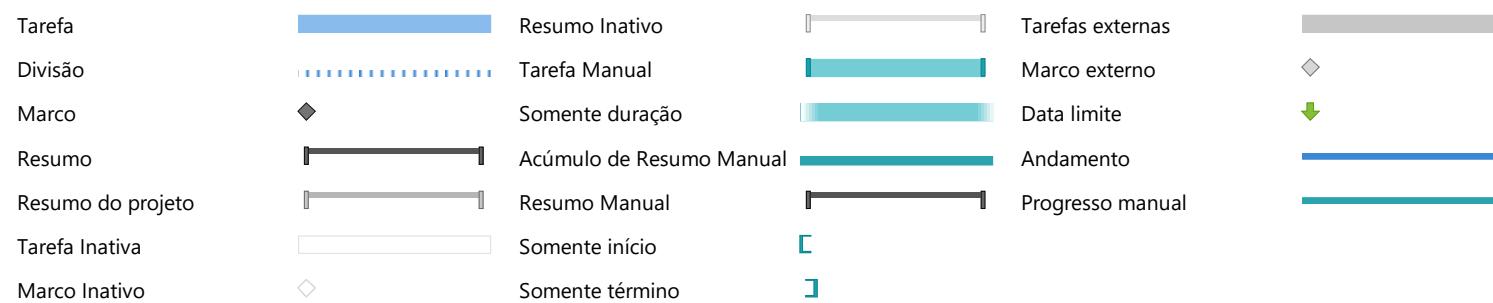


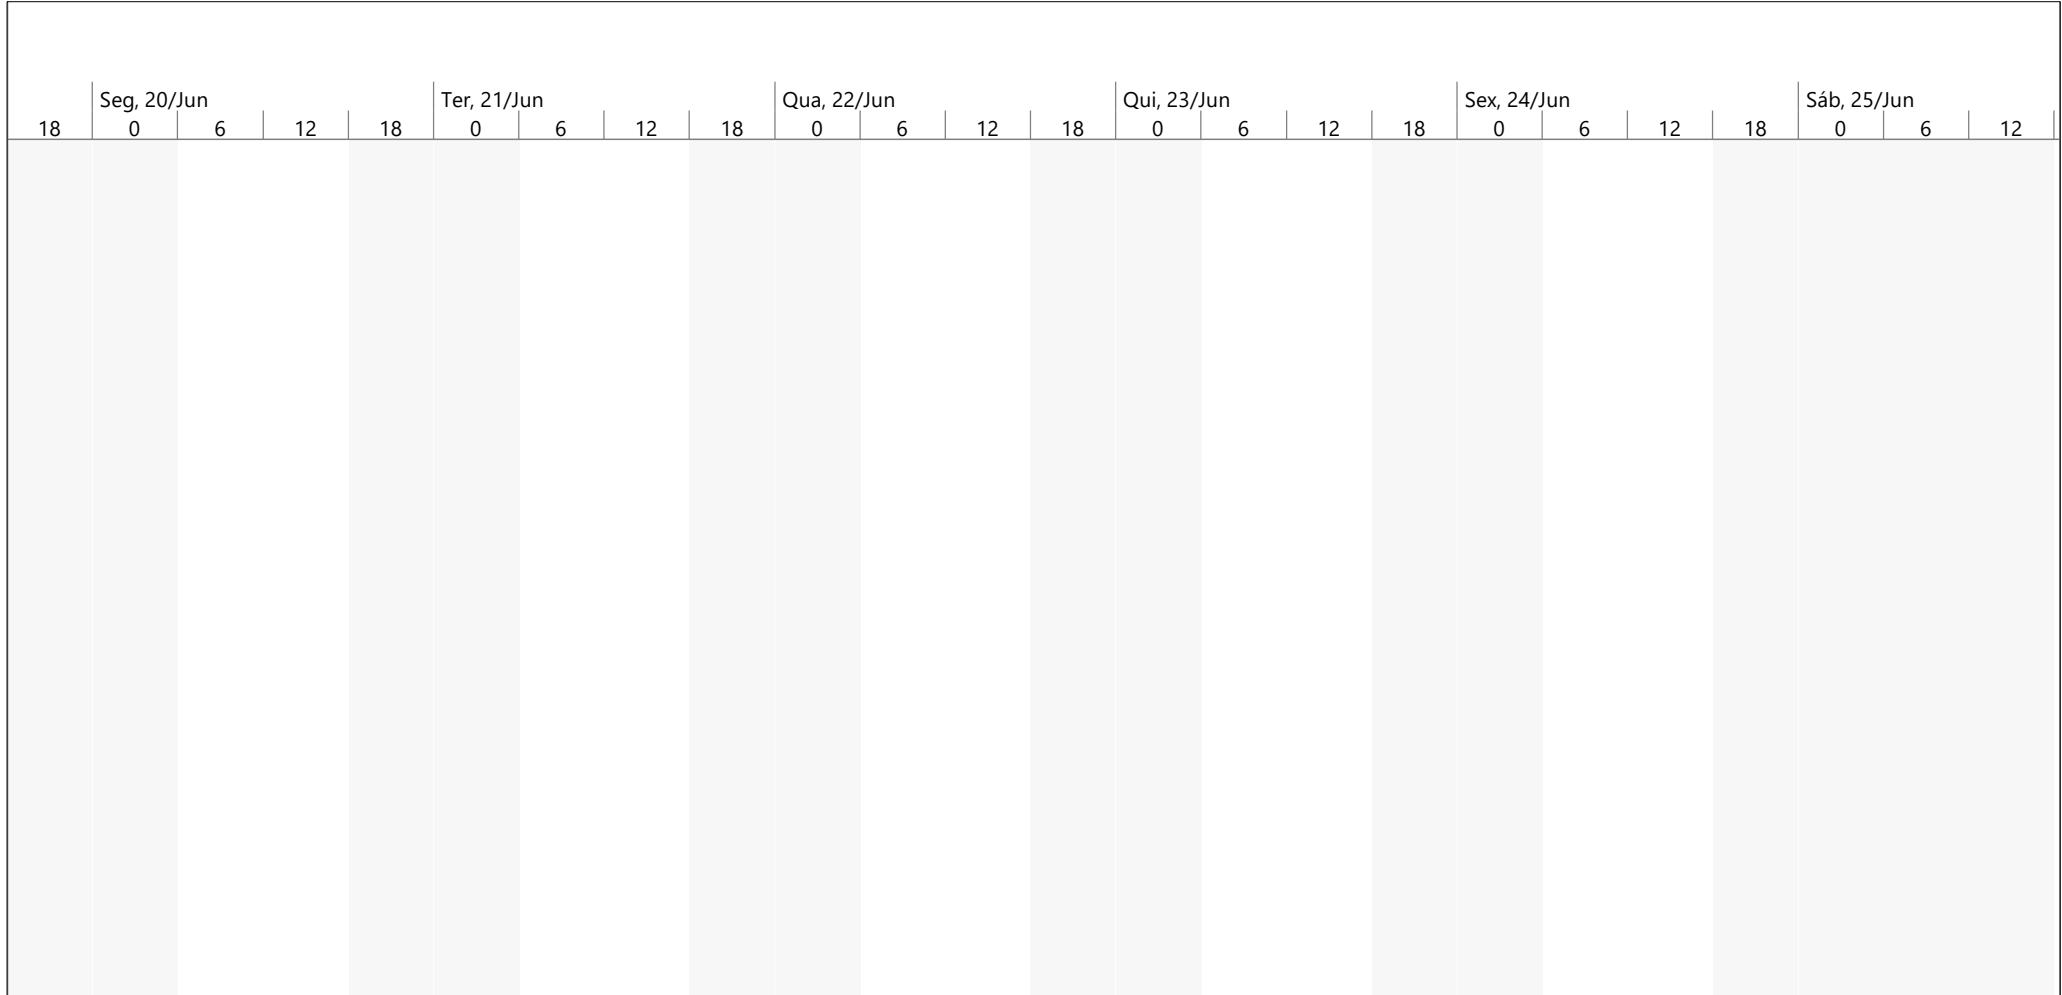


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

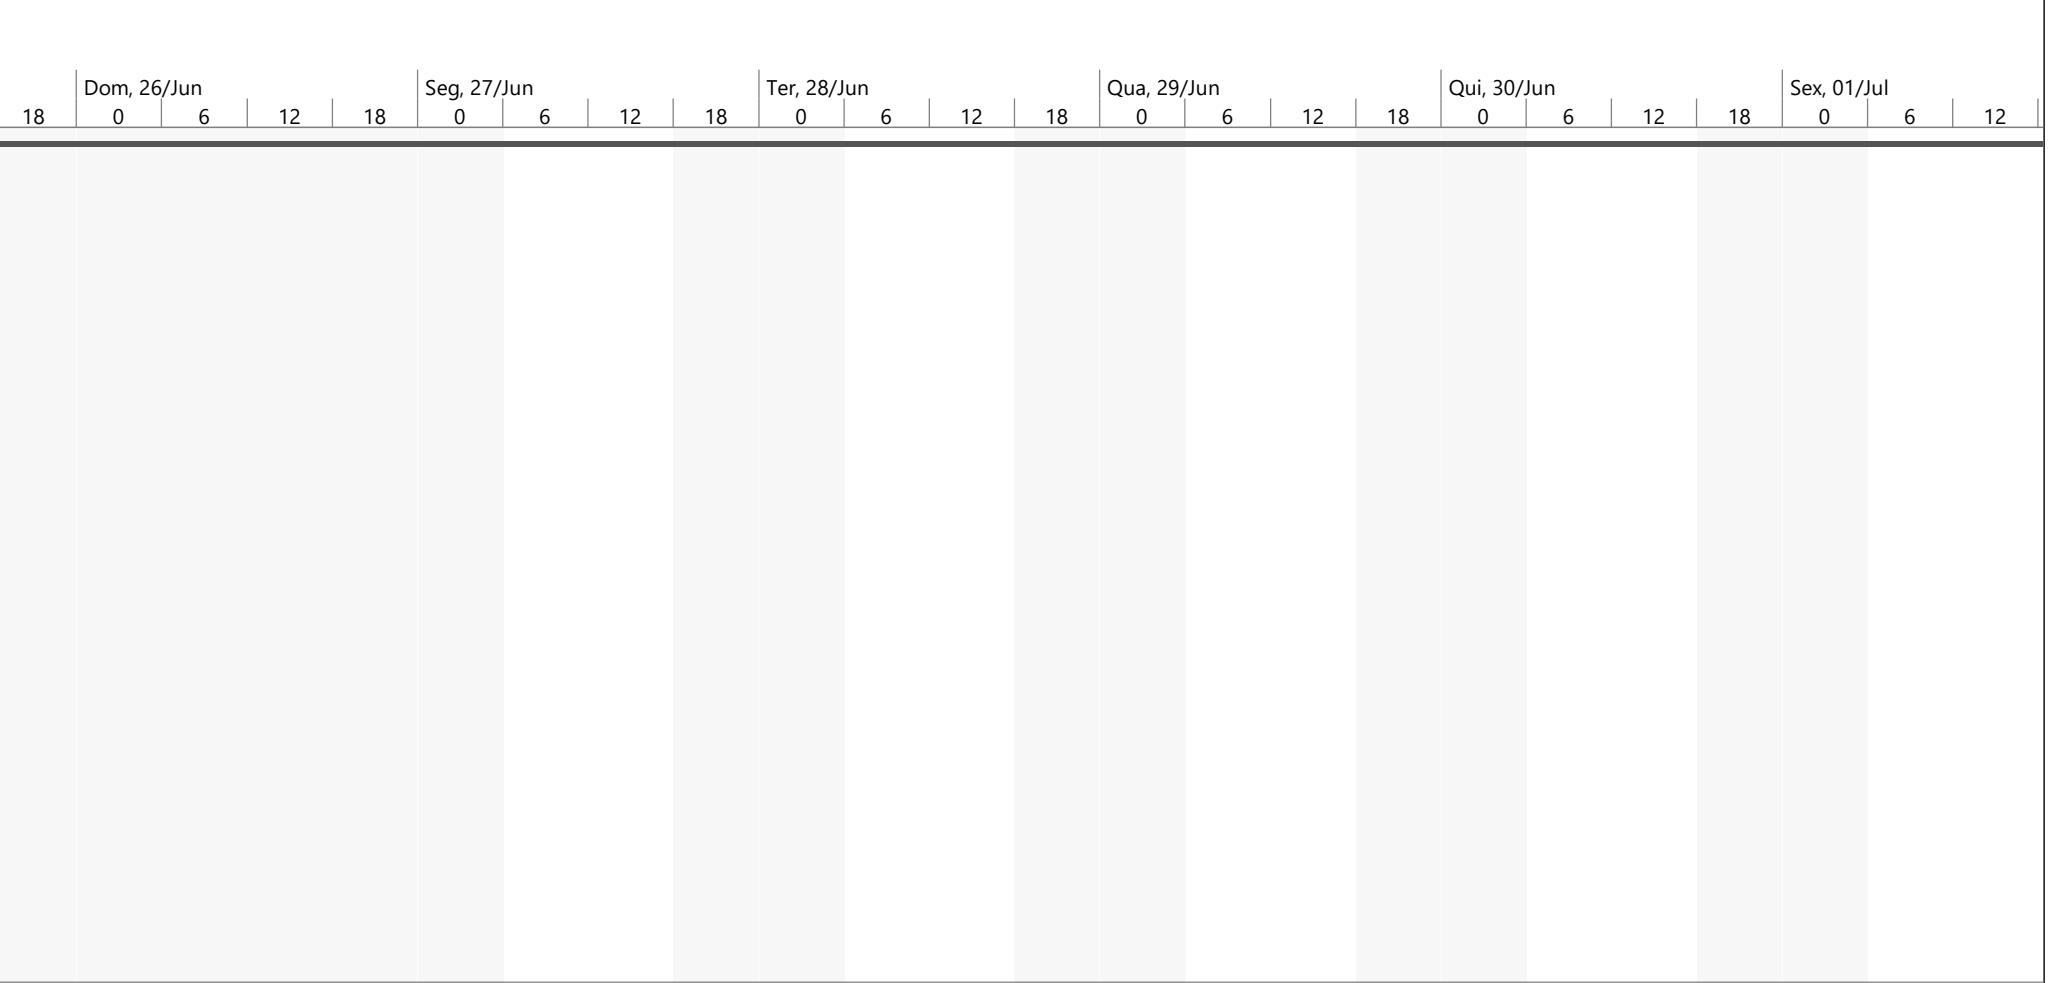


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

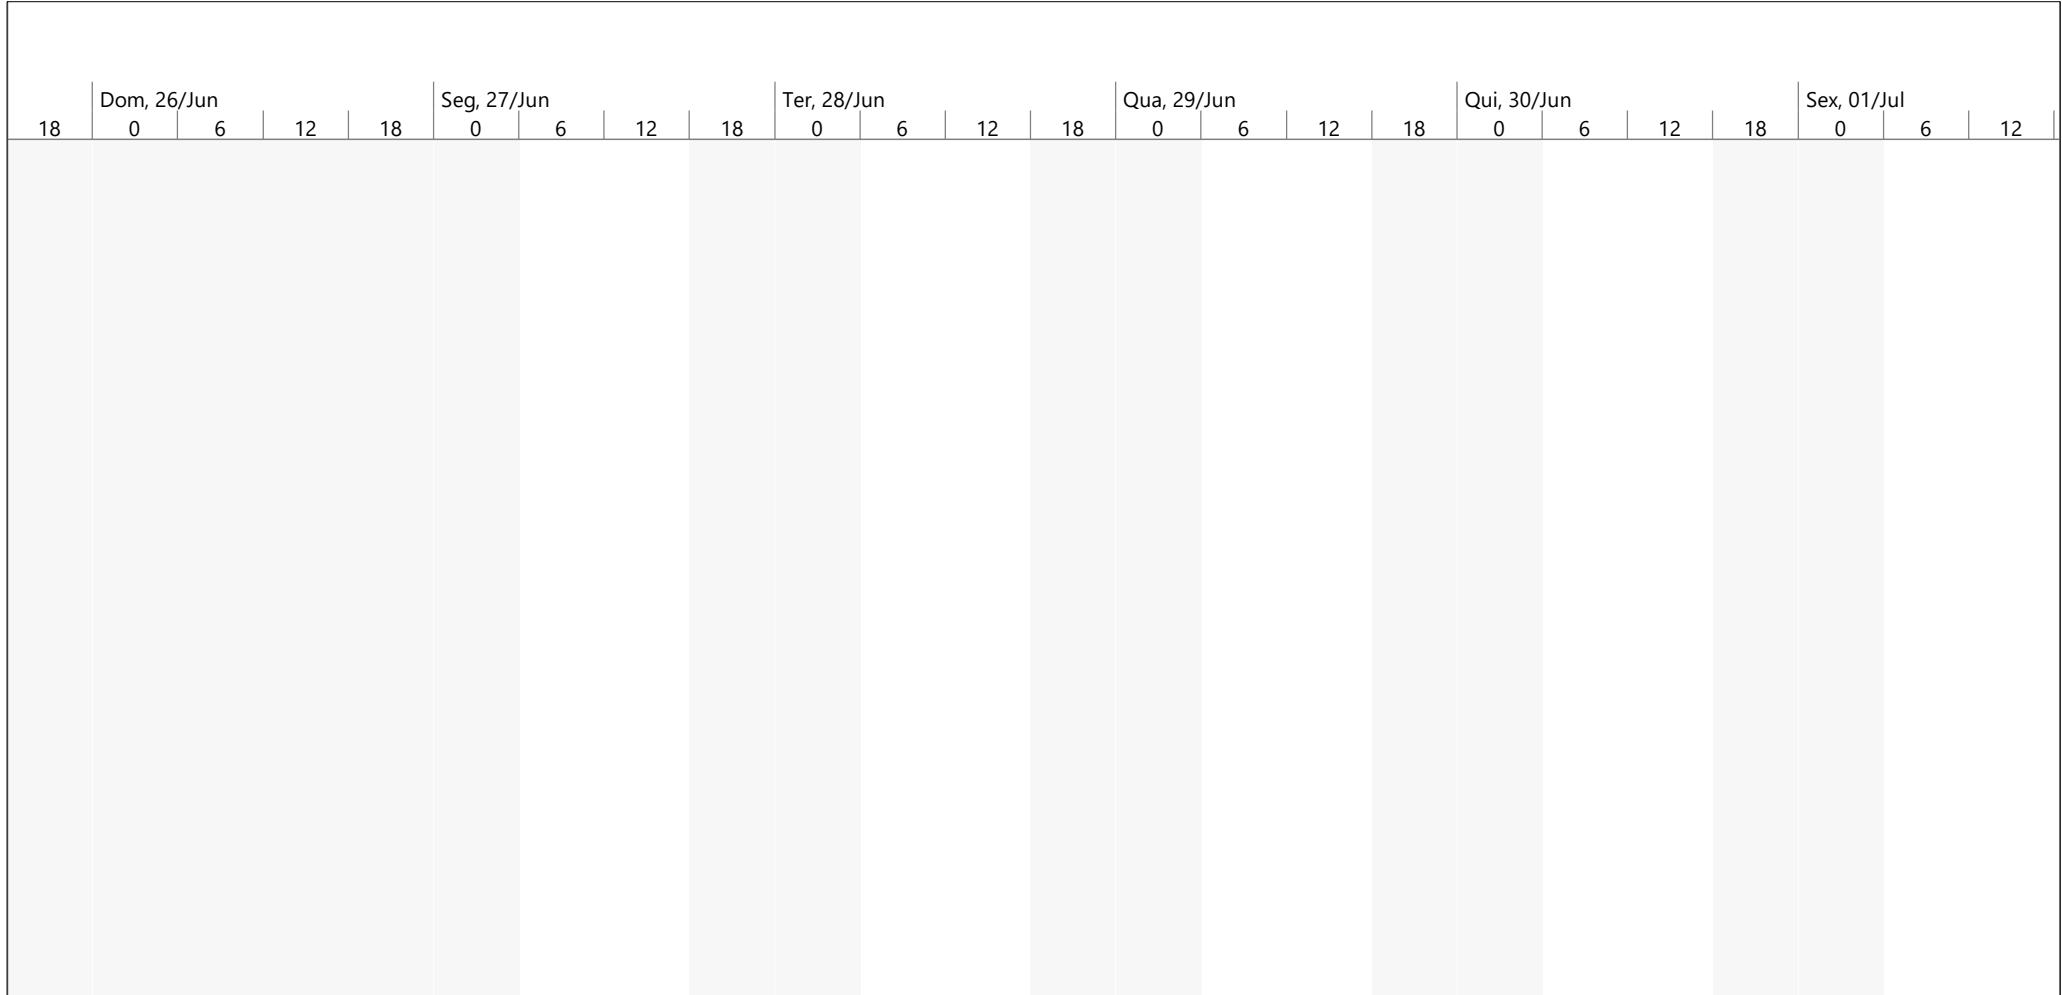


Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

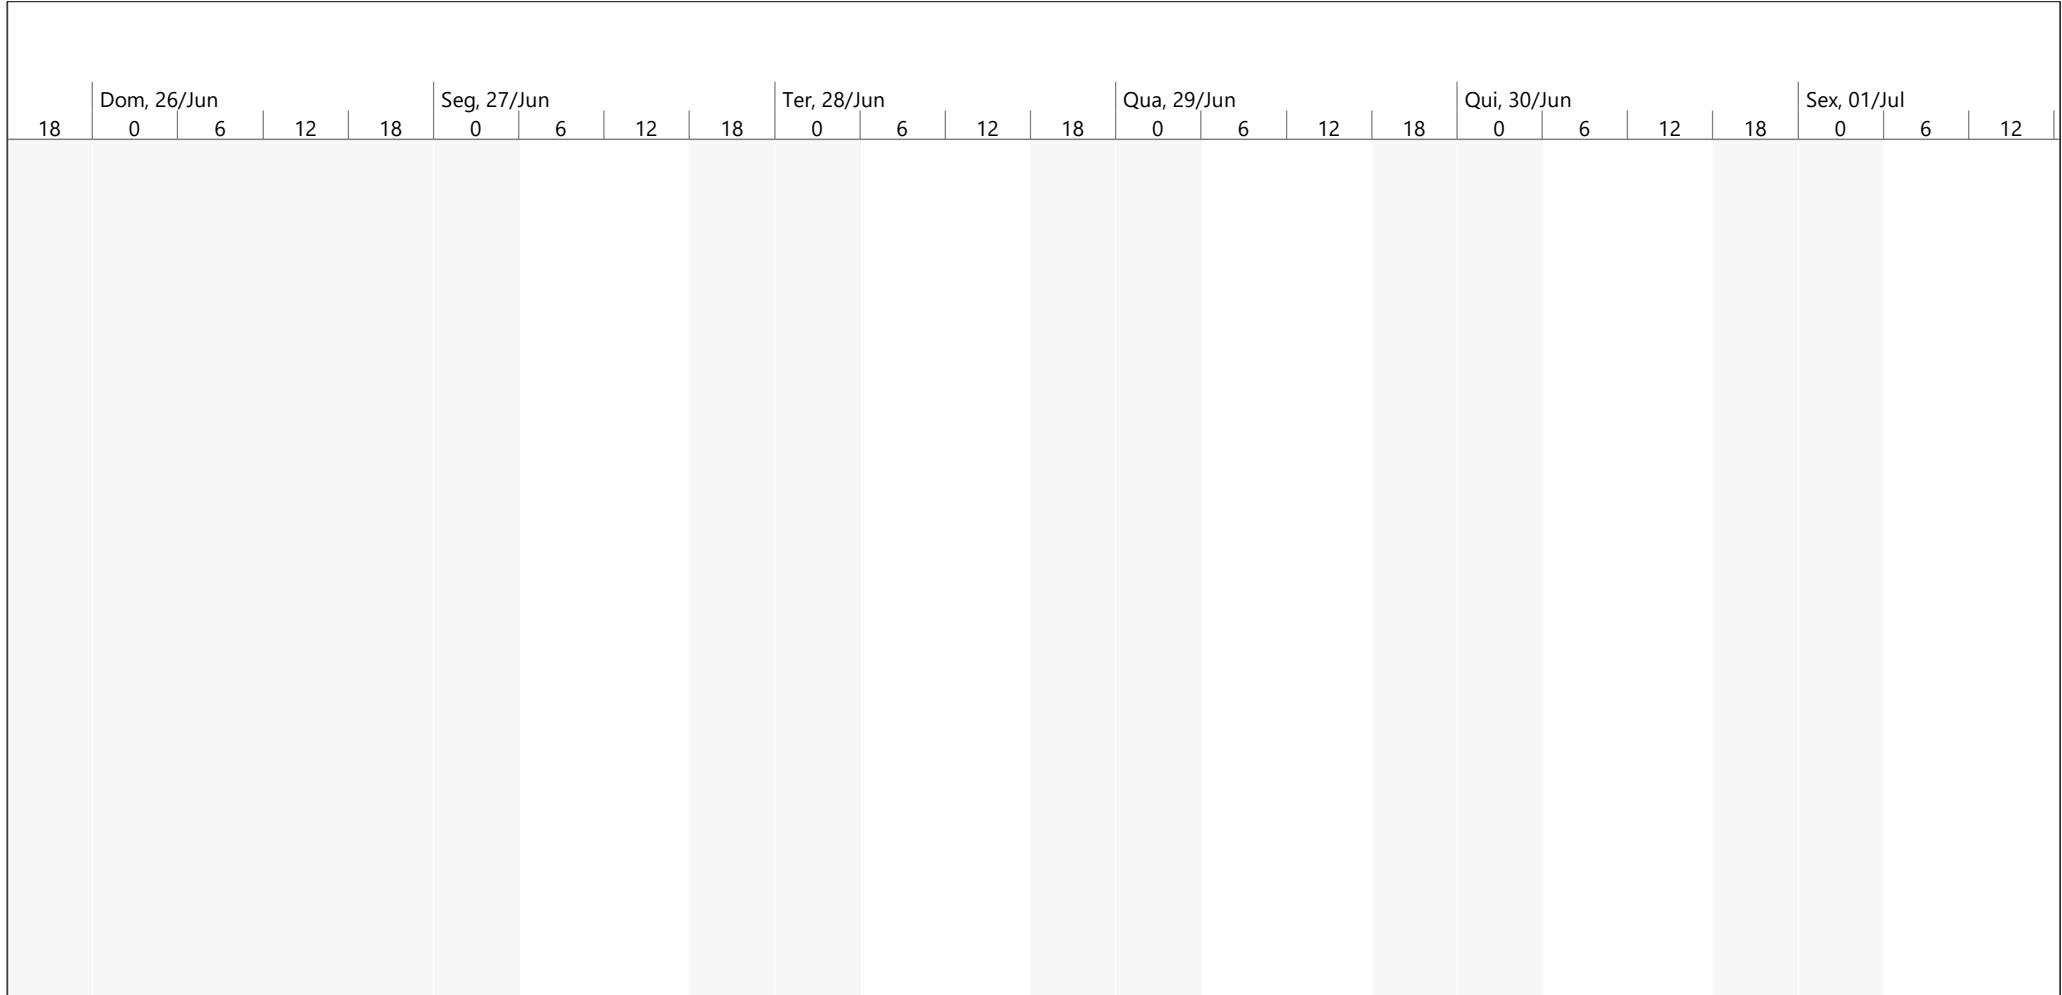

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	




Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

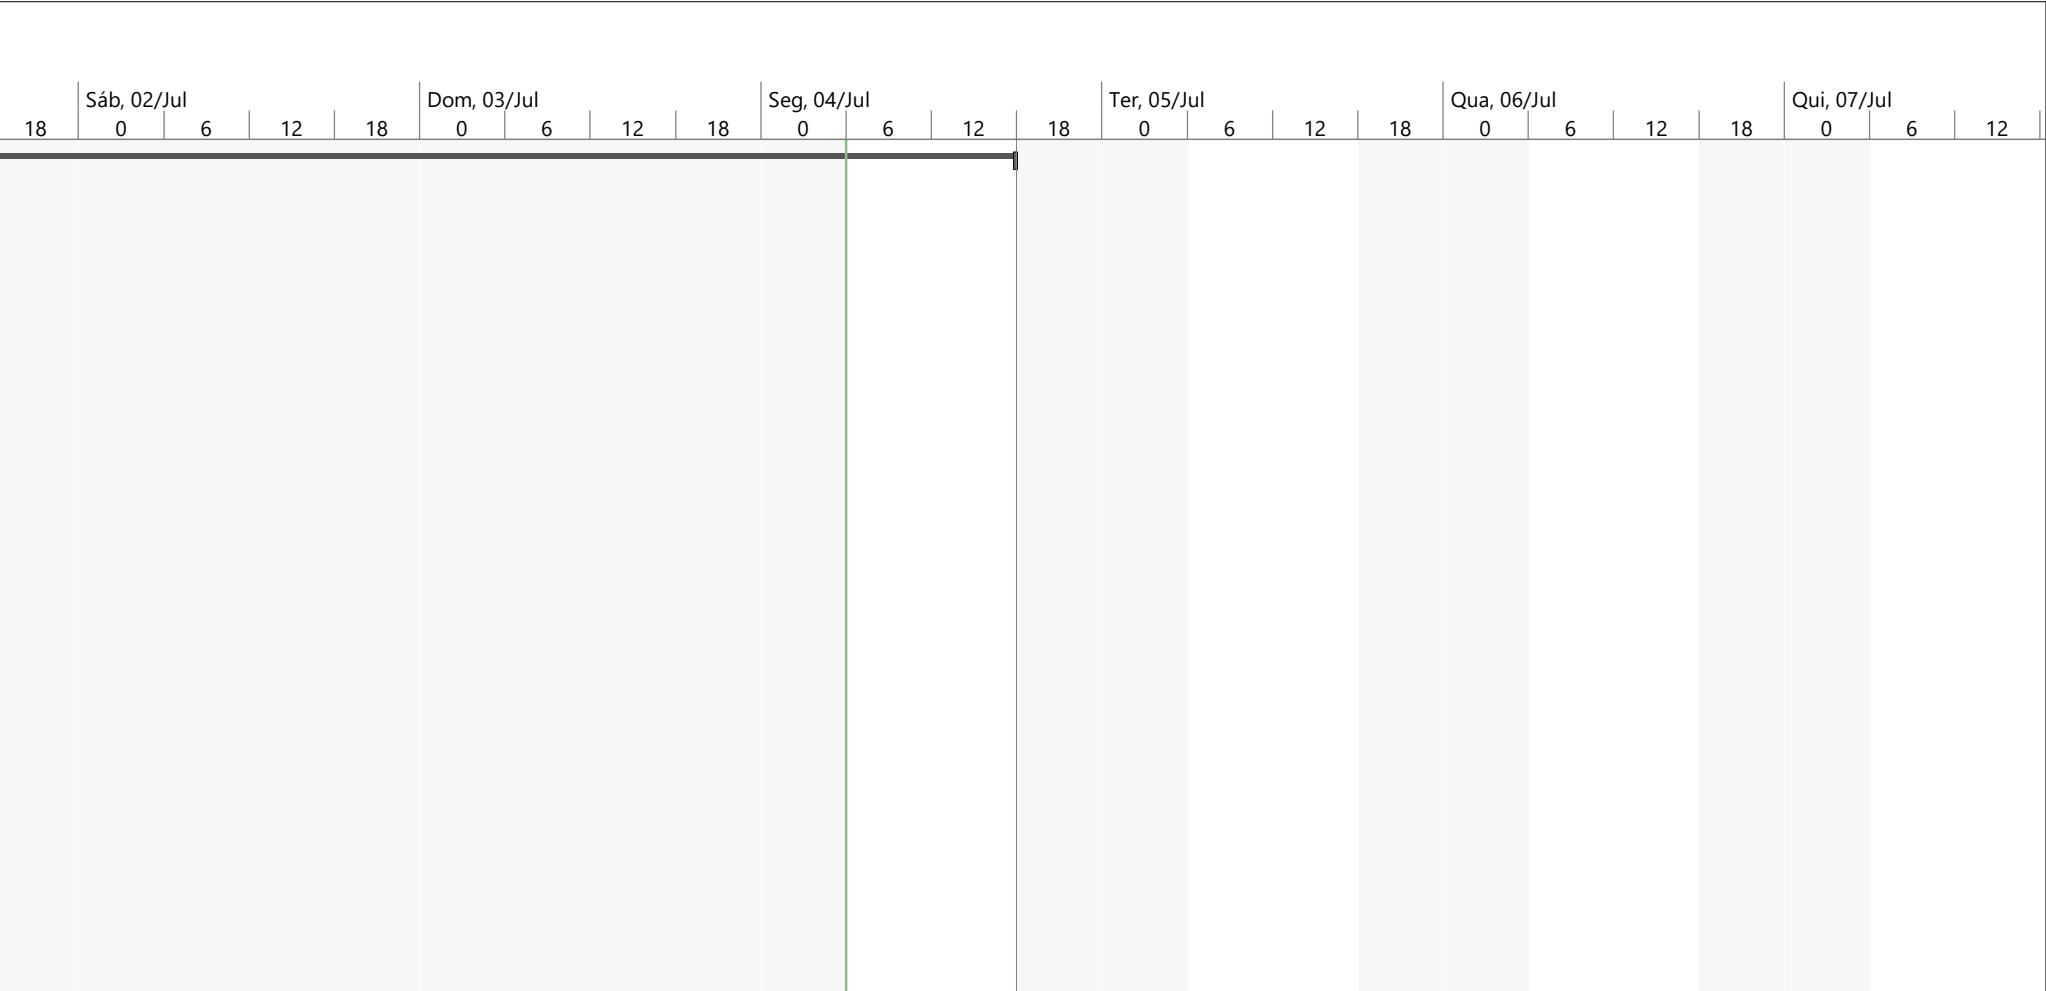


Projeto: Cronograma
Data: Seg 04/07/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

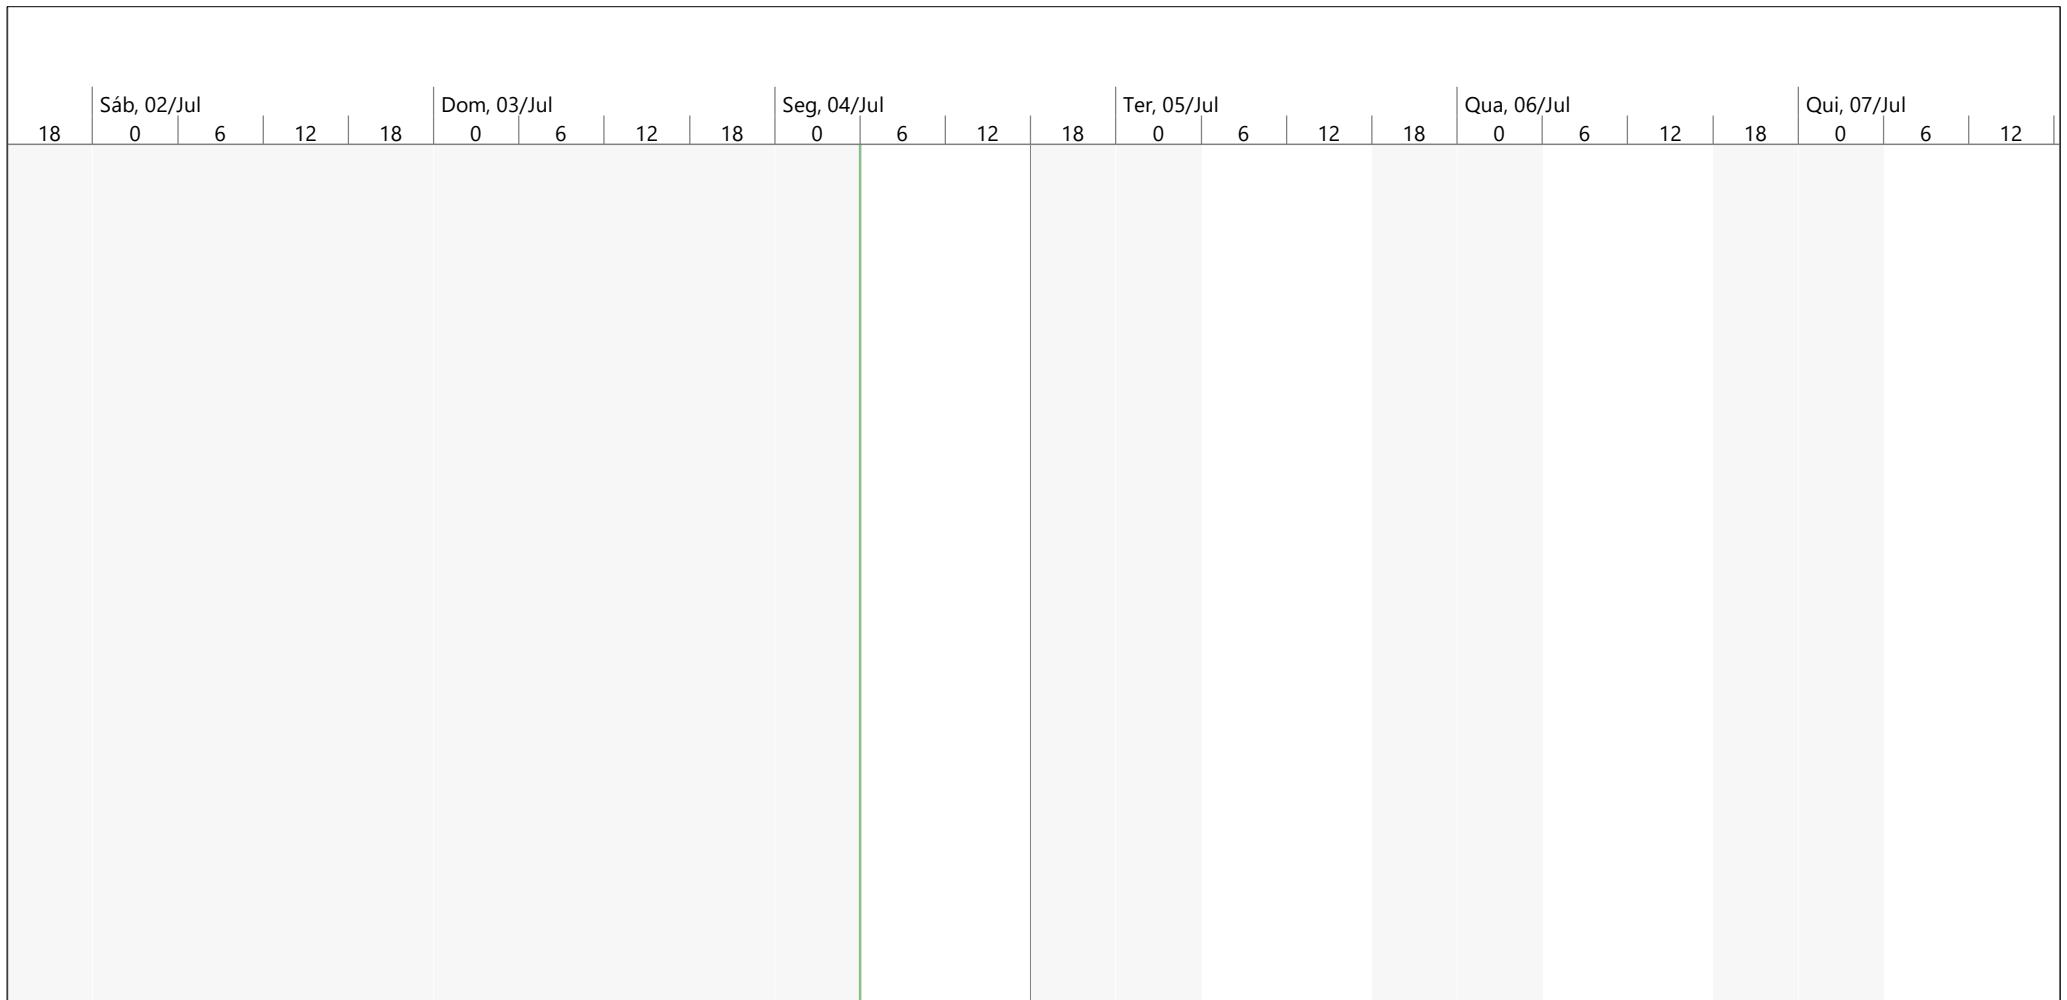

<p>Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22</p>	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

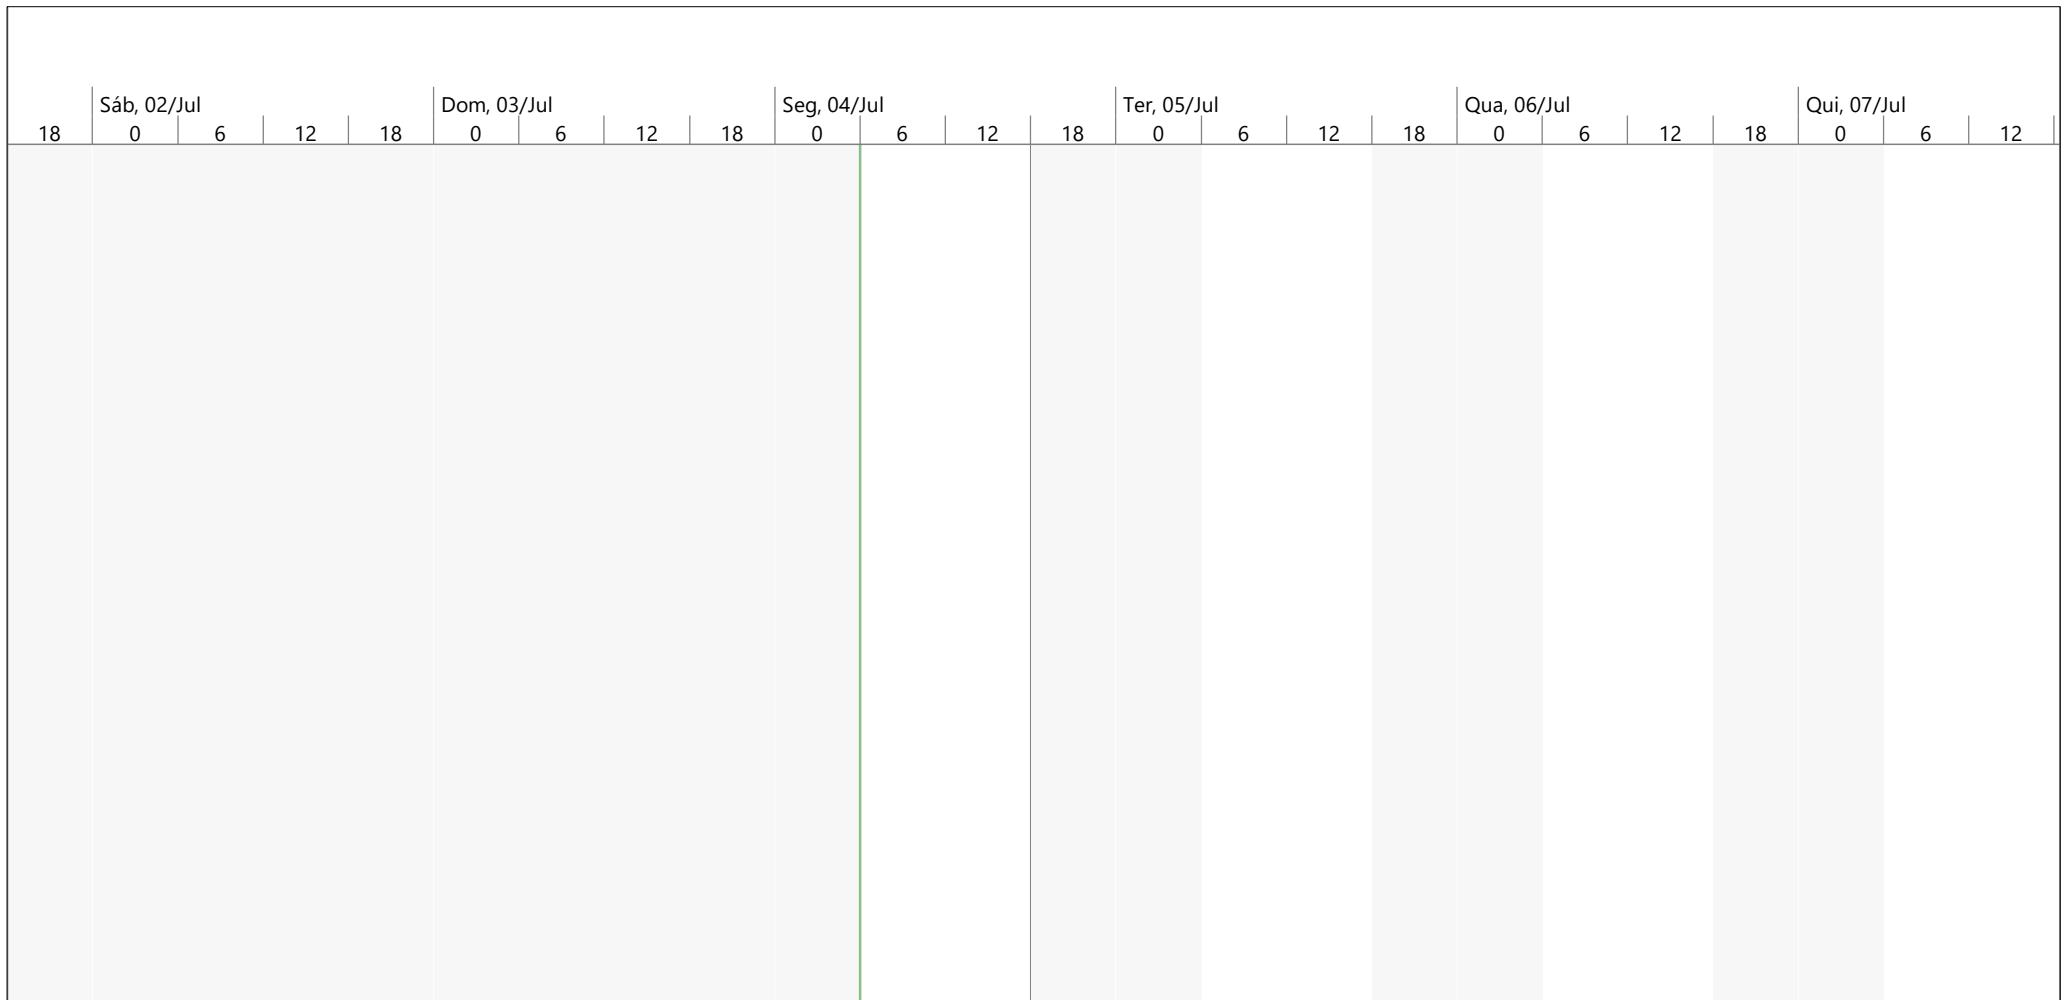

Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	



Projeto: Cronograma Data: Seg 04/07/22	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	
